

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
												VERSIÓN		1		
												PÁGINA		1	DE	9
												FECHA		2/9/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		ANTIOQUIA		ACTA No. 26		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 336 530 649.00		MES agosto-2023		
												ACTA FINAL		☐		
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL		VALOR INICIAL (incluido I): \$ 389 978 471 425.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$		389 978 471 425.00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 18/08/23		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
Subtotal				EXPLANACIONES				\$ 38 887 515 670		\$ 25 308 193 990		\$ 1 062 214 635		\$ 9 811 863 951.00		
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17.00	\$ 1 154 779	\$ 19 631 243		\$ -		\$ -		\$ -		
1.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas			\$ 1 154 779		17.00	\$ 19 631 243		\$ -	2.73	\$ 3 152 546.00		
2	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	405 159.00	\$ 52 715	\$ 21 357 956 685		\$ -		\$ -		\$ -		
2.1	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales			\$ 52 715		181 807.00	\$ 9 583 956 005	15 249.00	\$ 803 851 035	92 987.00	\$ 4 901 809 705.00		
3	1	210-13		excavación en material común de la explanación y canales	m3	1 718 124.00	\$ 9 200	\$ 15 806 740 800	31 294.00	\$ 287 904 800		\$ -	31 294.00	\$ 287 904 800.00		
3.1	1-11601	210-13		excavación en material común de la explanación y canales			\$ 9 200		1 569 345.00	\$ 14 437 974 000	28 083.00	\$ 258 363 600	497 357.00	\$ 4 575 684 400.00		
4	1	220-13		Terraplenes	m3	118 271.00	\$ 12 500	\$ 1 478 387 500		\$ -		\$ -		\$ -		
4.1	1-11602	220-13		Terraplenes			\$ 12 500		68 271.00	\$ 853 387 500		\$ -	3 465.00	\$ 43 312 500.00		
5	1	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante	m2	20 342.00	\$ 11 051	\$ 224 799 442		\$ -		\$ -		\$ -		
5.1	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante			\$ 11 051		11 342.00	\$ 125 340 442		\$ -		\$ -		
Subtotal				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$ 3 486 720 000		\$ 3 703 081 000		\$ -		\$ 161 920 000.00		
6	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	16 829.00	\$ 110 000	\$ 1 851 190 000		\$ -		\$ -		\$ -		
6.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 110 000		17 055.10	\$ 1 876 061 000		\$ -	1 472.00	\$ 161 920 000.00		
7	2	330-13		Base granular clase A	m3	12 581.00	\$ 130 000	\$ 1 635 530 000		\$ -		\$ -		\$ -		
7.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 130 000		11 607.00	\$ 1 508 910 000		\$ -		\$ -		
7.2	2-15105	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 130 000		2 447.00	\$ 318 110 000		\$ -		\$ -		
Subtotal				PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$ 8 227 878 276		\$ 5 240 557 746		\$ -		\$ -		
8	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	83 248.00	\$ 2 918	\$ 242 917 664		\$ -		\$ -		\$ -		
8.1	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2 918		68 263.00	\$ 199 191 434		\$ -		\$ -		
8.2	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2 918		1.00	\$ 2 918		\$ -		\$ -		
9	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	57 188.00	\$ 1 849	\$ 105 740 612		\$ -		\$ -		\$ -		
9.1	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1 849		46 894.00	\$ 86 707 006		\$ -		\$ -		
9.2	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1 849		15 617.30	\$ 28 876 388		\$ -		\$ -		
10	7	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	6 863.00	\$ 700 000	\$ 4 804 100 000		\$ -		\$ -		\$ -		
10.1	7-11603	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 700 000		5 628.00	\$ 3 939 600 000		\$ -		\$ -		
10.2	7-14104	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 700 000		1 235.00	\$ 864 500 000		\$ -		\$ -		
11	7	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4 271.00	\$ 720 000	\$ 3 075 120 000		\$ -		\$ -		\$ -		
11.1	7-11603	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 720 000		100.00	\$ 72 000 000		\$ -		\$ -		
11.2	7-14104	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 720 000		69.00	\$ 49 680 000		\$ -		\$ -		
Subtotal				PAVIMENTOS DE CONCRETO				\$ 2 752 295 000		\$ 337 295 000		\$ -		\$ -		
12	5	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	3 419.00	\$ 805 000	\$ 2 752 295 000		\$ -		\$ -		\$ -		
12.1	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3		\$ 805 000		342.00	\$ 275 310 000		\$ -		\$ -		
12.2	5-15105	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3		\$ 805 000		77.00	\$ 61 985 000		\$ -		\$ -		
Subtotal				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				\$ 173 395 951 001		\$ 162 413 064 232		\$ 5 584 973 533		\$ 78 883 735 514.00		
13	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	43 888.00	\$ 32 667	\$ 1 433 689 296		\$ -		\$ -		\$ -		
13.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		17 555.00	\$ 573 469 185		\$ -	4 699.70	\$ 153 525 099.00		
13.2	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		1 194.00	\$ 39 004 398		\$ -		\$ -		
13.3	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		9 887.00	\$ 322 978 629		\$ -	5 403.80	\$ 176 525 935.00		
13.4	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		7 778.00	\$ 254 083 926		\$ -	2 132.60	\$ 69 665 645.00		
13.5	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		8 778.00	\$ 286 750 926		\$ -	2 995.60	\$ 97 857 265.00		
13.6	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		2 195.00	\$ 71 704 065		\$ -		\$ -		
14	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21 548.00	\$ 80 707	\$ 1 739 074 436		\$ -		\$ -		\$ -		
14.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		1 000.00	\$ 80 707 000		\$ -		\$ -		
14.2	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		500.00	\$ 40 353 500		\$ -		\$ -		
14.3	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		1 254.00	\$ 101 206 578		\$ -		\$ -		
14.4	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		810.00	\$ 65 372 670		\$ -		\$ -		
14.5	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		810.00	\$ 65 372 670		\$ -	89.30	\$ 7 207 135.00		
14.6	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		578.00	\$ 46 648 646		\$ -		\$ -		
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3	87 497.00	\$ 38 000	\$ 3 324 886 000		\$ -		\$ -		\$ -		
15.1	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		22 675.00	\$ 861 650 000		\$ -	863.50	\$ 32 813 000.00		
15.2	5-11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		2 374.00	\$ 90 212 000		\$ -		\$ -		
15.3	5-11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		13 748.00	\$ 522 424 000	1 856.70	\$ 70 554 600	2 877.30	\$ 109 337 400.00		
15.4	5-14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		10 145.00	\$ 385 510 000		\$ -	164.50	\$ 6 251 000.00		
15.5	5-14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		10 145.00	\$ 385 510 000		\$ -		\$ -		
15.6	5-15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		4 377.00	\$ 166 326 000		\$ -		\$ -		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1											
												VERSIÓN		1											
												PÁGINA		2	DE	9									
												FECHA		2/9/2023											
														(Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 26		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 336 530 649.00				MES agosto-2023									
										ACTA FINAL ☐															
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL												VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):											
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00													
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 18/08/23		OBRA EJECUTADA														
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR											
16	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	85 825.00	\$ 70 000	\$ 6 007 750 000		\$ -		\$ -		\$ -											
16.1	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		8 330.00	\$ 583 100 000		\$ -		\$ -											
16.2	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		740.00	\$ 51 800 000		\$ -		\$ -											
16.3	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		8 581.00	\$ 600 670 000		\$ -		\$ -											
16.4	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		1 416.00	\$ 99 120 000		\$ -		\$ -											
16.5	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		1 416.00	\$ 99 120 000		\$ -		\$ -											
16.6	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		4 292.00	\$ 300 440 000	250.30	\$ 17 521 000	3 060.60	\$ 214 242 000.00											
17	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	16 634.00	\$ 131 414	\$ 2 185 940 476		\$ -		\$ -		\$ -											
17.1	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		4 654.00	\$ 611 600 756		\$ -		\$ -											
17.2	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		1 432.00	\$ 188 184 848		\$ -		\$ -											
17.3	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		1 663.00	\$ 218 541 482		\$ -		\$ -											
17.4	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		3 327.00	\$ 437 214 378		\$ -		\$ -											
17.5	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		3 327.00	\$ 437 214 378		\$ -		\$ -											
17.6	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		831.00	\$ 109 205 034		\$ -		\$ -											
18	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	10 628.00	\$ 133 476	\$ 1 418 582 928		\$ -		\$ -		\$ -											
18.1	5-11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		2 551.00	\$ 340 497 276		\$ -	1 490.70	\$ 198 972 673.00											
18.2	5-11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		531.00	\$ 70 875 756		\$ -		\$ -											
18.3	5-11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		563.00	\$ 75 146 988		\$ -		\$ -											
18.4	5-14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		626.00	\$ 83 555 976		\$ -	20.30	\$ 2 709 563.00											
18.5	5-14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		626.00	\$ 83 555 976		\$ -		\$ -											
18.6	5-15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		1 031.00	\$ 137 613 756		\$ -	3.00	\$ 400 428.00											
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m	m	231.00	\$ 2 250 000	\$ 519 750 000		\$ -		\$ -		\$ -											
19.1	6-11606		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 250 000		1 035.00	\$ 2 328 750 000	85.10	\$ 191 475 000	325.00	\$ 731 250 000.00											
19.2	6-14101		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 250 000		106.00	\$ 238 500 000	26.00	\$ 58 500 000	26.00	\$ 58 500 000.00											
20	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	496.00	\$ 2 900 000	\$ 1 438 400 000		\$ -		\$ -		\$ -											
20.1	6-11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 900 000		44.00	\$ 127 600 000	22.00	\$ 63 800 000	44.00	\$ 127 600 000.00											
20.2	6-14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m	m		\$ 2 900 000		371.00	\$ 1 075 900 000		\$ -	162.50	\$ 471 250 000.00											
21	6		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	220.00	\$ 3 600 000	\$ 792 000 000		\$ -		\$ -		\$ -											
21.1	6-11606		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3 600 000		14.00	\$ 50 400 000		\$ -		\$ -											
21.2	6-14101		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3 600 000		46.00	\$ 165 600 000		\$ -		\$ -											
22	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de	m	508.00	\$ 4 020 000	\$ 2 042 160 000		\$ -		\$ -		\$ -											
22.1	6-11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m		\$ 4 020 000		51.00	\$ 205 020 000		\$ -		\$ -											
22.2	6-14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m		\$ 4 020 000		157.00	\$ 631 140 000		\$ -	40.00	\$ 160 800 000.00											
23	6		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m	160.00	\$ 5 300 000	\$ 848 000 000		\$ -		\$ -		\$ -											
23.1	6-11606		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m		\$ 5 300 000		1.00	\$ 5 300 000		\$ -		\$ -											
23.2	6-14101		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 5 300 000		1.00	\$ 5 300 000		\$ -		\$ -											
24	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m	152.00	\$ 6 500 000	\$ 988 000 000		\$ -		\$ -		\$ -											
24.1	6-11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m		\$ 6 500 000		10.00	\$ 65 000 000		\$ -		\$ -											
24.2	6-14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m		\$ 6 500 000		161.00	\$ 1 046 500 000		\$ -	161.00	\$ 1 046 500 000.00											
25	4	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	36 262.00	\$ 210 000	\$ 7 615 020 000		\$ -		\$ -		\$ -											
25.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m		\$ 210 000		1.20	\$ 252 000		\$ -		\$ -											
26	4	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	32 316.00	\$ 324 690	\$ 10 492 682 040		\$ -		\$ -		\$ -											
26.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m		\$ 324 690		99 100.00	\$ 32 176 779 000	1 660.00	\$ 538 985 400	74 350.00	\$ 24 140 701 500.00											
27	4	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	m	21 103.00	\$ 350 000	\$ 7 386 050 000		\$ -		\$ -		\$ -											
27.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	m		\$ 350 000		6 103.00	\$ 2 136 050 000		\$ -		\$ -											
28	4	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)	m	25 316.00	\$ 375 000	\$ 9 493 500 000		\$ -		\$ -		\$ -											
28.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)	m		\$ 375 000		62 316.00	\$ 23 368 500 000	4 710.00	\$ 1 766 250 000	39 940.00	\$ 14 977 500 000.00											
29	4	623-13		Anclaje tipo tendón	m	18 637.00	\$ 311 825	\$ 5 811 482 525		\$ -		\$ -		\$ -											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		3	DE	9			
												FECHA		2/9/2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 26		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 336 530 649.00			MES agosto-2023				
												ACTA FINAL		☐					
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR INICIAL (incluido I+): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):						
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 18/08/23		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
29.1	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m		\$ 311 825		1.90	\$ 592 467		\$ -		\$ -					
30	4	623-13	PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte	m	86 057.00	\$ 121 647	\$ 10 468 575 879		\$ -		\$ -		\$ -					
30.1	4-11606	623-13	PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte	m		\$ 121 647		1.10	\$ 133 811		\$ -		\$ -					
31	4		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte	m	16 021.00	\$ 99 033	\$ 1 586 607 693		\$ -		\$ -		\$ -					
31.1	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte	m		\$ 99 033		21 021.00	\$ 2 081 772 693	45.00	\$ 4 456 485	7 233.00	\$ 716 305 689.00					
32	6		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes	m3	8 762.00	\$ 1 450 000	\$ 12 704 900 000		\$ -		\$ -		\$ -					
32.1	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes	m3		\$ 1 450 000		4 858.00	\$ 7 044 100 000	475.20	\$ 689 040 000	2 822.90	\$ 4 093 205 000.00					
33	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes	m3	1 388.00	\$ 1 350 000	\$ 1 873 800 000		\$ -		\$ -		\$ -					
33.1	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes	m3		\$ 1 350 000		196.60	\$ 265 410 000		\$ -		\$ -					
34	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	203.00	\$ 1 271 489	\$ 258 112 267		\$ -		\$ -		\$ -					
34.1	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		\$ 1 271 489		526.20	\$ 669 057 512		\$ -	304.80	\$ 387 549 846.00					
35	6		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3	6 902.00	\$ 930 000	\$ 6 418 860 000		\$ -		\$ -		\$ -					
35.1	6-11606		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		3 419.20	\$ 3 179 856 000	102.30	\$ 95 139 000	2 581.50	\$ 2 400 795 000.00					
35.2	6-14102		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		2 305.00	\$ 2 143 650 000	22.80	\$ 21 204 000	1 686.50	\$ 1 568 445 000.00					
35.3	6-15105		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		3 492.00	\$ 3 247 560 000	102.50	\$ 95 325 000	794.70	\$ 739 071 000.00					
36	6		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1 306.00	\$ 1 050 000	\$ 1 371 300 000		\$ -		\$ -		\$ -					
36.1	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		\$ 1 050 000		156.00	\$ 163 800 000		\$ -	31.30	\$ 32 865 000.00					
36.2	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		\$ 1 050 000		784.00	\$ 823 200 000		\$ -	266.90	\$ 280 245 000.00					
37	6		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	114.00	\$ 1 100 000	\$ 125 400 000		\$ -		\$ -		\$ -					
37.1	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3		\$ 1 100 000		84.90	\$ 93 390 000		\$ -	35.40	\$ 38 940 000.00					
37.2	6-114102		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3		\$ 1 100 000		55.50	\$ 61 050 000		\$ -		\$ -					
38	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	10 188.00	\$ 780 000	\$ 7 946 640 000		\$ -		\$ -		\$ -					
38.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		1 456.00	\$ 1 135 680 000	46.50	\$ 36 270 000	374.10	\$ 291 798 000.00					
38.2	5-11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		29.00	\$ 22 620 000		\$ -		\$ -					
38.3	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		1 665.00	\$ 1 298 700 000		\$ -		\$ -					
38.4	5-11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		309.00	\$ 241 020 000		\$ -	22.00	\$ 17 160 000.00					
38.5	5-14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		200.00	\$ 156 000 000		\$ -		\$ -					
38.6	5-15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		1 530.00	\$ 1 193 400 000		\$ -	75.90	\$ 59 202 000.00					
39	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	3 761.00	\$ 680 000	\$ 2 557 480 000		\$ -		\$ -		\$ -					
39.1	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		878.00	\$ 597 040 000		\$ -		\$ -					
39.2	5-11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		188.00	\$ 127 840 000		\$ -		\$ -					
39.3	5-11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		1 128.00	\$ 767 040 000		\$ -	158.70	\$ 107 916 000.00					
39.4	5-11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		188.00	\$ 127 840 000		\$ -		\$ -					
39.5	5-14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		164.00	\$ 111 520 000		\$ -		\$ -					
39.6	5-15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		165.00	\$ 112 200 000		\$ -		\$ -					
40	5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3	6 498.00	\$ 950 000	\$ 6 173 100 000		\$ -		\$ -		\$ -					
40.1	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3		\$ 950 000		20 727.90	\$ 19 691 505 000	418.70	\$ 397 765 000	11 002.62	\$ 10 452 489 000.00					
40.2	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3		\$ 950 000		350.00	\$ 332 500 000		\$ -	51.20	\$ 48 640 000.00					
41	5	630-13		concreto clase 14 mpa	m3	1 140.00	\$ 543 697	\$ 619 814 580		\$ -		\$ -		\$ -					
41.1	5-11604	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		398.10	\$ 216 445 776	34.50	\$ 18 757 547	217.80	\$ 118 417 207.00					
41.2	5-11605	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		7.00	\$ 3 805 879		\$ -		\$ -					
41.3	5-11606	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		221.00	\$ 120 157 037		\$ -	56.90	\$ 30 936 360.00					
41.4	5-11607	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		57.00	\$ 30 990 729		\$ -		\$ -					
41.5	5-14102	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		228.00	\$ 123 962 916		\$ -	25.10	\$ 13 646 795.00					
41.6	5-14104	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		171.00	\$ 92 972 187		\$ -	1.60	\$ 869 915.00					
41.7	5-15105	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		306.00	\$ 166 371 282	1.80	\$ 978 655	125.10	\$ 68 016 496.00					
42	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1 372.00	\$ 545 397	\$ 748 284 684		\$ -		\$ -		\$ -					
42.1	4-11605		632.1P	Baranda Metalica	m		\$ 545 397		400.00	\$ 218 158 800		\$ -		\$ -					
42.2	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m		\$ 545 397		686.00	\$ 374 142 342		\$ -		\$ -					
43	4	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg	5 529 845.00	\$ 5 378	\$ 29 739 506 410		\$ -		\$ -		\$ -					
43.1	4-11606	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		552 985.00	\$ 2 973 953 330	44 673.70	\$ 240 255 159	407 476.80	\$ 2 191 410 232.00					
43.2	4-11605	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		23 013.30	\$ 123 765 527		\$ -		\$ -					
43.3	4-11604	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		561 477.00	\$ 3 019 623 306	2 446.70	\$ 13 158 353	19 640.90	\$ 105 628 760.00					
43.4	4-14101	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		552 985.00	\$ 2 973 953 330	9 528.10	\$ 51 242 122	311 830.30	\$ 1 677 023 352.00					
43.5	4-14102	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		552 985.00	\$ 2 973 953 330		\$ -	353 610.00	\$ 1 901 714 579.00					
43.6	4-14103	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		552 985.00	\$ 2 973 953 330	57 056.60	\$ 306 850 395	423 847.10	\$ 2 279 449 704.00					
43.7	4-14104	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		252 985.00	\$ 1 360 553 330		\$ -	40 026.50	\$ 215 262 516.00					
43.8	4-15102	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		252 985.00	\$ 1 360 553 330	311.90	\$ 1 677 398	32 483.30	\$ 174 695 187.00					
43.9	4-15104	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		605 966.00	\$ 3 258 885 148	10 494.00	\$ 56 436 732	59 335.30	\$ 319 105 243.00					
44	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	tf-m	1 751 321.00	\$ 2 150	\$ 3 765 340 150		\$ -		\$ -		\$ -					
44.1	4-14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	tf-m		\$ 2 150		1 908 393.00	\$ 4 103 044 950	276 152.50	\$ 593 727 875	1 470 838.50	\$ 3 162 302 775.00					
45	4	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und	56.00	\$ 2 551 672	\$ 142 893 632		\$ -		\$ -		\$ -					
45.1	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und		\$ 2 551 65												

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
												VERSIÓN		1		
												PÁGINA		4	DE	9
												FECHA		2/9/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		ANTIOQUIA		ACTA No. 26		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 336 530 649.00		MES agosto-2023		
												ACTA FINAL		☐		
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO-CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR INICIAL (incluido I): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):				
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00						
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 18/08/23		OBRA EJECUTADA				
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
46.1	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	und		\$ 6 524 758		8.00	\$ 52 198 064		\$ -		\$ -		
47	4	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de	und	24.00	\$ 8 095 360	\$ 194 288 640		\$ -		\$ -		\$ -		
47.1	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de	und		\$ 8 095 360		24.00	\$ 194 288 640		\$ -		\$ -		
48	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de	m	37.00	\$ 611 137	\$ 22 612 069		\$ -		\$ -		\$ -		
48.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de	m		\$ 611 137		37.00	\$ 22 612 069		\$ -		\$ -		
49	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de	m	349.00	\$ 1 300 914	\$ 454 018 986		\$ -		\$ -		\$ -		
49.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de	m		\$ 1 300 914		349.00	\$ 454 018 986		\$ -	54.60	\$ 71 029 904.00		
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de	m	26.00	\$ 1 722 892	\$ 44 795 192		\$ -		\$ -		\$ -		
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de	m		\$ 1 722 892		26.00	\$ 44 795 192		\$ -		\$ -		
51	5	663-13		tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	m	3 628.00	\$ 42 055	\$ 152 575 540		\$ -		\$ -		\$ -		
51.1	5-11604	663-13		tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	m		\$ 42 055		1 814.00	\$ 76 287 770	7.20	\$ 302 796	724.40	\$ 30 464 643.00		
51.2	5-11606	663-13		tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	m		\$ 42 055		544.00	\$ 22 877 920		\$ -	326.20	\$ 13 718 341.00		
51.3	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100	m		\$ 42 055		1 270.00	\$ 53 409 850		\$ -		\$ -		
52	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m	2 630.00	\$ 69 709	\$ 183 334 670		\$ -		\$ -		\$ -		
52.1	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m		\$ 69 709		1 052.00	\$ 73 333 868		\$ -	173.10	\$ 12 066 628.00		
52.2	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m		\$ 69 709		789.00	\$ 55 000 401		\$ -		\$ -		
52.3	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m		\$ 69 709		1 879.00	\$ 130 983 211	75.20	\$ 5 242 117	737.70	\$ 51 424 329.00		
53	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m	599.00	\$ 80 970	\$ 48 501 030		\$ -		\$ -		\$ -		
53.1	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m		\$ 80 970		180.00	\$ 14 574 600		\$ -		\$ -		
53.2	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m		\$ 80 970		240.00	\$ 19 432 800	80.50	\$ 6 518 085	157.80	\$ 12 777 066.00		
53.3	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m		\$ 80 970		162.00	\$ 13 117 140		\$ -		\$ -		
53.4	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m		\$ 80 970		137.00	\$ 11 092 890		\$ -		\$ -		
54	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	771.00	\$ 202 186	\$ 155 885 406		\$ -		\$ -		\$ -		
54.1	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		\$ 202 186		347.00	\$ 70 158 542		\$ -	188.00	\$ 38 010 968.00		
54.2	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		\$ 202 186		424.00	\$ 85 726 864		\$ -		\$ -		
55	5	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	1 435.00	\$ 250 758	\$ 359 837 730		\$ -		\$ -		\$ -		
55.1	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		\$ 250 758		1 435.00	\$ 359 837 730		\$ -		\$ -		
56	5	663-13	670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA	m3	3 568.00	\$ 780 000	\$ 2 783 040 000		\$ -		\$ -		\$ -		
56.1	5-11604	663-13	670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA	m3		\$ 780 000		2 168.00	\$ 1 691 040 000	19.60	\$ 15 288 000	137.50	\$ 107 250 000.00		
57	5	671.1P		Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la	m3	9 621.00	\$ 643 000	\$ 6 186 303 000		\$ -		\$ -		\$ -		
57.1	5-11604	671.1P		Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la	m3		\$ 643 000		2 421.00	\$ 1 556 703 000		\$ -		\$ -		
58	5	671.4P		Cunetas en sacos de suelo cemento	m	630.00	\$ 137 058	\$ 86 346 540		\$ -		\$ -		\$ -		
58.1	5-11604	671.4P		Cunetas en sacos de suelo cemento	m		\$ 137 058		630.00	\$ 86 346 540		\$ -		\$ -		
59	5	671.5P		Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	1 801.00	\$ 194 649	\$ 350 562 849		\$ -		\$ -		\$ -		
59.1	5-11604	671.5P		Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		\$ 194 649		900.00	\$ 175 184 100		\$ -		\$ -		
59.2	5-11606	671.5P		Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		\$ 194 649		901.00	\$ 175 378 749		\$ -		\$ -		
60	5	671.7P		Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	4 426.00	\$ 1 050 000	\$ 4 647 300 000		\$ -		\$ -		\$ -		
60.1	5-11604	671.7P		Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		\$ 1 050 000		1 041.00	\$ 1 093 050 000		\$ -	45.10	\$ 47 355 000.00		
60.2	5-11606	671.7P		Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		\$ 1 050 000		2 213.00	\$ 2 323 650 000		\$ -		\$ -		
61	7	673-13		geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido)	m2	28 751.00	\$ 7 005	\$ 201 400 755		\$ -		\$ -		\$ -		
61.1	7-11604	673-13		geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido)	m2		\$ 7 005		11 501.00	\$ 80 564 505		\$ -	4 386.20	\$ 30 725 331.00		
61.2	7-11606	673-13		geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido)	m2		\$ 7 005		5 750.00	\$ 40 278 750		\$ -		\$ -		
61.3	7-15106	673-13		geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido)	m2		\$ 7 005		11 500.00	\$ 80 557 500		\$ -		\$ -		
62	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	78 089.00	\$ 7 720	\$ 602 847 080		\$ -		\$ -		\$ -		
62.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		\$ 7 720		31 235.00	\$ 241 134 200	1 021.00	\$ 7 882 120	1 091.10	\$ 8 423 292.00		
62.2	7-11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		\$ 7 720		15 618.00	\$ 120 570 960		\$ -		\$ -		
62.3	7-15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		\$ 7 720		31 236.00	\$ 241 141 920		\$ -	32.00	\$ 247 040.00		
63	7	673.3P		Geodren planar 0,50 m	m	585.00	\$ 28 444	\$ 16 639 740		\$ -		\$ -		\$ -		
63.1	7-11604	673.3P		Geodren planar 0,50 m	m		\$ 28 444		4 531.40	\$ 128 891 142		\$ -	3 459.70	\$ 98 407 706.00		
63.2	7-11606	673.3P		Geodren planar 0,50 m	m		\$ 28 444		1 817.00	\$ 51 682 748	135.80	\$ 3 862 695	429.80	\$ 12 225 231.00		
63.3	7-15106	673.3P		Geodren planar 0,50 m	m		\$ 28 444		2 034.00	\$ 57 855 096	75.20	\$ 2 138 989	454.10	\$ 12 916 421.00		
64	5	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)	m	23 684.00	\$ 65 894	\$ 1 560 633 496		\$ -		\$ -		\$ -		
64.1	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)	m		\$ 65 894		23 684.00	\$ 1 560 633 496		\$ -		\$ -		
65	5	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	7 965.00	\$ 190 308	\$ 1 515 803 220		\$ -		\$ -		\$ -		
65.1	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m		\$ 190 308		10 965.00	\$ 2 086 727 220	570.00	\$ 108 475 560	5 322.00	\$ 1 012 819 176.00		
66	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	74 901.00	\$ 13 581	\$ 1 017 230 481		\$ -		\$ -		\$ -		
66.1	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 13 581		74 901.00	\$ 1 017 230 481		\$ -		\$ -		
67	7	683-13		geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	82 321.00	\$ 20 637	\$ 1 698 858 477		\$ -		\$ -		\$ -		
67.1	7-11606	683-13		geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 20 637		82 321.00	\$ 1 698 858 477		\$ -	31 139.00	\$ 642 615 543.00		
68	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	9 836.00	\$ 32 884	\$ 323 447 024		\$ -		\$ -		\$ -		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

5

DE

9

FECHA

2/9/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

ACTA No.

26

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 15 336 530 649.00

MES

agosto-2023

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No : 983 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCION, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL:

37 MESES

PLAZO ACUMULADO:

37 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

02/07/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

01/08/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido I):

\$ 389 978 471 425.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 389 978 471 425.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
68.1	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 32 884		9 836.00	\$ 323 447 024		\$ -		\$ -
69	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	11 346.00	\$ 40 763	\$ 462 496 998		\$ -		\$ -		\$ -
69.1	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 40 763		11 346.00	\$ 462 496 998		\$ -		\$ -
70	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	11 322.00	\$ 20 969	\$ 237 411 018		\$ -		\$ -		\$ -
70.1	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 20 969		26 322.00	\$ 551 946 018	5 050.00	\$ 105 893 450	16 372.00	\$ 343 304 468.00
Subtotal				OBRAS SUBTERRÁNEAS			\$ 88 356 190 138		\$ 82 847 323 133		\$ 3 296 024 750		\$ 52 039 372 715.00	
71	5		PT-1	Perforación exploratoria	m	1 206.00	\$ 231 723	\$ 279 457 938		\$ -		\$ -		\$ -
71.1	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	m		\$ 231 723		1 206.00	\$ 279 457 938		\$ -		\$ -
72	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	13 426.00	\$ 250 000	\$ 3 356 500 000		\$ -		\$ -		\$ -
72.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3		\$ 250 000		23 426.00	\$ 5 856 500 000	176.20	\$ 44 050 000	10 932.90	\$ 2 733 225 000.00
73	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	57 279.00	\$ 256 280	\$ 14 679 462 120		\$ -		\$ -		\$ -
73.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3		\$ 256 280		67 279.00	\$ 17 242 262 120	365.60	\$ 93 695 968	54 520.20	\$ 13 972 436 856.00
74	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	53 444.00	\$ 305 000	\$ 16 300 420 000		\$ -		\$ -		\$ -
74.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3		\$ 305 000		29 730.10	\$ 9 067 680 500	40.20	\$ 12 261 000	9 699.10	\$ 2 958 225 500.00
75	4		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	m	21 401.00	\$ 98 785	\$ 2 114 097 785		\$ -		\$ -		\$ -
75.1	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	m		\$ 98 785		23 401.00	\$ 2 311 667 785	150.00	\$ 14 817 750	16 918.00	\$ 1 671 244 630.00
76	5		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	14 649.00	\$ 1 000 000	\$ 14 649 000 000		\$ -		\$ -		\$ -
76.1	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3		\$ 1 000 000		6 858.10	\$ 6 858 100 000	2 327.20	\$ 2 327 200 000	2 327.20	\$ 2 327 200 000.00
77	5		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación	m3	9 768.00	\$ 1 030 000	\$ 10 061 040 000		\$ -		\$ -		\$ -
77.1	5-11606		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación	m3		\$ 1 030 000		4 242.90	\$ 4 370 187 000	210.50	\$ 216 815 000	3 094.67	\$ 3 187 510 100.00
77.2	5-15103		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación subterránea)	m3		\$ 1 030 000		18 490.70	\$ 19 045 421 000	343.60	\$ 353 908 000	13 821.44	\$ 14 236 083 200.00
78	5		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	240.00	\$ 173 926	\$ 41 742 240		\$ -		\$ -		\$ -
78.1	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m		\$ 173 926		240.00	\$ 41 742 240		\$ -		\$ -
79	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2	23 412.00	\$ 24 116	\$ 564 603 792		\$ -		\$ -		\$ -
79.1	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2		\$ 24 116		14 047.00	\$ 338 757 452		\$ -		\$ -
79.2	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2		\$ 24 116		9 365.00	\$ 225 846 340		\$ -		\$ -
80	4		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2	29 216.00	\$ 14 391	\$ 420 447 456		\$ -		\$ -		\$ -
80.1	4-11606		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2		\$ 14 391		116 868.00	\$ 1 681 847 388	4 526.70	\$ 65 143 740	82 247.80	\$ 1 183 628 092.00
80.2	4-15104		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2		\$ 14 391		22 365.10	\$ 321 856 154	238.90	\$ 3 438 010	8 067.20	\$ 116 095 074.00
81	4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	211 151.00	\$ 28 502	\$ 6 018 225 802		\$ -		\$ -		\$ -
81.1	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2		\$ 28 502		42 305.00	\$ 1 205 777 110		\$ -	712.10	\$ 20 296 274.00
81.2	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2		\$ 28 502		20 460.00	\$ 583 150 920		\$ -		\$ -
82	4		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	708 686.00	\$ 10 584	\$ 7 500 732 624		\$ -		\$ -		\$ -
82.1	4-15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg		\$ 10 584		474 945.00	\$ 5 026 817 880	4 406.40	\$ 46 637 338	333 749.40	\$ 3 532 403 651.00
83	4		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	26 789.00	\$ 8 836	\$ 236 707 604		\$ -		\$ -		\$ -
83.1	4-15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg		\$ 8 836		11 789.00	\$ 104 167 604		\$ -		\$ -
84	4		PT-6	Fibra de Acero	Kg	244 200.00	\$ 12 365	\$ 3 019 533 000		\$ -		\$ -		\$ -
84.1	4-15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg		\$ 12 365		60 898.70	\$ 753 012 425		\$ -	46 550.90	\$ 575 601 880.00
85	7		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	40 801.00	\$ 80 000	\$ 3 264 080 000		\$ -		\$ -		\$ -
85.1	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil			\$ 80 000		1.10	\$ 88 000		\$ -		\$ -
86	5		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	16.00	\$ 3 514 941	\$ 56 239 056		\$ -		\$ -		\$ -
86.1	5-15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A			\$ 3 514 941		16.00	\$ 56 239 056		\$ -		\$ -
87	5		PT10	tubería para enfijajes: tubería metálica de 4" de diámetro	m	22 379.00	\$ 258 899	\$ 5 793 900 721		\$ -		\$ -		\$ -
87.1	5-15102		PT10	tubería para enfijajes: tubería metálica de 4" de diámetro			\$ 258 899		28 879.00	\$ 7 476 744 221	456.00	\$ 118 057 944	21 342.00	\$ 5 525 422 458.00
Subtotal				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			\$ 2 592 324 621		\$ 2 592 324 621		\$ 19 582 635		\$ 317 960 573.00	
88	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m	34 789.00	\$ 1 791	\$ 62 307 099		\$ -		\$ -		\$ -
88.1	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1 791		27 831.00	\$ 49 845 321		\$ -		\$ -
88.2	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m		\$ 1 791		6 958.00	\$ 12 461 778		\$ -		\$ -
89	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2	163.00	\$ 59 987	\$ 9 777 881		\$ -		\$ -		\$ -
89.1	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2		\$ 59 987		130.00	\$ 7 798 310		\$ -		\$ -
89.2	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2		\$ 59 987		33.00	\$ 1 979 571		\$ -		\$ -
90	5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	300.00	\$ 8 375	\$ 2 512 500		\$ -		\$ -		\$ -
90.1	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		\$ 8 375		240.00	\$ 2 010 000		\$ -		\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 6 DE 9					
FECHA															2/9/2023 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 26		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 336 530 649.00			MES agosto-2023				
ACTA FINAL ☐																			
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Inclúidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 389 978 471 425.00					VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):				
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 18/08/23		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
90.2	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		\$ 8 375		60.00	\$ 502 500		\$ -		\$ -					
91	4		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u	279.00	\$ 396 078	\$ 110 505 762		\$ -		\$ -		\$ -					
91.1	4-11607		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u		\$ 396 078		223.00	\$ 88 325 394		\$ -	34.00	\$ 13 466 652.00					
91.2	4-15107		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u		\$ 396 078		56.00	\$ 22 180 368		\$ -		\$ -					
92	4		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	143.00	\$ 503 069	\$ 71 938 867		\$ -		\$ -		\$ -					
92.1	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 503 069		114.00	\$ 57 349 866		\$ -		\$ -					
92.2	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 503 069		29.00	\$ 14 589 001		\$ -		\$ -					
93	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	44.00	\$ 324 103	\$ 14 260 532		\$ -		\$ -		\$ -					
93.1	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 324 103		35.00	\$ 11 343 605		\$ -		\$ -					
93.2	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 324 103		9.00	\$ 2 916 927		\$ -		\$ -					
94	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	\$ 11 489 679	\$ 11 489 679		\$ -		\$ -		\$ -					
94.1	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 11 489 679		1.00	\$ 11 489 679		\$ -		\$ -					
95	5	720-13		Poste de referencia	u	9.00	\$ 252 800	\$ 2 275 200		\$ -		\$ -		\$ -					
95.1	5-11607	720-13		Poste de referencia	u		\$ 252 800		7.00	\$ 1 769 600		\$ -		\$ -					
95.2	5-15107	720-13		Poste de referencia	u		\$ 252 800		2.00	\$ 505 600		\$ -		\$ -					
96	4	730-13		Defensa metalica	m	166.00	\$ 230 532	\$ 38 268 312		\$ -		\$ -		\$ -					
96.1	4-11607	730-13		Defensa metalica	m		\$ 230 532		166.00	\$ 38 268 312		\$ -		\$ -					
97	5	731-13		Defensa de concreto	m	2 794.00	\$ 802 567	\$ 2 242 372 198		\$ -		\$ -		\$ -					
97.1	5-11607	731-13		Defensa de concreto	m		\$ 802 567		2 794.00	\$ 2 242 372 198	24.40	\$ 19 582 635	379.40	\$ 304 493 921.00					
98	4	730-13		Sección final	u	6.00	\$ 121 353	\$ 728 118		\$ -		\$ -		\$ -					
98.1	4-11607	730-13		Sección final	u		\$ 121 353		6.00	\$ 728 118		\$ -		\$ -					
99	4	730-13		Sección de tope	u	6.00	\$ 95 809	\$ 574 854		\$ -		\$ -		\$ -					
99.1	4-11607	730-13		Sección de tope	u		\$ 95 809		6.00	\$ 574 854		\$ -		\$ -					
100	5	740-13		Captafaros	u	1 149.00	\$ 22 031	\$ 25 313 619		\$ -		\$ -		\$ -					
100.1	5-11607	740-13		Captafaros	u		\$ 22 031		1 149.00	\$ 25 313 619		\$ -		\$ -					
Subtotal				OBRAS VARIAS				\$ 62 929 266	\$ 78 808 066	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
101	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2710	\$ 18 835	\$ 51 042 850		\$ -		\$ -		\$ -					
101.1	5-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		\$ 18 835		2 710.00	\$ 51 042 850		\$ -		\$ -					
102	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	524	\$ 22 684	\$ 11 886 416		\$ -		\$ -		\$ -					
102.1	5-11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		\$ 22 684		1 224.00	\$ 27 765 216		\$ -		\$ -					
Subtotal				TRANSPORTES				\$ 19 865 740 000	\$ 21 772 867 100	\$ 1 243 613 100	\$ 16 438 418 000.00								
103	3	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km	19865740	\$ 1 000	\$ 19 865 740 000	45 233.00	\$ 45 233 000	\$ -	45 233.00	\$ 45 233 000.00						
103.1	3-11608	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		17 204 925.90	\$ 17 204 925 900	1 243 613.10	\$ 1 243 613 100	14 192 210.90	\$ 14 192 210 900.00					
103.2	3-14101	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		847 137.20	\$ 847 137 200	\$ -	1 724.00	\$ 1 724 000.00						
103.3	3-15101	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		3 675 571.00	\$ 3 675 571 000	\$ -	2 199 250.10	\$ 2 199 250 100.00						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 7 DE 9									
															FECHA		2/9/2023 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 26		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 336 530 649.00			MES agosto-2023								
															ACTA FINAL		☐						
CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)															PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2															FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Inclúidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)															FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021															INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL			VALOR INICIAL (incluido I.V.): \$ 389 978 471 425.00			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		
															VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00								
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA											
										Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 18/08/23		PRESENTE ACTA		ACUMULADO									
				GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR						
Subtotal						ITÉM NO PREVISTOS					\$ -		\$ 33 334 029 018		\$ 3 510 726 197		\$ 17 564 982 704.00						
105		1		211-13		remoción de derrumbes (no incluye transporte)		M3		\$ 9 121	\$ -	1 344.00	\$ 12 258 624		\$ -	1 344.00	\$ 12 258 624.00						
105.1		1-11601		211-13		remoción de derrumbes (no incluye transporte)		M3		\$ 9 121		74 838.00	\$ 682 597 398	560.00	\$ 5 107 760	68 824.00	\$ 627 743 704.00						
106		1		310.1P		conformación de calzada existente		M2		\$ 1 317	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -						
106.1		1-11601		310.1P		conformación de calzada existente		M2		\$ 1 317		48 441.00	\$ 63 796 797		\$ -	41 148.00	\$ 54 191 916.00						
107		2		320.1P		mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y		M3		\$ 88 378	\$ -	3 060.00	\$ 270 436 680		\$ -	3 060.00	\$ 270 436 680.00						
107.1		2-11602		320.1P		mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)		M3		\$ 88 378		7 103.00	\$ 627 748 934		\$ -	3 041.00	\$ 268 757 498.00						
108		2		230.1P		mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)		M3		\$ 13 724	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -						
108.1		2-11602		230.1P		mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)		M3		\$ 13 724		432.00	\$ 5 928 768		\$ -		\$ -						
109.0		5		NP-05P		limpieza de estructuras de drenaje		UND		\$ 646 464	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -						
109.1		5-11604		NP-05P		limpieza de estructuras de drenaje		UND		\$ 646 464		10.00	\$ 6 464 640		\$ -		\$ -						
110		3		900-13		transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir		M3-KM		\$ 1 000	\$ -	28 504.00	\$ 28 504 000		\$ -	28 504.00	\$ 28 504 000.00						
110.1		3-11608		900-13		transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir		M3-KM		\$ 1 000		1 435 586.50	\$ 1 435 586 500	15 883.00	\$ 15 883 000	1 253 775.70	\$ 1 253 775 700.00						
111.0		3		900-13		transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100		M3 -KM		\$ 1 182	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -						
111.1		3-11608		900-13		transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100		M3 -KM		\$ 1 182		38 139.00	\$ 45 080 298		\$ -	21 254.00	\$ 25 122 228.00						
112		5		681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado		M3		\$ 267 346	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -						
112.1		5-11606		681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado		M3		\$ 267 346		496.00	\$ 132 603 616	44.00	\$ 11 763 224	256.00	\$ 68 440 576.00						
112.2		5-11604		681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado		M3		\$ 267 346		1 500.00	\$ 401 019 000		\$ -	882.00	\$ 235 799 172.00						
113		1		221.1P		enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)		M3		\$ 18 619	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -						
113.1		1-11602		221.1P		enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)		M3		\$ 18 619		240.00	\$ 4 468 560		\$ -		\$ -						
114		2		330.2P		instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)		M3		\$ 21 395	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -						
114.1		2-11602		330.2P		instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)		M3		\$ 21 395		1.00	\$ 21 395		\$ -		\$ -						
115		2		230.2P		mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)		M3		\$ 100 111	\$ -	1 515.00	\$ 151 668 165		\$ -	1 515.00	\$ 151 668 165.00						
115.1		2-11602		230.2P		mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)		M3		\$ 100 111		226.00	\$ 22 625 086		\$ -	226.00	\$ 22 625 086.00						
116		1		200-13		talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)		U		\$ 255 977			\$ -		\$ -		\$ -						
116.1		1-11606		200-13		talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)		U		\$ 255 977		316.00	\$ 80 888 732		\$ -	140.00	\$ 35 836 780.00						
117		1		200-13		talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)		U		\$ 427 938			\$ -		\$ -		\$ -						
117.1		1-11606		200-13		talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)		U		\$ 427 938		5 071.00	\$ 2 170 073 598		\$ -	3 719.00	\$ 1 591 501 422.00						
118		1		200-13		talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)		U		\$ 733 607			\$ -		\$ -		\$ -						
118.1		1-11606		200-13		talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)		U		\$ 733 607		1 070.00	\$ 784 959 490		\$ -	1 000.00	\$ 733 607 000.00						
119		1		200-13		talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)		U		\$ 1 118 742			\$ -		\$ -		\$ -						
119.1		1-11606		200-13		talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)		U		\$ 1 118 742		36.00	\$ 40 274 712		\$ -	7.00	\$ 7 831 194.00						

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

8DE9

FECHA

2/8/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

ACTA No.

26

VALOR BÁSICO ACTA:

\$15 336 530 649.00

MES

agosto-2023

ACTA FINAL

CONTRATO No :

983 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

967 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL:

37 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

02/07/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

01/08/2024

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$389 978 471 425.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$389 978 471 425.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
										Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 18/08/23		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
120	1	210-13		voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		\$ 623 659			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
120.1	1-11606	210-13		voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		\$ 623 659		650.00	\$ 405 378 350	119.90	\$ 74 776 714	344.30	\$ 214 725 793.00			
120.2	1-14101	210-13		voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		\$ 623 659		1 983.00	\$ 1 236 715 797	37.20	\$ 23 200 115	1 317.90	\$ 821 920 198.00			
121.1	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	ML		\$ 114 139		10 500.00	\$ 1 198 459 500	219.00	\$ 24 996 441	3 013.60	\$ 343 969 291.00			
122.1	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3		\$ 67 263		9 182.00	\$ 617 608 866		\$ -	745.30	\$ 50 131 115.00			
123.1	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3		\$ 3 169		210 226.00	\$ 666 206 194	13 801.00	\$ 43 735 369	178 131.00	\$ 564 497 139.00			
124.1	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG		\$ 36 667		67 085.00	\$ 2 459 805 695	3 697.00	\$ 135 557 899	53 474.20	\$ 1 960 738 494.00			
125.1	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros	M3-E		\$ 812		580 797.00	\$ 471 607 164		\$ -	45 486.40	\$ 36 934 957.00			
126.1	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3		\$ 1 232 974		636.00	\$ 784 171 464		\$ -	423.00	\$ 521 548 002.00			
127.1	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3		\$ 386 222		1 050.00	\$ 405 533 100		\$ -	513.20	\$ 198 209 130.00			
128.1	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3		\$ 386 712		1 270.20	\$ 491 201 582	15.60	\$ 6 032 707	452.10	\$ 174 832 495.00			
129.1	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3		\$ 1 233 963		3 387.00	\$ 4 179 432 681	260.60	\$ 321 570 758	2 457.70	\$ 3 032 710 866.00			
130.1	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS		\$ 49 732		60 028.00	\$ 2 985 312 496	8 519.00	\$ 423 666 908	27 843.00	\$ 1 384 688 076.00			
131.1	5-11606		NP-27	Concreto acelerado Fc = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3		\$ 1 213 879		1 830.00	\$ 2 221 398 570	230.20	\$ 279 434 946	587.70	\$ 713 396 689.00			
132.1	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3		\$ 205 763		613.00	\$ 126 132 719	2.10	\$ 432 102	68.10	\$ 14 012 460.00			
137.1	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	UND		\$ 47 368		750.00	\$ 35 526 000		\$ -		\$ -			
138.1	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG		\$ 7 012		94 400.00	\$ 661 932 800		\$ -		\$ -			
139.1	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M		\$ 123 314		8 400.00	\$ 1 035 837 600		\$ -		\$ -			
140.1	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M		\$ 250 587		2 000.00	\$ 501 174 000		\$ -		\$ -			
141.1	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la	M		\$ 320 581		1 500.00	\$ 480 871 500		\$ -		\$ -			
142.1	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2		\$ 124 083		22 890.70	\$ 2 840 346 728	7 956.92	\$ 987 318 504	7 956.92	\$ 987 318 504.00			
143.1	5-15103		NP-39	microfibra sintética para control contra incendios	KG		\$ 30 728		9 442.40	\$ 290 146 067	3 490.70	\$ 107 262 230	3 490.70	\$ 107 262 230.00			
144.1	4-15102		NP-40	macrofibra metálica de revestimiento	KG		\$ 18 048		125 899.00	\$ 2 272 225 152	58 177.50	\$ 1 049 987 520	58 177.50	\$ 1 049 987 520.00			
				Ajuste por Actas de Modificacion				\$ -		\$ 66							
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				\$ 337 627 543 972.00		\$ 337 627 543 972.00		\$ 14 717 134 850.00		\$ 175 218 253 457.00			
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				\$ 26 261 883 970.00		\$ 26 261 883 970.00				\$ 18 636 390 576.00			
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)				\$ 407 895 168.00		\$ 407 895 168.00		\$ -		\$ -			
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)				\$ 364 297 323 110.00		\$ 364 297 323 110.00		\$ 14 717 134 850.00		\$ 193 854 644 033.00			
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)				\$ 2 662 172 746.00		\$ 2 662 172 746.00		\$ 107 548 293.00		\$ 1 416 630 092.00			
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)				\$ 366 959 495 856.00		\$ 366 959 495 856.00		\$ 14 824 683 143.00		\$ 195 271 274 125.00			
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)				\$ 412 000 000.00		\$ 412 000 000.00		\$ -		\$ 185 606 000.00			
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G) * 19%				\$ 78 280 000.00		\$ 78 280 000.00		\$ -		\$ 35 265 140.00			
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)				\$ 490 280 000.00		\$ 490 280 000.00		\$ -		\$ 220 871 140.00			
				GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)				\$ 22 222 695 569.00		\$ 22 222 695 569.00		\$ 660 383 704.00		\$ 3 469 568 075.00			
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)				\$ 306 000 000.00		\$ 306 000 000.00				\$ 4 315 309.00			
				VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)				\$ 389 978 471 425.00		\$ 389 978 471 425.00		\$ 15 485 066 847.00		\$ 198 966 028 649.00			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.


AIU

30. %

Utilidad

5. %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 69 281 569 425.00	17.8911%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 4 685 911 072.00	30.58%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 37 021 368 562.00	9.560%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 32 260 202 863.00	8.3311%

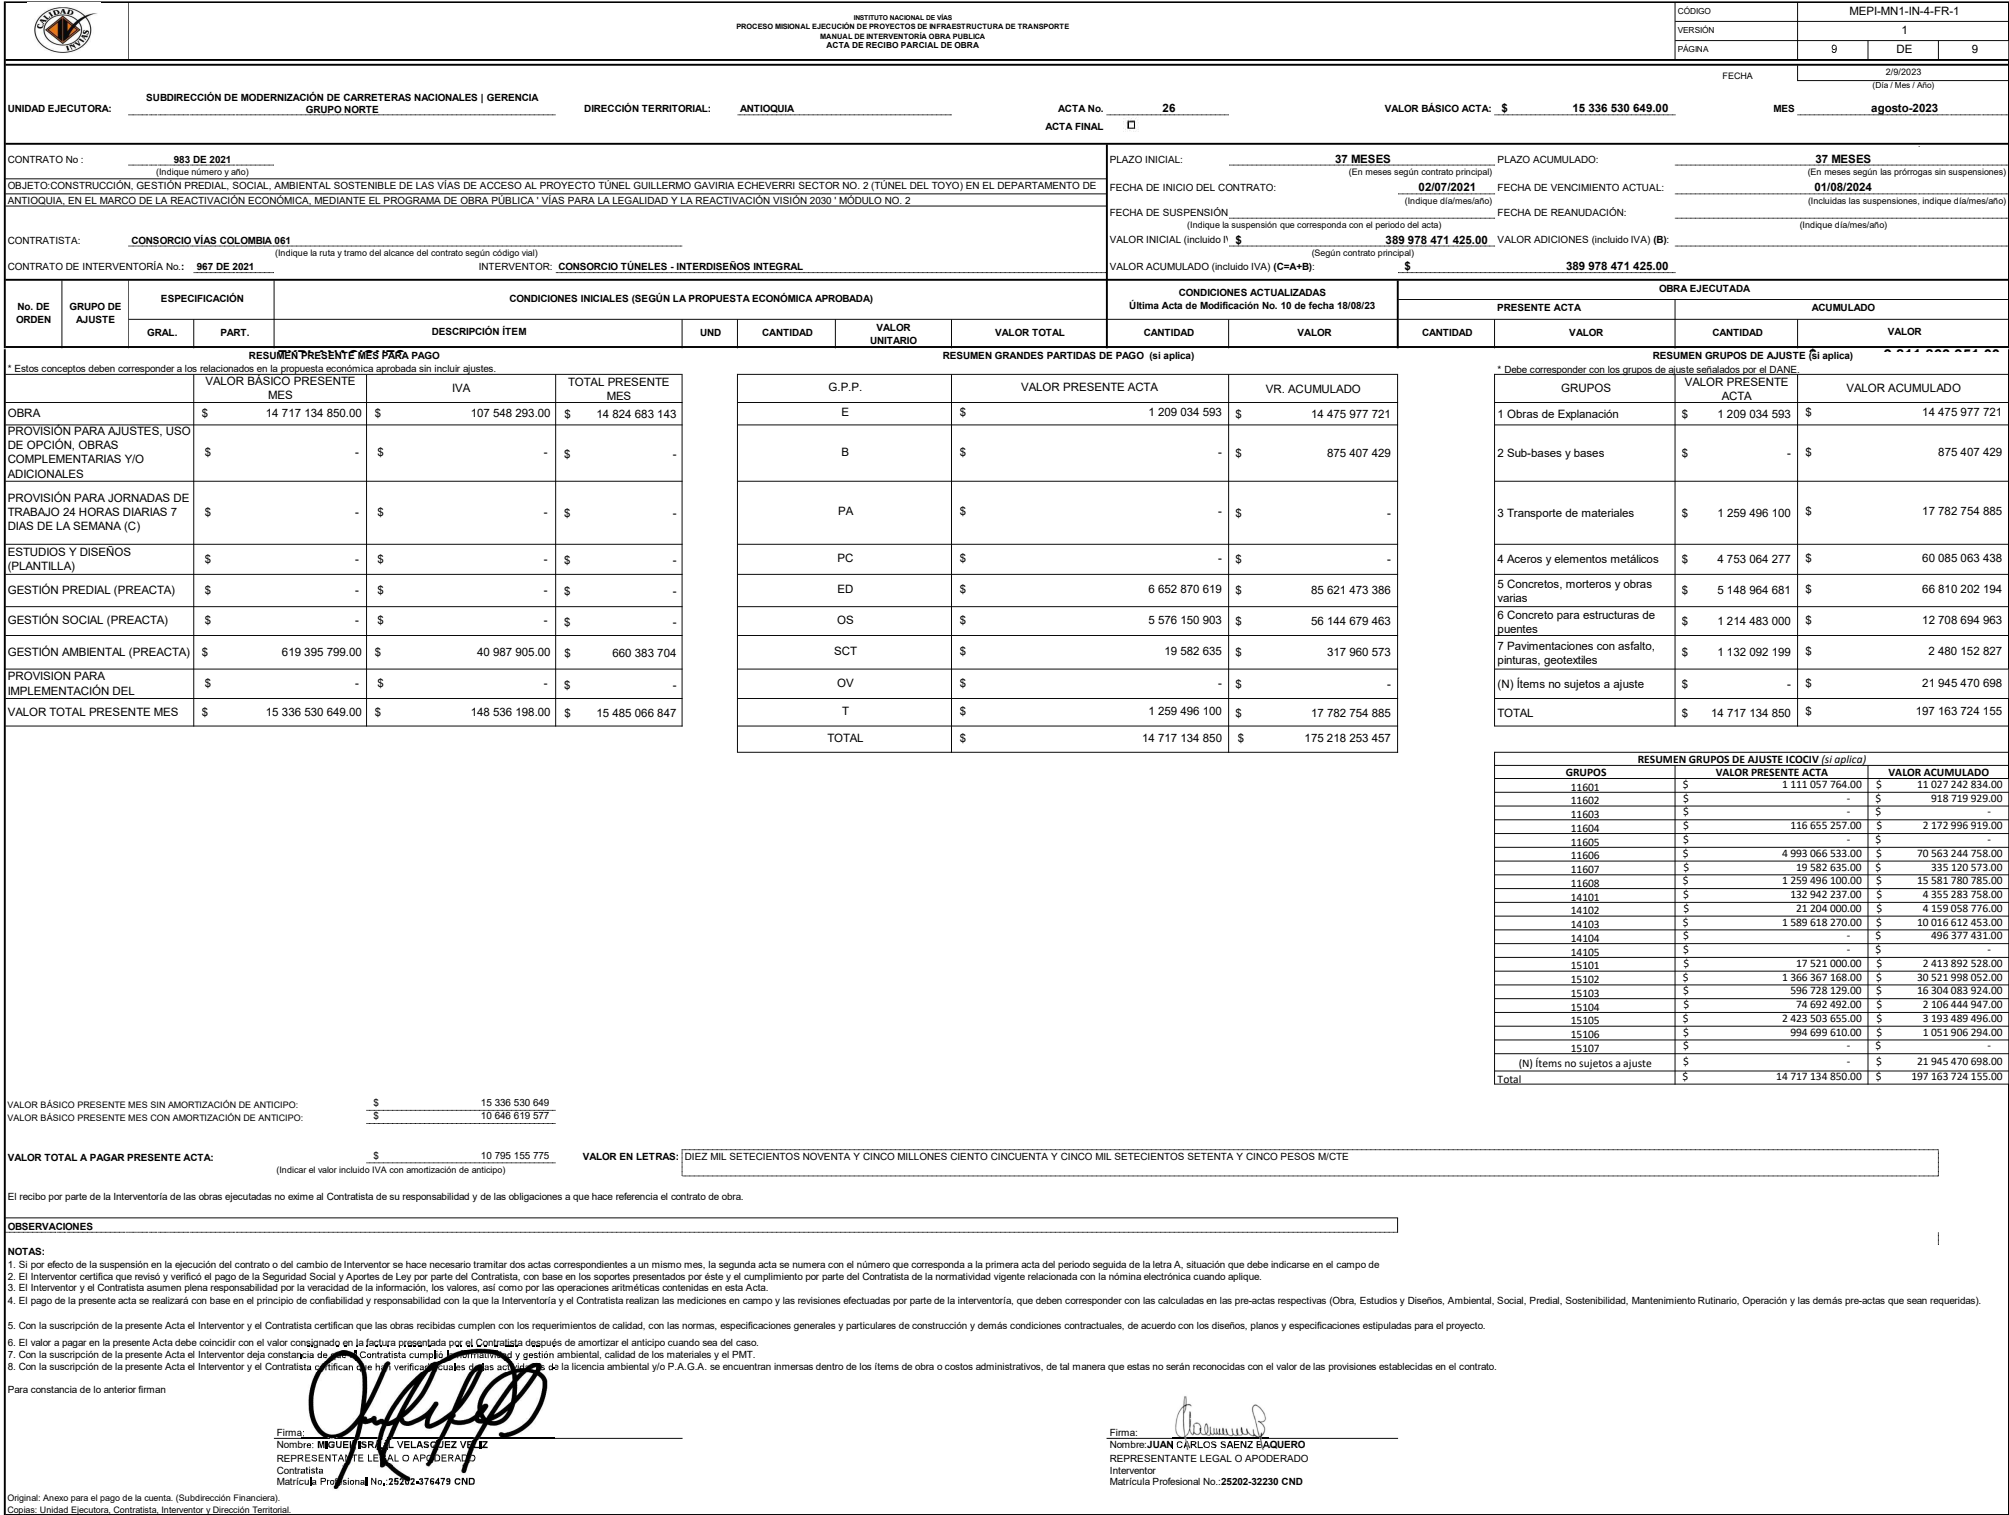



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>26</u>	<u>agosto-2023</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>3 233 149 155.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>6 785 834 920.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>776 171 700.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
						TOTAL ACTA: \$	<u>10 795 155 775.00</u>

Firmado
digitalmente por
MAURICIO
HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

Formulado	RP96623;11;10795155775
Texto Libre	SMCN-GERENCIA GRUPO NORTEACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 26 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto	SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 26 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP96623;11;10795155775

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL					CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
						VERSIÓN		1	
						PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 983 DE 2021 Contratista: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato: **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

Acta No.: 26 Valor basico: \$ 15 336 530 649.00 Período: agosto-2023

Valor Incluido Iva: \$ 15 485 066 847.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (carretera - puente -túnel)	Valor incluido IVA (construcción, rehabilitación, mejoramiento)	Valor incluido IVA Provision para Servicios del Túnel	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (gestion social, predial y ambiental)	Valor incluido IVA Provision implementación protocolo de bioseguridad	Subtotal
1	6203	CARRETERA	\$ 5 054 346 402.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5 054 346 402.00
2	6203	PUENTE	\$ 1 756 507 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 756 507 400.00
3	6203	TUNEL	\$ 8 013 829 341.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 013 829 341.00
4	6203	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6203	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660 383 704.00	\$ -	\$ 660 383 704.00
6	6203	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 14 824 683 143.00	\$ -	\$ -	\$ 660 383 704.00	\$ -	\$ 15 485 066 847.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890907569-1	MUNICIPIO 1	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$ 15 485 066 847.00	\$ 15 336 530 649.00
890983786-7	MUNICIPIO 2	GIRALDO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5		\$ -	\$ -
TOTAL ANTIOQUIA			\$ 15 485 066 847.00	\$ 15 336 530 649.00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -


NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -




MIGUEL ISMAEL VELÁSQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula No.: 25202-376479 CND
Contratista



JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula No.: 25202-32230 CND
Interventoria

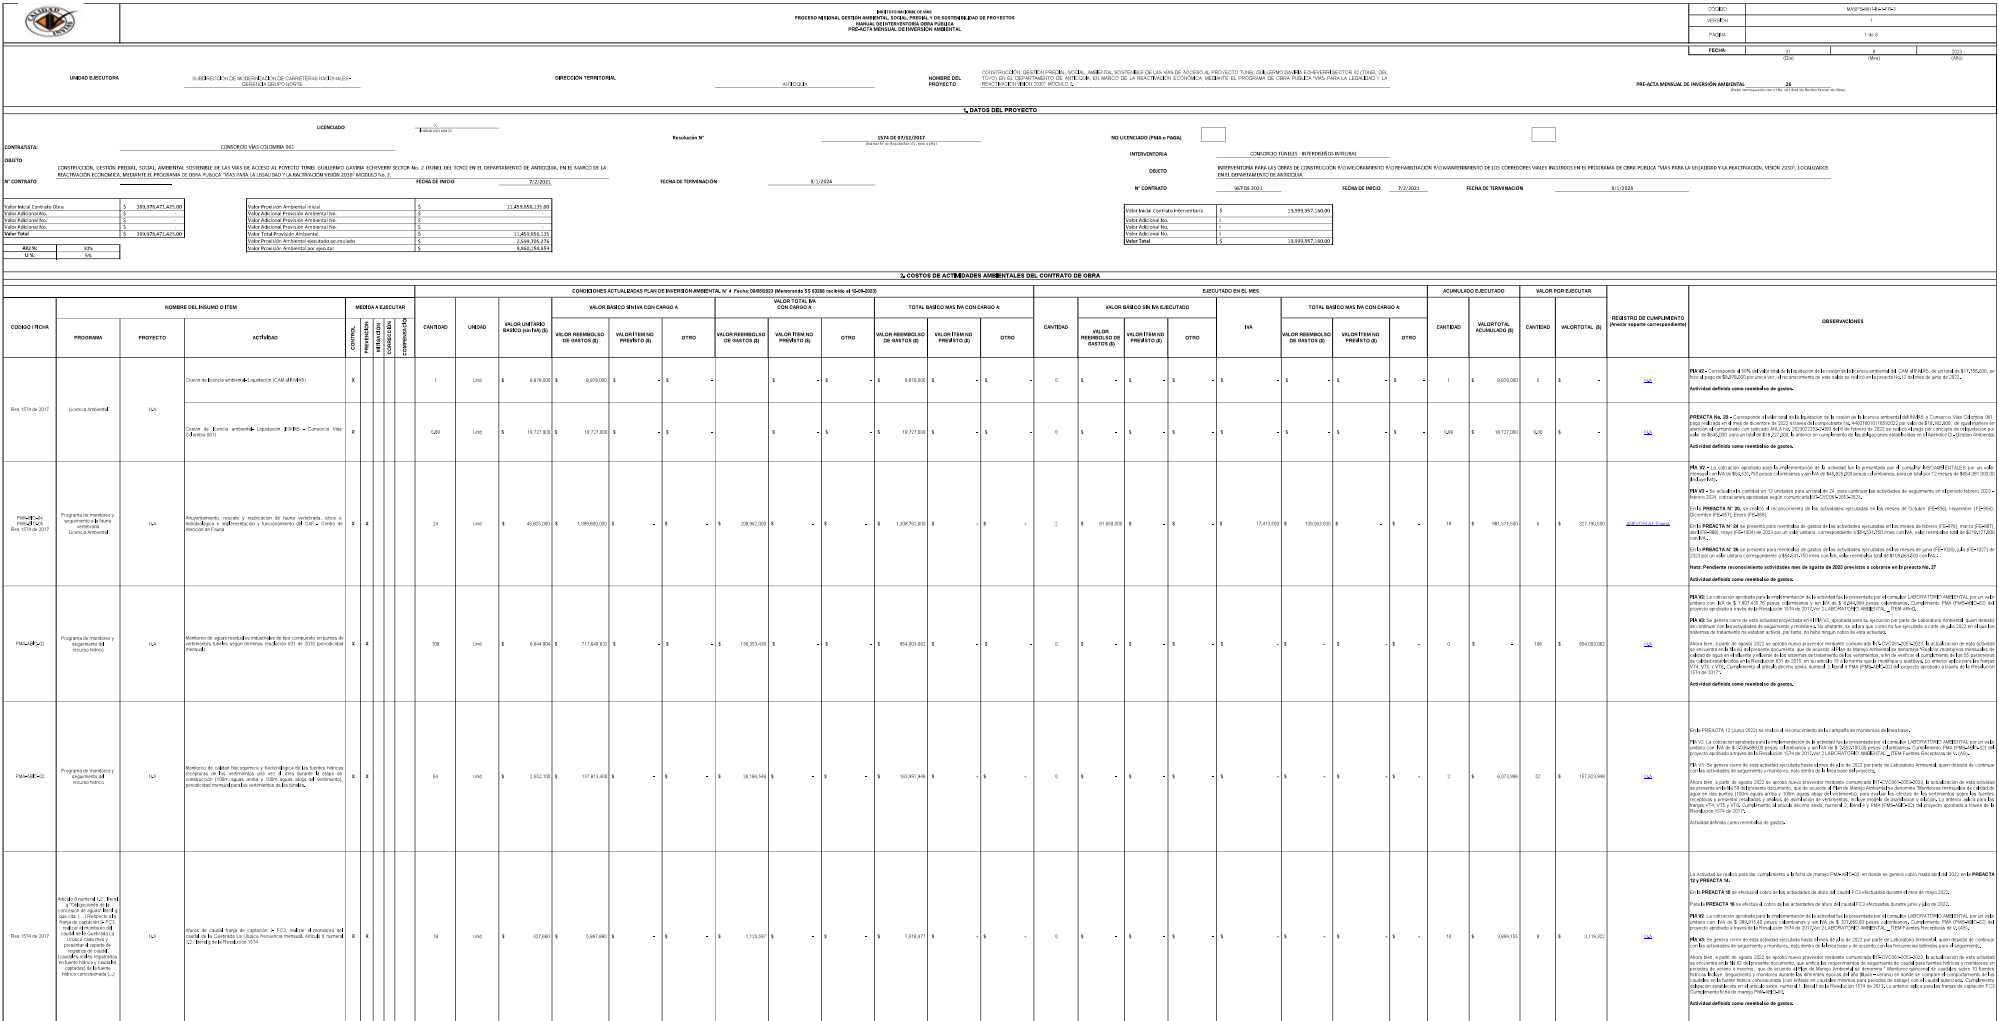

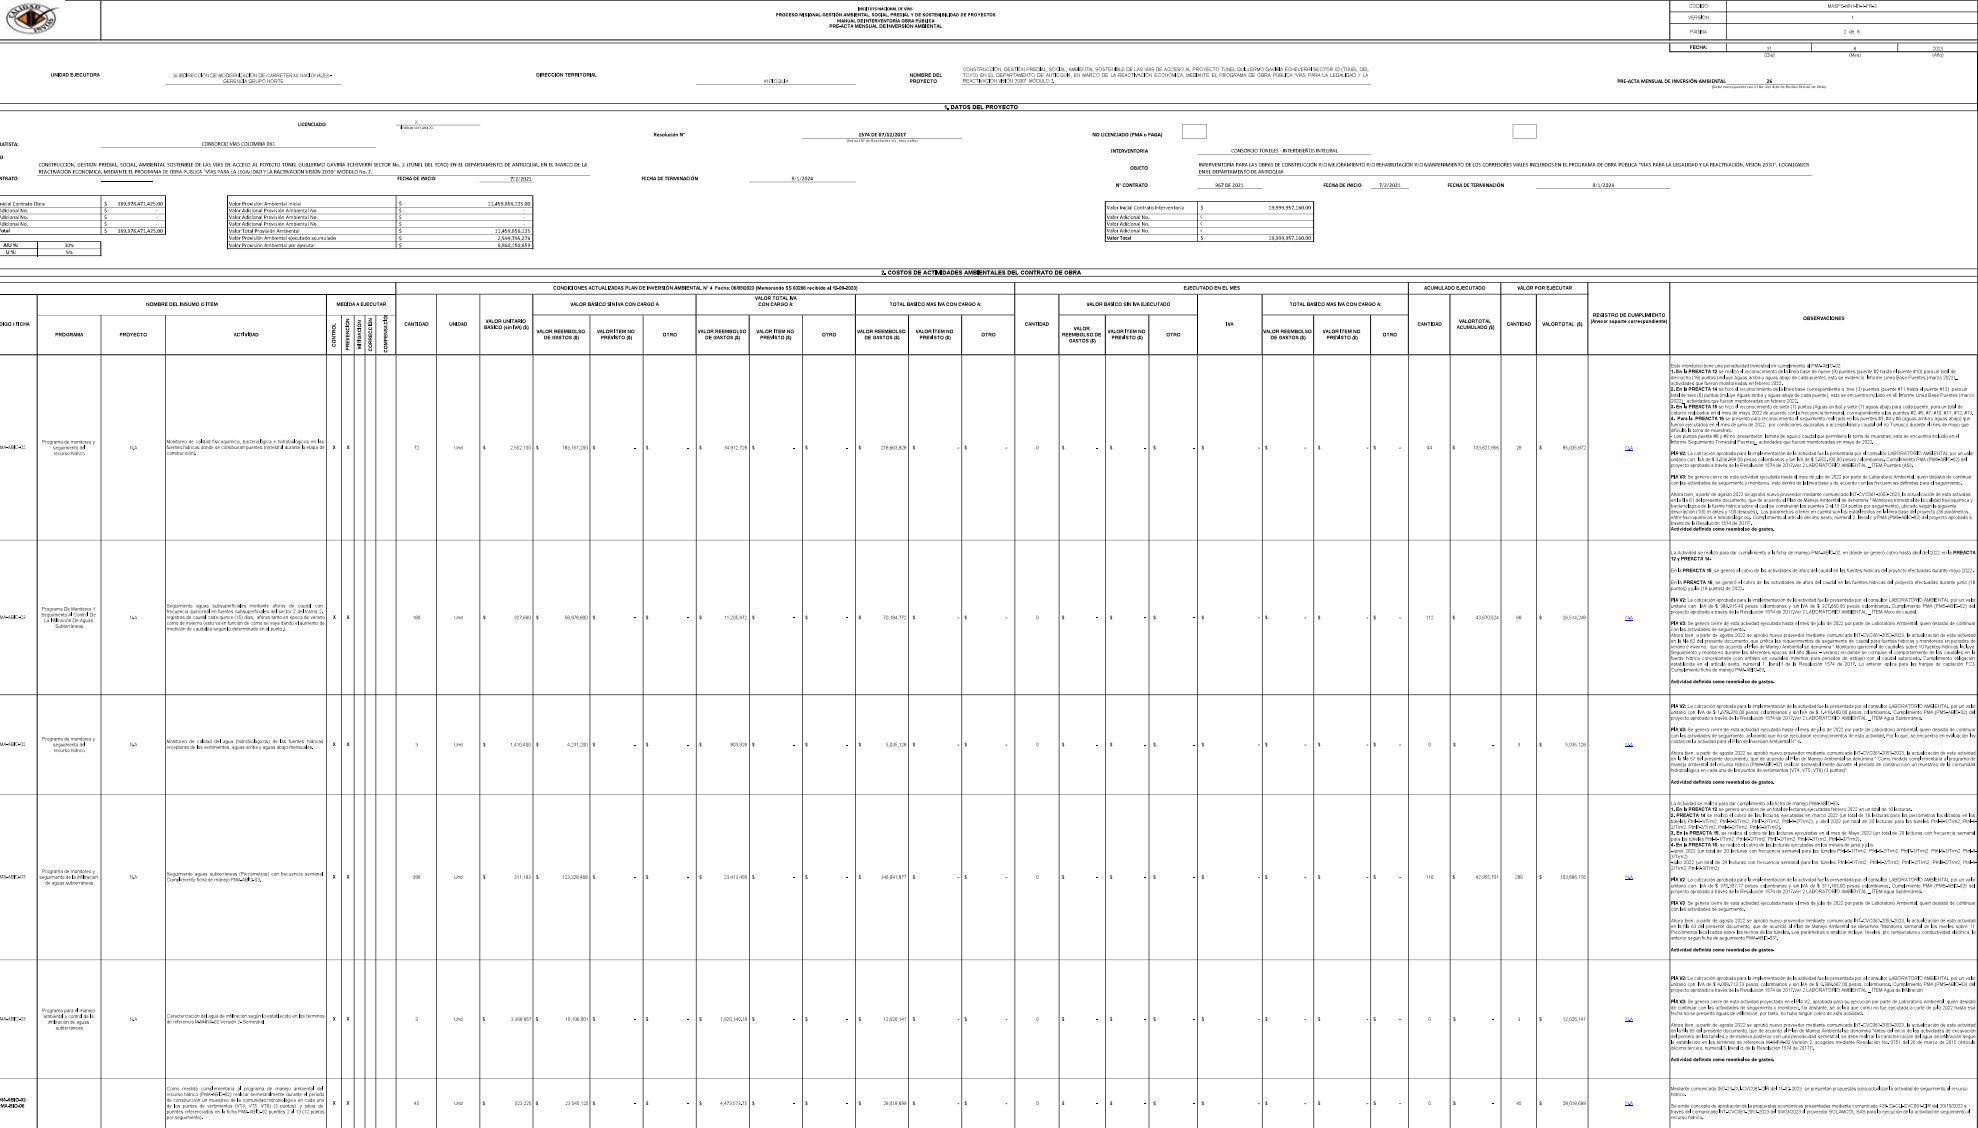



UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS N.M. (OMAR)-
GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTICOLLAPSE

NONO
PROTE


OC467P
TC400 I
PRACT

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

26

1. DATOS DEL PROYECTO

[illegible]



UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS N.M. (DADES) - GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ARTICOLI

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PERSONAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GARCÍA ECHAVEZ SECTOR 62 (TUNEL DE TOTO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN EN 2020. MÓDULO 2.

PRE-ACCIÓN MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

26
(Este corresponden con el No. del Acta de Sesión Plena de Oroya)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____
(rubricar con X)

Resolution N°

1574 DE 07/12/2017

NO LICENCIADO (PMA e PMSA)

CONJUNTO DEVALORES - INTERFERÊNCIAS INTEGRAL

INSTRUCION, GESTION FISCAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTIENE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PUEBLO TUNEL GUILLERMO GARCIA SCHWENGER SECTOR No. 2 (TUNEL DEL PONC) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA ACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LOGISTICA Y LA PRODUCTIVIDAD 2019" MODELO/No. 2.

FECHA DE TERMINACIÓN

8/1/2004

ASTORIA BUREAU OF CONSTRUCTION AND PLANNING

Value Initial Contributions Class	\$ 389,976,471,425.00
Value Additional Res.	-
Value Additional Res.	-
Value Additional Res.	-
Value Total	\$ 389,976,471,425.00
ADU %	37%
U %	6%


Valor Presión Ambiental total	\$	11,459,856,135.00
Valor Adicional Presión Ambiental no	\$	-
Valor Adicional Presión Ambiental no	\$	-
Valor Adicional Presión Ambiental no	\$	-
Valor Total Presión Ambiental	\$	11,459,856,135.00
Valor Presión Ambiental ejecutado acumulado	\$	2,646,705,274.00
Valor Presión Ambiental por ejecutar	\$	8,863,150,861.00

Valor Inicial Contrato Interactiva	\$	23.999.957.150,00
Valor Adicional No.	0	
Valor Adicional No.	0	
Valor Adicional No.	0	
Valor Total	\$	23.999.957.150,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE CERA

[illegible]

[illegible]

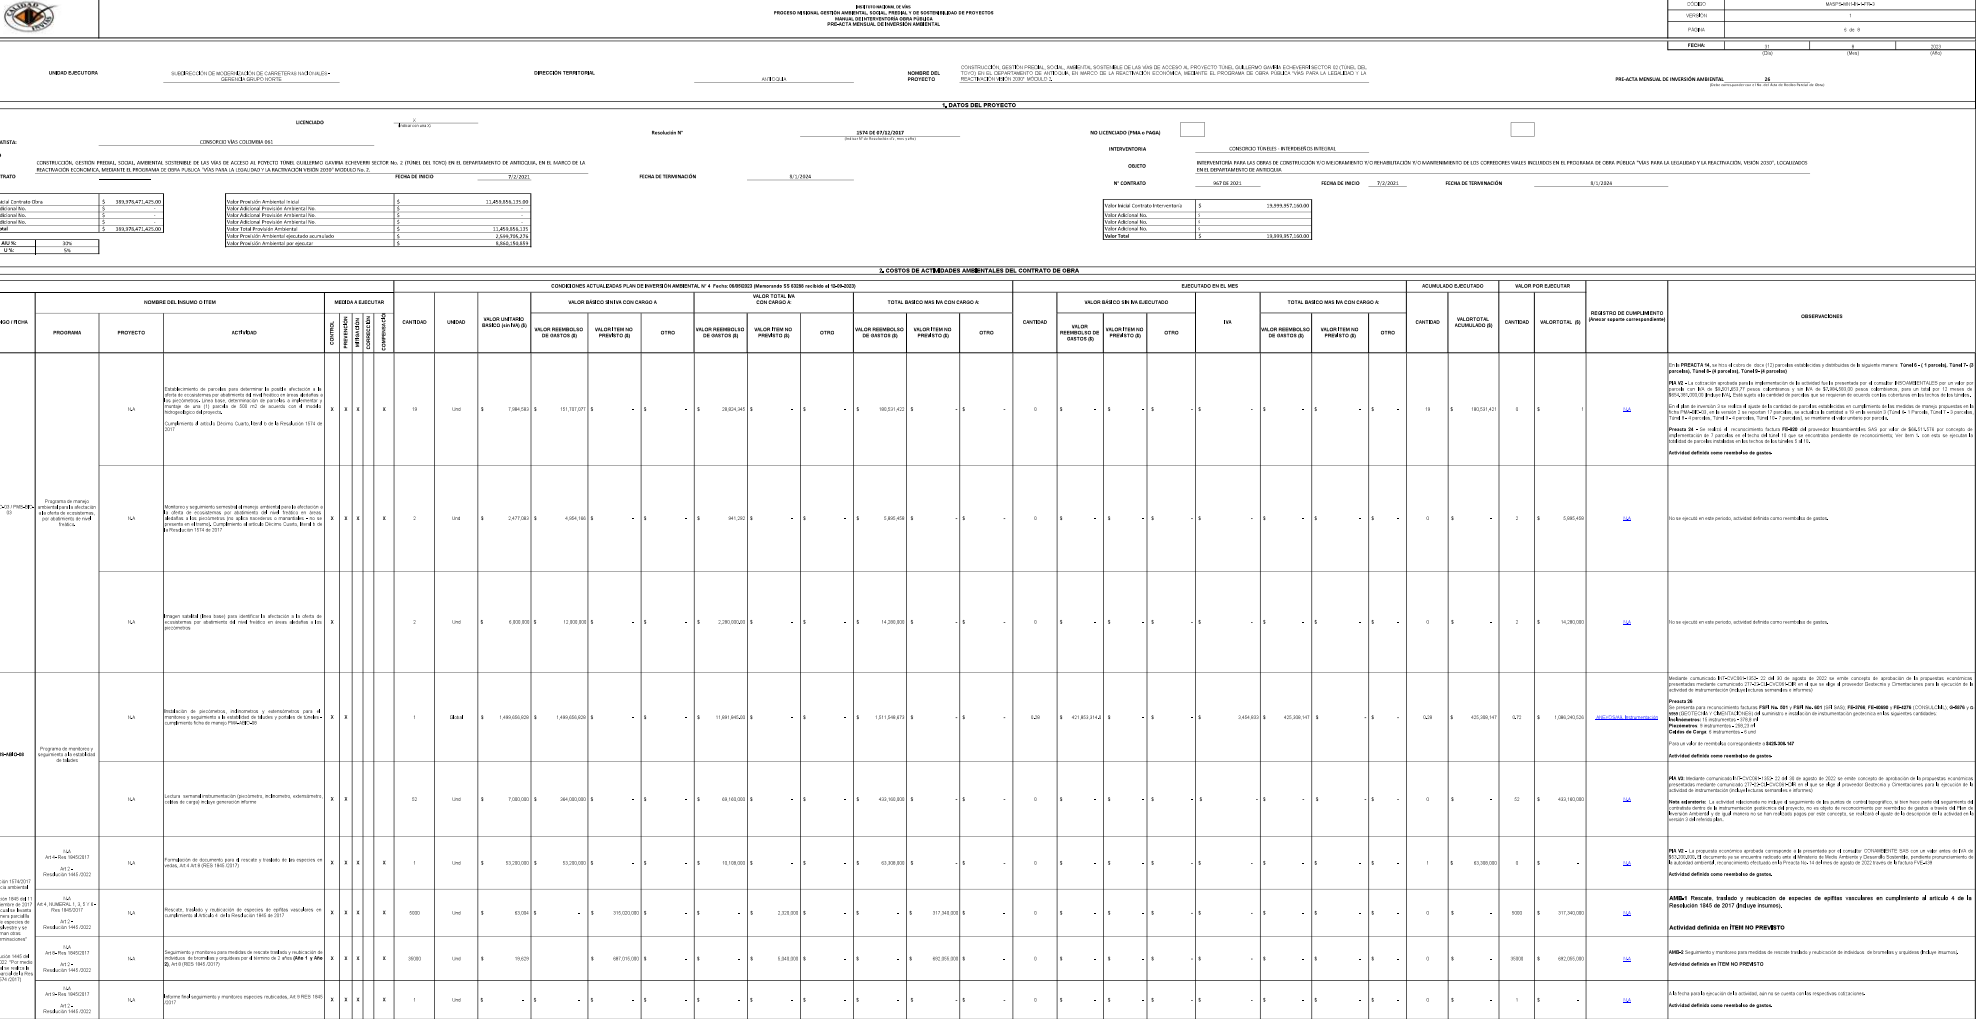

[illegible][illegible]



UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES GERENCIA DE PROYECTOS	DIRECCIÓN TERRITORIAL	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD
				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASesorIA AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DEL SITIO DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAYAMA, GUAYAMA, PUERTO RICO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASesorIA AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DEL SITIO DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAYAMA, GUAYAMA, PUERTO RICO	15/05/2017	30/05/2017

1. DATOS DEL PROYECTO

3. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE SERVICIO

	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	016.086.789
	VALOR GABO GESTION	\$	-
	VALOR TOTAL GABO PROYECTA	\$	016.086.789
	VALOR IVA	\$	40.807.809,20
	VALOR TOTAL PROYECTA OBTENCION AMBITUAL	\$	687.385.134

NOTAS

Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a las recursos y obligaciones previstas contractualmente.

Firma: 
 Nombre: MIGUEL BERNAL VELASCO
 Representante Legal y Apoderado
 Contrataste: CONSORCIO VAS COTOMAC
 Montañas, 2025-10-17 11:00

Nome: **JAIN CARLOS SAINZ BACQUERO**
Representante Legal o Apoderado:
Intermediaria: **CONSORCIO TÚNELES • INTERSECCIONES AUTOMÁTICAS**
Matrícula No.: **35305-00293 C142**

Nome: **ANGELA J. J. DE CARREIRA LEMUS**
Profissão/Atividade: **Administradora de Empresas**
CNPJ nº: **07.015.362/0001-20**

Via: Via, Firma
Nombre: **BEATRIZ CARRILLO DANIEL OLIVERA**
Profesion: **Arquitecta**
Intervención: **CONSERVACIÓN TÚNELES INTERIORES INTEGRAL**
Módulo: **11**, 2020-624371 CDS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6						
											VERSIÓN	1						
											PÁGINA	1 DE 2						
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		26		FECHA							AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)					
1. DATOS DEL PROYECTO																		
UNIDAD EJECUTORA	Gerencia Grupo Norte			OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2							No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		983 de 2021			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		967 de 2021			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E E M	I T E M	JULIO	2023	CANTIDAD E.JECU. MES	VALOR BÁSICO E.JECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD E.JECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
PMA_SOC-01. Programa de manejo de información y participación comunitaria	Impresión de volantes		Unitario	2000	\$ 309.40	\$ 618.800,00	X		\$ 637.209,30	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 637.209,30	
	Pauta de cuñas radiales		Unitario	100	\$ 11.000	\$ 1.100.000,00	X		\$ 1.132.725,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.132.725,00	
	Refrigerios reuniones con la comunidad		Unitario	4000	\$ 10.000	\$ 40.000.000,00	X		\$ 41.190.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1018	\$ 10.482.855	\$ 30.707.145,00	
	Impresión de brochure		Unitario	2000	\$ 2.320,5	\$ 4.641.000,00	X		\$ 4.779.069,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 4.779.069,75	
	Diseño e impresión de Boletín		Unitario	18000	\$ 1.329,23	\$ 23.926.140,00	X		\$ 24.637.942,67	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 24.637.942,67	
	Impresión de cartillas de finalización de obra		Global	1	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	X		\$ 8.238.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 8.238.000,00	
	Página WEB	Diseño web	Unitario	1	\$ 2.082.500	\$ 2.082.500,00	X		\$ 2.144.454,38	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.144.454,38	
		Administración de Contenidos Sitio web	Unitario	5	\$ 571.200	\$ 2.856.000,00	X		\$ 2.940.966,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.940.966,00	
	Video del proyecto		Unitario	2	\$ 30.000.000	\$ 60.000.000,00	X		\$ 61.785.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 61.785.000,00	
Encuestas Anuales		Unitario	100	\$ 32.130	\$ 3.213.000,00	X		\$ 3.308.586,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.308.586,75		
PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socio ambiental al personal y a la comunidad	Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales para trabajadores		Unitario	2000	\$ 1.904	\$ 3.808.000,00	X		\$ 3.921.288,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.921.288,00	
	Actividades educativas socioambientales anuales con unidades territoriales menores		Global	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000,00	X		\$ 51.487.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 51.487.500,00	
	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores		Global	2	\$ 30.000.000	\$ 60.000.000,00	X		\$ 61.785.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 61.785.000,00	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la cultura ambiental, a la población estudiantil (Segunda expedición ambiental)	Kit temático (Camiseta) diseñada para la “Segunda expedición ambiental del occidente Antioqueño”.	Unitario	100	\$ 46.410	\$ 4.641.000,00	X		\$ 4.779.069,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 4.779.069,75	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad)	Kit temático (Termo para agua) diseñada para la semana de la movilidad	Unitario	100	\$ 10.115	\$ 1.011.500,00	X		\$ 1.041.592,13	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.041.592,13	
		Kit temático (Bolsa ecológica) diseñada para la semana de la movilidad	Unitario	100	\$ 11.900	\$ 1.190.000,00	X		\$ 1.225.402,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.225.402,50	
		Kit temático (Camiseta) diseñada para la semana de la movilidad	Unitario	100	\$ 42.840	\$ 4.284.000,00	X		\$ 4.411.449,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 4.411.449,00	
		Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad	Unitario	100	\$ 26.180	\$ 2.618.000,00	X		\$ 2.695.885,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.695.885,50	
	Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad estudiantil)		Unitario	240	\$ 110.213	\$ 26.451.130,00	X		\$ 27.238.051,12	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 27.238.051,12	
	Kits temáticos Socioambientales		Global	1	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000,00	X		\$ 82.380.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 82.380.000,00	
PMA_SOC-05 Programa de manejo de para la promoción de las condiciones de salud de la población	Dotación mediante obras de infraestructura en el Hospital de Santa Fe de Antioquia		Global	1	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000,00	X		\$ 154.462.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 154.462.500,00	
	Apoyo de actividades para la promoción y prevención en salud		Global	2	\$ 3.000.000	\$ 6.000.000,00	X		\$ 6.178.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 6.178.500,00	
PMA_SOC-06. Programa de manejo para la potenciación del sector productivo y empleabilidad	Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos emprendimientos en el área de influencia del proyecto		Unitario	1	\$ 99.722.000	\$ 99.722.000,00	X		\$ 102.688.729,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 102.688.729,50	
	Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área de influencia del proyecto		Global	3	\$ 400.000.000	\$ 1.200.000.000,00	X		\$ 1.235.700.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.235.700.000,00	
PMA_SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario	Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de Antioquia		Unitario	2	\$ 11.662.590	\$ 23.325.180,00	X		\$ 24.019.104,11	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 24.019.104,11	
	Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades territoriales menores		Unitario	1	\$ 11.662.591	\$ 11.662.591,00	X		\$ 12.009.553,08	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 12.009.553,08	
	Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio colectivo (no individual) en infraestructura o dotación para cada unidad territorial menor		Global	6	\$ 77.000.000	\$ 462.000.000,00	X		\$ 475.744.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 475.744.500,00	
Arqueología preventiva	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Unitario	28	\$ 47.005.000	\$ 1.316.140.000,00	X		\$ 1.355.295.165,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	17	\$ 822.857.780	\$ 532.437.385,00	
	Actividades de rescate de material arqueológico y arqueología pública		Global	1	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000,00	X		\$ 308.925.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 308.925.000,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6								
		VERSIÓN 1																		
		PÁGINA 2 DE 2																		
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			26		FECHA				AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)							
1. DATOS DEL PROYECTO																				
UNIDAD EJECUTORA		Gerencia Grupo Norte			OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2					No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		983 de 2021						
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Antioquia										No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		967 de 2021						
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																				
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		4		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES			
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	R E M	I T E M	JULIO	2023	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)		CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)
Guía para Instituciones de Educación Superior y Estudiantes (Del Aula a la Obra)	1. Actividad del Aula a la Obra 21/04/2022	Alquiler salon y recursos locativos		Unitario	1	\$ 400.000	\$ 400.000,00	X		\$ 411.900,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 411.900	\$ -	
		Compra de cascos de seguridad		Unitario	1	\$ 2.169.580	\$ 2.169.579,50	X		\$ 2.234.124,49	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 2.234.124	\$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios		Unitario	1	\$ 1.474.000	\$ 1.474.000,00	X		\$ 1.517.851,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.517.852	\$ -	
		Transporte de estudiantes a evento		Unitario	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625	\$ -	
		Alquiler salon y recursos locativos		Unitario	1	\$ 400.000	\$ 400.000,00	X		\$ 411.900,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 411.900	\$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios		Unitario	1	\$ 2.280.000	\$ 2.280.000,00	X		\$ 2.347.830,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 2.347.830	\$ -	
		Transporte de estudiantes a evento		Unitario	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625	\$ -	
		Alquiler salon y recursos locativos		Unitario	1	\$ 386.000	\$ 386.000,00	X		\$ 397.483,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 397.484	\$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios		Unitario	1	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000,00	X		\$ 1.715.563,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.715.564	\$ -	
		Transporte de estudiantes a evento		Unitario	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625	\$ -	
		Alquiler salon y recursos locativos		Unitario	1	\$ 550.000	\$ 550.000,00	X		\$ 566.362,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 566.363	\$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios		Unitario	1	\$ 1.861.000	\$ 1.861.000,00	X		\$ 1.916.364,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.916.365	\$ -	
	Transporte de estudiantes a evento		Unitario	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625	\$ -		
	Alquiler salon y recursos locativos		Unitario	1	\$ 386.000	\$ 386.000,00	X		\$ 397.483,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 397.483,50		
	Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios		Unitario	1	\$ 1.890.000	\$ 1.890.000,00	X		\$ 1.946.227,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.946.228	\$ -		
	Transporte de estudiantes a evento		Unitario	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625	\$ -		
	Actividad del Aula a la Obra		Global	30	\$ 8.000.000	\$ 240.000.000,00	X		\$ 247.140.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 247.140.000,00		
	Línea Deportiva (Campeonato Fútbol 5, Campeonato Ping Pong y/o CiclotNVIAS)	1. Alquiler de sonido		Unitario	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625	\$ -	
		2. Tarjeta regalo		Unitario	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000,00	X		\$ 1.235.700,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.235.700	\$ -	
		3. Uniformes deportivos		Global	1	\$ 6.397.440	\$ 6.397.440,00	X		\$ 6.587.763,84	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 6.587.764	\$ -	
		4. Premiación		Global	1	\$ 1.428.000	\$ 1.428.000,00	X		\$ 1.470.483,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.470.483	\$ -	
		5. Alimentación		Global	1	\$ 3.885.000	\$ 3.885.000,00	X		\$ 4.000.579,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 4.000.579	\$ -	
		6. Arbitraje evento		Unitario	1	\$ 480.000	\$ 480.000,00	X		\$ 494.280,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 494.280	\$ -	
	3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		4		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES			
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAPREDIAL (\$)	R E M	I T E M	JULIO	2023	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAPREDIAL (incluye OTROS*) (\$)		CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)
Gestión Sociopredial		Reconocimiento de factores		Unitario	0	\$ -	\$ -	X				0	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -
Gestión Sociopredial		Reconocimiento de factores		Unitario	0	\$ -	\$ -	X				0	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -
4. RESUMEN																				
A		VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS					\$		G		VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO					\$		-		
B		VALOR BÁSICO PRE-ACTA					\$		H		OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA					\$		-		
C		VALOR IVA MENSUAL					\$		I		VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL					\$		-		
D		VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL					\$		J		VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAPREDIAL					\$		-		
E		RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)					\$		K		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					\$		869.862.799.000		
F		VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA					\$		L		EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)					\$		19,99%		
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																				
6. FIRMAS																				
Firma Nombre: MIGUEL ISRAHEL VELÁSQUEZ VELIZ Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-376499 ☐ Apoderado ☒ Firma Nombre: ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No. 266061004-I ☐ Apoderado ☒ Firma Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Representante Legal Interventoria Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND ☐ Apoderado ☒ Firma Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO Profesional Social Interventoria Matrícula Profesional No.: 171351109 ☐ Apoderado ☒																				

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.


4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

		FECHA		2/9/2023 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE			2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		
3. AÑO : 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12			4. FECHA DE ELABORACIÓN: 2/9/2023		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03			TRAMO:		SECTOR 2
6. CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021					
7. OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2					
8. CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061			NIT		901.472.786-3
9. INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL			NIT		
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:					
11. PLAZO INICIAL: 37 MESES		12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021		13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A	
14. PLAZO ACUMULADO: 37 MESES		15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024	
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL		18. VR. DE LA GESTIÓN: 0		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0	
II. INFORMACION FINANCIERA					
20. VR. INICIAL (INCLUIDO)		\$		-	
21. VR. ANTICIPO:		\$		-	
22. VR. ADICIÓN No:		\$		-	
23. VR. ADICIÓN No:		\$		-	
24. VR. TOTAL ADICIONES:		\$		-	
25. VR. TOTAL		\$		-	
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN					
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD		V/R UNIDAD.	
				TOTAL	
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	1 394 000	0	
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	2 788 000	0	
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	1 045 000	0	
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	348 500	0	
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	1 074 000	0	
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0	805 500	0	
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	268 500	0	
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	754 000	0	
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	377 000	0	
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	377 000	0	
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	320 000	0	
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	217 000	0	
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	1 340 000	0	
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	2 680 000	0	
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	860 000	0	
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	640 000	0	
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	640 000	0	
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	640 000	0	
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	346 500	0	
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	231 000	0	
	1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	346 500	0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		0	231 000	0	
48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		0	115 500	0	
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		0	115 500	0	
50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		0	231 000	0	
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		0	231 000	0	
52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		0	321 000	0	
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	321 000	0	
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	107 000	0	
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	749 000	0	
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	642 000	0	
	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	150 000	0	
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	300 000	0	
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	150 000	0	
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	150 000	0	
	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	640 000	0	
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				0	
IVA				19%	
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		0		0	



CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	2/9/2023 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:										SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE										2.DIRECCIÓN TERRITORIAL:										ANTIOQUIA																													
3.AÑO : 2023										MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12										4.FECHA DE ELABORACIÓN										2/9/2023																													
5.LOCALIZACIÓN:										RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03																				TRAMO:										SECTOR 2																			
6.CONTRATO DE OBRA No:										983 DE 2021																																																	
7.OBJETO:										CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2																																																	
8.CONTRATISTA:										CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061																				NIT										901.472.786-3																			
9.INTERVENTOR:										CONSORCIO TUNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL																				NIT																													
10.CONTRATO DE INTERVENTORIA No:																																																											
11.PLAZO INICIAL:										37 MESES										12.FECHA DE INICIO:										2/07/2021										13.FECHA DE REANUDACIÓN:										N/A									
14.PLAZO ACUMULADO:										37 MESES										15.FECHA DE SUSPENSIÓN:										N/A										16.FECHA DE VENCIMIENTO:										1/08/2024									
17.TIPO DE GESTIÓN:										PREDIAL										18.VR. DE LA GESTIÓN:										0										19.VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:										0									

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

[illegible]

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	0
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	0
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	0
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	0
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	0
74. OTROS	0
75. IVA	0
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	0
77. SALDO POR EJECUTAR	0

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL INTERVENTOR			
 MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ				 JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO			
NOMBRES Y APELLIDOS		NUMERO		NOMBRES Y APELLIDOS		NUMERO	
C.C. ___ C.E. X		459 947		C.C. X C.E. ___		NUMERC	
MATRICULA PROFESIONAL		NUMERO		MATRICULA PROFESIONAL		NUMERO	
		25202-376479 CND				25202-32230 CND	
Representante Legal		Apoderado		Representante Legal		Apoderado	
☐		☒		☐		☒	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

Santa Fe de Antioquia, 8 de septiembre de 2023

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial Antioquia
Calle 51 # 79-51
Medellín, Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No. 967 de 2021 "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

Asunto: Certificación de cumplimiento de hitos. Alcance a cartas INT-INVIAS-2745-2023 y INT-INVIAS-2746-2023 del 4 de septiembre de 2023.


Respetado ingeniero Hoyos:

A través de las cartas citadas en el asunto, que fueron recibidas por la Entidad mediante los radicados 2023E-VUVRAZ-005764 y 2023E-VUVRAZ-005731 respectivamente, remitimos el acta de recibo parcial de obra 26 y el acta de ajustes provisionales 26, ambas del mes de agosto de 2023, presentadas por el Consorcio Vías Colombia 061, adjudicatario del contrato de obra No. 983 de 2021.

Al respecto, en las cartas de Interventoría mencionadas en el asunto, dejamos de manifiesto que, a la fecha de radicación de las mismas, el Contratista de obra no había cumplido con la entrega pactada en el cronograma de hitos vigentes, de los túneles 6 y 8 y, por lo tanto, de conformidad con el apéndice H del pliego de condiciones no se avaló el pago de las respectivas actas.

No obstante, el 2 y el 7 de septiembre de 2023, el Contratista hizo entrega de las obras principales de los túneles 8 y 6 respectivamente, de conformidad con el alcance pactado en el acta de reunión No. 3 del 31 de mayo de 2023, que contiene el cronograma de hitos vigente; así las cosas, respetuosamente remitimos las certificaciones de cumplimiento de los trabajos asociados a los hitos señalados, y avalamos proseguir el trámite de pago de las actas de obra y ajustes remitidas a la Entidad.

Sin otro particular,



ING. JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

Anexo: Dos (2) folios. Certificación de hitos túnel 6 y túnel 8.
Copia: Ing. Luis Jaime Díaz. - Gerente Grupo Norte – Subdirección de Modernización de Carreteras INVIAS
CVC061, seguimiento: 415-23-CLI-CVC061-DIR - 416-23-CLI-CVC061-DIR
Elaboró: JBM / Revisó: CAHH/ Aprobó: JCSB



CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL CERTIFICA:

Que de acuerdo con el cronograma de obra vigente (PDT_CVC061_v4.2), se avala el pago del acta de recibo parcial de obra No. 26, del mes de agosto de 2023, teniendo en cuenta el cumplimiento con el compromiso de terminación del hito correspondiente a la ejecución de las obras principales del Túnel 8, en la fecha propuesta para su cumplimiento. De acuerdo con la programación de Hitos y cronograma de obra vigentes queda pendiente la construcción de los andenes y el pavimento MR que serán ejecutados los últimos tres meses del plazo contractual vigente.

La presente se expide a los 02 días del mes de septiembre de 2023 en Santa Fe Antioquia.

ING. JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

Elaboró: JCBM
Revisó: CAHH



CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL CERTIFICA:

Que de acuerdo con el cronograma de obra vigente (PDT_CVC061_v4.2), se avala el pago del acta de recibo parcial de obra No. 26, del mes de agosto de 2023, teniendo en cuenta el cumplimiento con el compromiso de terminación del hito correspondiente a la ejecución de las obras principales del Túnel 6, en la fecha propuesta para su cumplimiento. De acuerdo con la programación de Hitos y cronograma de obra vigentes queda pendiente la construcción de los andenes y el pavimento MR que serán ejecutados los últimos tres meses del plazo contractual vigente.

La presente se expide a los 07 días del mes de septiembre de 2023 en Santa Fe Antioquia.

ING. JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

Elaboró: JCBM
Revisó: CAHH

