

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN 1
				PÁGINA 1 DE 1
				FECHA 4/6/2024 (Día / Mes / Año)
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		PERIODO MES: mayo-2024
UNIDAD EJECUTORA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 35 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 9 939 231 687	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4 6 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES	FIRMA
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	4 6 2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5 6 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18 06 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18 06 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	19 06 24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				
ORDEN DE PAGO				
CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021				
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3				
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indicar el ordenador del pago)				
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 8 558 767 432 VALOR EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 35 DEL PERIODO mayo-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal				
Firma: Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula N° 05202096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 18/06/2024 (Suscribe según su competencia)				
Firma: Firmado digitalmente por LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Matrícula No. 53202-092415 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 18/06/2024 (Suscribe según su competencia)				
Firma: Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:				
Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1						
						VERSIÓN		1						
						PÁGINA		1	DE	9				
								FECHA						
								4/6/2024 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		ACTA No. 35		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 9 939 231 687.00		MES mayo-2024				
						ACTA FINAL								
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREJUDICIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)						FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL						VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):						
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00								
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal				EXPLANACIONES				\$ 38 887 515 670		\$ 20 377 638 767		\$ 677 887 945		\$ 15 290 091 041.00
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17.00	\$ 1 154 779	\$ 19 631 243		\$ -		\$ -		\$ -
1.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$ 1 154 779		2.73	\$ 3 152 547		\$ -	2.73	\$ 3 152 546.00
2	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	405 159.00	\$ 52 715	\$ 21 357 956 685		\$ -		\$ -		\$ -
2.1	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 52 715		223 348.00	\$ 11 773 789 820	10 283.00	\$ 542 068 345	174 253.00	\$ 9 185 746 895.00
3	1	210-13		excavación en material común de la explanación y canales	m3	1 718 124.00	\$ 9 200	\$ 15 806 740 800	31 294.00	\$ 287 904 800		\$ -	31 294.00	\$ 287 904 800.00
3.1	1-11601	210-13		excavación en material común de la explanación y canales	m3		\$ 9 200		879 173.00	\$ 8 088 391 600	14 763.00	\$ 135 819 600	625 754.00	\$ 5 756 936 800.00
4	1	220-13		Terraplenes	m3	118 271.00	\$ 12 500	\$ 1 478 387 500		\$ -		\$ -		\$ -
4.1	1-11602	220-13		Terraplenes	m3		\$ 12 500		17 952.00	\$ 224 400 000		\$ -	4 508.00	\$ 56 350 000.00
5	1	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante	m2	20 342.00	\$ 11 051	\$ 224 799 442		\$ -		\$ -		\$ -
5.1	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante	m2		\$ 11 051			\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$ 3 486 720 000		\$ 161 920 000		\$ -		\$ 161 920 000.00
6	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	16 829.00	\$ 110 000	\$ 1 851 190 000		\$ -		\$ -		\$ -
6.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 110 000		1 472.00	\$ 161 920 000		\$ -	1 472.00	\$ 161 920 000.00
7	2	330-13		Base granular clase A	m3	12 581.00	\$ 130 000	\$ 1 635 530 000		\$ -		\$ -		\$ -
7.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 130 000			\$ -		\$ -		\$ -
7.2	2-15105	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 130 000			\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal				PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$ 8 227 878 276		\$ -		\$ -		\$ -
8	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	83 248.00	\$ 2 918	\$ 242 917 664		\$ -		\$ -		\$ -
8.1	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2 918			\$ -		\$ -		\$ -
8.2	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2 918			\$ -		\$ -		\$ -
9	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	57 188.00	\$ 1 849	\$ 105 740 612		\$ -		\$ -		\$ -
9.1	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1 849			\$ -		\$ -		\$ -
9.2	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1 849			\$ -		\$ -		\$ -
10	7	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	6 863.00	\$ 700 000	\$ 4 804 100 000		\$ -		\$ -		\$ -
10.1	7-11603	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 700 000			\$ -		\$ -		\$ -
10.2	7-14104	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 700 000			\$ -		\$ -		\$ -
11	7	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4 271.00	\$ 720 000	\$ 3 075 120 000		\$ -		\$ -		\$ -
11.1	7-11603	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 720 000			\$ -		\$ -		\$ -
11.2	7-14104	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 720 000			\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal				PAVIMENTOS DE CONCRETO				\$ 2 752 295 000		\$ -		\$ -		\$ -
12	5	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	3 419.00	\$ 805 000	\$ 2 752 295 000		\$ -		\$ -		\$ -
12.1	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3		\$ 805 000			\$ -		\$ -		\$ -
12.2	5-15105	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3		\$ 805 000			\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				\$ 173 395 951 001		\$ 140 009 024 511		\$ 2 473 214 984		\$ 113 115 563 595.00
13	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	43 888.00	\$ 32 667	\$ 1 433 689 296		\$ -		\$ -		\$ -
13.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		9 950.30	\$ 325 046 450	810.20	\$ 26 466 803	8 174.30	\$ 267 029 858.00
13.2	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667			\$ -		\$ -		\$ -
13.3	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		11 702.90	\$ 382 298 634		\$ -	6 957.50	\$ 227 280 653.00
13.4	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		5 128.20	\$ 167 522 909		\$ -	2 132.60	\$ 69 665 645.00
13.5	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		2 995.60	\$ 97 857 265		\$ -	2 995.60	\$ 97 857 265.00
13.6	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667			\$ -		\$ -		\$ -
14	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21 548.00	\$ 80 707	\$ 1 739 074 436		\$ -		\$ -		\$ -
14.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		147.90	\$ 11 936 565		\$ -	147.90	\$ 11 936 565.00
14.2	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707			\$ -		\$ -		\$ -
14.3	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707			\$ -		\$ -		\$ -
14.4	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		180.60	\$ 14 575 684		\$ -		\$ -
14.5	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		89.30	\$ 7 207 135		\$ -	89.30	\$ 7 207 135.00
14.6	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707			\$ -		\$ -		\$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3	87 497.00	\$ 38 000	\$ 3 324 886 000		\$ -		\$ -		\$ -
15.1	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		2 272.10	\$ 86 339 800	459.60	\$ 17 464 800	1 323.10	\$ 50 277 800.00
15.2	5-11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000			\$ -		\$ -		\$ -
15.3	5-11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		13 277.20	\$ 504 533 600		\$ -	4 032.50	\$ 153 235 000.00
15.4	5-14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		208.80	\$ 7 934 400		\$ -	164.50	\$ 6 251 000.00
15.5	5-14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		242.60	\$ 9 218 800		\$ -		\$ -
15.6	5-15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000			\$ -		\$ -		\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1						
												VERSIÓN		1						
												PÁGINA		2 DE 9						
FECHA															4/6/2024 (Día / Mes / Año)					
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE															MES			mayo-2024		
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA															ACTA No. 35			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 9 939 231 687.00		
UNIDAD EJECUTORA:															ACTA FINAL					
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórogas sin suspensiones)					
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL					VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):					
															VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR						
16	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	85 825.00	\$ 70 000	\$ 6 007 750 000		\$ -		\$ -		\$ -						
16.1	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		4 871.30	\$ 340 991 000		\$ -		\$ -						
16.2	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		1.00	\$ 70 000		\$ -		\$ -						
16.3	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		1 605.60	\$ 112 392 000		\$ -		\$ -						
16.4	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000			\$ -		\$ -		\$ -						
16.5	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000			\$ -		\$ -		\$ -						
16.6	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		6 192.00	\$ 433 440 000		\$ -	5 523.20	\$ 386 624 000.00						
17	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	16 634.00	\$ 131 414	\$ 2 185 940 476		\$ -		\$ -		\$ -						
17.1	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414			\$ -		\$ -		\$ -						
17.2	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414			\$ -		\$ -		\$ -						
17.3	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		582.00	\$ 76 482 948		\$ -		\$ -						
17.4	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414			\$ -		\$ -		\$ -						
17.5	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414			\$ -		\$ -		\$ -						
17.6	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414			\$ -		\$ -		\$ -						
18	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	10 628.00	\$ 133 476	\$ 1 418 582 928		\$ -		\$ -		\$ -						
18.1	5-11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		1 494.90	\$ 199 533 272		\$ -	1 491.90	\$ 199 132 844.00						
18.2	5-11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476			\$ -		\$ -		\$ -						
18.3	5-11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476			\$ -		\$ -		\$ -						
18.4	5-14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		91.00	\$ 12 146 316		\$ -	20.30	\$ 2 709 563.00						
18.5	5-14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		20.30	\$ 2 709 563		\$ -		\$ -						
18.6	5-15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		3.00	\$ 400 428		\$ -	3.00	\$ 400 428.00						
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m	m	231.00	\$ 2 250 000	\$ 519 750 000		\$ -		\$ -		\$ -						
19.1	6-11606		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 250 000		741.00	\$ 1 667 250 000		\$ -	680.00	\$ 1 530 000 000.00						
19.2	6-14101		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 250 000		49.30	\$ 110 925 000		\$ -	49.30	\$ 110 925 000.00						
20	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	496.00	\$ 2 900 000	\$ 1 438 400 000		\$ -		\$ -		\$ -						
20.1	6-11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 900 000		170.00	\$ 493 000 000		\$ -	170.00	\$ 493 000 000.00						
20.2	6-14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m	m		\$ 2 900 000		219.80	\$ 637 420 000		\$ -	219.80	\$ 637 420 000.00						
21	6		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m	220.00	\$ 3 600 000	\$ 792 000 000		\$ -		\$ -		\$ -						
21.1	6-11606		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3 600 000			\$ -		\$ -		\$ -						
21.2	6-14101		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3 600 000			\$ -		\$ -		\$ -						
22	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro 2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de	m	508.00	\$ 4 020 000	\$ 2 042 160 000		\$ -		\$ -		\$ -						
22.1	6-11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 4 020 000			\$ -		\$ -		\$ -						
22.2	6-14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 4 020 000		90.40	\$ 363 408 000		\$ -	90.40	\$ 363 408 000.00						
23	6		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m	160.00	\$ 5 300 000	\$ 848 000 000		\$ -		\$ -		\$ -						
23.1	6-11606		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 5 300 000			\$ -		\$ -		\$ -						
23.2	6-14101		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro 2.5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 5 300 000			\$ -		\$ -		\$ -						
24	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m	152.00	\$ 6 500 000	\$ 988 000 000		\$ -		\$ -		\$ -						
24.1	6-11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 6 500 000			\$ -		\$ -		\$ -						
24.2	6-14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 6 500 000		161.00	\$ 1 046 500 000		\$ -	161.00	\$ 1 046 500 000.00						
25	4	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	36 262.00	\$ 210 000	\$ 7 615 020 000		\$ -		\$ -		\$ -						
25.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m		\$ 210 000		0.00	\$ -		\$ -		\$ -						
26	4	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	32 316.00	\$ 324 690	\$ 10 492 682 040		\$ -		\$ -		\$ -						
26.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m		\$ 324 690		80 775.00	\$ 26 226 834 750		\$ -	79 835.00	\$ 25 921 626 150.00						
27	4	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	m	21 103.00	\$ 350 000	\$ 7 386 050 000		\$ -		\$ -		\$ -						
27.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	m		\$ 350 000			\$ -		\$ -		\$ -						
28	4	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)	m	25 316.00	\$ 375 000	\$ 9 493 500 000		\$ -		\$ -		\$ -						
28.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)	m		\$ 375 000		125 983.00	\$ 47 243 625 000	1 965.00	\$ 736 875 000	81 600.00	\$ 30 600 000 000.00						
29	4	623-13		Anclaje tipo tendón	m	18 637.00	\$ 311 825	\$ 5 811 482 525		\$ -		\$ -		\$ -						
29.1	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m		\$ 311 825		1.90	\$ 592 467		\$ -		\$ -						
30	4	623-13	PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte	m	86 057.00	\$ 121 647	\$ 10 468 575 879		\$ -		\$ -		\$ -						


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA					CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1										
							VERSIÓN		1										
							PÁGINA		3	DE	9								
							FECHA		4/6/2024 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		ANTIOQUIA		ACTA No.		35		VALOR BÁSICO ACTA: \$		9 939 231 687.00		MES		mayo-2024	
							ACTA FINAL												
CONTRATO No. : 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO-CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PRELAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24		OBRA EJECUTADA								
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
30.1	4-11606	623-13	PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte	m		\$ 121 647		1.10	\$ 133 811		\$ -		\$ -					
31	4		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte	m	16 021.00	\$ 99 033	\$ 1 586 607 693		\$ -		\$ -		\$ -					
31.1	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte	m		\$ 99 033		18 310.00	\$ 1 813 294 230	660.00	\$ 65 361 780	8 883.00	\$ 879 710 139.00					
32	6		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes	m3	8 762.00	\$ 1 450 000	\$ 12 704 900 000		\$ -		\$ -		\$ -					
32.1	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes	m3		\$ 1 450 000		3 270.80	\$ 4 742 660 000		\$ -	3 270.80	\$ 4 742 660 000.00					
33	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes	m3	1 388.00	\$ 1 350 000	\$ 1 873 800 000		\$ -		\$ -		\$ -					
33.1	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes	m3		\$ 1 350 000			\$ -		\$ -		\$ -					
34	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	203.00	\$ 1 271 489	\$ 258 112 267		\$ -		\$ -		\$ -					
34.1	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		\$ 1 271 489		406.40	\$ 516 733 130		\$ -	406.40	\$ 516 733 128.00					
35	6		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3	6 902.00	\$ 930 000	\$ 6 418 860 000		\$ -		\$ -		\$ -					
35.1	6-11606		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		3 445.30	\$ 3 204 129 000	79.90	\$ 74 307 000	3 327.10	\$ 3 094 203 000.00					
35.2	6-14102		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		2 622.30	\$ 2 438 739 000	36.90	\$ 34 317 000	2 033.50	\$ 1 891 155 000.00					
35.3	6-15105		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		2 609.40	\$ 2 426 742 000	496.30	\$ 461 559 000	2 345.00	\$ 2 180 850 000.00					
36	6		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1 306.00	\$ 1 050 000	\$ 1 371 300 000		\$ -		\$ -		\$ -					
36.1	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		\$ 1 050 000		42.30	\$ 44 415 000		\$ -	42.30	\$ 44 415 000.00					
36.2	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		\$ 1 050 000		448.90	\$ 471 345 000	91.40	\$ 95 970 000	448.90	\$ 471 345 000.00					
37	6		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	114.00	\$ 1 100 000	\$ 125 400 000		\$ -		\$ -		\$ -					
37.1	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3		\$ 1 100 000		60.20	\$ 66 220 000		\$ -	60.20	\$ 66 220 000.00					
37.2	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3		\$ 1 100 000		33.80	\$ 37 180 000		\$ -	9.00	\$ 9 900 000.00					
38	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	10 188.00	\$ 780 000	\$ 7 946 640 000		\$ -		\$ -		\$ -					
38.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		1 037.10	\$ 808 938 000		\$ -	663.70	\$ 517 686 000.00					
38.2	5-11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000			\$ -		\$ -		\$ -					
38.3	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		22.00	\$ 17 160 000		\$ -		\$ -					
38.4	5-11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		22.00	\$ 17 160 000		\$ -	22.00	\$ 17 160 000.00					
38.5	5-14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000			\$ -		\$ -		\$ -					
38.6	5-15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		175.90	\$ 137 202 000		\$ -	75.90	\$ 59 202 000.00					
39	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	3 761.00	\$ 680 000	\$ 2 557 480 000		\$ -		\$ -		\$ -					
39.1	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		113.40	\$ 77 112 000	9.20	\$ 6 256 000	25.20	\$ 17 136 000.00					
39.2	5-11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000			\$ -		\$ -		\$ -					
39.3	5-11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		161.30	\$ 109 684 000		\$ -	158.70	\$ 107 916 000.00					
39.4	5-11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000			\$ -		\$ -		\$ -					
39.5	5-14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000			\$ -		\$ -		\$ -					
39.6	5-15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000			\$ -		\$ -		\$ -					
40	5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3	6 498.00	\$ 950 000	\$ 6 173 100 000		\$ -		\$ -		\$ -					
40.1	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3		\$ 950 000		15 215.10	\$ 14 454 345 000	227.20	\$ 215 840 000	13 857.02	\$ 13 164 169 000.00					
40.2	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3		\$ 950 000		51.20	\$ 48 640 000		\$ -	51.20	\$ 48 640 000.00					
41	5	630-13		concreto clase 14 mpa	m3	1 140.00	\$ 543 697	\$ 619 814 580		\$ -		\$ -		\$ -					
41.1	5-11604	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		388.30	\$ 211 117 546	21.80	\$ 11 852 595	321.90	\$ 175 016 066.00					
41.2	5-11605	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		11.10	\$ 6 035 037		\$ -		\$ -					
41.3	5-11606	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		323.30	\$ 175 777 240		\$ -	80.70	\$ 43 876 349.00					
41.4	5-11607	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697			\$ -		\$ -		\$ -					
41.5	5-14102	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		33.20	\$ 18 050 740		\$ -	25.10	\$ 13 646 795.00					
41.6	5-14104	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		1.60	\$ 869 915		\$ -	1.60	\$ 869 915.00					
41.7	5-15105	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		247.90	\$ 134 782 486	18.20	\$ 9 895 285	223.50	\$ 121 516 282.00					
42	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1 372.00	\$ 545 397	\$ 748 284 684		\$ -		\$ -		\$ -					
42.1	4-11605		632.1P	Baranda Metalica	m		\$ 545 397			\$ -		\$ -		\$ -					
42.2	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m		\$ 545 397			\$ -		\$ -		\$ -					
43	4	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg	5 529 845.00	\$ 5 378	\$ 29 739 506 410		\$ -		\$ -		\$ -					
43.1	4-11606	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		872 188.70	\$ 4 690 630 829	13 829.90	\$ 74 377 202	709 105.40	\$ 3 813 568 844.00					
43.2	4-11605	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378			\$ -		\$ -		\$ -					
43.3	4-11604	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		62 100.30	\$ 333 975 413	1 223.00	\$ 6 577 294	40 449.00	\$ 217 534 722.00					
43.4	4-14101	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		381 810.30	\$ 2 053 375 793		\$ -	381 810.30	\$ 2 053 375 792.00					
43.5	4-14102	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		446 496.90	\$ 2 401 260 329		\$ -	416 150.10	\$ 2 238 055 237.00					
43.6	4-14103	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		527 968.30	\$ 2 839 413 517	19 293.80	\$ 103 762 056	522 445.50	\$ 2 809 711 898.00					
43.7	4-14104	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		60 370.20	\$ 324 670 936		\$ -	54 299.70	\$ 292 023 786.00					
43.8	4-15102	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		49 187.00	\$ 264 527 686		\$ -	47 940.50	\$ 257 824 008.00					
43.9	4-15104	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		360 989.20	\$ 1 941 399 918	31 414.60	\$ 168 947 719	179 094.20	\$ 963 168 608.00					
44	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	tf-m	1 751 321.00	\$ 2 150	\$ 3 765 340 150		\$ -		\$ -		\$ -					
44.1	4-14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	tf-m		\$ 2 150		2 623 864.20	\$ 5 641 308 030	30 700.00	\$ 66 005 000	2 623 864.20	\$ 5 641 308 030.00					
45	4	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und	56.00	\$ 2 551 672	\$ 142 893 632		\$ -		\$ -		\$ -					
45.1	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und		\$ 2 551 672		32.00	\$ 81 653 504		\$ -	32.00	\$ 81 653 504.00					
46	4	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	und	8.00	\$ 6 524 758	\$ 52 198 064		\$ -		\$ -		\$ -					
46.1	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	und		\$ 6 524 758		</										


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1								
												VERSIÓN		1								
												PÁGINA		4	DE	9						
															FECHA			4/6/2024 (Día / Mes / Año)				
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE															MES			mayo-2024				
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA															ACTA No. 35			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 9 939 231 687.00				
UNIDAD EJECUTORA:															ACTA FINAL							
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)															PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREJUDICIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2															FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)															FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021															VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):				
INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL															VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00							
															CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24			OBRA EJECUTADA				
																		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1						
						VERSIÓN		1						
						PÁGINA		5	DE	9				
								FECHA						
								4/6/2024 (Día / Mes / Año)						
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		ACTA No. 35		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 9 939 231 687.00		MES mayo-2024						
ACTA FINAL														
CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PRELAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)						FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021						VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):						
INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00								
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
69.1	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 40 763		\$ -		\$ -		\$ -	
70	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	11 322.00	\$ 20 969	\$ 237 411 018		\$ -		\$ -		\$ -
70.1	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 20 969		24 768.60	\$ 519 372 773		\$ -	23 698.00	\$ 496 923 362.00
Subtotal				OBRAS SUBTERRÁNEAS			\$ 88 356 190 138		\$ 79 179 447 325		\$ 2 304 214 445		\$ 76 834 677 658.00	
71	5		PT-1	Perforación exploratoria	m	1 206.00	\$ 231 723	\$ 279 457 938		\$ -		\$ -		\$ -
71.1	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	m		\$ 231 723			\$ -		\$ -		\$ -
72	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	13 426.00	\$ 250 000	\$ 3 356 500 000		\$ -		\$ -		\$ -
72.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3		\$ 250 000		16 358.40	\$ 4 089 600 000		\$ -	16 358.40	\$ 4 089 600 000.00
73	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	57 279.00	\$ 256 280	\$ 14 679 462 120		\$ -		\$ -		\$ -
73.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3		\$ 256 280		69 633.20	\$ 17 845 596 496		\$ -	69 383.20	\$ 17 781 526 496.00
74	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	53 444.00	\$ 305 000	\$ 16 300 420 000		\$ -		\$ -		\$ -
74.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3		\$ 305 000		17 739.00	\$ 5 410 395 000	102.70	\$ 31 323 500	17 738.90	\$ 5 410 364 500.00
75	4		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	m	21 401.00	\$ 98 785	\$ 2 114 097 785		\$ -		\$ -		\$ -
75.1	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	m		\$ 98 785		22 275.60	\$ 2 200 495 146		\$ -	22 275.50	\$ 2 200 485 268.00
76	5		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	14 649.00	\$ 1 000 000	\$ 14 649 000 000		\$ -		\$ -		\$ -
76.1	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3		\$ 1 000 000		8 714.80	\$ 8 714 800 000	1 971.80	\$ 1 971 800 000	8 018.90	\$ 8 018 900 000.00
77	5		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación	m3	9 768.00	\$ 1 030 000	\$ 10 061 040 000		\$ -		\$ -		\$ -
77.1	5-11606		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación	m3		\$ 1 030 000		3 742.90	\$ 3 855 187 000		\$ -	3 247.57	\$ 3 344 997 100.00
77.2	5-15103		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación subterránea)	m3		\$ 1 030 000		21 719.00	\$ 22 370 570 000	130.10	\$ 134 003 000	21 003.34	\$ 21 633 440 200.00
78	5		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	240.00	\$ 173 926	\$ 41 742 240		\$ -		\$ -		\$ -
78.1	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m		\$ 173 926			\$ -		\$ -		\$ -
79	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2	23 412.00	\$ 24 116	\$ 564 603 792		\$ -		\$ -		\$ -
79.1	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2		\$ 24 116			\$ -		\$ -		\$ -
79.2	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2		\$ 24 116			\$ -		\$ -		\$ -
80	4		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2	29 216.00	\$ 14 391	\$ 420 447 456		\$ -		\$ -		\$ -
80.1	4-11606		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2		\$ 14 391		125 673.80	\$ 1 808 571 656	7 072.80	\$ 101 784 665	120 967.70	\$ 1 740 846 174.00
80.2	4-15104		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2		\$ 14 391		29 428.20	\$ 423 501 226		\$ -	10 689.80	\$ 153 836 911.00
81	4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	211 151.00	\$ 28 502	\$ 6 018 225 802		\$ -		\$ -		\$ -
81.1	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2		\$ 28 502		712.10	\$ 20 296 274		\$ -	712.10	\$ 20 296 274.00
81.2	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2		\$ 28 502			\$ -		\$ -		\$ -
82	4		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	708 686.00	\$ 10 584	\$ 7 500 732 624		\$ -		\$ -		\$ -
82.1	4-15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg		\$ 10 584		513 979.40	\$ 5 439 957 970	6 170.00	\$ 65 303 280	513 978.20	\$ 5 439 945 271.00
83	4		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	26 789.00	\$ 8 836	\$ 236 707 604		\$ -		\$ -		\$ -
83.1	4-15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg		\$ 8 836			\$ -		\$ -		\$ -
84	4		PT-6	Fibra de Acero	Kg	244 200.00	\$ 12 365	\$ 3 019 533 000		\$ -		\$ -		\$ -
84.1	4-15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg		\$ 12 365		46 553.90	\$ 575 638 973		\$ -	46 550.90	\$ 575 601 880.00
85	7		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	40 801.00	\$ 80 000	\$ 3 264 080 000		\$ -		\$ -		\$ -
85.1	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2		\$ 80 000			\$ -		\$ -		\$ -
86	5		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	16.00	\$ 3 514 941	\$ 56 239 056		\$ -		\$ -		\$ -
86.1	5-15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u		\$ 3 514 941			\$ -		\$ -		\$ -
87	5		PT10	tubería para enfijajes: tubería metálica de 4" de diámetro	m	22 379.00	\$ 258 899	\$ 5 793 900 721		\$ -		\$ -		\$ -
87.1	5-15102		PT10	tubería para enfijajes: tubería metálica de 4" de diámetro	m		\$ 258 899		24 816.00	\$ 6 424 837 584		\$ -	24 816.00	\$ 6 424 837 584.00
Subtotal				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			\$ 2 592 324 621		\$ 1 343 400 428		\$ 91 893 922		\$ 960 415 457.00	
88	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m	34 789.00	\$ 1 791	\$ 62 307 099		\$ -		\$ -		\$ -
88.1	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m		\$ 1 791			\$ -		\$ -		\$ -
88.2	7-15107		MSV-2015	agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1 791			\$ -		\$ -		\$ -
89	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2	163.00	\$ 59 987	\$ 9 777 881		\$ -		\$ -		\$ -
89.1	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2		\$ 59 987			\$ -		\$ -		\$ -
89.2	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2		\$ 59 987			\$ -		\$ -		\$ -
90	5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	300.00	\$ 8 375	\$ 2 512 500		\$ -		\$ -		\$ -
90.1	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		\$ 8 375			\$ -		\$ -		\$ -
90.2	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		\$ 8 375			\$ -		\$ -		\$ -
91	4		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u	279.00	\$ 396 078	\$ 110 505 762		\$ -		\$ -		\$ -
91.1	4-11607		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u		\$ 396 078		34.00	\$ 13 466 652		\$ -	34.00	\$ 13 466 652.00
91.2	4-15107		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u		\$ 396 078			\$ -		\$ -		\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA 6 DE 9							
FECHA 4/6/2024 (Día / Mes / Año)																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 35		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 9 939 231 687.00		MES mayo-2024									
ACTA FINAL																			
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO-CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREJAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL								VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 389 978 471 425.00					
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24		OBRA EJECUTADA					
						DESCRIPCIÓN ÍTEM				UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.														
92	4		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	143.00	\$ 503 069	\$ 71 938 867		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
92.1	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u		\$ 503 069			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
92.2	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u		\$ 503 069			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
93	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	44.00	\$ 324 103	\$ 14 260 532		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
93.1	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 324 103			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
93.2	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 324 103			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
94	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	\$ 11 489 679	\$ 11 489 679		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
94.1	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 11 489 679			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
95	5	720-13		Poste de referencia	u	9.00	\$ 252 800	\$ 2 275 200		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
95.1	5-11607	720-13		Poste de referencia	u		\$ 252 800			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
95.2	5-15107	720-13		Poste de referencia	u		\$ 252 800			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
96	4	730-13		Defensa metálica	m	166.00	\$ 230 532	\$ 38 268 312		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
96.1	4-11607	730-13		Defensa metálica	m		\$ 230 532			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
97	5	731-13		Defensa de concreto	m	2 794.00	\$ 802 567	\$ 2 242 372 198		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
97.1	5-11607	731-13		Defensa de concreto	m		\$ 802 567		1 657.10	\$ 1 329 933 776	114.50	\$ 91 893 922	1 179.90	\$ 946 948 805.00					
98	4	730-13		Sección final	u	6.00	\$ 121 353	\$ 728 118		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
98.1	4-11607	730-13		Sección final	u		\$ 121 353			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
99	4	730-13		Sección de tope	u	6.00	\$ 95 809	\$ 574 854		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
99.1	4-11607	730-13		Sección de tope	u		\$ 95 809			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
100	5	740-13		Captafaros	u	1 149.00	\$ 22 031	\$ 25 313 619		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
100.1	5-11607	740-13		Captafaros	u		\$ 22 031			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Subtotal				OBRAS VARIAS			\$ 62 929 266	\$ 273 954 668		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
101	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2710	\$ 18 835	\$ 51 042 850		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
101.1	5-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		\$ 18 835			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
102	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	524	\$ 22 684	\$ 11 886 416		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
102.1	5-11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		\$ 22 684		12 077.00	\$ 273 954 668		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Subtotal				TRANSPORTES			\$ 19 865 740 000	\$ 24 292 530 000		\$ 727 779 400		\$ 23 374 825 800.00							
103	3	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km	19865740	\$ 1 000	\$ 19 865 740 000	45 233.00	\$ 45 233 000		\$ -	45 233.00	\$ 45 233 000.00					
103.1	3-11608	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		20 985 014.00	\$ 20 985 014 000	727 779.40	\$ 727 779 400	20 310 504.00	\$ 20 310 504 000.00					
103.2	3-14101	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		1 724.00	\$ 1 724 000		\$ -	1 724.00	\$ 1 724 000.00					
103.3	3-15101	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		3 260 559.00	\$ 3 260 559 000		\$ -	3 017 364.80	\$ 3 017 364 800.00					
Subtotal				ITÉM NO PREVISTOS			\$ -	\$ 49 110 643 167		\$ 2 576 829 396		\$ 37 071 135 466.00							
105	1	211-13		remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3		\$ 9 121	\$ -	1 344.00	\$ 12 258 624		\$ -	1 344.00	\$ 12 258 624.00					
105.1	1-11601	211-13		remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3		\$ 9 121		85 000.00	\$ 775 285 000	3 824.00	\$ 34 878 704	79 564.00	\$ 725 703 244.00					
106	1	310.1P		conformación de calzada existente	M2		\$ 1 317	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1											
												VERSIÓN		1											
												PÁGINA		7	DE	9									
												FECHA													
												4/6/2024 (Día / Mes / Año)													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA GRUPO NORTE												MES mayo-2024													
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA																									
ACTA No. 35												VALOR BÁSICO ACTA: \$ 9 939 231 687.00													
ACTA FINAL																									
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PRECIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):											
INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00													
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24		OBRA EJECUTADA														
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO												
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR											
106.1	1-11601		310.1P	conformación de calzada existente	M2		\$ 1 317		41 148.00	\$ 54 191 916		\$ -	41 148.00	\$ 54 191 916.00											
107	2		320.1P	mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y	M3		\$ 88 378	\$ -	3 060.00	\$ 270 436 680		\$ -	3 060.00	\$ 270 436 680.00											
107.1	2-11602		320.1P	mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3		\$ 88 378		6 101.00	\$ 539 194 178		\$ -	3 041.00	\$ 268 757 498.00											
108	2		230.1P	mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3		\$ 13 724	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -											
108.1	2-11602		230.1P	mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3		\$ 13 724			\$ -		\$ -		\$ -											
109.0	5		NP-05P	limpieza de estructuras de drenaje	UND		\$ 646 464	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -											
109.1	5-11604		NP-05P	limpieza de estructuras de drenaje	UND		\$ 646 464			\$ -		\$ -		\$ -											
110	3	900-13		transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir	M3-KM		\$ 1 000	\$ -	28 504.00	\$ 28 504 000		\$ -	28 504.00	\$ 28 504 000.00											
110.1	3-11608	900-13		transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir	M3-KM		\$ 1 000		1 589 586.50	\$ 1 589 586 500	110 162.20	\$ 110 162 200	1 573 419.70	\$ 1 573 419 700.00											
111.0	3	900-13		transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100	M3 -KM		\$ 1 182	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -											
111.1	3-11608	900-13		transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100	M3 -KM		\$ 1 182		21 254.00	\$ 25 122 228		\$ -	21 254.00	\$ 25 122 228.00											
112	5	681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		\$ 267 346	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -											
112.1	5-11606	681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		\$ 267 346		596.00	\$ 159 338 216		\$ -	400.00	\$ 106 938 400.00											
112.2	5-11604	681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		\$ 267 346		1 500.00	\$ 401 019 000		\$ -	882.00	\$ 235 799 172.00											
113	1		221.1P	enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		\$ 18 619	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -											
113.1	1-11602		221.1P	enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		\$ 18 619			\$ -		\$ -		\$ -											
114	2		330.2P	instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		\$ 21 395	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -											
114.1	2-11602		330.2P	instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		\$ 21 395			\$ -		\$ -		\$ -											
115	2		230.2P	mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3		\$ 100 111	\$ -	1 515.00	\$ 151 668 165		\$ -	1 515.00	\$ 151 668 165.00											
115.1	2-11602		230.2P	mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3		\$ 100 111		226.00	\$ 22 625 086		\$ -	226.00	\$ 22 625 086.00											
116	1	200-13		talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		\$ 255 977			\$ -		\$ -		\$ -											
116.1	1-11606	200-13		talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		\$ 255 977		140.00	\$ 35 836 780		\$ -	140.00	\$ 35 836 780.00											
117	1	200-13		talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		\$ 427 938			\$ -		\$ -		\$ -											
117.1	1-11606	200-13		talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		\$ 427 938		3 719.00	\$ 1 591 501 422		\$ -	3 719.00	\$ 1 591 501 422.00											
118	1	200-13		talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		\$ 733 607			\$ -		\$ -		\$ -											
118.1	1-11606	200-13		talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		\$ 733 607		1 000.00	\$ 733 607 000		\$ -	1 000.00	\$ 733 607 000.00											
119	1	200-13		talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		\$ 1 118 742			\$ -		\$ -		\$ -											
119.1	1-11606	200-13		talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		\$ 1 118 742		7.00	\$ 7 831 194		\$ -	7.00	\$ 7 831 194.00											
120	1	210-13		voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		\$ 623 659			\$ -		\$ -		\$ -											
120.1	1-11606	210-13		voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		\$ 623 659		850.00	\$ 530 110 150		\$ -	668.90	\$ 417 165 504.00											
120.2	1-14101	210-13		voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		\$ 623 659		1 574.00	\$ 981 639 266		\$ -	1 573.90	\$ 981 576 903.00											
121.1	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	ML		\$ 114 139		3 442.60	\$ 392 934 921		\$ -	3 270.60	\$ 373 303 014.00											
122.1	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3		\$ 67 263		1 599.50	\$ 107 587 168	31.70	\$ 2 132 237	930.40	\$ 62 581 497.00											

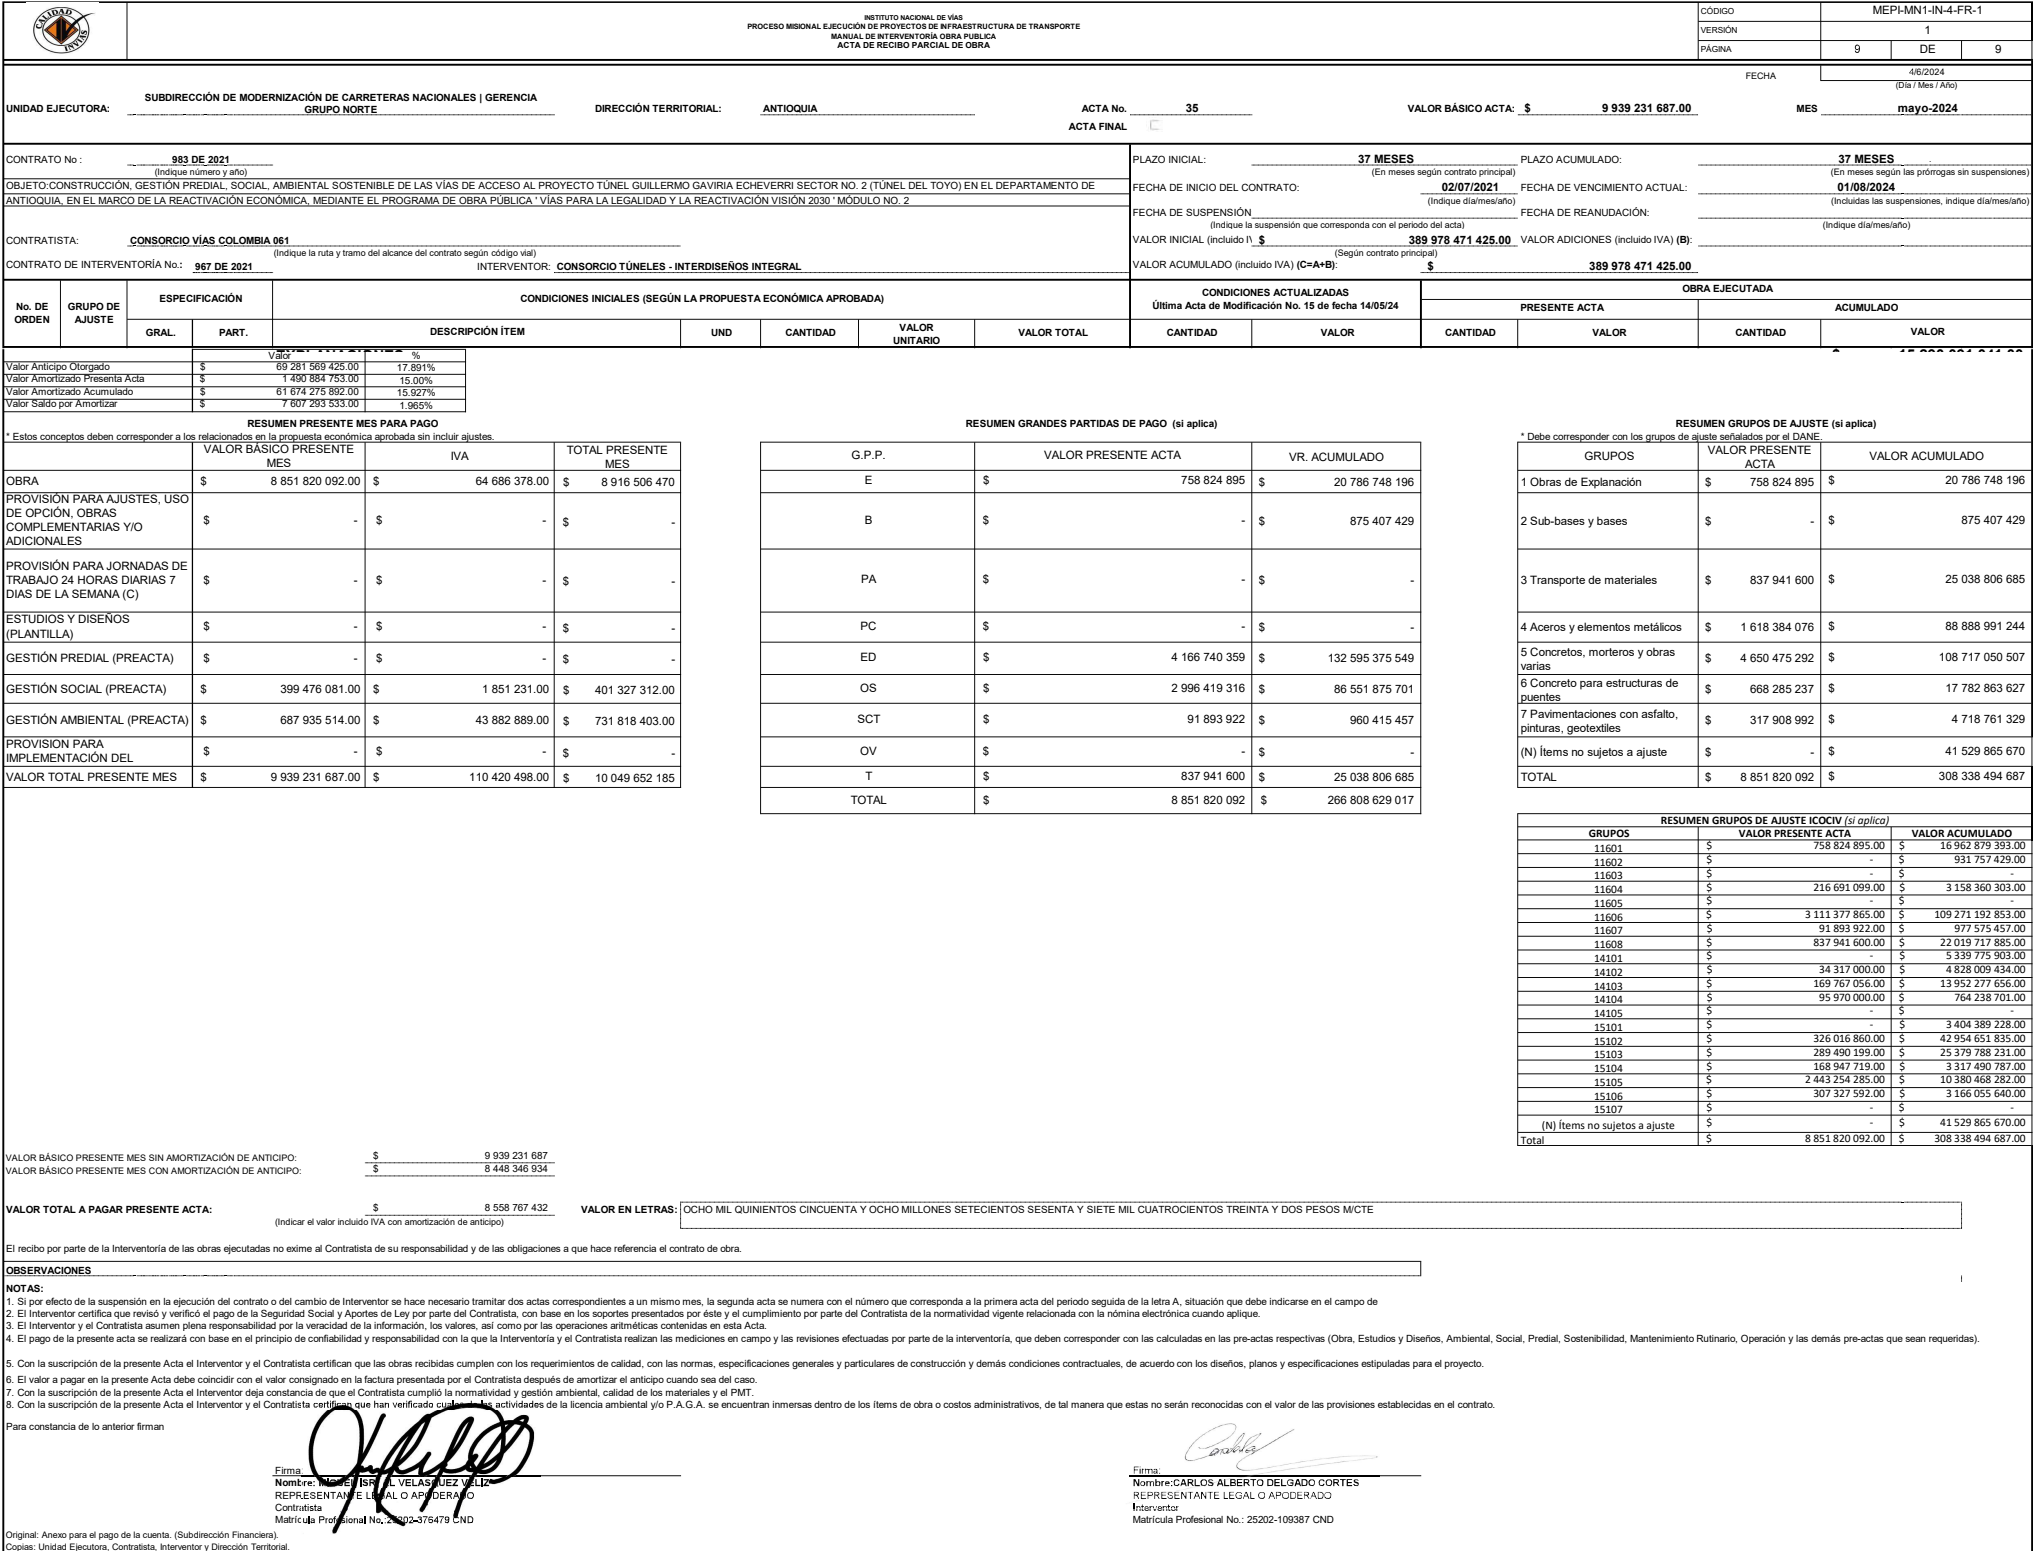

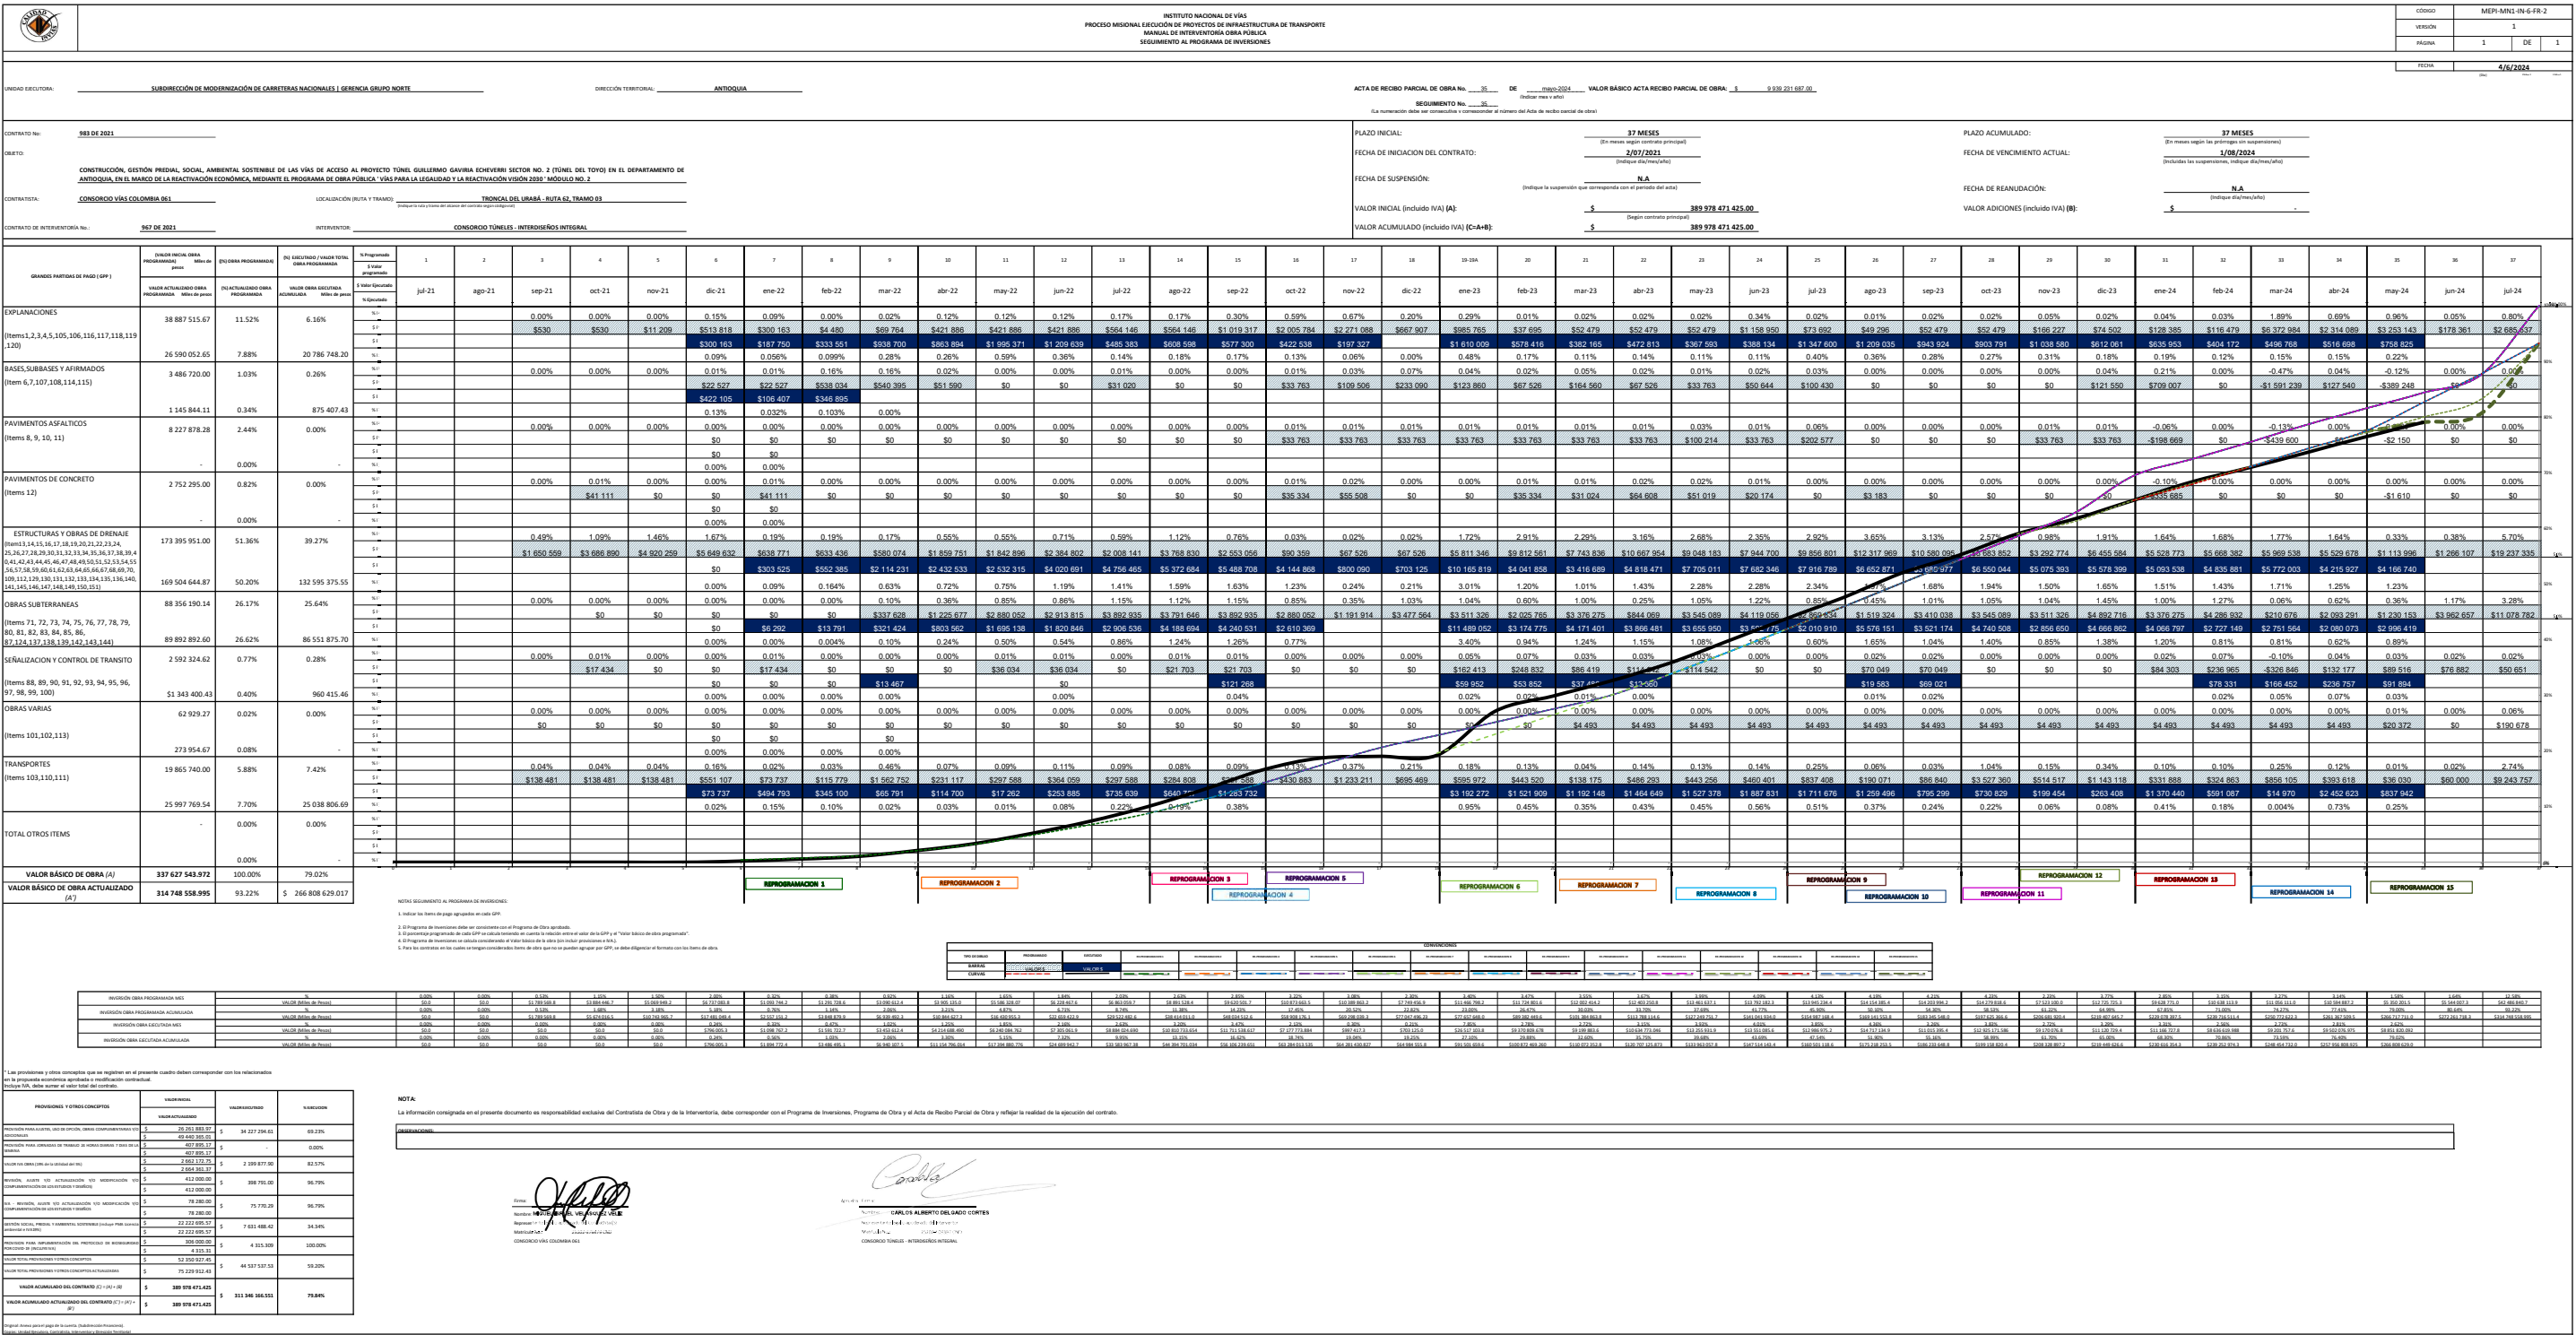



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>35</u>	<u>mayo-2024</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>10</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>498 120 265.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>2 385 328 483.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>10</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>5 087 331 361.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>207524</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-51102D-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>587 987 323.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
						TOTAL ACTA: \$	<u>8 558 767 432.00</u>

 Firmado digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

Formulado	RP207524;10;5585451626;RP207524;11;2973315806
Texto Libre	SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 35 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto	SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 35 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;5585451626;RP207524;11;2973315806



PROCESO GESTION FINANCIERA
FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFIN-FR-5		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Acta N° 35 Valor basico \$ 9 939 231 687.00 Período mayo-2024

Valor Incluido Iva \$ 10 049 652 185.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Valor incluido IVA (gestion social, predial y ambiental)	Subtotal
1	6203	CARRETERA	\$ 4 651 852 744.00				\$ 4 651 852 744.00
2	6203	PUENTE	\$ 399 030 941.00				\$ 399 030 941.00
3	6203	TUNEL	\$ 3 865 622 785.00				\$ 3 865 622 785.00
4	6203	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL				\$ 1 133 145 715.00	\$ 1 133 145 715.00
5	6203	ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -			\$ -
6							
7							
8							
9							
10							
TOTALES			\$ 8 916 506 470.00	\$ -		\$ 1 133 145 715.00	\$ 10 049 652 185.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890907569-1	MUNICIPIO 1	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$ 10 049 652 185.00	\$ 9 939 231 687.00
890983786-7	MUNICIPIO 2	GIRALDO		
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL ANTIOQUIA 1			\$ 10 049 652 185.00	\$ 9 939 231 687.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista


CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-109387 CND
Interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6						
											VERSIÓN		1						
											PÁGINA		1 DE 1						
											FECHA		MAYO 2024 (31/ 05 / 2024)						
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		35		1. DATOS DEL PROYECTO											
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte				OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2						No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		983 de 2021			
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Antioquia												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		967 de 2021			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		5		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	N E E M	Y T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **		
PMA_SOC-01. Programa de manejo de información y participación comunitaria	Impresión de volantes		Ejemplar	2000	\$ 333,20	\$ 666.400,00		X		\$ 686.225,40	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 686.225,40	
	Pauta de cuñas radiales (2023)		Emisión	12	\$ 11.000	\$ 132.000,00		X		\$ 135.927,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 135.927	\$ -	
	Pauta de cuñas radiales (2024)		Emisión	20	\$ 12.300	\$ 246.000,00		X		\$ 253.318,50	4	\$ 49.200,00	2,5%	\$ 1.464	\$ 50.663,70	4	\$ 50.663,70	\$ 202.655,00	Anexo1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de información y participación comunitaria 1. Pautas cuñas radiales 1.Factura FE476 Enero de 2024 2.Factura FE477 Febrero de 2024 3.Factura FE491 Marzo de 2024 4.Factura FE492 Abril de 2024
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2023)		Refrigerio	1886	\$ 10.000	\$ 18.860.000,00		X		\$ 19.421.086,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1886	\$ 19.421.086	\$ -	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2024)		Refrigerio	1000	\$ 11.000	\$ 11.000.000,00		X		\$ 11.327.250,00	499	\$ 5.489.000,00	2,5%	\$ 163.298	\$ 5.652.297,75	499	\$ 5.652.297,75	\$ 5.674.952,25	Anexo1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de información y participación comunitaria 2. Refrigerios reuniones con la comunidad 1. Factura No. FEV 35209: Refrigerios COPACO - 24/02/2024. 2. Factura No. FEV 33987: Refrigerios jornada de empleabilidad - 08/03/2024. 3. Factura No. FEV 34388: Refrigerios capacitación socioambiental - 15/03/2024 - Comunidad El Rodeo. 4. Factura No. FEV 34389: Refrigerios capacitación seguridad vial - 21/03/2024 - I.E.R El Balso. 5. Factura No. FEV 36165: Refrigerios capacitación socioambiental - 10/04/2024 - Comunidad Cativo. 6. Factura No. FEV 35205: Refrigerios capacitación socioambiental - 18/04/2024 - I.E.R El Balso 7. Factura No. FEV 36206: Refrigerios capacitación socioambiental - 18/04/2024 - I.E.R Pinguro 8. Factura No. FEV 35207: Refrigerios capacitación socioambiental - 18/04/2024 - Comunidad Cativo. 9. Factura No. FEV 35208: Refrigerios capacitación socioambiental - 19/04/2024 - I.E El Rodeo 10. Factura No. FEV 36169: Refrigerios capacitación socioambiental - 02/05/2024 - I.E Tinajitas
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2023)		Almuerzo	35	\$ 12.000	\$ 420.000,00		X		\$ 432.495,00	35	\$ 420.000,00	2,5%	\$ 12.495	\$ 432.495,00	35	\$ 432.495,00	\$ -	Anexo1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de información y participación comunitaria 3. Almuerzos reuniones con la comunidad 1. Factura No. FEV 30350: Almuerzos capacitación ESAP el 09 y 10 de diciembre de 2023. Nota: Ejecutado y cobrado al 100%
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2024)		Almuerzo	60	\$ 13.000	\$ 780.000,00		X		\$ 803.205,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 803.205,00	
	Diseño e impresión de Brochure (2023)		Ejemplar	1000	\$ 2.320,5	\$ 2.320.500,00		X		\$ 2.389.534,88	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.389.534,88	
	Diseño e impresión de Brochure (2024)		Ejemplar	1000	\$ 2.356,2	\$ 2.356.200,00		X		\$ 2.426.296,95	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.426.296,95	
	Diseño e impresión de Boletín (2023)		Ejemplar	12000	\$ 1.329,23	\$ 15.950.760,00		X		\$ 16.425.295,11	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12000	\$ 16.425.295,11	\$ -	
	Diseño e impresión de Boletín (2024)		Ejemplar	9000	\$ 1.507,73	\$ 13.569.570,00		X		\$ 13.973.264,71	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 13.973.264,71	
	Video del proyecto (2023)		Video	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00		X		\$ 30.892.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 30.892.500	\$ -	
	Video del proyecto (2024)		Video	1	\$ 30.500.000,00	\$ 30.500.000,00		X		\$ 31.407.375,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 31.407.375,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		1 DE 1					
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			35		FECHA						MAYO 2024 (31/ 05 / 2024)				
1. DATOS DEL PROYECTO																			
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte			OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2							No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		983 de 2021			
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Antioquia												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		967 de 2021			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	5		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	20	M	MARZO	2024	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **		
	Página WEB	Diseño web	Unitario	1	\$ 2.082.500	\$ 2.082.500,00	X		\$ 2.144.454,38	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.144.454,38	\$ -		
		Administración de Contenidos Sitio web	Unitario	3	\$ 571.200	\$ 1.713.600,00	X		\$ 1.764.579,60	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.764.579,60		
		Encuestas Anuales (2023)	Encuesta	50	\$ 32.130	\$ 1.606.500,00	X		\$ 1.654.293,38	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	50	\$ 1.654.293,38	\$ -		
		Encuestas Anuales (2024)	Encuesta	50	\$ 35.700	\$ 1.785.000,00	X		\$ 1.838.103,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.838.103,75		
PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socio ambiental al personal y a la comunidad	Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales para trabajadores (2023)		Ejemplar	1000	\$ 1.904	\$ 1.904.000,00	X		\$ 1.960.644,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 1.960.644	\$ -		
	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores	Institución Educativa Rural Santa Rosa de Lima - sedes: Tinajitas, Pinguro y El Balso (municipio de Giraldo Antioquia)	Unitario	3	\$ 17.545.000	\$ 52.635.000,00	X		\$ 54.200.891,25	3	\$ 52.635.000,00	2,5%	\$ 1.565.891	\$ 54.200.891,25	3	\$ 54.200.891,25	\$ -	Anexo 2. PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socio ambiental al personal y a la comunidad 1. Vinculación PRAES 1. Cuenta de cobro N°01 Sebastian Vargas: Plantas Ornamentales. Nota: Ejecutado y cobrado al 100%	
		Institución Educativa Rural Nurquí - sede Carmen Ferrer (vereda El Rodeo, municipio de Santa Fe de Antioquia)	Unitario	1	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	X		\$ 30.892.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 30.892.500,00		
		Institución Educativa San Luis Gonzaga - sede Santa Inés (vereda Cativo, municipio de Santa Fe de Antioquia)	Unitario	1	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	X		\$ 30.892.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 30.892.500,00		
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la cultura ambiental, a la población estudiantil (Segunda expedición ambiental)		Kit temático (Camiseta) diseñada para la "Segunda expedición ambiental del occidente Antioqueño".	Camiseta	100	\$ 46.410	\$ 4.641.000,00	X		\$ 4.779.070,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 4.779.070,00	\$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad)	Kit temático (Termo para agua) diseñada para la semana de la movilidad	Termo	100	\$ 10.115	\$ 1.011.500,00	X		\$ 1.041.592,13	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 1.041.592	\$ -		
		Kit temático (Bolsa ecológica) diseñada para la semana de la movilidad	Bolsa ecológica	100	\$ 11.900	\$ 1.190.000,00	X		\$ 1.225.402,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 1.225.403	\$ -		
		Kit temático (Camiseta) diseñada para la semana de la movilidad	Camiseta	100	\$ 42.840	\$ 4.284.000,00	X		\$ 4.411.449,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 4.411.449	\$ -		
		Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad	Gorra	100	\$ 26.180	\$ 2.618.000,00	X		\$ 2.695.885,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 2.695.886	\$ -		
		Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023	Gorra	150	\$ 19.040	\$ 2.856.000,00	X		\$ 2.940.966,00	150	\$ 2.856.000,00	2,5%	\$ 84.966	\$ 2.940.966,00	150	\$ 2.940.966,00	\$ -	Anexo 2. PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socio ambiental al personal y a la comunidad 2. Kit semana movilidad	
		Kit temático (camiseta) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023	Camiseta	150	\$ 26.180	\$ 3.927.000,00	X		\$ 4.043.828,25	150	\$ 3.927.000,00	2,5%	\$ 116.828	\$ 4.043.828,25	150	\$ 4.043.828,25	\$ -	1. Factura No. PC-511: Kits semana de la movilidad - Satan Fe de Antioquia.	
		Kit temático (botilito) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023	Botilito	100	\$ 16.065	\$ 1.606.500,00	X		\$ 1.654.293,38	100	\$ 1.606.500,00	2,5%	\$ 47.793	\$ 1.654.293,38	100	\$ 1.654.293,38	\$ -	Nota: Ejecutado y cobrado al 100%	
	Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad estudiantil) 2023		Kit	240	\$ 110.213	\$ 26.451.130,00	X		\$ 27.238.051,12	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	240	\$ 27.238.051	\$ -		
	Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad estudiantil) 2024		Kit	300	\$ 232.859	\$ 69.857.760,00	X		\$ 71.936.028,36	300	\$ 69.857.760,00	2,5%	\$ 2.078.268	\$ 71.936.028,36	300	\$ 71.936.028,36	\$ -	Anexo 2. PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socio ambiental al personal y a la comunidad 3. Kits escolares 1. Factura No. PC-593: Kits escolares Nota: Ejecutado y cobrado al 100%	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6								
												VERSIÓN		1								
												PÁGINA		1 DE 1								
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			35		1. DATOS DEL PROYECTO						FECHA		MAYO 2024 (31/ 05 / 2024)					
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte				OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2						No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		983 de 2021						
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Antioquia												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		967 de 2021						
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																						
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	20		MARZO		2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)					
	de Girardo (Antioquia)	Dotación (nevera) restaurante escolar	Nevera	1	\$ 8.091.881	\$ 8.091.881,00	X		\$ 8.332.614,46	1	\$ 8.091.881,00	2,5%	\$ 240.733	\$ 8.332.614,46	1	\$ 8.332.614,46	\$ -	Anexo 3. PMA_SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario 1. Nevecón 4. Factura FDWS12938 <i>Nota: Se hace claridad que el CVC 061 está cobrando un monto menor al valor de la factura, debido a que este superaba el valor aprobado por la interventoría.</i> <i>Nota: Ejecutado y cobrado al 100%</i>				
		Vereda Tinajitas, municipio de Girardo (Antioquia)	Global	1	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000,00	X		\$ 123.570.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 123.570.000,00					
		Vereda Cativo, municipio de Santa Fe de Antioquia (Antioquia)	Global	1	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000,00	X		\$ 123.570.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 123.570.000,00					
		Vereda El Rodeo, municipio Santa Fe de Antioquia (Antioquia)	Global	1	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000,00	X		\$ 123.570.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 123.570.000,00					
		Vereda Kilómetro 14, municipio Santa Fe de Antioquia (Antioquia)	Global	1	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000,00	X		\$ 123.570.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 123.570.000,00					
	Placas conmemorativas	Placa	5	\$ 2.306.220	\$ 11.531.100,00	X		\$ 11.874.150,23	2	\$ 4.612.440,00	2,5%	\$ 137.220	\$ 4.749.660,09	2	\$ 4.749.660,09	\$ 7.124.490,14	Anexo 3. PMA_SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario 2. Placas Conmemorativas 1. Factura N°FE 4296					
	Ejecución de una Obra con Participación Comunitaria (OPC) en Una Unidad Territorial Menor		Global	1	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000,00	X		\$ 72.082.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 72.082.500,00					
Arqueología preventiva	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico a noviembre 2023		Mes	22	\$ 47.005.000	\$ 1.034.110.000,00	X		\$ 1.064.874.772,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	22	\$ 1.064.874.772,75	\$ -					
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico diciembre 2023		Mes	1	\$ 40.737.666	\$ 40.737.666,00	X		\$ 41.949.613,56	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 41.949.613,56	\$ -					
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico 2024		Mes	8	\$ 35.105.000	\$ 280.840.000,00	X		\$ 289.194.990,00	1	\$ 35.105.000,00	2,5%	\$ 1.044.373,75	\$ 36.149.373,75	4	\$ 144.597.495,25	\$ 144.597.494,75	Anexo 4. Arqueología preventiva 1. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico: DGFEN° 45, Abril de 2024.				
Educación Superior y Estudiantes (Del Aula a la Obra)	1. Actividad del Aula a la Obra 21/04/2022	Alquiler salon y recursos locatvtos	Unitario	1	\$ 400.000	\$ 400.000,00	X		\$ 411.900,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 411.900,00	\$ -					
		Compra de cascos de seguridad	Casco	1	\$ 2.169.580	\$ 2.169.579,50	X		\$ 2.234.124,49	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.234.124,49	\$ -					
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios	Alimentación	1	\$ 1.474.000	\$ 1.474.000,00	X		\$ 1.517.851,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.517.851,50	\$ -					
		Transporte de estudiantes a evento	Recorrido	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625,00	\$ -					
	2. Actividad del Aula a la Obra 04/05/2022	Alquiler salon y recursos locatvtos.	Unitario	1	\$ 400.000	\$ 400.000,00	X		\$ 411.900,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 411.900,00	\$ -					
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios	Alimentación	1	\$ 2.280.000	\$ 2.280.000,00	X		\$ 2.347.830,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.347.830,00	\$ -					
		Transporte de estudiantes a evento	Recorrido	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625,00	\$ -					
	3. Actividad del Aula a la Obra 27/05/2022	Alquiler salon y recursos locatvtos	Unitario	1	\$ 386.000	\$ 386.000,00	X		\$ 397.483,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 397.483,50	\$ -					
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios	Alimentación	1	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000,00	X		\$ 1.715.563,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.715.563,50	\$ -					
		Transporte de estudiantes a evento	Recorrido	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625,00	\$ -					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO												CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
														VERSIÓN	1					
														PÁGINA	1 DE 1					
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			35			FECHA					MAYO 2024 (31/05/2024)					
1. DATOS DEL PROYECTO																				
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte				OBJETO DEL CONTRATO				CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2					No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		983 de 2021			
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Antioquia													No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		967 de 2021			
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																				
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		5		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	20	2024	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
Guía para Instituciones de Educación Superior	4. Actividad del Aula a la Obra 17/06/2022	Alquiler salon y recursos locativos		Unitario	1	\$ 550.000	\$ 550.000,00	X		\$ 566.362,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 566.362,50	\$ -		
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios		Alimentación	1	\$ 1.861.000	\$ 1.861.000,00	X		\$ 1.916.364,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.916.364,75	\$ -		
		Transporte de estudiantes a evento		Recorrido	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625,00	\$ -		
	5. Actividad del Aula a la Obra 15/07/2022	Alquiler salon y recursos locativos		Unitario	1	\$ 386.000	\$ 386.000,00	X		\$ 397.483,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 397.483,50	\$ -		
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios		Alimentación	1	\$ 1.890.000	\$ 1.890.000,00	X		\$ 1.946.227,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.946.227,50	\$ -		
		Transporte de estudiantes a evento		Recorrido	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625,00	\$ -		
	Línea Deportiva (Campeonato Fútbol 5, Campeonato Ping Pong y/o CicloINVIAS)	1. Alquiler de sonido		Sonido	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	X		\$ 1.544.625,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.544.625,00	\$ -		
		2. Tarjeta regalo		Unitario	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000,00	X		\$ 1.235.700,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.235.700,00	\$ -		
		3. Uniformes deportivos		Uniforme	1	\$ 6.397.440	\$ 6.397.440,00	X		\$ 6.587.763,84	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 6.587.763,84	\$ -		
		4. Premiación		Unitario	1	\$ 1.428.000	\$ 1.428.000,00	X		\$ 1.470.483,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.470.483,00	\$ -		
		5. Alimentación		Alimentación	1	\$ 3.885.000	\$ 3.885.000,00	X		\$ 4.000.579,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 4.000.579,00	\$ -		
		6. Arbitraje evento		Unitario	1	\$ 480.000	\$ 480.000,00	X		\$ 494.280,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 494.280,00	\$ -		
3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPIEDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																				
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		4		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPIEDIAL(\$)	24	2023	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPIEDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPIEDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
Gestión Sociopredial		Reconocimiento de factores		Unitario	0	\$ -	\$ -	X			0	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -		
Gestión Sociopredial		Reconocimiento de factores		Unitario	0	\$ -	\$ -	X			0	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -		
4. RESUMEN																				
A		VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS					\$	401.327.312,00		G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO					\$	-			
B		VALOR BÁSICO PRE-ACTA					\$	389.732.762,0		H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA					\$	9.743.319,00			
C		VALOR IVA MENSUAL					\$	1.851.231,00		I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL					\$	401.327.312,00			
D		VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL					\$	401.327.312,00		J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPIEDIAL					\$	-			
E		RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)					\$	1.959.272.803,00		K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					\$	2.046.887.249,00			
F		VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA					\$	4.006.160.052,00		L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)						51,09%			
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																				
6. FIRMAS																				

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ	Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ	Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTÉS	Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO
Representante Legal Contratista	Profesional Social Contratista	Representante Legal Interventoría	Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-376479	Matrícula Profesional No. 216471004 - I	Matrícula Profesional No.: 25202-109387 CND	Matrícula Profesional No.: 171351109
NOTAS:			
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.			
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.			
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.			
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.			
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.			
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

		FECHA		4/6/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL				
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE		2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		
3. AÑO : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		4. FECHA DE ELABORACIÓN: 3/6/2024		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03		TRAMO:		SECTOR 2
6. CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021				
7. OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061		NIT	901.472.786-3
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL		NIT	
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:				
11. PLAZO INICIAL:	37 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2/07/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:
14. PLAZO ACUMULADO:	37 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	0	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:
0				
II. INFORMACION FINANCIERA				
20. VR. INICIAL (INCLUIDO)	\$	-		
21. VR. ANTICIPO:	\$	-		
22. VR. ADICIÓN No:	\$	-		
23. VR. ADICIÓN No:	\$	-		
24. VR. TOTAL ADICIONES:	\$	-		
25. VR. TOTAL	\$	-		
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN				
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	1 394 000	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	2 788 000	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	1 045 000	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	348 500	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	1 074 000	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0	805 500	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	268 500	0
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	754 000	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	377 000	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	377 000	0
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	320 000	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	217 000	0
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	1 340 000	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	2 680 000	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	860 000	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	640 000	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	640 000	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	640 000	0
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	346 500	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	231 000	0
	1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	346 500
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		0	231 000	0
48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		0	115 500	0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		0	115 500	0
50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		0	231 000	0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		0	231 000	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	321 000	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	321 000	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	107 000	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	749 000	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	642 000	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	150 000	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	300 000	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	150 000	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	150 000	0
	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	640 000	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				0
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		0		0

FECHA

4/6/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

3. AÑO : 2024
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. FECHA DE ELABORACIÓN 3/6/2024

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03

TRAMO: SECTOR 2

6. CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021

7. OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

8. CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

9. INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT 901.472.786-3

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

11. PLAZO INICIAL: 37 MESES

12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021

13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

14. PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL

18. VR. DE LA GESTIÓN: 0

19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)											
FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	(EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

0

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

0

64. OTROS

0

65. IVA

0

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

0

68. IVA PRESENTE PREACTA

0

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

0

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL

0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

72. GESTIÓN PREDIAL

0

73. DESEMBOLSOS PREDIALES

0

74. OTROS

0

75. IVA

0

76. VALOR TOTAL ACUMULADO

0

77. SALDO POR EJECUTAR

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

NOMBRES Y APELLIDOS CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES

C.C. C.E. X

NUMERO 459 947

C.C. X C.E.

NUMERO 25202-109387 CND

MATRÍCULA PROFESIONAL

NUMERO 25202-376479 CND

MATRÍCULA PROFESIONAL

NUMERO 25202-109387 CND

Representante Legal

Apoderado

Representante Legal

Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA

31

05

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

ACTA PARCIAL NO. 35

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MODIFICACIÓN

COMPLEMENTACIÓN

AJUSTE

REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA NO:

983

DE

2021

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

2

(Día)

DE

7

(Mes)

DE

2021

(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

1

(Día)

DE

8

(Mes)

DE

2024

(Año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

INTERVENTOR:

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

CONTRATO NO.:

967

DE

2021

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
983 DE 2021	21/05/2021	37 MESES	389 978 471 425.00	389 978 471 425.00


SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	NA	NA	NA	NA	NA
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO

VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY



MEPI-MN1-IN-1-FR-4

1

2

2024

(Año)

1. Documentos

2. Planos

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-
--	-----------	----------

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma: 
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula No.: 25202-576479 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma _____
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 25202-109387 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.
