


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1
			FECHA	4/8/2023 (Día / Mes / Año)		
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA			PERIODO MES: junio-2023
UNIDAD EJECUTORA:	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 24 (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: -\$ 15 024 882	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)			NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR			NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR			NOMBRE DE QUIEN APRUEBA		JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)			NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA			NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		LUZ HELENA ARIZA RUIZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		Luis Diaz	
25/08/23						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.						
ORDEN DE PAGO						
CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021						
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3						
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061						
VALOR TOTAL A PAGAR: -\$ 15 134 679 VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (Negativo)						
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 24 DEL PERIODO junio-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.						
 Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por LUZ HELENA ARIZA RUIZ Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ						
Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula N° 05202096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 24/08/2023 (Suscribe según su competencia) Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No. 05202-096971 ANT DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA Fecha firma: 24/08/2023 (Suscribe según su competencia) Firma: Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Matrícula No. : 63202-092415 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 25/08/2023 (Suscribe según su competencia) Firma: Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula No. : 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:						
Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.						



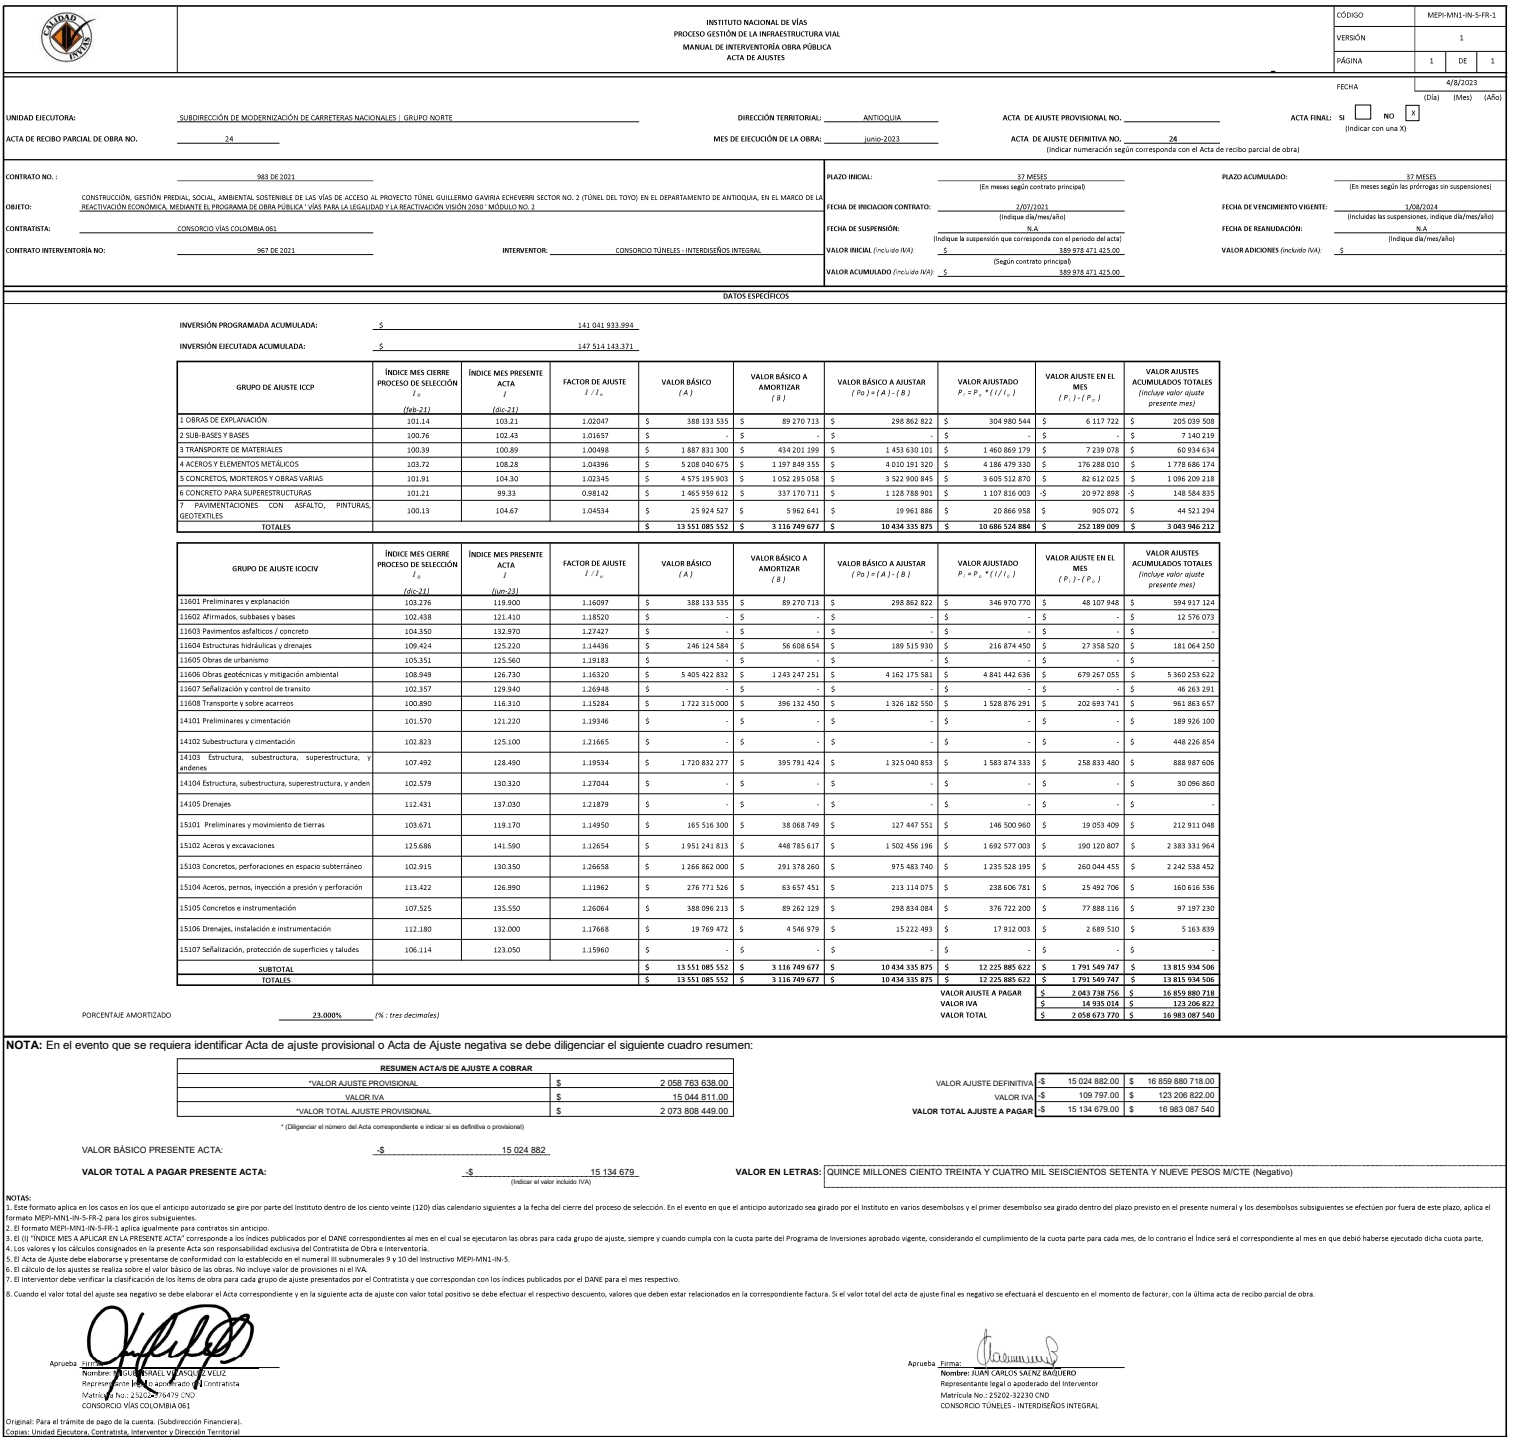

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	X	24 D
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ -
NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ -
NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ -
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
						TOTAL ACTA:	\$ -

 Firmado
digitalmente por
MAURICIO
HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

Formulado	RP96623;11;0
Texto Libre	SMCN-GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 24 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto	SMCN-GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 24 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP96623;11;0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL					CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 983 DE 2021

Contratista : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato : CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Acta No.: 24 D

Valor básico : -\$ 15 024 882.00

Período : junio-2023

Valor Incluido Iva : -\$ 15 134 679.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (carretera - puente-túnel)	Valor incluido IVA (construcción, rehabilitación, mejoramiento)	Valor incluido IVA Provision para servicios del tunel	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (gestión social, predial y ambiental)	Valor incluido IVA Provision implementación protocolo de bioseguridad	Subtotal
1	6203	CARRETERA	-\$ 7 159 111.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7 159 111.00
2	6203	PUENTE	-\$ 1 921 930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 1 921 930.00
3	6203	TUNEL	-\$ 6 053 638.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 6 053 638.00
4	6203	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6203	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6203	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES			\$ (15 134 679.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 15 134 679.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890907569-1	MUNICIPIO 1	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	-\$ 15 134 679.00	-\$ 15 024 882.00
890983786-7	MUNICIPIO 2	GIRALDO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5		\$ -	\$ -
TOTAL ANTIOQUIA			\$ (15 134 679.00)	\$ (15 024 882.00)

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			\$ -
	MUNICIPIO 2			\$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -

MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventor

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

						2021										
						(ene-21)	(feb-21)	(mar-21)	(abr-21)	(may-21)	(jun-21)	(jul-21)	(ago-21)	(sep-21)		
						5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice		
ICOCIV CIELO ABIERTO						22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11601	01	Preliminares y explanación	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19
530201	53211	53211_06	Vías interurban:	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84
ICOCIV PUENTES						5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	51.10	101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30
ICOCIV TUNELES						25.38	101.20	101.46	102.26	102.07	102.73	102.90	103.63	103.65	103.85	
530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	23.60	102.85	103.72	106.09	113.40	116.12	115.41	120.57	120.39	121.10
530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	27.59	100.97	100.91	102.19	101.91	101.37	100.98	101.89	102.03	102.25
530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	6.86	101.62	102.49	104.31	106.68	108.20	109.19	112.51	112.91	112.95
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e instrumentación	8.68	100.96	101.00	103.08	103.77	103.60	103.20	105.50	106.02	106.35
530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	7.06	100.41	101.67	103.11	104.49	104.55	106.31	110.24	110.05	110.23
530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	0.84	99.17	99.37	100.19	100.64	101.39	102.27	102.85	103.62	103.62

1	2	3				2022										
			(oct-21)	(nov-21)	(dic-21)	(ene-22)	(feb-22)	(mar-22)	(abr-22)	(may-22)	(jun-22)	(jul-22)	(ago-22)	(sep-22)	(oct-22)	(nov-22)
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
11601	01	Preliminares y explanación	103.14	103.21	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.042	110.424
11602	02	Afirmados, subbases y bases	102.21	102.42	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.525	108.728
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	103.50	103.66	104.35	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.634	119.175
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	108.61	109.16	109.42	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.331	119.693
11605	05	Obras de urbanismo	104.88	104.98	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.492	113.637
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.36	108.49	108.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.435	118.641
11607	07	Señalización y control de tránsito	101.70	102.00	102.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.399	116.284
11608	08	Transporte y sobre acarreo	100.89	100.89	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.527	105.531
14101	01	Preliminares y cimentación	101.39	101.29	101.57	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.190	109.438
14102	02	Subestructura y cimentación	102.53	102.34	102.82	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.161	112.351
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	106.76	106.77	107.49	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.771	118.063
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	101.90	101.84	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.388	115.538
14105	05	Drenajes	108.76	112.13	112.43	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.579	130.848
15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	103.94	103.94	103.67	105.05	106.72	107.29	107.81	108.23	108.36	109.41	109.47	109.93	110.420	110.937
15102	02	Aceros y excavaciones	121.63	123.20	125.69	128.39	132.16	135.72	138.78	136.77	134.28	135.74	134.17	135.08	137.563	138.907
15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.82	102.48	102.92	105.32	106.40	108.19	108.82	109.54	110.19	111.27	111.98	112.24	113.640	113.613
15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	112.97	113.37	113.42	115.64	117.56	118.60	120.05	120.45	119.63	121.21	120.87	121.65	123.889	124.199
15105	05	Concretos e instrumentación	107.19	106.79	107.53	109.98	111.14	112.77	113.73	114.28	114.52	116.02	116.61	117.13	119.526	119.622
15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	110.89	112.28	112.18	114.81	115.81	118.64	119.60	120.81	120.56	123.05	123.31	124.46	129.544	129.613
15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	103.90	105.01	106.11	109.20	108.93	109.86	111.98	112.43	112.85	113.71	114.55	114.78	115.416	115.719

1	2	3	(dic-22)	(ene-23)	(feb-23)	(mar-23)	(abr-23)	(may-23)	(jun-23)
			28	29	30	31	32	33	34
			Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
11601	01	Preliminares y explanación	110.308	115.699	118.020	118.780	119.530	119.900	119.900
11602	02	Afirmados, subbases y bases	108.894	114.911	117.900	119.710	120.520	121.030	121.410
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	118.600	126.706	131.730	132.310	132.850	133.110	132.970
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	119.271	123.173	125.080	125.230	125.480	125.470	125.220
11605	05	Obras de urbanismo	113.748	121.127	123.230	123.960	124.280	124.990	125.560
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	118.220	123.301	125.510	125.760	126.980	127.020	126.730
11607	07	Señalización y control de tránsito	114.256	128.390	131.600	130.880	132.240	131.260	129.940
11608	08	Transporte y sobre acarreos	105.743	108.971	111.190	111.670	113.110	115.590	116.310
14101	01	Preliminares y cimentación	109.240	116.355	119.180	120.290	120.720	120.920	121.220
14102	02	Subestructura y cimentación	111.595	120.563	123.760	124.250	124.710	124.940	125.100
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	117.405	124.739	127.780	128.300	128.530	128.630	128.490
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y anden	115.294	124.333	128.770	129.390	129.780	129.970	130.320
14105	05	Drenajes	130.673	136.636	139.480	136.600	137.160	137.290	137.030
15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	110.304	116.405	117.820	118.530	118.840	119.130	119.170
15102	02	Aceros y excavaciones	138.080	139.973	142.860	142.660	142.420	142.830	141.590
15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	112.747	122.969	124.840	125.000	129.660	129.890	130.350
15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	123.262	126.351	127.910	127.670	127.810	127.750	126.990
15105	05	Concretos e instrumentación	118.675	127.709	129.060	128.980	135.080	135.300	135.550
15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	128.636	131.512	133.570	132.650	132.670	132.560	132.000
15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	116.315	117.657	120.430	121.550	121.710	122.480	123.050

CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

983 DE 2021
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030 '
MÓDULO NO. 2

ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES		VALOR DE AJUSTE	MES	SALDO POR EJECUTAR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				%	VALOR AJUSTE	
1	JULIO	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0	JULIO	\$ 0.00	0.00%	\$ 0	
2	AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0	AGOSTO	\$ 0.00	0.00%	\$ 0	
3	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759	\$ -	\$ 1 789 569 759.43	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
4	OCTUBRE	\$ 5 674 016 476	\$ -	\$ 3 884 446 716.10	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
						\$ 0	OCTUBRE	\$ 3 884 446 716.10	0.00%		
5	NOVIEMBRE	\$ 10 743 965 651	\$ -	\$ 5 069 949 175.56	\$ -	\$ 0	SEPTIEMBRE	\$ 1 789 569 759.43	0.00%	\$ 0	
							OCTUBRE	\$ 3 884 446 716.10			
							NOVIEMBRE	\$ 5 069 949 175.56			
6	DICIEMBRE	\$ 17 481 049 425	\$ 796 005 269	\$ 6 737 083 773.90	\$ 796 005 269.00	\$ 796 005 269	SEPTIEMBRE	\$ 993 564 490.43	100.00%	\$ 796 005 269	
							OCTUBRE	\$ 3 884 446 716.10	0.00%	\$ 0	
							NOVIEMBRE	\$ 5 069 949 175.56	0.00%	\$ 0	
							DICIEMBRE	\$ 6 737 083 773.90	0.00%	\$ 0	
	REPROGRAMACION 2					\$ 16 017 642 390.00	DICIEMBRE	\$ 667 401 766.00			
7	ENERO	\$ 2 557 151 246	\$ 1 894 772 428	\$ 1 093 744 211	\$ 1 098 767 159.00	\$ 667 401 766	DICIEMBRE	\$ 0.00	60.74%	\$ 667 401 766.00	
						\$ 431 365 393.00	ENERO	\$ 662 378 818.00	39.26%	\$ 431 365 393.00	
8	FEBRERO	\$ 3 848 879 860	\$ 3 486 495 096	\$ 1 291 728 614	\$ 1 591 722 668.00	\$ 662 378 818	ENERO	\$ 0.00	41.61%	\$ 662 378 818	
						\$ 929 343 850.00	FEBRERO	\$ 362 384 764.00	58.39%	\$ 929 343 850	
9	MARZO	\$ 6 939 492 288	\$ 6 940 107 524	\$ 3 090 612 428.000	\$ 3 453 612 428.00	\$ 362 384 764.00	FEBRERO	\$ 0.00	10.49%	\$ 362 384 764	
						\$ 3 091 227 664	MARZO	-\$ 615 236.00	89.51%	\$ 3 091 227 664	
10	ABRIL	\$ 10 844 627 261	\$ 11 154 796 014	\$ 3 905 134 972.83	\$ 4 214 688 490.00	\$ 4 214 688 490	ABRIL	-\$ 310 168 753	100.00%	\$ 4 214 688 490	
11	MAYO	\$ 16 430 955 328	\$ 17 394 880 776	\$ 5 586 328 066.88	\$ 6 240 084 762.00	\$ 6 240 084 762	MAYO	-\$ 963 925 448	100.00%	\$ 6 240 084 762	
12	JUNIO	\$ 24 699 942 690	\$ 22 659 422 885	\$ 6 228 467 557.28	\$ 7 305 061 914.00	\$ 7 305 061 914	JUNIO	-\$ 2 040 519 805	100.00%	\$ 7 305 061 914	
13	JULIO	\$ 33 583 967 380	\$ 29 522 482 579	\$ 6 863 059 693.78	\$ 8 884 024 690.00	\$ 8 884 024 690	JULIO	-\$ 4 061 484 801	100.00%	\$ 8 884 024 690	
14	AGOSTO	\$ 38 414 010 967	\$ 44 394 701 034	\$ 8 891 528 387.92	\$ 10 810 733 654.00	\$ 10 810 733 654	AGOSTO	-\$ 5 980 690 067	100.00%	\$ 10 810 733 654	
15	SEPTIEMBRE	\$ 48 034 512 600	\$ 56 106 239 651	\$ 9 620 501 700.00	\$ 11 711 538 617.00	\$ 11 711 538 617	SEPTIEMBRE	-\$ 8 071 726 984	100.00%	\$ 11 711 538 617	
16	OCTUBRE	\$ 58 908 176 111	\$ 63 284 013 535	\$ 10 873 663 463.51	\$ 7 177 773 884.00	\$ 7 177 773 884	OCTUBRE	-\$ 4 375 837 404.79	100.00%	\$ 7 177 773 884	
17	NOVIEMBRE	\$ 69 298 039 313	\$ 64 281 430 827	\$ 10 389 863 202.40	\$ 997 417 292.00	\$ 997 417 292	NOVIEMBRE	\$ 5 016 608 505.61	100.00%	\$ 997 417 292	
18	DICIEMBRE	\$ 77 047 496 235	\$ 64 984 555 827	\$ 7 749 456 921.62	\$ 703 125 000.00	\$ 703 125 000	NOVIEMBRE	\$ 4 313 483 505.61	100.00%	\$ 703 125 000	
						\$ 0	DICIEMBRE	\$ 7 749 456 921.62	0.00%	\$ 0	
	REPROGRAMACION 06					\$ 10 856 646 367	DICIEMBRE	\$ 1 206 294 060.03			
19	ENERO	\$ 77 657 648 020	\$ 80 471 386 745	\$ 11 466 798 152.09	\$ 15 486 830 918.00	\$ 1 206 294 060	DICIEMBRE	\$ 0.00	7.79%	\$ 1 206 294 060.00	
						\$ 14 280 536 858	ENERO	-\$ 2 813 738 705.88	92.21%	\$ 14 280 536 858.00	
19A	ENERO		\$ 91 501 659 582		\$ 11 030 272 837.00	\$ 11 030 272 837	ENERO	-\$ 13 844 011 542.88	100.00%	\$ 11 030 272 837.00	
20	FEBRERO	\$ 89 382 449 614	\$ 100 872 469 260	\$ 11 724 801 593.96	\$ 9 370 809 678.00	\$ 9 370 809 678	FEBRERO	-\$ 11 490 019 626.91	100.00%	\$ 9 370 809 678.00	
21	MARZO	\$ 101 384 863 786	\$ 110 072 352 827	\$ 12 002 414 171.76	\$ 9 199 883 567.00	\$ 9 199 883 567	MARZO	-\$ 8 687 489 022.16	100.00%	\$ 9 199 883 567.00	
22	ABRIL	\$ 113 788 114 596	\$ 120 707 125 873	\$ 12 403 250 810.17	\$ 10 634 773 046.00	\$ 10 634 773 046	ABRIL	-\$ 6 919 011 257.99	100.00%	\$ 10 634 773 046.00	
23	MAYO	\$ 127 249 751 657	\$ 133 963 057 819	\$ 13 461 637 060.99	\$ 13 255 931 946.00	\$ 13 255 931 946	MAYO	-\$ 6 713 306 142.99	100.00%	\$ 13 255 931 946.00	
24	JUNIO	\$ 141 041 933 994	\$ 147 514 143 371	\$ 13 792 182 337.04	\$ 13 551 085 552.00	\$ 13 551 085 552	JUNIO	-\$ 6 472 209 357.96	100.00%	\$ 13 551 085 552	
