

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 4020 DE FECHA DE 09-12-2024



OBJETO: REALIZAR CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA ADQUISICION DE MATERIALES GRANULARES, MEZCLA ASFALTICA MDC-2 O 19, EMULSION ASFALTICA Y DISCO DE CORTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATISTA: RUMA INGENIERIA SAS
R.L.: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
DIRECCION: CALLE 14 # 27 - 36
TELEFONOS: 3502996264

CORREO ELECTRONIC gerencia@ruma.com.co

INTERVENTOR: N/A
R.L.: N/A
DIRECCION: N/A
TELEFONOS: N/A
CORREO ELECTRONIC N/A

SUPERVISOR (E): JAVIER VERGARA MARIÑO
DIRECCION: DIAGONAL 15 N° 15-21 Palacio Municipal, Yopal - Casanare
TELEFONOS: (608) 6345913
CORREO ELECTRONIC seobras@yopal-casanare.gov.co

APOYO SUPERVISION: JUAN SEBASTIAN PATIÑO MARIÑO
DIRECCION: CALLE 16 # 25-13
TELEFONOS: 3105505791
CORREO ELECTRONIC ingsebastianpat@hotmail.com

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	RUMA INGENIERIA SAS
Rep. Legal:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Contrato No.	1020 de 2024.12.09
Objeto :	REALIZAR CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA ADQUISICION DE MATERIALES GRANULARES, MEZCLA ASFALTICA MDC-2 O 19, EMULSION ASFALTICA Y DISCO DE CORTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
Valor Inicial:	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL, UN PESO M/CTE.
Valor Adicionado:	\$ 1,494,834,726.00
Valor Actualizado:	\$ 4,485,815,727.00
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo adicionado:	CUATRO MESES
Plazo Actualizado:	DIEZ MESES
Fecha de Iniciación:	24/12/2024
Fecha terminación del Contrato	23/10/2025
Estado actual del contrato:	VIGENTE

2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	24/12/2024	SEIS (6) MESES	\$ 2,990,981,001.00	NINGUNA
PRORROGA1		TRES (3) MESES	\$ 1,494,834,726.00	NINGUNA
PRORROGA 2		UN (1) MES	\$ -	NI GUNA

3. ADICIONALES AL CONTRATO

NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
1	ADICIONAL	\$ 1,494,834,726.00	20/06/2025

4. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE CONTRATO

Obra programada (%)	89.85%	Obra ejecutada (%)	89.85%
Valor Obra Programada		Valor Obra Ejecutada	

5. DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Contratista	N/A
Rep. Legal:	N/A
Contrato No.	N/A
Objeto :	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Adicionado:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	N/A
Plazo adicionado:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha terminación del Contrato	N/A
Estado actual del contrato:	N/A

6. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. ADICIONALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

8. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORÍA

Obra programada (%)		Obra ejecutada (%)	
Valor Obra Programada		Valor Obra Ejecutada	

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Vías en afirmado: Se han venido realizando intervenciones en la red vial terciaria de municipio que están incluidas en el PROGRAMA DE INTERVENCIÓN RURAL 2025, ejecutando actividades de recomformación de terraplen a nivel de rasante en algunos casos con recarga de material granular de diferente granulometría según los requerimientos de las vías intervenidas, también se realiza limpieza de cunetas laterales, con retiro de material vegetal, la longitud de vías intervenidas fue de 54,8 km instalando un total de 4026 m³ de CRUDO CLASIFICADO DE T. MAX 4" y 948 M3 DE SUB BASE TRITURADA DE T. MAX 2" así:

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ITEM	CORREGIMIENTO	VEREDA	VIA	CODIGO	LONGITUD Km
	MORICHAL	MORICHAL	VIAS INTERNAS BARRIO CAÑAGUATE	N/A	0.7
1	COORDENADAS		ACTIVIDAD EJECUTADA	MATERIAL INSTALADO	
	5°17'44.28"N, 72°23'55.69"O		Se realizo perfilado y recomformacion de terraplen a nivel de rasante con recarga de material petreo, sub base de 2" y crudo de rio de tamaño aximo de 4", ademas se hizo limpieza de laterales con retiro de material vegetal.	SUB BASE DE 2" 204	CRUDO DE RIO TMAX 4" 12

UBICACIÓN DE LA VIA INTERVENIDA




Para la movilizacion del material requerido para esta intervencion la Secretaria de infraestructura dispuso una flotilla de volquetas adscritas al Banco de maquinaria municipal de Yopal, las cuales se relacionan identificandoolas con numero de placa y nombre del conductor, asi como las fechas de salida y los volúmenes transportados. tambien se utilizaron volquetas particulares las cuales fueron aportadas por la comunidad beneficiada.

ITEM	DESTINO	FECHA	SUB BASE TRITURADA 2" (m³)	CRUDO DE RIO SELECCIONADO T MAX 4"(m³)	PLACA	OPERADOR
1	BARRIO CAÑAGUATE	4/08/2025	24	12	OSE 782	ANDRES PLATA
2	BARRIO CAÑAGUATE	4/08/2025	36		OSE 774	FABIAN MENDOZA
3	BARRIO CAÑAGUATE	5/08/2025	36		OSE 775	JOSE CAMELO
4	BARRIO CAÑAGUATE	6/08/2025	36		OSE 769	JULIO PALACIOS
5	BARRIO CAÑAGUATE	6/08/2025	36		OSE 774	FABIAN MENDOZA
6	BARRIO CAÑAGUATE	6/08/2025	36		OSE 775	JOSE CAMELO
TOTAL			204	12		

ITEM	CORREGIMIENTO	VEREDA	VIA	CODIGO	LONGITUD Km
2	TILODIRAN	LA ALEMANIA	VIA CENTRAL YOPAL-TILO (K28+581)_ RAMAL ALEMANIA B	85001-10_03	17.6
			VIA CENTRAL YOPAL-TILO (K27+565)_ALEMANIA_NOCUITO	85001-10_05	
			RAMAL ALEMANIA (ESCUELA SEDE ALEMANIA)	85001-10_06	
			EL ARENAL_ALEMANIA	85001-10_07	
	COORDENADAS		ACTIVIDAD EJECUTADA	MATERIAL INSTALADO	
	5° 7'24.50"N 72°15'43.70"O	5°11'43.01"N 72°15'30.93"O	Se realizo mantenimiento del terraplen de la via a nivel de rasante con recarga de materiales petreos asi como limpieza de laterales con retiro de material vegetal.	SUB BASE DE 2"	CRUDO DE RIO TMAX 4"
			120	444	

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACIÓN DE LA VIA INTERVENIDA

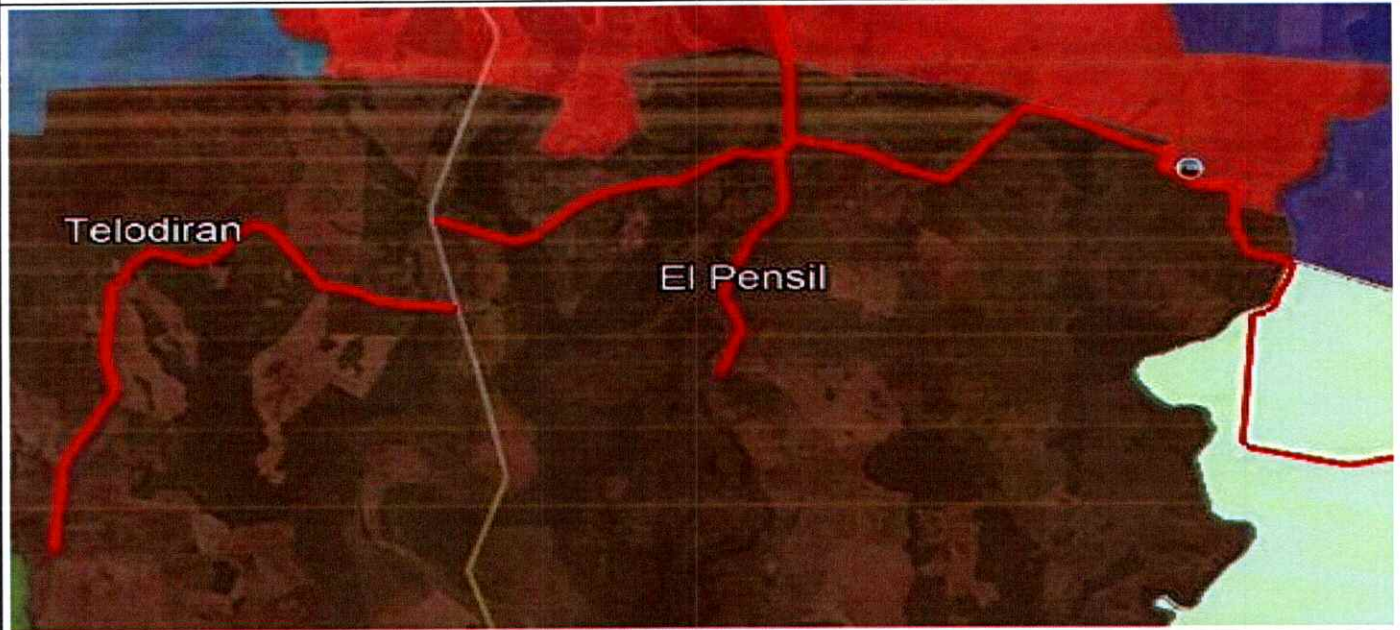

Para la movilización del material requerido para esta intervención la Secretaría de infraestructura dispuso una flotilla de volquetas adscritas al Banco de maquinaria municipal de Yopal, las cuales se relacionan identificándolas con número de placa y nombre del conductor, así como las fechas de salida y los volúmenes transportados.

ITEM	DESTINO	FECHA	SUB BASE TRITURADA 2" (m ³)	CRUDO DE RIO SELECCIONADO T MAX 4" (m ³)	PLACA	OPERADOR
1	VEREDA LA ALEMANIA	6/08/2025	24	0	OSE 773	HENRY ESPINOZA
2	VEREDA LA ALEMANIA	6/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
3	VEREDA LA ALEMANIA	6/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
4	VEREDA LA ALEMANIA	6/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
5	VEREDA LA ALEMANIA	7/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
6	VEREDA LA ALEMANIA	7/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
7	VEREDA LA ALEMANIA	7/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
8	VEREDA LA ALEMANIA	8/08/2025	36	0	OSE 773	HENRY ESPINOZA
9	VEREDA LA ALEMANIA	8/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
10	VEREDA LA ALEMANIA	8/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
11	VEREDA LA ALEMANIA	8/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
12	VEREDA LA ALEMANIA	11/08/2025	36	0	OSE 775	JOSE CAMELO
13	VEREDA LA ALEMANIA	11/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
14	VEREDA LA ALEMANIA	11/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
15	VEREDA LA ALEMANIA	11/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
16	VEREDA LA ALEMANIA	11/08/2025	24	12	OSE 774	FABIAN MENDOZA
TOTAL			120	444		

ITEM	CORREGIMIENTO	VEREDA	VIA	CODIGO	LONGITUD Km	
3	TILODIRAN	ARENAL	VARIANTE LA UNION_EL GARZON_EL ARENAL_VIA CENTRAL TILODIRAN (65CA04)	85001-06_20	7.5	
			PICON-ARENAL_EL GARZON	85001-06_17		
	COORDENADAS		ACTIVIDAD EJECUTADA	MATERIAL INSTALADO		
	5°11'16.10"N 72°18'5.74"O	5°12'19.85"N 72°17'16.17"O	Se realizo mantenimiento del terraplen de la via a nivel de rasante con recarga de materiales petreos asi como limpieza de laterales con retiro de material vegetal.	SUB BASE DE 2"		CRUDO DE RIO TMAX 4"
				468	1836	

UBICACIÓN DE LA VIA INTERVENIDA

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Para la movilización del material requerido para esta intervención la Secretaría de infraestructura dispuso una flotilla de volquetas adscritas al Banco de maquinaria municipal de Yopal, las cuales se relacionan identificándolas con número de placa y nombre del conductor, así como las fechas de salida y los volúmenes transportados.

ITEM	DESTINO	FECHA	SUB BASE TRITURADA 2" (m ³)	CRUDO DE RIO SELECCIONADO T MAX 4" (m ³)	PLACA	OPERADOR
1	EL ARENAL	12/08/2025	24	12	OSE 774	FABIAN MENDOZA
2	EL ARENAL	12/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
3	EL ARENAL	12/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
4	EL ARENAL	12/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
5	EL ARENAL	13/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
6	EL ARENAL	13/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
7	EL ARENAL	13/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
8	EL ARENAL	14/08/2025	24	12	OSE 774	FABIAN MENDOZA
9	EL ARENAL	14/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
10	EL ARENAL	14/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
11	EL ARENAL	14/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
12	EL ARENAL	15/08/2025	24	12	OSE 774	FABIAN MENDOZA
13	EL ARENAL	15/08/2025	24	12	OSE 769	JULIO PALACIOS
14	EL ARENAL	15/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
15	EL ARENAL	15/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
16	EL ARENAL	15/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
17	EL ARENAL	18/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
18	EL ARENAL	18/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
19	EL ARENAL	18/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
20	EL ARENAL	19/08/2025	24	12	OSE 769	JULIO PALACIOS
21	EL ARENAL	19/08/2025	24	12	OSE 774	FABIAN MENDOZA
22	EL ARENAL	19/08/2025	24	12	OSE 775	JOSE CAMELO
23	EL ARENAL	19/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
24	EL ARENAL	19/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
25	EL ARENAL	19/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
26	EL ARENAL	20/08/2025	24	12	OSE 773	HENRY ESPINOZA
27	EL ARENAL	20/08/2025	24	12	OSE 769	JULIO PALACIOS
28	EL ARENAL	20/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
29	EL ARENAL	20/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
30	EL ARENAL	20/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
31	EL ARENAL	20/08/2025	24	12	OSE 774	FABIAN MENDOZA
32	EL ARENAL	21/08/2025	24	12	OSE 773	HENRY ESPINOZA
33	EL ARENAL	21/08/2025	24	12	OSE 769	JULIO PALACIOS
34	EL ARENAL	21/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
35	EL ARENAL	21/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
36	EL ARENAL	21/08/2025		36	OSE 774	FABIAN MENDOZA

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

37	EL ARENAL	22/08/2025	24	12	OSE 773	HENRY ESPINOZA
38	EL ARENAL	22/08/2025	0	36	UVM 004	PARTICULAR
39	EL ARENAL	22/08/2025	0	36	TGK 150	PARTICULAR
40	EL ARENAL	22/08/2025	12	24	OSE 774	FABIAN MENDOZA
41	EL ARENAL	25/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
42	EL ARENAL	25/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
43	EL ARENAL	25/08/2025		36	OSE 774	FABIAN MENDOZA
44	EL ARENAL	27/08/2025	24	12	OSE 769	JULIO PALACIOS
45	EL ARENAL	28/08/2025	24	12	OSE 774	FABIAN MENDOZA
46	EL ARENAL	28/08/2025	24	12	OSE 769	JULIO PALACIOS
47	EL ARENAL	28/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
48	EL ARENAL	28/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
49	EL ARENAL	28/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
50	EL ARENAL	29/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
51	EL ARENAL	29/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
52	EL ARENAL	29/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
53	EL ARENAL	29/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
54	EL ARENAL	29/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
55	EL ARENAL	29/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
56	EL ARENAL	4/09/2025	24	12	OSE 773	HENRY ESPINOZA
57	EL ARENAL	4/09/2025	24	12	OSE 775	JOSE CAMELO
58	EL ARENAL	4/09/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
59	EL ARENAL	4/09/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
60	EL ARENAL	4/09/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
61	EL ARENAL	5/09/2025	24	12	OSE 769	JULIO PALACIOS
62	EL ARENAL	5/09/2025	0	36	SPD 897	PARTICULAR
63	EL ARENAL	5/09/2025	0	36	UVM 004	PARTICULAR
64	EL ARENAL	5/09/2025	0	36	TGK 150	PARTICULAR
			468	1836		

ITEM	CORREGIMIENTO	VEREDA	VIA	CODIGO	LONGITUD Km
4	MORICHAL	PICON	PICON-ARENAL_EL GARZON	85001-06_17	13
	COORDENADAS		ACTIVIDAD EJECUTADA	MATERIAL INSTALADO	
				SUB BASE DE 2"	CRUDO DE RIO TMAX 4"
	5°12'38.44"N 72°18'48.74"O	5°15'30.56"N 72°21'55.38"O	Se realizo mantenimiento del terraplen de la via a nivel de rasante con recarga de materiales petreos asi como limpieza de laterales con retiro de material vegetal.	156	348

UBICACIÓN DE LA VIA INTERVENIDA



ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Para la movilización del material requerido para esta intervención la Secretaría de infraestructura dispuso una flotilla de volquetas adscritas al Banco de maquinaria municipal de Yopal, las cuales se relacionan identificandoolas con numero de placa y nombre del conductor, así como las fechas de salida y los volúmenes transportados.

ITEM	DESTINO	FECHA	SUB BASE TRITURADA 2" /m ³	CRUDO DE RIO SELECCIONADO T MAX 4" /m ³	PLACA	OPERADOR
1	PICON- ARENAL	25/08/2025	12	24	OSE 769	JULIO PALACIOS
2	PICON- ARENAL	26/08/2025	12	24	OSE 773	HENRY ESPINOZA
3	PICON- ARENAL	26/08/2025	12	24	OSE 769	JULIO PALACIOS
4	PICON- ARENAL	26/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
5	PICON- ARENAL	26/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
6	PICON- ARENAL	26/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
7	PICON- ARENAL	27/08/2025	24	12	OSE 774	FABIAN MENDOZA
8	PICON- ARENAL	27/08/2025		36	SPD 897	PARTICULAR
9	PICON- ARENAL	27/08/2025		36	UVM 004	PARTICULAR
10	PICON- ARENAL	27/08/2025		36	TGK 150	PARTICULAR
11	PICON- ARENAL	28/08/2025	24	12	OSE 782	ANDRES PLATA
12	PICON- ARENAL	2/09/2025	24	12	OSE 775	JOSE CAMELO
13	PICON- ARENAL	3/09/2025	24	12	OSE 775	JOSE CAMELO
14	PICON- ARENAL	4/09/2025	24	12	OSE 769	JULIO PALACIOS
TOTAL			156	348		

ITEM	CORREGIMIENTO	VEREDA	VIA	CODIGO	LONGITUD Km
5	TACARIMENA	RINCON DE LA MANGA	RAMAL-RINCON DE LA MANGA	85001-09_10	4
	COORDENADAS		ACTIVIDAD EJECUTADA	MATERIAL INSTALADO	
	5°22'37.23"N 72°13'21.38"O	5°22'12.51"N 72°11'55.70"O	Se realizo mantenimiento del terraplen de la via a nivel de rasante con recarga de materiales petreos así como limpieza de laterales con retiro de material vegetal.	SUB BASE DE 2"	CRUDO SELECCIONADO DE T MAX 4"
					360



Para la movilización del material requerido para esta intervención la Secretaría de infraestructura dispuso una flotilla de volquetas adscritas al Banco de maquinaria municipal de Yopal, las cuales se relacionan identificandoolas con numero de placa y nombre del conductor, así como las fechas de salida y los volúmenes transportados.

ITEM	DESTINO	FECHA	SUB BASE 2"	CRUDO CLASIFICADO T MAX 4"	PLACA	OPERADOR
1	RINCON DE LA MANGA	9/09/2025		36	OSE 775	JOSE CAMELO
2	RINCON DE LA MANGA	9/09/2025		36	OSDE 773	HENRY ESPINOZA
3	RINCON DE LA MANGA	9/09/2025		36	OSE 782	ANDRES PLATA
4	RINCON DE LA MANGA	9/09/2025		36	OSE 779	JULIO PALACIOS
5	RINCON DE LA MANGA	10/09/2025		36	OSE 775	JOSE CAMELO
6	RINCON DE LA MANGA	11/09/2025		36	OSE 775	JOSE CAMELO

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

7	RINCON DE LA MANGA	11/09/2025		36	OSE 773	HENRY ESPINOZA
8	RINCON DE LA MANGA	12/09/2025		36	OSE 782	ANDRES PLATA
9	RINCON DE LA MANGA	12/09/2025		36	OSE 773	HENRY ESPINOZA
10	RINCON DE LA MANGA	12/09/2025		36	OSE 775	JOSE CAMELO
TOTAL			0	360		

ITEM	CORREGIMIENTO	VEREDA	VIA	CODIGO	LONGITUD Km
6	EL TALADRO	RINCON DEL MORICHE	RAMAL RICON DEL MORICHE (K27+000)_RÍO CRAVO SUR	85001-04_09	12
			CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA_SAN ANTONIO_TALADRO_SAN NICOLAS_RINCON DEL MORICHE	85001-04_02	
	COORDENADAS		ACTIVIDAD EJECUTADA	MATERIAL INSTALADO	
	5°18'9.94"N 72° 5'55.18"O	5°18'48.39"N 72° 6'36.13"O	Se realizo mantenimiento del terraplen de la via a nivel de rasante con recarga de materiales petreos asi como limpieza de laterales con retiro de material vegetal.	SUB BASE DE 2"	CRUDO DE RIO TMAX 4"
				0	1026

UBICACIÓN DE LA VIA INTERVENIDA



ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Para la movilización del material requerido para esta intervención la Secretaría de infraestructura dispuso una flotilla de volquetas adscritas al Banco de maquinaria municipal de Yopal, las cuales se relacionan identificandoolas con numero de placa y nombre del conductor, así como las fechas de salida y los volúmenes transportados.

ITEM	DESTINO	FECHA	SUB BASE TRITURADA 2" (m ³)	CRUDO DE RIO (SELECCIONADO T MAX 4" (m ³))	PLACA	OPERADOR
1	RINCON DEL MORICHE	9/08/2025		72	NHQ-812	ALQUILADO
2	RINCON DEL MORICHE	9/08/2025		72	NHQ-810	ALQUILADO
3	RINCON DEL MORICHE	9/08/2025		72	NHQ-811	ALQUILADO
4	RINCON DEL MORICHE	13/9/2025		72	NHQ-812	ALQUILADO
5	RINCON DEL MORICHE	13/9/2025		72	NHQ-810	ALQUILADO
6	RINCON DEL MORICHE	13/9/2025		72	NHQ-811	ALQUILADO
7	RINCON DEL MORICHE	15/09/2025		72	NHQ-811	ALQUILADO
8	RINCON DEL MORICHE	15/09/2025		72	NHQ-812	ALQUILADO
9	RINCON DEL MORICHE	15/09/2025		72	NHQ-810	ALQUILADO
10	RINCON DEL MORICHE	16/09/2025		72	NHQ-811	ALQUILADO
11	RINCON DEL MORICHE	16/09/2025		72	NHQ-812	ALQUILADO
12	RINCON DEL MORICHE	16/09/2025		72	NHQ-810	ALQUILADO
13	RINCON DEL MORICHE	17/09/2025		54	NHQ-812	ALQUILADO
14	RINCON DEL MORICHE	17/09/2025		54	NHQ-810	ALQUILADO
15	RINCON DEL MORICHE	17/09/2025		54	NHQ-811	ALQUILADO
TOTAL			0	1026		

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se realizo por la metodologia de selección abreviada, incluida esta, se han hecho cincoo actas para pago parcial.

Durante el presente periodo se consumieron 4026 metros cubicos (m3) de crudo de río clasificado T.m 4" por un valor \$ 159.626.874 M/CTE.

Durante el presente periodo no se consumieron galones (GAL) de emulsión asfáltica CRL-1 o CRR-1

Durante el presente periodo no se instalo mezcla asfáltica MDC-2 O 19

Durante el presente periodo se consumieron 948 metros cubicos (m3) de sub base triturada T MAX 2" por un valor \$ 51.780.708 M/CTE.

El periodo de ejecución del presente informe corresponde desde el 01de agosto de 2025 hasta el 17 de septiembre de 2025

En el numeral 13. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS se incluyen ademas de las cantidades recibidas para ejecutar en los frentes del área rural, se incluyen tambien todas las cantidades de lo recibido y ejecutado en el los frentes urbanos, según el reporte hecho por el apoyo a la supervision del area urbana.

11. NOVEDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato 4020.2024 de acta de inicio con fecha de 24 de Diciembre de año de 2024 que tiene como objeto "REALIZAR CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS Y EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GRANULARES, MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 O 19, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y DISCO DE CORTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.", con un periodo de ejecución de diez (10) meses que va desde el 24 de diciembre de 2024 hasta el 23 de octubre del año 2025, el proveedor empezo a suministrar material desde el día del acta de inicio,abarcando la totalidad de las cantidades contratadas debido a la alta demanda que se encontraba el municipio de yopal a nivel de malla vial urbana y las vías terciarias del municipio, los materiales se han entregado segun lo requerido, cumpliendo con tiempos de entrega y calidad esperada.Se hizo adición numero 01 prorroga numero 01, en tiempo se adicionaron 3 meses, en valor se adicionaron MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS. PESOS. M/CTE. la cual se discrimina de la siguiente forma

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES SOLICITADAS ADICIONAL N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
ACTIVIDADES CONTRACTUALES							
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC-2 O 19)	m3	1.450,00	1.007.563,03	\$ 1.460.966.393,50	955,00	\$ 962.222.693,65
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 O CRL-1	gal	3.990,00	25.420,17	\$ 101.426.478,30	2.630,00	\$ 66.855.047,10
3	SUB BASE TRITURADA T MAX 2"	m3	8.000,00	54.621,85	\$ 436.974.800,00	2.800,00	\$ 152.941.180,00
4	BASE TRITURADA T MAX 1 1/2"	m3	485	66.848,74	\$ 32.421.638,90		\$ -
5	CRUDO DE RIO CLASIFICADO T MAX 4"	m3	10927	39.649,58	\$ 433.250.960,66	1.870,00	\$ 74.144.714,60
6	DISCO DIAMANTADO D= 14" CORTE CONCRETO LADRILLO O BALDOSA	und	80	605.042,00	\$ 48.403.360,00		
VALOR COSTOS DIRECTOS					\$ 2.513.443.631,36		\$ 1.256.163.635,35
IVA 19%					\$ 477.554.289,96		\$ 238.671.090,72
VALOR COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO					\$ 2.990.997.921,00		\$ 1.494.834.726,00

Ademas se hizo prorroga en el plazo de ejecucion del contrato por un periodo de un (1) mes dando como nueva fecha de terminacion del contrato el dia 23 de Octubre de 2025

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LICENCIAS, PERMISOS DEL PROYECTO

1. MEZCLA DENSA EN CALIENTE

Tabla 450 — 2. Requisitos de los agregados para mezclas asfálticas en caliente de gradación continua

Característica	Norma de ensayo	Nivel de tránsito		
		NT1	NT2	NT3
Dureza, agregado grueso (Q)				
Desgaste en la máquina de Los Angeles, máximo (%).	INV E-218	25/35/-	25/35/35	25/35/25
(Nota 1):		5/7/-	5/7/7	5/7/7
- Capa de: rodadura/intermedia/base, 500 revoluciones				
- Capa de: rodadura/intermedia/base, 100 revoluciones				
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%):	INV E-238	-	25/30/30	20/25/25
- Capa de: rodadura/intermedia/base				
Resistencia mecánica por el método del 10% de finos, capa de: rodadura/intermedia/base	INV E-224	-	-	110/90/75
- Valor en seco, mínimo (kN)		-	-	75/75/75
- Relación húmedo/seco, mínima (%)				
Coefficiente de pulimento acelerado para rodadura, mínimo.	INV E-232	45	45	45
Durabilidad (Q)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio, agregados fino y grueso, máximo (%).	INV E-220	18	18	18
Análisis petrográfico				
Cuantifica los porcentajes relativos de los diferentes minerales y las tipologías de rocas que componen el agregado (Nota 2).	ASTM D295	-	-	Reportar
Limpieza, agregado grueso (F)				
Impurezas en agregado grueso, máximo (%).	INV E-237	0,5	0,5	0,5
Limpieza, gradación combinada (F)				
Índice de Plasticidad, máximo (%).	INV E-128 e INV E-129	NP	NP	NP
Equivalente de arena, mínimo (%).	INV E-133	50	50	50
Valor de azul de metileno, máximo.	INV E-235	10	10	10

Característica	Norma de ensayo	Nivel de tránsito		
		NT1	NT2	NT3
Geometría de las partículas, agregado grueso (F)				
Partículas planas y alargadas, relación 5:1, máximo (%).	INV E-240	10	10	10
Caras fracturadas, mínimo (%):				
- Una cara: rodadura/intermedia/base	INV E-227	75/60/-	75/75/60	85/75/60
- Dos caras: rodadura/intermedia/base		-/-/-	60/-/-	70/-/-
Geometría de las partículas, agregado fino (F)				
Angularidad de la fracción fina, método A, mínimo (%):	INV E-239	40/35/-	45/40/35	45/40/35
- Capa de: rodadura/intermedia/base				
Adhesividad (Q)				
Agregado grueso: cubrimiento de los agregados con materiales asfálticos en presencia del agua hirviendo (%).	INV E-757	Reportar		
Agregado fino: adhesividad de los ligantes bituminosos a los agregados finos (método Riedel-Weber), índice mínimo.	INV E-774	4		

Nota 1: se aceptan valores superiores de desgaste siempre y cuando el valor de Micro-Deval se cumpla; esta nota no resulta aplicable para tránsito NT1.

Nota 2: este ensayo es aplicable únicamente para tránsito NT3. El informe debe cuantificar los porcentajes relativos de los diferentes minerales y las tipologías de rocas que componen el agregado, debe incluir advertencia sobre la presencia de minerales contaminantes, deletéreos, con posibles reactividades químicas, inestables o susceptibles a cambios volumétricos. Debe indicar el grado de meteorización o de alteración del agregado, y la porosidad. También debe incluir valores de acidez y carga de partícula con un concepto sobre la adherencia con el asfalto y las emulsiones.

Tabla 450 — 3. Proporción máxima de arena natural en el agregado para mezclas asfálticas en caliente de gradación continua

Característica	Nivel de tránsito		
	NT1	NT2	NT3
Proporción de arena natural: porcentaje (%) de la masa total del agregado combinado.	≤ 25	≤ 25	≤ 15
Proporción de arena natural: porcentaje (%) de la masa total del agregado fino.	≤ 50		

EMULSIÓN ASFÁLTICA DE IMPRIMACIÓN O RIEGO DE LIGA.

Tabla 416 — 1. Especificaciones del asfalto líquido para riegos de imprimación

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Característica	Unidad	Norma de ensayo INV	MC 30	
			Mín.	Máx.
Punto de inflamación (Copa abierta de Tag.)	°C	E-710	38	-
Viscosidad a 60 °C	cSt (Pa-s)	E-715/E-717	30 (0,03)	60 (0,06)
Viscosidad Saybolt-Furol a 25 °C	s	E-714	75	150

Destilación:				
Destilado (porcentaje (%)) sobre el volumen total destilado hasta 360 °C):				
- A 225 °C	%	E-723	-	25
- A 260 °C	%		40	70
- A 315 °C	%		75	93
Residuo de destilación a 360 °C (porcentaje (%)) en volumen por diferencia)				
	%	E-723	50	60
Ensayos sobre el residuo de la destilación				
Penetración (25 °C, 100 g, 5 s)	0,1 mm	E-706	120	300
Ductilidad (25 °C, 5 cm/min)	cm	E-702	100	-
Solubilidad en tricloroetileno	%	E-713	99,5	100

Tabla 411 – 1. Especificaciones de emulsiones asfálticas catiónicas

Ensayos sobre la emulsión	Norma de ensayo	Tipo de retorta (Nota)											
		Rápida				Medio				Lenta			
		GRR-40		GRR-45		CRM-05		GRL-40		GRL-57		GRL-57h	
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Destilación:	INV E-762	60	-	65	-	65	-	40	-	57	-	57	-
- Contenido de asfalto residual (%)		3	-	3	-	12	10	20	-	-	-	-	-
- Contenido de aceite (%)	INV E-761	-	40	-	35	-	35	-	50	-	43	-	43
Viscosidad:	INV E-763	20	100	-	-	50	-	50	20	200	20	100	-
- Saybolt-Furol a 25 °C (s)		-	-	100	400	-	450	-	-	-	-	-	-
- Saybolt-Furol a 50 °C (s)													
Estabilidad durante el almacenamiento:	INV E-764	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
- Sedimentación a 24 h (%)		-	5	-	5	-	5	-	10	-	5	-	5
- Sedimentación a los 5 días (%)													
Tamizado	INV E-765	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Retenido lama de 0,650 mm (máx. 20) (%)													
Demulsibilidad (%)	INV E-766	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotura en ensayo de mezcla con cemento (%)	INV E-770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
Carga eléctrica de la partícula	INV E-767	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva
pH	INV E-768	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5
Índice de rotura	UNE-EN 12075-1	Reportar											

SUB BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA T MAX 2"

Tabla 320 – 2. Requisitos de los agregados para subbases granulares

Característica	Norma de ensayo INV	Subbase granular		
		Clase A	Clase B	Clase C
Dureza (D)				
Desgaste en la máquina de Los Angeles (Granulometría A), máximo (%): • 500 revoluciones	E-218	50	50	50
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%).	E-238	30	35	-
Durabilidad (D)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%). (Nota): • Sulfato de sodio • Sulfato de magnesio	E-220	12 18	12 18	12 18
Limpieza (F)				
Límite líquido, máximo (%).	E-125	25	25	25
Índice de Plasticidad, máximo (%).	E-125 y E-126	6	6	6
Equivalente de arena, mínimo (%).	E-133	25	25	25
Contenido de terrones de arcilla y partículas delezna bles, máximo (%).	E-211	2	2	2
Resistencia del material (F)				
CBR (%): porcentaje asociado al valor mínimo especificado de la densidad seca, medido en una muestra sometida a cuatro días (4 d) de inmersión, mínimo.	E-148	40	30	30

Nota: se puede validar el requisito de durabilidad, empleando cualquiera de los dos sulfatos indicados.

Tabla 320 – 3. Franjas granulométricas del material de subbase granular

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tipo de gradación	Tamiz (mm / U.S. Standard)									
	50.0	37.5	25.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075	
	2	1 1/2	1	1/2	3/8	Nro. 4	Nro. 10	Nro. 40	Nro. 200	
	Pulgadas	Pulgadas	Pulgada	Pulgada	Pulgada					
Pasa tamiz (%)										
SBG-50 (Nota)	100	70 - 95	60 - 90	45 - 75	40 - 70	25 - 55	15 - 40	6 - 25	2 - 15	
SBG-36 (Nota)	-	100	75 - 95	55 - 85	45 - 75	30 - 60	20 - 45	8 - 30	2 - 15	
Tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo (%)	0 %		7 %				6 %		3 %	

Nota: el número indica el tamaño máximo, en milímetros, de las partículas en la gradación empleada.

Tabla 320 - 2. Requisitos de los agregados para subbases granulares

Característica	Norma de ensayo INV	Subbase granular		
		Clase A	Clase B	Clase C
Dureza (O)				
Desgaste en la máquina de Los Ángeles (Granulometría AL máximo (%): - 500 revoluciones	E-218	50	50	50
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%)	E-238	30	35	-
Durabilidad (O)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) (Nota): - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	12 18	12 18	12 18
Limpeza (F)				
Limite líquido, máximo (%)	E-125	25	25	25
Índice de Plasticidad, máximo (%)	E-125 y E-126	6	6	6
Equivalente de arena, mínimo (%)	E-133	25	25	25
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	E-211	2	2	2
Resistencia del material (F)				
CBR (%): porcentaje asociado al valor mínimo especificado de la densidad seca, medido en una muestra sometida a cuatro días (4 d) de inmersión, mínimo.	E-148	40	30	30

Nota: se puede validar el requisito de durabilidad, empleando cualquiera de los dos sulfatos indicados.

Tabla 320 - 3. Franjas granulométricas del material de subbase granular

Tipo de gradación	Tamiz (mm / U.S. Standard)									
	50.0	37.5	25.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075	
	2	1 1/2	1	1/2	3/8	Nro. 4	Nro. 10	Nro. 40	Nro. 200	
	Pulgadas	Pulgadas	Pulgada	Pulgada	Pulgada					
Pasa tamiz (%)										
SBG-50 (Nota)	100	70 - 95	60 - 90	45 - 75	40 - 70	25 - 55	15 - 40	6 - 25	2 - 15	
SBG-36 (Nota)	-	100	75 - 95	55 - 85	45 - 75	30 - 60	20 - 45	8 - 30	2 - 15	
Tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo (%)	0 %		7 %				6 %		3 %	

Nota: el número indica el tamaño máximo, en milímetros, de las partículas en la gradación empleada.

BASE TRITURADA T.MAX 1 1/2"

Tabla 330 - 2. Requisitos de los agregados para bases granulares

Característica	Norma de ensayo INV	Base granular		
		Clase A	Clase B	Clase C
Dureza (O)				
Desgaste en la máquina de Los Angeles (Granulometría A), máximo (%): - 500 revoluciones - 100 revoluciones	E-218	35 7	40 8	40 8
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%).	E-238	25	30	-
Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10 % de finos: - Valor en seco, mínimo (kN) - Relación húmedo/seco, mínimo (%)	E-224	90 75	70 75	- -
Durabilidad (O)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%). (Nota 1): - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	12 18	12 18	12 18

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

13. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS EN EL FRENTE RURAL DURANTE EL PERIODO

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES EN EL PERIODO						CORTE A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	VALOR
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC-19)	m³	1.450.00	\$ 1.007.563.03	1.460.966.394	0	0
2	EMULSION ASFALTICA CRR-1 o CRL-1	galon	3.990.00	\$ 25.420.17	101.426.478.30	0	0
3	SUB BASE TRITURADA T.MAX 2"	m³	8.000.00	\$ 54.621.85	436.974.800.00	948	51,781,514
4	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2"	m3	485.00	\$ 66,848.74	32,421,638.90	0	0
5	CRUDO DE RIO CLASIFICADO T MAX 4"	m³	10.927.00	\$ 39,649.58	433,250,960.66	4,026	159,629,209
6	DISCO DIAMANTADO D=14" CORTE CONCRETO LADRILLO O BALDOSA	und	80.00	605,042.00	48,403,360.00	0	-
VALOR COSTOS DIRECTOS					2,513,443,631.36		211,410,722.88
					IVA (19%)		40,168,037.35
					-		
VALOR TOTAL							251,578,760.23




13. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS EN EL FRENTE RURAL Y UTBANO

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES EN EL PERIODO						CORTE 4 A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	VALOR
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC-19)	m³	2.405.00	\$ 1,007,563.00	2,423,189,015	160	161,210,080.00
2	EMULSION ASFALTICA CRR-1 o CRL-1	galon	6,620.00	\$ 25,420.00	168,280,400.00	440	11,184,800.00
3	SUB BASE TRITURADA T.MAX 2"	m³	10,800.00	\$ 54,621.00	589,906,800.00	1,164	63,578,844.00
4	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2"	m3	485.00	\$ 66,848.00	32,421,280.00		0.00
5	CRUDO DE RIO CLASIFICADO T MAX 4"	m³	12,797.00	\$ 39,649.00	507,388,253.00	4,156	164,781,244.00
6	DISCO DIAMANTADO D=14" CORTE CONCRETO LADRILLO O BALDOSA	und	80.00	605,042.00	48,403,360.00	0	0.00
VALOR COSTOS DIRECTOS					3,769,589,108.00		\$ 400,754,968
					IVA (19%)		\$ 76,143,444
					-		
VALOR TOTAL							\$ 476,898,412


 CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES NOMBRE: ING JAVIER VERGARA MARIÑO Supervisor Designado	 CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO NOMBRE: JUAN SEBASTIAN PATIÑO MARIÑO Apoyo a Supervisión Designado SOPY
---	---


ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025


10. REGISTRO FOTOGRAFICO

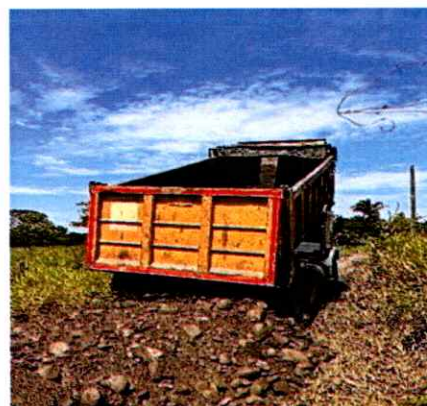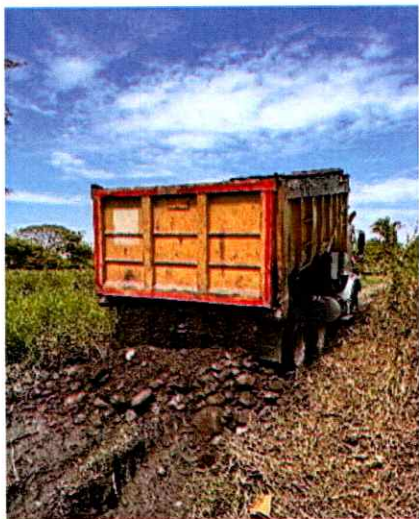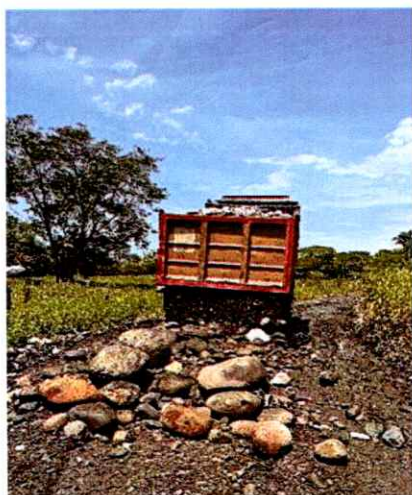

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

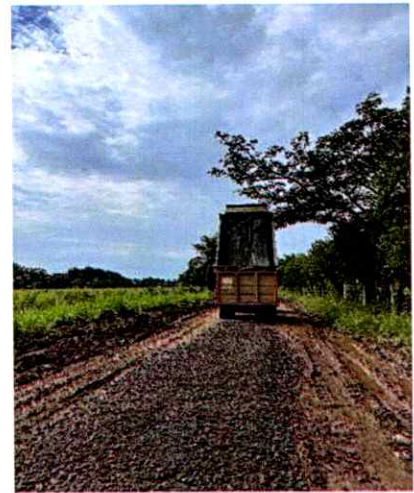

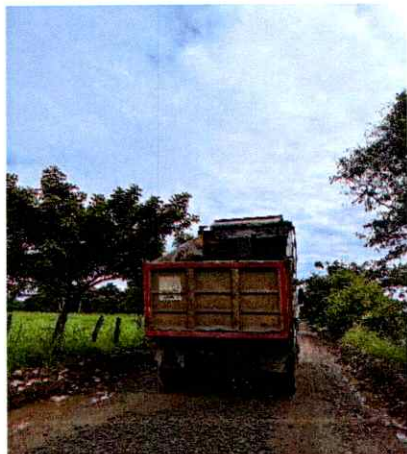

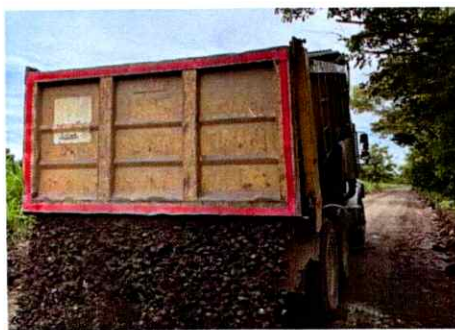

ACTA PARCIAL N° 05 DEL 02 DE AGOSTO AL 017 DE SEPTIEMBRE DE 2025

