

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 172	Contratista: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
Contrato de Interventoría No. 2276 del 2021	Interventoría: CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO

INFORME MENSUAL No. 1	MES O PERIODO: ENERO
--	---

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		4
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		5
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		8
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Items no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	16
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	16
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	16
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	16
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	16
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	16
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		16
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	16
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	16
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	17
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	17
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	17
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		21
5.1	Información general del contrato		21
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		21
5.3	Informes especialistas y profesionales		21
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		21
5.5	Informe matriz de riesgos		21
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		22
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		22
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		22
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	22
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	22
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	22
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	22
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	22
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	22
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	22
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	22
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	22
7	Conclusiones y recomendaciones		28
8	Anexos		28
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		28
8.2	Registro fotográfico y vídeo del avance de las obras		28
8.3	Registro fotográfico y vídeo de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		28
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		28

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


 Firma: _____
 Nombre: _____
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INV/AS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial



INFORMACIÓN DE VÍA
PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MARSHAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN GENERAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPLAN-11-FB-2
VERSIÓN	1
Página	1 DE 2

FECHA: 11/01/2021
(dd-mm-aaaa)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUCURBA PERIODO MES: 01/01 - 01/02

CONTRATO DE OBRA N.º: 172 DE 2021

PLAZO INICIAL: 01/01/2021

VALOR INICIAL (incluido IVA): 0

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA QUE CONECTA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA

FECHA DE INICIO: 01/01/2021

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0

AL OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA

FECHA DE SUSPENSIÓN: 01/01/2021

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0

CONTRATISTA: JUAN FERNANDO CASTRO DIAZ

FECHA DE VINCULAMIENTO: 01/01/2021

ANTICIPO CONCEDIDO: 0

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 01/01/2021

PLAZO ACUMULADO: 01/01/2021

ANTICIPO AMORTIZADO: 0

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 01/01/2021

INTERVENIOR: COMISARIO ACT-38

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Puentes	
	Puentes	
	Puentes	
Mantenimiento	Puentes	
Obras (Especificar cada una)		

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Puentes		
	Puentes		
	Puentes		
Mantenimiento	Puentes		
Obras (Especificar cada una)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDO LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	0	0,000,000.00	0,000,000.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑO	0	10,000,000.00	10,000,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PRECIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	20,000,000.00		20,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	0,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑO				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PRECIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALORES ACUMULADOS				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): 0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

	INSTITUCIONAL DE VAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS RESUMEN MENSAJES ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPLANUN-15.FB.2
		VERSIÓN	1
		Página	1 DE 2
		FECHA	4/03/2023 (24-03-2023)
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Folio 1		Folio 2	
Incluir la localización y actividad.		Incluir la localización y actividad.	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
 Firma: _____ Nombre: Miguel Armando Díaz Cargo: Director de Intervención Matrícula Profesional No. 26320/12786 CND Original Informacional de Intervención. Archivo de Gestión del MIVAS. Código: Intervención. Situación Técnica			

1. INTRODUCCIÓN.

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa “Colombia rural” por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

Para esto Los municipios tenían la responsabilidad de contratar las empresas encargadas de ejecutar estas actividades, mediante licitación pública o selección abreviada según sea el caso para cada municipio, proceso constructivo que atenderá los diseños, alcances especificaciones y normas que defina **INVIAS**

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

Mediante **CONTRATO NÚMERO 2276 DE 2021**. Entre los suscritos, **EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía número 91.108.270 quien obra en su calidad de **SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES**, nombrado mediante Resolución No. 3570 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 202 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación **del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, expedida por el **INVIAS**, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.816.621 de Bogotá D.C, obrando en nombre y representación del **CONSORCIO ACI – 3B**, en su calidad de representante según carta de información anexa, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella ni los integrantes del consorcio que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número 4218 del 21 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-167-2021, contrato que se registrá por las estipulaciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 sus normas reglamentarias y las siguientes

De acuerdo con lo anterior, el **INVIAS** adjudicó el contrato **No. 2276 de 2021** al **CONSORCIO ACI-3B**, cuyo objeto es **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA** se encuentra Integrado por ACI Proyectos SAS Con Nit. 860.059.851-6 con una Participación del 50 % y 3B Proyectos SAS con Nit. 900.504.398-4 con una Participación Del 50%.

Del mismo modo **EL MUNICIPIO DE CERETÈ**, entidad territorial identificado con NIT 800.096.744-5, representado legalmente en este contrato por el señor **LUÍS ANTONIO RHENALS OTERO**, persona mayor de edad, residente en el Municipio de Cereté, Departamento de Córdoba, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.064.982.903 de Cereté – Córdoba, quien actúa en su calidad de Alcalde, y por ende representa legal del **MUNICIPIO**, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, que mediante Resolución No 239 del 16 de septiembre de 2021 la entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-020_2021, y Mediante Resolución No. 271 de 28 octubre de 2021 la Entidad adjudico el Contrato de Obra N0 172 de 2021 al contratista **DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10784359 de montería, el cual cuenta con una Participación del 100 %. cuyo objeto es **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA”** .

Se designó al ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO, identificado con cédula de ciudadanía 11.078.166 de Chima, con matrícula profesional No. 222020-97095 COR, del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, quien desempeña el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 17, asignado a la Dirección Territorial Córdoba de la planta global del Instituto Nacional de Vías, incorporado mediante Resolución No. 06478, como gestor técnico de proyectos se designó al ingeniero Álvaro Galvis.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chima, por el este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.

El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Rabolargo en el sector San Antonio – El Cedro, en la siguiente tabla se muestran las características de las vías. Nomenclatura Catastral Ancho de calzada (m) Bordillo (m) Longitud del tramo (m) Funcionalidad Tipo de terreno.

Nomenclatura Catastral	Ancho de calzada (m)	Bordillo (m)	Longitud del tramo (m)	Funcionalidad	Tipo de terreno
San Antonio -El Cedro	5.50	0.2	3488.76	Terciaria	Plano

El material que se va a utilizar en este proyecto, será suministrado por la cantera VILLA CARMEN la cual cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CAR del departamento. Es preciso aclarar que no será necesario montaje de Plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por Plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los valles del

Sinú y del San Jorge – CVS. Asimismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas.

A continuación, se muestra una imagen general y específica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

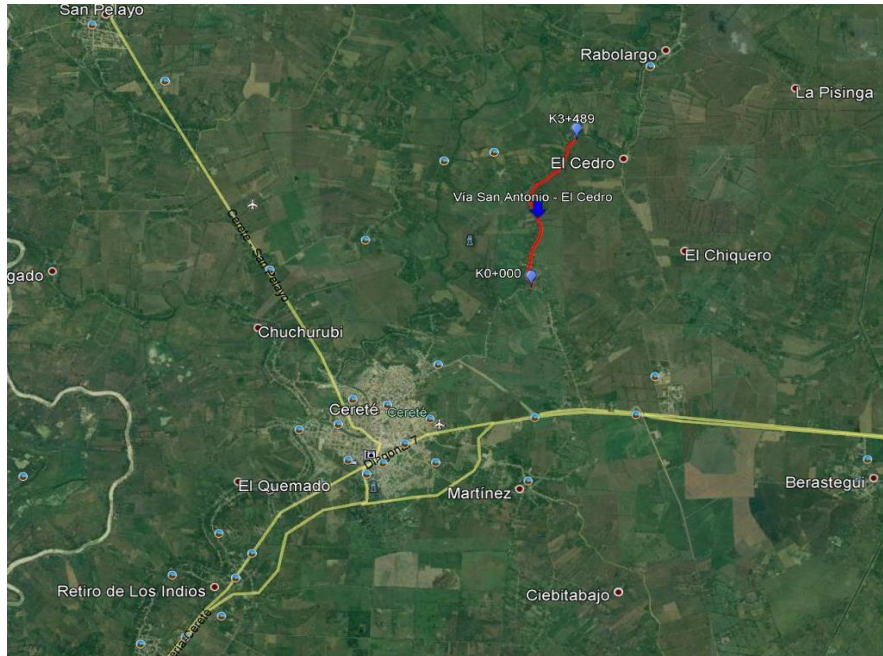


Figura 1 Localización General del Proyecto.

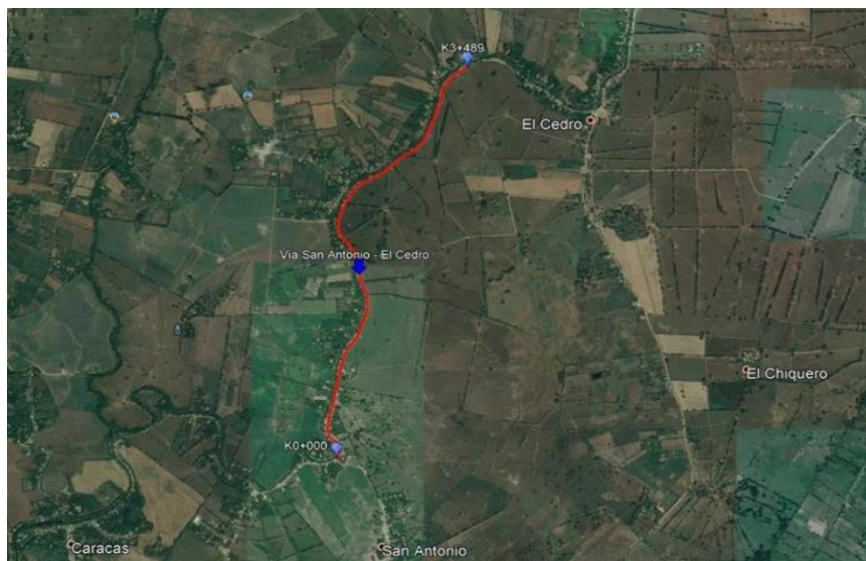


Figura 2 Localización específica de la vía a diseño

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte con el municipio de San Pelayo, por el este con el municipio de Ciénaga de oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con el municipio de San Carlos, Los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto , ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales, de esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.



Figura 3 vía sin intervenir K0+000



Figura 4 Vía sin intervenir K0+460

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto en general consiste en la construcción de 3.488,76 metros lineales pavimento, ubicados en la zona rural del Municipio de Cereté, como seguidamente se anota:

Alneamiento/Nomenclatura Catastral	PR Inicial	PR Final	Coordenadas PR Inicial		Coordenadas PR Final	
			Este	Norte	Este	Norte
Vía San Antonio - El Cedro	K0+000.00	K3+488.76	1144304.298	1477322.493	1145169.775	1480292.632


Características propuestas de diseño geométrico de la vía

Longitud:	K3+488.76
Tipo de terreno:	Plano
Velocidad de diseño:	40 Km/h
Ancho de Calzada:	5.50 m
Ancho de Carril:	2.75 m
Bombeo Normal:	2.00%
E _{max}	4%


SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA

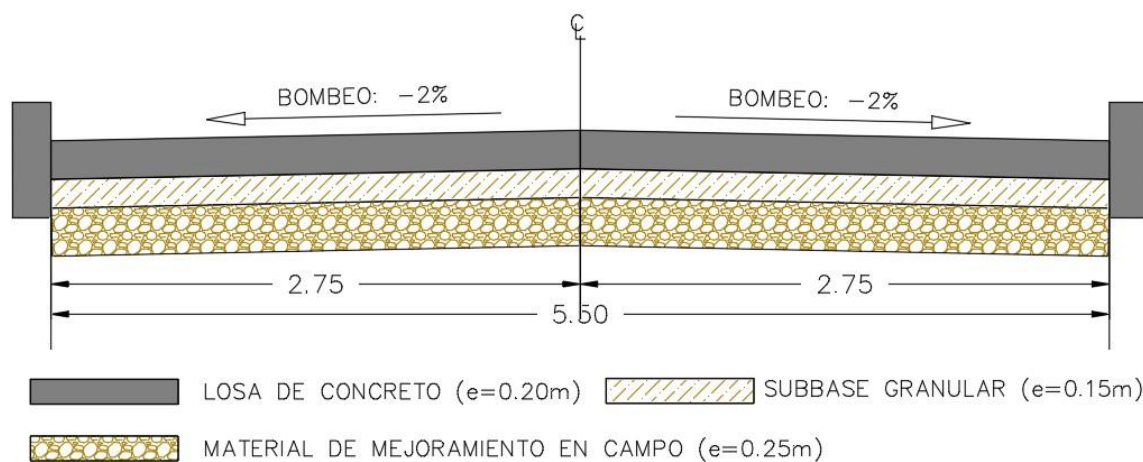


SECCION TÍPICA TRAMOS RECTOS

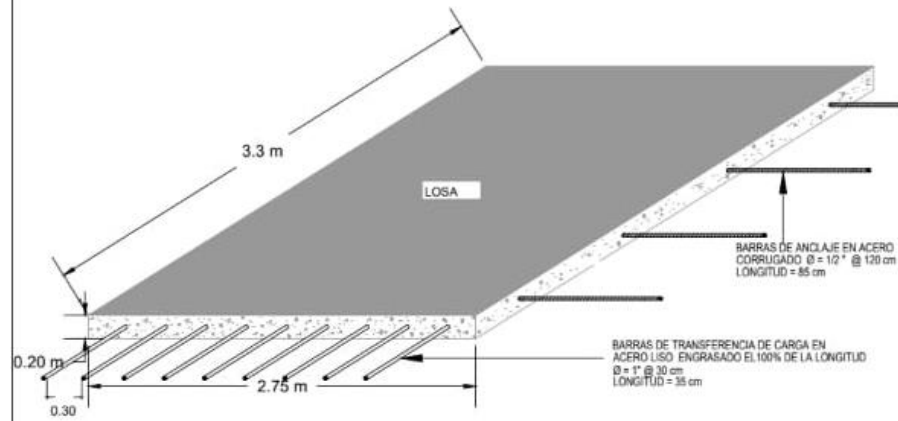


SECCIÓN TÍPICA TRAMOS IRREGULARES

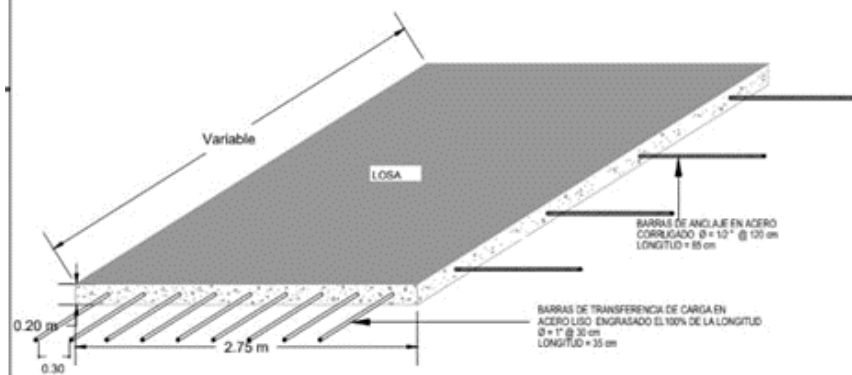


ISOMETRICO INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

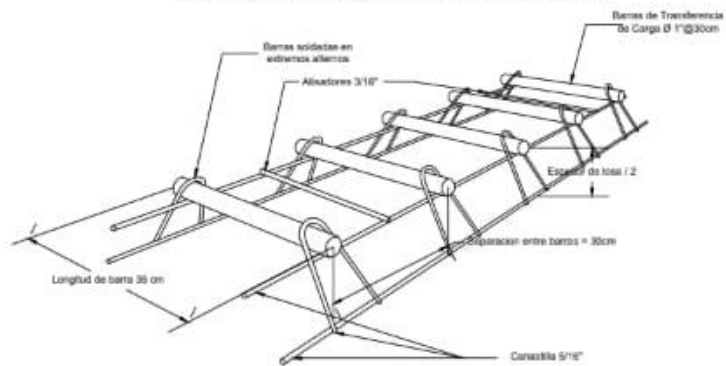


PLANTA INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

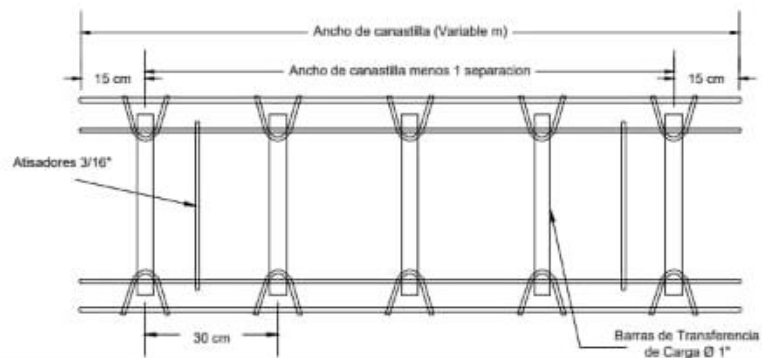


CORTE INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

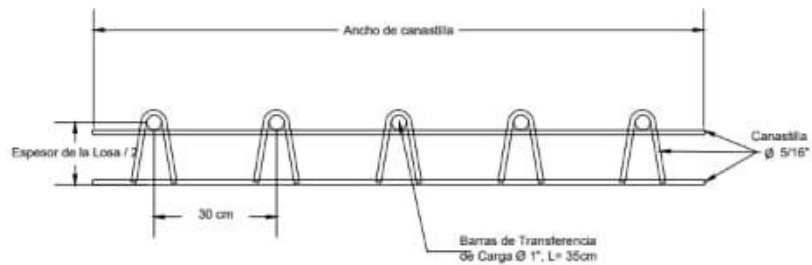

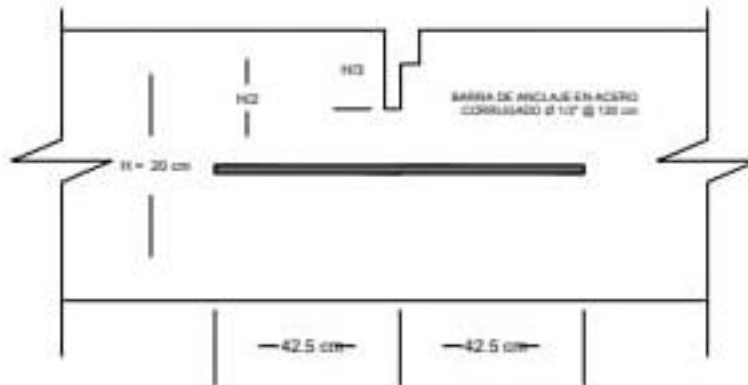

DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA LONGITUDINAL

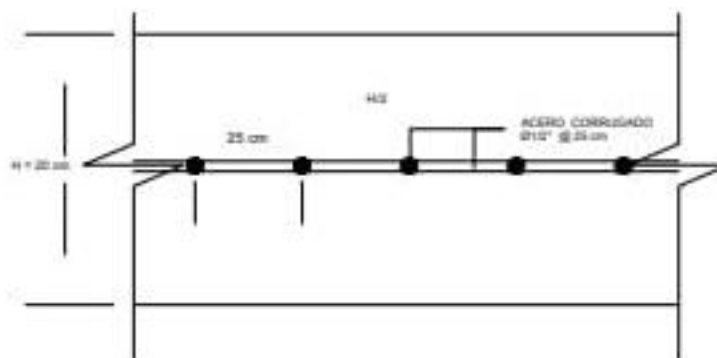


DETALLE CONSTRUCTIVO LOSA REFORZADA





DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA DE EXPANSIÓN

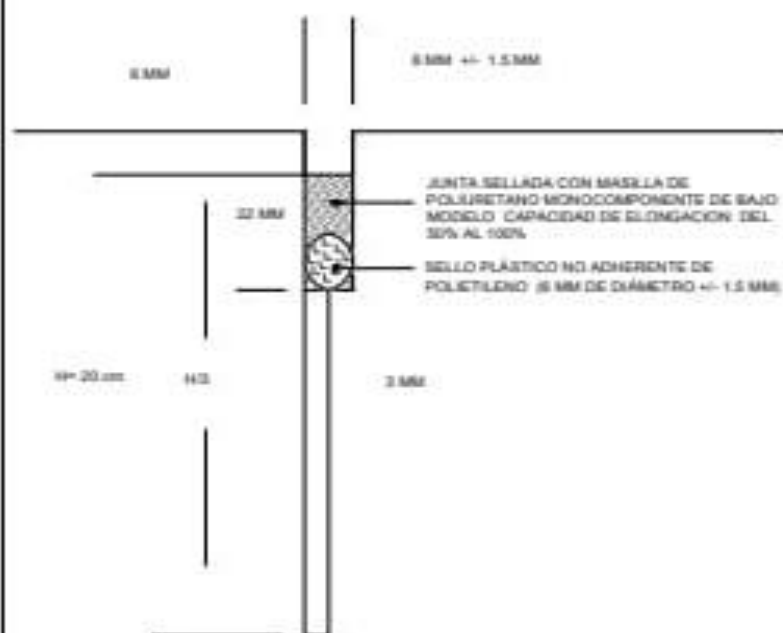

DETALLE CONSTRUCCIÓN JUNTA LONGITUDINAL

Igualmente de conformidad con el convenio suscrito por el Municipio de Cereté e Invias del cual se deriva la presente contratación se adelantará una etapa de revisión, ajustes y/o actualización de los estudios y diseños de las obras a ejecutados.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

A continuación, se presenta la información general del contrato de obra No 172 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
CONTRATO DE OBRA	N0. 172 DE 2021
CONTRATISTA	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA 100% DE PARTICIPACIÓN
NIT CONTRATISTA	10784359
DIRECCIÓN	CRA 6 N0. 65-24 PLACES MALL RECRO OFICINA 319.
TELEFONO	3103585668
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA:	6 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:	31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA	31 DE JULIO DE 2022 3103585668
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO):	\$ 5.685.110.960.00

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

- El día 31 de enero de 2022 se firma acta de inicio del proyecto que tiene como objeto construcción de pavimento rígido de la vía que comunica la vereda San Antonio – El cedro corregimiento de Rabolargo municipio de Cerete departamento de Córdoba

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (según ultima acta de modificación)	VALOR EJECUTADO DEL MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Subtotal básico de obras	\$ 5.636.522.432,00		0		0
Provisión					
IVA					
Estudios y diseños	\$ 29.633.731,90		0		0
IVA estudios y diseños	\$ 3.026.396,00		0		0
Gestión social, Gestión predial, Gestión ambiental	\$29.633.731,90		0		
Gestión de sostenibilidad					
otros					
VALOR TOTAL	\$ 5.685.110.960,00		0		0

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

En este periodo no se realizaron ítems no previstos en este contrato.

3.4 ESTADO DE AVANCES Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

A la fecha este Contrato no presenta avance ya que solo se firmó el Acta de inicio

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1. INFORME SEMANAL.

En este mes no se realizaron actividades físicas en obra por tal motivo no se anexa Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 el cual relacionan los Informes semanales del presente mes.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATADO DE OBRA.

En este periodo no se realizaron actividades en obra por esta razón no se anexa formato MEPI-MN1-IN15-FR-4 en el que se relacionan la maquinaria y equipo contratado en obra.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

En este mes no se relaciona personal en obra debido que las actividades no habían iniciado por tal motivo no se anexa Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATADO DE OBRA.

En este mes no se realizan actividades en obra por tal motivo no se relaciona Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se relaciona estado general del tiempo en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se relacionan el estado general del tiempo. (Ver pág. 18)

4.6. RESUMEN DE ENSAYO DE LABORATORIO.

En este periodo no se habían iniciado actividades en obra por tal razón no se relaciona Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 el cual se refiere a ensayos de Laboratorios que se realizan en el mes.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

En este mes No se realizaron actividades por tal motivo no se relaciona formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1 el cual trata de las Garantía y Seguros del contrato de obra.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

En este mes no se habían iniciado las actividades físicas en obra por tal motivo no se anexa Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

4.9. OTROS DOCUMENTOS.

- SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DE ANTICIPO.

Este proyecto no contempla anticipo.

- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Se anexa seguimiento al programa de obra del contratista (ver pag.19)

- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN.

Se anexa cuadro programa de inversión (ver pág. 20.)

- ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

En este mes no se realizaron comités de comité de obra debido a que las actividades no habían iniciado por tal razón no se relaciona Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- ACTAS DE REUNION.

En este mes no se realizaron actas de reunión debido a que las actividades no habían iniciado por tal razón no se relaciona MEPI-MN1-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEP-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		4/02/2022 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA
-------------------	------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No:	172	CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENE RO		PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento del Córdoba - Grupo 4,	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2276 del 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco																															X	1
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
 Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma: Nombre: _____ Residente de Obra Matrícula Profesional No.: _____	Firma: _____ Nombre: _____ Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: _____
--	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.


ALCALDÍA DE CERETÉ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA							GANTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	febrero 2022							marzo 2022							abril 2022							mayo 2022							junio 2022							julio 2022							agosto 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24

Activar Win
Ve a Configurac

Elaboró:



FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(indicar con una X)

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	5.685.110.959,90
---	----	------------------

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	6,48%	13,00%	17,73%	50,51%	12,28%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$365.269.779	\$720.753.466	\$909.482.615	\$2.848.539.273	\$620.078.301
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	6,48%	19,48%	37,21%	87,72%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$365.269.779	\$1.098.023.245	\$2.097.505.860	\$4.944.444.131	\$5.636.522.432
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%							
	VALOR (Miles de Pesos)							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%							
	VALOR (Miles de Pesos)							

CONVENIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	=====

Aprueba Firma: _____
Nombre: MARIA ESTHELA JULIO GONZALEZ
Directora de Inventoria

Aprueba Firma

Nombre: **SUGHEIDY MONTIEL PATIÑO**

Secretaría de planeación e infraestructura - Cereté

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA- GRUPO 4”.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº. 2276 DE 2021
INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI-3B
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	ACI PROYECTOS S.A.S 50% 3B PROYECTOS S.A.S 50%
NIT DE INTERVENTORIA	90155192-6
TELEFONO	3134024184
DIRECCION	-CARRERA 7 156-10 PISO 31 TORRE KRYSTAL-NORTH POINT -CARRERA 18 13ª 04 AP 301 ED COLOSINA BARRIO VENUS II, CERETE, CORDOBA
PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA :	6 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	31 DE JULIO DE 2022
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO):	\$1.930.530.773

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Se realizó visita a la alcaldía donde se recibe documentación referente al proyecto como lo es pólizas de garantías.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

En este periodo no se realizaron consultas especialistas

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

El informe de programa anual de caja –PAC Se encuentra en ejecución

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

El informe de matriz de riesgo se encuentra en ejecución en este mes.

5.6. INFORMACION DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

De acuerdo al sistema de gestión documental implementado por INVIA a través de las fuentes de información que maneja los documentos electrónicos, a la fecha no se encuentra actualizada la plataforma CIFRA dado a que se solicitó al INVIA mediante comunicado la entrega de Usuario y contraseña y hasta la fecha no se ha recibido dicha información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.1. EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En este periodo no hubo equipo y vehículos en la interventoría por tal razón no se relaciona formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Sin embargo, este periodo no se ejecutaron actividades. (Ver pág. 23)

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Sin embargo, este periodo no se ejecutaron actividades. (Ver pág. 24)

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.


Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver pág. 26 y 27)

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En este mes no se realizó ninguna actividad respecto al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. Por tal motivo no se relaciona.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** El Contrato de Interventoría no contempla anticipo.
- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO:** Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. (Ver pág. 22)
- **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGA:** Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3.

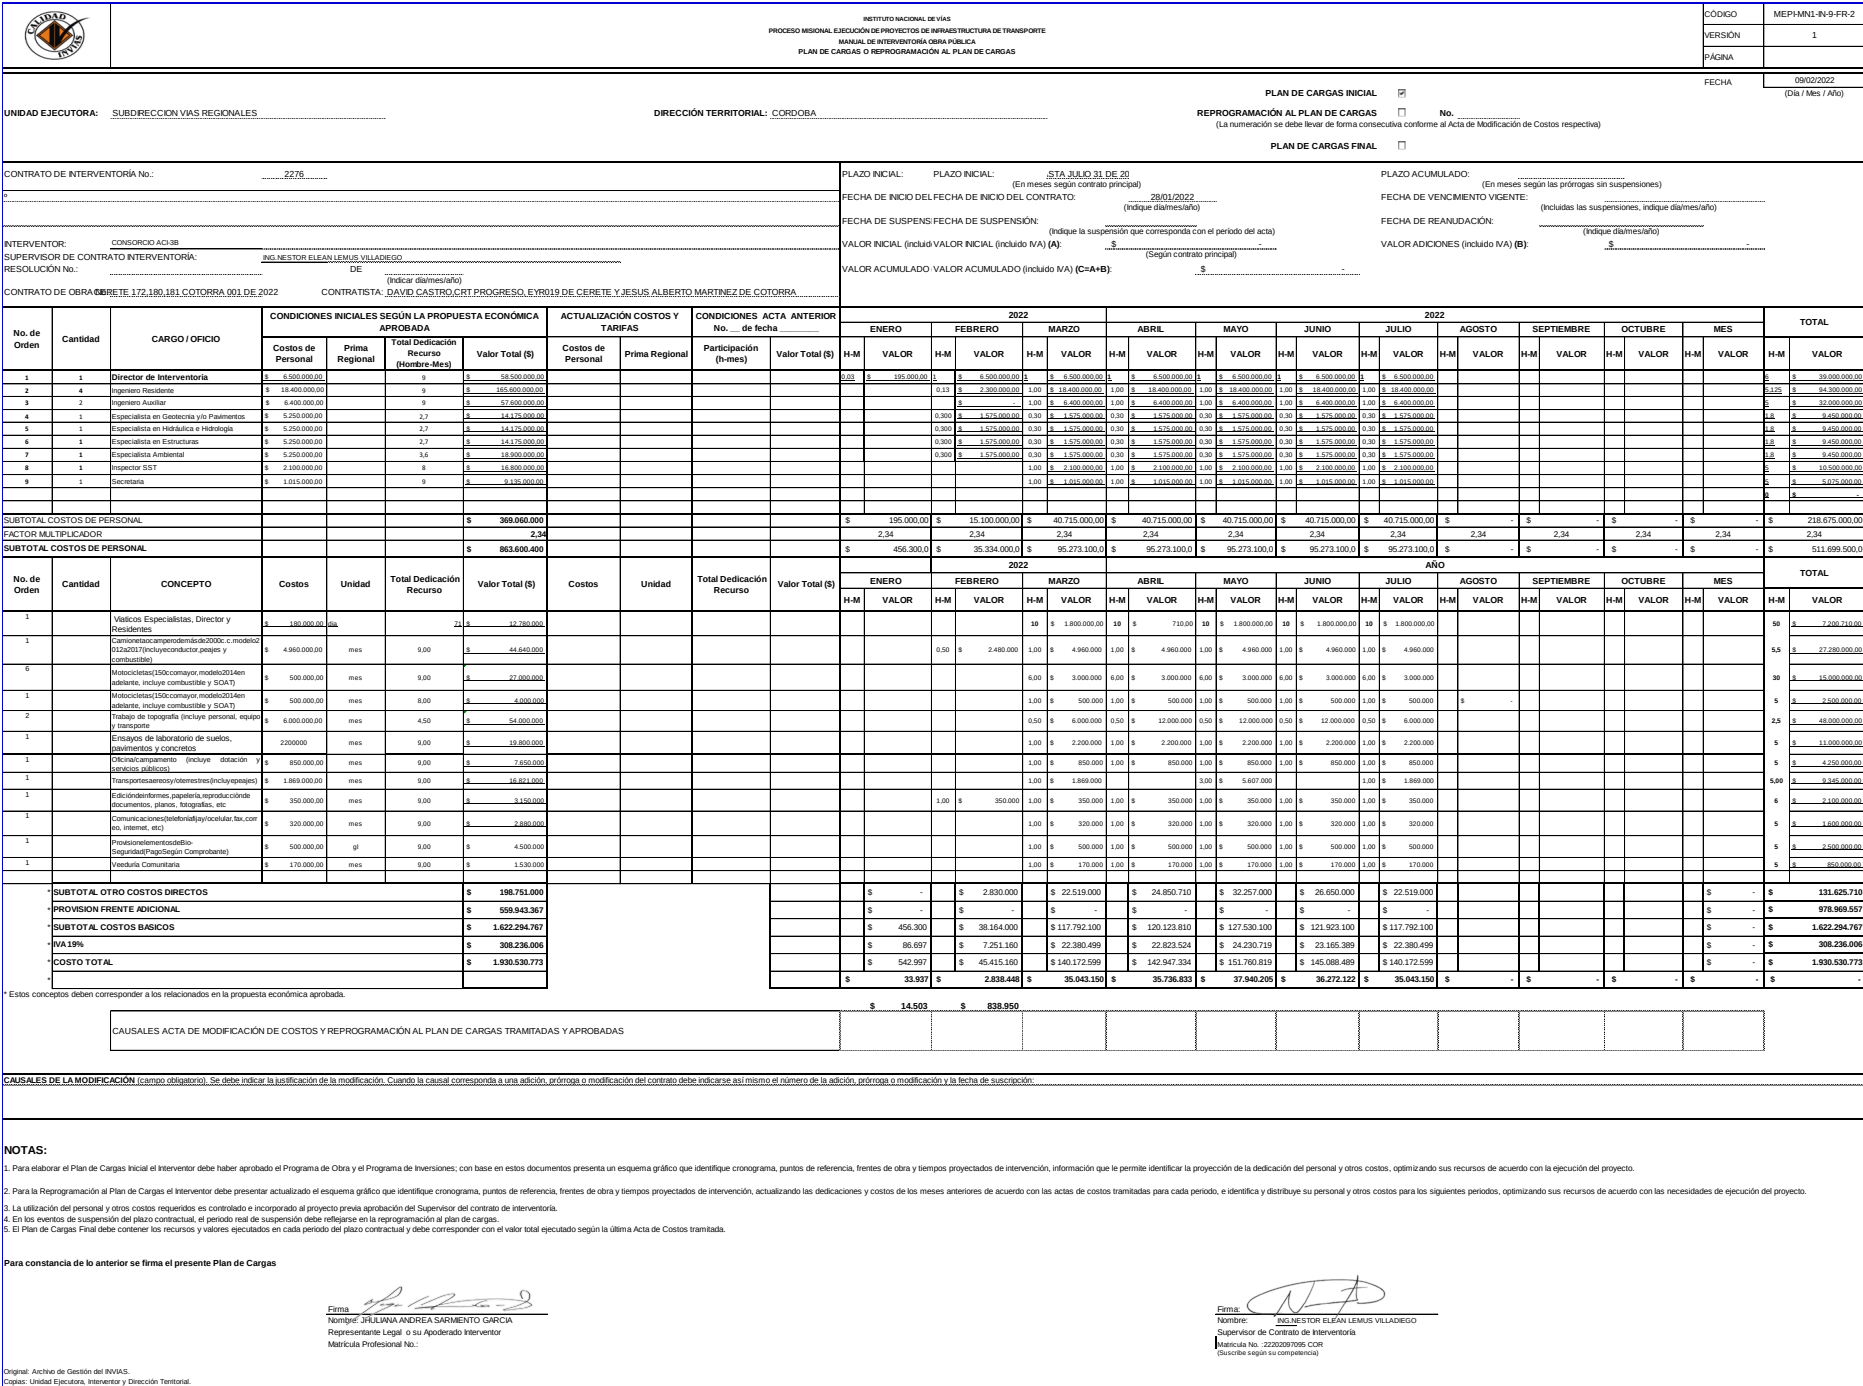

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATO DE INTERVENCIÓN															CÓDIGO	MEP/IN-149-15/20-7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																	VERSIÓN	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																	PÁGINA	1 DE 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																	FECHA	4/02/2022 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES																	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 2276 DE 2021																	INTERVENIOR: CONSORCIO ACI-38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DEL 2022																	PROYECTO: PES-INTERVENCIÓN VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTRATO DE OBRA No.: 172-180-181 DE 2021																	CONTRATISTA: ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIO CIVIL, CONSORCIO CRT PROGRESA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NOMBRE APL: SUJA																	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (ver nota 5)	Indice Base de Cotización (BSC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 DE 4	

FECHA			4/02/2022 <small>(Día / Mes / Año)</small>		
-------	--	--	---	--	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
--	--------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
---	-------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4					

FECHA DE INICIO:	31 DE ENERO DE 2022				
PLAZO INICIAL:	6 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2022 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>				
VALOR INICIAL:	\$	1,930,530,773.00			
VALOR ACUMULADO:	\$	*			
		<small>(Incluye adiciones)</small>			

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ING. NESTOR LEMUS
---	-------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 193,053,077	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	\$ 772,212,309	31	1	2022	31/06/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 386,106,155	31	1	2022	31/06/2022		
Calidad del servicio	30%	\$ 579,159,232	31	6	2022	31	6	2025
			31	6	2022	31	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	3199814-4, 3199816-9, 3199817-6, 3199829-4
Certificado de modificación o anexo No.:	
<small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA 4/02/2022
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		
Calidad del servicio		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma 
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

Se firmó acta de inicio el día 31 de enero de 2022

Se programó vista técnica y recorrido del proyecto por parte de INVIAS, contratista, funcionarios de la alcaldía e interventoría con el fin de dar inicio a las actividades.

Se realizó visita a la alcaldía donde hacen entrega de documentación del contrato, pólizas, aprobación de pólizas y registró presupuestal.

8. ANEXOS.

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR.

En este mes no se realizo envío de correspondencia por parte de la interventoría

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

No se presenta registro fotográfico ni video del avance de obras debido a que no se habían iniciado actividades en obra.

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PEDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS (CUANDO EL CONTRATO TENGA QUE ADELANTAR ESTAS GESTIONES).

No se presenta registro fotográfico debido a que en este mes no se habían iniciado actividades en obra.

8.4. BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

En este periodo no se presenta bitácora ya que no se habían iniciado actividades físicas en obra.
