

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

AERONAUTICA CIVIL-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO INTER PMA NORTE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 24001385 H3 de 2024.

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”

CONSORCIO PMA AEROPUESTOS NS
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 24001333 H3 de 2024.

OBJETO: “REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 3
1 AL 31 DE MARZO DE 2025

BOGOTÁ, D.C. 23 DE MAYO 2025

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

REVISION Y ESTADO DE INFORMES

CLASE DE DOCUMENTO: Informe Mensual No. 03	FECHA:
REVISIÓN Y ESTADO DE INFORMES	23-25-2025

REVISION	No. DE REVISIONES	1	2	3	4
	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN:				
	Gina Paola González Reyes				
	RESPONSABLE DE REVISIÓN:				
	Pedro Luis Jiménez				

CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN No.	MODIFICACIÓN	FECHA DE EMISION	OBSERVACIONES
1	Primera Emisión	10 de abril de 2025	
2	Segunda Emisión	23 de mayo de 2025	Atención observaciones ID: 1659598

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

DESTINATARIO DEL INFORME	No. DE COPIAS
Cliente – Aeronáutica civil	1
Archivo CONSORCIO INTER PMA NORTE – Original	1

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	7
1.1. GENERALIDADES	7
1.1.1. Descripción General.....	7
1.1.2. Alcance del Proyecto.....	7
1.1.3. Localización y Área de Influencia	9
1.1.4. Descripción general del Contrato de Consultoría.	11
1.1.5. Descripción general del Contrato de Interventoría.....	12
1.1.6. Objeto del Contrato de Consultoría 24001333 H3 DE 2024.	12
1.1.7. Objeto del Contrato de Interventoría 24001385 H3 2024.	12
1.2. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.	13
1.2.1. Contrato de Consultoría.....	13
1.2.2. Contrato de Interventoría.....	13
1.3. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL PROFESIONAL.....	14
1.3.1. Personal del Contratista de Obra	14
1.3.2. Personal de Interventoría.....	17
1.3.3. Profesionales del AEROCIVIL asignados como Supervisión y Apoyo para el desarrollo del proyecto.	20
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA	21
2.1. SEGUIMIENTO A GARANTIAS Y VIGENCIAS.....	21
2.1.1. Contrato de Consultoría	21
2.1.2. Contrato de Interventoría	22
2.2. ADICIONES, MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS.	22
2.2.1. Contrato de Consultoría	22
2.2.2. Contrato de Interventoría	22
2.3. CONTROL LEGAL.	23
2.3.1. Contrato de Consultoría	23
2.3.2. Contrato de Interventoría	23
2.4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.....	23
2.4.1. Contrato de Consultoría	23
2.4.2. Contrato de Interventoría	25
2.5. BALANCE FINANCIERO.....	25

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA
		30/11/2024

2.5.1.	Contrato de Consultoría.....	25
2.5.2.	Contrato de Interventoría.....	28
2.6.	CONTROL FINANCIERO	30
2.6.1.	Contrato de Consultoría.....	30
2.6.2.	Contrato de Interventoría.....	30
3.	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	31
3.1.	CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO.....	31
3.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	41
3.2.1.	Contrato de Consultoría.....	41
3.2.2.	Contrato de Interventoría.....	47
3.3.	ALCANCE DE ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS POR COMPONENTE	59
3.3.1.	Componente Técnico.....	59
3.3.2.	Componente Ambiental.....	68
3.3.3.	Componente Predial.....	68
3.3.4.	Componente Social.....	68
3.3.5.	Componente Riesgos.....	69
3.4.	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO.....	69
3.5.	FORMATOS DE SEGUIMIEINTO DE CONTRATO	69
3.6.	ACTAS DE COMITES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL PERIODO.....	70
3.7.	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	70
3.7.1.	Correspondencia Enviada.....	70
3.7.2.	Correspondencia Recibida.....	72
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	76

Lista de Tablas

Tabla 1-1.	Datos de Contrato de Consultoría.....	13
Tabla 1-2.	Datos de contrato de interventoría.....	13
Tabla 1-3.	Directorio telefónico del personal del Consultor	14
Tabla 1-4.	Cambio de Profesionales Consultor. Oficio NS-076.....	16
Tabla 1-5.	Concepto de solicitud de cambio de profesionales.....	16
Tabla 1-6.	Directorio telefónico del personal de Interventoría	17
Tabla 1-7.	Directorio telefónico personal del AEROCIVIL asignados como Apoyo a la Supervisión.....	20

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

Tabla 2-1. Pólizas Contrato de Consultoría.....	21
Tabla 2-2. Pólizas Contrato de Interventoría.....	22
Tabla 2-3. Actas suscritas contrato de Consultoría	23
Tabla 2-4. Actas suscritas contrato de Interventoría	23
Tabla 2-5. Etapas de desarrollo del proyecto.....	23
Tabla 2-6. Vigencia presupuestal.....	26
Tabla 2-7. Propuesta económica Aeropuerto SKSA.....	26
Tabla 2-8. Propuesta económica Aeropuerto SKUC.	27
Tabla 2-9. Propuesta económica Aeropuerto SKOC.....	27
Tabla 2-10. Forma de pago contrato de consultoría.....	28
Tabla 2-11. Vigencia presupuestal.....	28
Tabla 2-12. Propuesta económica contrato interventoría.	29
Tabla 2-13. Forma de pago contrato de consultoría.....	29
Tabla 3-1. Estado de entregas EDT.....	31
Tabla 3-2. Cronograma detallado aprobado el 21/03/2025	31
Tabla 3-3. Seguimiento de Cronograma detallado. Corte 30 de marzo de 2025	32
Tabla 3-4 Indicadores de gestión. Corte 25 de marzo de 2025	35
Tabla 3-5. Actividades Ejecutada en el periodo comprendido entre 1 y 31 de marzo de 2025.	41
Tabla 3-6. Estado de entrega de componentes en el periodo comprendido entre 1 y 30 de abril de 2025.	42
Tabla 3-7. Estado de Actividades ejecutadas – cumplimiento de obligaciones.	48
Tabla 3-8. Estado metodologías de los Componente Etapa I.....	59
Tabla 3-9. Tabla resumen socialización ATO Los Colonizadores, Saravena.	61
Tabla 3-10. Tabla resumen socialización ATO Santiago Pérez Quiroz, Arauca.	63
Tabla 3-11. Tabla resumen socialización ATO Aguas Claras, Ocaña.	65
Tabla 3-12. Estado informes seguimiento semanal.....	69
Tabla 3-13. Estado de correspondencia enviada.	70
Tabla 3-14. Estado de correspondencia recibida del consultor.	72
Tabla 3-15. Estado de correspondencia recibida de la Entidad.....	75

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1-1. Localización Aeropuerto Los Colonizadores - Saravena.....	9
Ilustración 1-2. Localización Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz - Arauca.....	10
Ilustración 1-3. Localización Aeropuerto Aguas Claras - Ocaña.....	11
Ilustración 3-1. Curva S – Corte 30 de marzo de 2025.....	33
Ilustración 3-2. Jornada de Socialización ATO Los Colonizadores, Saravena – 17-02-2025.	62
Ilustración 3-3. Jornada de Socialización ATO Los Colonizadores, Saravena – 18-02-2025.	62
Ilustración 3-4 Jornada de Socialización ATO Los Colonizadores, Saravena – 18-02-2025.	63
Ilustración 3-5. Jornada de Socialización ATO Santiago Pérez Quiroz, Arauca – 20-02-2025.	64

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

Ilustración 3-6. Jornada de Socialización ATO Santiago Pérez Quiroz, Arauca – 20-02-2025.	64
Ilustración 3-7 Jornada de Socialización ATO Aguas Claras, Ocaña – 27-03-2025.	66
Ilustración 3-8. Jornada de Socialización ATO Aguas Claras, Ocaña – 27-03-2025.	66

Listado de Anexos

Anexo No. 1	Documentos legales contrato Consultoría
Anexo No. 2	Documentos legales contrato Interventoría
Anexo No. 3	Cronograma detallado de contrato
Anexo No. 4	Registro fotográfico del contrato
Anexo No. 5	Informes semanales
Anexo No. 6	Aprobación hojas de vida
Anexo No. 7	Correspondencia enviada y recibida
Anexo No. 8	Metodologías de trabajo
Anexo No. 9	Seguimiento Socializaciones

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

1. INTRODUCCIÓN

1.1. GENERALIDADES

1.1.1. Descripción General

En el presente informe se relacionan las actividades que se han realizado en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 24001385 H3 2024 cuyo objeto es: ***“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”***, durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2025, el cual corresponde al mes No. 3 de ejecución del contrato en mención.

La AEROCIVIL mediante Resolución 02706 del 4 de diciembre de 2024 abrió el proceso de contratación 24001385 H3 2024 con objeto ***“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”***, siendo adjudicado mediante Resolución 02991 del 23 de diciembre de 2024 al CONSORCIO INTER PMA NORTE suscribiendo el 30 de diciembre de 2024 el contrato de Interventoría No. 24001385 H3 2024.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato en el ámbito técnico, administrativo y financiero, con el fin de garantizar la calidad del proyecto, de la misma manera garantizar el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo del CONSORCIO INTER PMA NORTE, la legislación vigente y los documentos asociados al anexo técnico del proceso de contratación.

1.1.2. Alcance del Proyecto.

El alcance del contrato es ***“REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”***.

Para el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, se cuenta con la participación de especialistas en las diferentes áreas que apoyarán la actualización el Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca, así como la elaboración de los Esquemas de Planificación Aeroportuaria de los Aeropuertos Los Colonizadores de Saravena, Arauca y Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander.

Dentro del alcance del contrato se realizará lo correspondiente al análisis de conectividad multimodal e intermodal, integración operacional y económica de la zona de influencia, a nivel de factibilidad para la aeronave de diseño, mediante la elaboración de los documentos de planificación donde se establecerán las necesidades de la infraestructura física y

<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>	
<p align="center">VERSIÓN No. 0</p>		<p align="center">FECHA</p> <p align="right">30/11/2024</p>

tecnológica, así mismo, la definición de los servicios requeridos para la atención eficiente de la demanda actual y proyectada a 30 años, con base en el análisis de las demandas (actual y proyectada), enmarcado en el cumplimiento normativo en el lado aire, lado tierra y servicios complementarios.

Como parte del componente técnico del proyecto se determinarán las condiciones y/o elementos arquitectónicos para las diferentes infraestructuras propuestas, considerando la máxima expansión posible de acuerdo con las necesidades actuales y proyectadas.

Como parte del FORMATO 8, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del proceso de contratación 24001333 H3 DE 2024 se establecen los siguientes objetivos principales del proyecto:

“(…) • Analizar previamente el Plan Maestro vigente, si aplica, del (los) aeropuerto(s) e identificar las necesidades y problemáticas de la infraestructura que impactan los niveles de servicio y las condiciones operacionales, elaborar los estudios necesarios para actualizar los Planes Maestros, los cuales deben contemplar diferentes escenarios de desarrollo o crecimiento, de conformidad con los pronósticos y proyecciones de demanda e identificar la infraestructura que atienda las necesidades de cada escenario de crecimiento propuesto en los diferentes horizontes de planificación.

• Evaluar técnicamente la implantación de una Infraestructura Logística Especializada (ILE) a nivel de prefactibilidad.

• Elaborar los estudios y diseños a nivel de factibilidad para las actuaciones inmediatas para la operación de una Aeronave 4 Charlie – A320 para el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca y una aeronave 3 Charlie – ATR72 para los aeropuertos de Los Colonizadores de Saravena y Aguas Claras de Ocaña, así mismo, los estudios y diseños, para determinar las intervenciones inmediatas (PAL 0 a 1 año del Plan Maestro, si aplica, del (los) aeropuerto(s), de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en este documento y sus anexos. (...)”

Desarrollados en cinco (5) etapas, las cuales se presentan a continuación:

“(…) • ETAPA I. Caracterización y evaluación de la infraestructura existente en contraste con los pronósticos, proyecciones de la demanda y niveles de servicio.

• ETAPA II: Diagnóstico del Aeropuerto

• ETAPA III: Elaboración de los estudios de prefactibilidad

• ETAPA IV: Desarrollo de estudios a nivel de factibilidad para la operación de una Aeronave 4 Charli – A320 para el Aeropuerto de Arauca y Aeronave 3 Charlie – ATR72 para los aeropuertos de Saravena y Ocaña, así mismo, los estudios y diseños, para determinar las intervenciones inmediatas (PAL 0 a 1 año)

• ETAPA III: Viabilidad jurídica y financiera (...)”


<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>	
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p> <p>30/11/2024</p>

1.1.3. Localización y Área de Influencia

1.1.3.1. Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena

El aeropuerto Los Colonizadores en la ciudad de Saravena, departamento de Arauca con coordenadas 065701.32°N, 0715122.33°W, se encuentra a 1.4 km de Saravena, y a una distancia aproximada de 585 km de la capital del país, Bogotá. La Ilustración 1-1 presenta la ubicación del Aeropuerto en el Municipio de Saravena.

Ilustración 1-1. Localización Aeropuerto Los Colonizadores - Saravena.

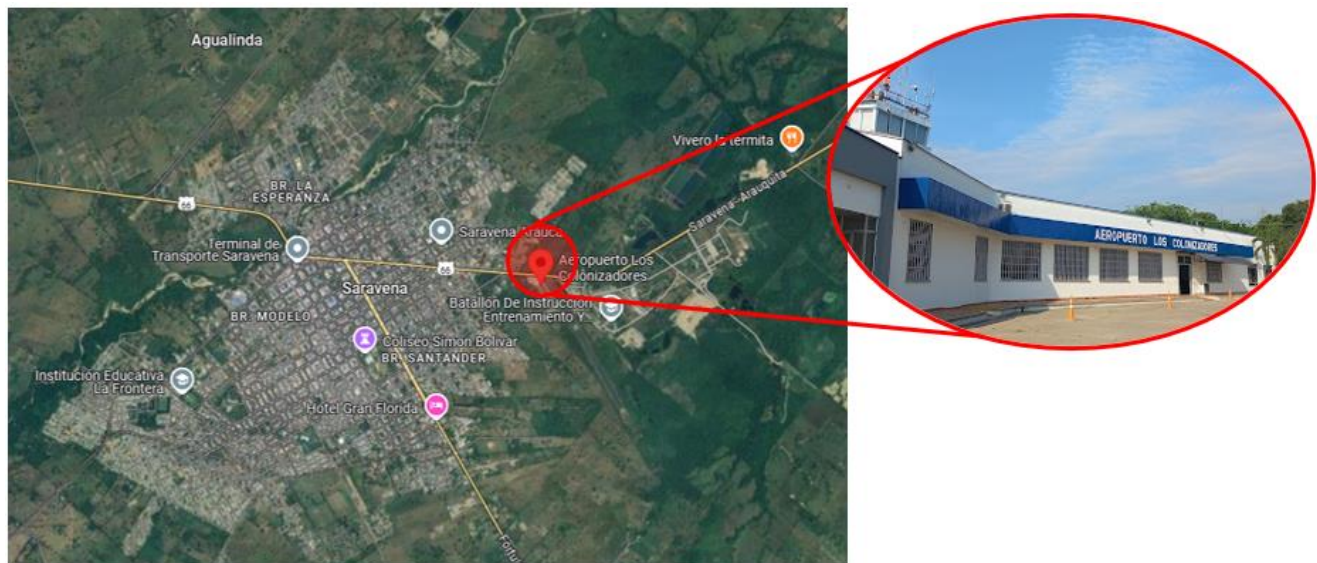

Fuente: Google Maps

Para acceder directamente al aeropuerto desde el municipio de Saravena, es necesario seguir la Ruta Nacional 66 con dirección al Puente Internacional José Antonio Páez.

En la actualidad, esta terminal aérea cuenta con operaciones comerciales, con vuelos de destino Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta.

El transporte por carretera hacia el Municipio de Saravena, esta caracterizado por dos carreteras a nivel nacional, con el Departamento de Norte de Santander se comunica por medio de la llamada “trocha de la soberanía” que a pesar de ser una vía arterial y no está en óptimas condiciones ha permitido la comunicación comercial entre los dos departamentos, por otro lado, se encuentra la vía Villavicencio-Yopal-Tame-Saravena, la cual facilita la interconexión con la capital del país.

Con respecto de las áreas de influencia del transporte fluvial, se cuenta con proximidad al Río Arauca y el Río Banadia, sin embargo, principalmente con presencia de embarcaciones pequeñas.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

1.1.3.2. Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca

El aeropuerto Santiago Pérez Quiroz en la ciudad de Arauca, departamento de Arauca con coordenadas 070408.08°N, 0704413.05°W, se encuentra a 4 km de Arauca, y a una distancia aproximada de 690 km de la capital del país, Bogotá. La Ilustración 1-2 presenta la ubicación del Aeropuerto en La Ciudad de Arauca.

Ilustración 1-2. Localización Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz - Arauca.



Fuente: Google Maps – Aerocivil.

Para acceder al aeropuerto desde la ciudad de Arauca, es necesario seguir la Ruta Nacional con dirección Vía Arauca – Arauquita, tomando la Carretera Nacional 66 que permite acceder al aeropuerto.

Actualmente esta terminal aérea cuenta con operaciones comerciales, con vuelos directos en las siguientes rutas:

- Bogotá – Arauca – Bogotá.
- Cúcuta – Arauca – Cúcuta.
- Bucaramanga – Arauca – Bucaramanga

El transporte por carretera hacia la Ciudad de Arauca se comunica con la República Bolivariana de Venezuela mediante el Puente Internacional José Antonio Páez, por otro lado, la conexión hacia el centro del país se facilita por la Ruta de los Libertadores, que une Caracas (Venezuela) con Bogotá (Colombia).


Con respecto a las áreas de influencia del transporte fluvial, a través del Río Arauca, se cuenta con dos puntos estratégicos: Puerto Armada Nacional de uso especial y el Paso de las Canoas, como punto de conexión hacia Venezuela.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

1.1.3.3. Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña

El aeropuerto Aguas Claras del Municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander con coordenadas 081854.39°N, 0732130.31°W, se encuentra a 10.7 km de Ocaña, y a una distancia aproximada de 635 km de la capital del país, Bogotá. La Ilustración 1-3 presenta la ubicación del Aeropuerto en el Municipio de Ocaña.

Ilustración 1-3. Localización Aeropuerto Aguas Claras - Ocaña.

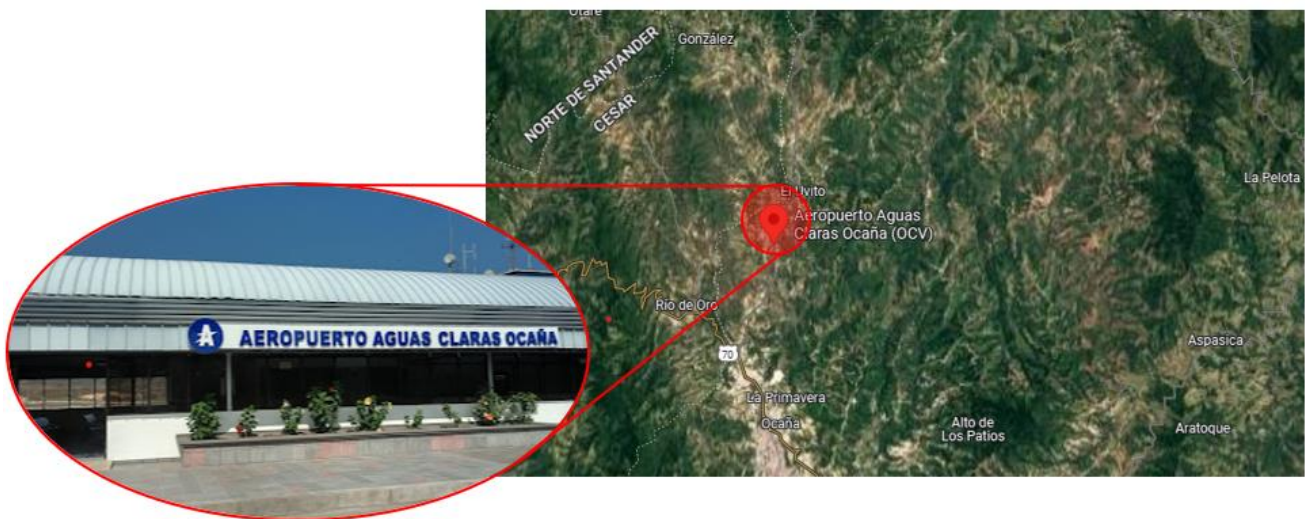

Fuente: Google Maps

Para acceder al aeropuerto desde el Municipio de Ocaña, es necesario seguir la vía Convención, posteriormente tomar la vía Aeropuerto Aguas Claras que permite acceder al aeropuerto.

Actualmente esta terminal aérea no cuenta con operaciones comerciales, se realizan únicamente vuelos de tipo Militar.

El transporte por carretera hacia el Municipio de Ocaña tiene como principal carretera de intercomunicación la vía Cucutá-Ocaña, la cual comunica al Municipio con el resto del país.

Con respecto de las áreas de influencia del transporte fluvial, se cuenta con proximidad al Río Catatumbo y el Río Tejo.

1.1.4. Descripción general del Contrato de Consultoría.

El contratista deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. 24001333 H3 de 2024, que tuvo apertura mediante Resolución No. 02579 del 19 de noviembre de 2024, con el objeto de contratar: “REALIZAR CONSULTORIA PARA

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”.

Que mediante Resolución No. 02894 del 16 de diciembre de 2024, la Entidad adjudicó el procedimiento de contratación de concurso de méritos No. 24001333 H3 DE 2024 al proponente tres (3) CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS, integrado por: CONSULTORA CAPITAL S.A.S. - BIC identificado con NIT 901.480.564-9 con una participación del 50%, CONSULTORA CENTRAL S.A.S. – BIC identificado con NIT 901.665.975–8 con una participación del 10% y SCADIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA AEROPOTUARIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. identificado con NIT 800.141.827–0 con una participación del 40%; por un valor de: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$9.476.507.267) incluido IVA, con plazo de ejecución de DOCE (12) MESES, término contado a partir de los requisitos de ejecución.

1.1.5. Descripción general del Contrato de Interventoría.

Mediante la Resolución 02706 del 4 de diciembre de 2024 la Entidad abrió el Proceso de Contratación 24001385 H3 24 con el objeto de: *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”.*

Que a través de la Resolución No. 02991 del 23 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el proceso de selección No. 24001385 H3 24, al proponente dos (2) CONSORCIO INTER PMA NORTE integrado por: INGEPLAN.CO SAS BIC identificado con NIT 800.169.622–1 con una participación del 40%, e INCOPLAN IN S.A.S identificado con NIT 901.472.564–5 con una participación del 60%; por un valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.407.194.389) incluido IVA, con plazo de ejecución de DOCE (12) MESES, término contado a partir de los requisitos de ejecución.

1.1.6. Objeto del Contrato de Consultoría 24001333 H3 DE 2024.

El objeto del Contrato es: *“REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”*

1.1.7. Objeto del Contrato de Interventoría 24001385 H3 2024.

El objeto del contrato es: *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A*

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”

1.2. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.

1.2.1. Contrato de Consultoría.

Tabla 1-1. Datos de Contrato de Consultoría

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 24001333 H3 DE 2024	
Objeto	“REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”
Contratista	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS <ul style="list-style-type: none"> • CONSULTORA CAPITAL S.A.S.-BIC - 50% • CONSULTORA CENTRAL S.A.S.-BIC – 10% • SCADIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA AEROPOTUARIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. – 40%
Nit	901.898.961-5
Representante Legal	FRANCISCO JOSÉ MEDINA BARRAGÁN
Fecha de Inicio	31 de diciembre de 2024
Plazo Inicial	12 meses
Fecha de Terminación	30 de diciembre de 2025
Valor de Contrato	\$9.476.507.267,00

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

1.2.2. Contrato de Interventoría.

Tabla 1-2. Datos de contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001385 H3 2024	
Objeto	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”
Contratista	CONSORCIO INTER PMA NORTE <ul style="list-style-type: none"> • INGEPLAN.CO SAS BIC - 40% • INCOPLAN IN S.A.S – 60%
Nit	901.900.799-6
Representante Legal	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Fecha de Inicio	31 de diciembre de 2024
Plazo Inicial	12 meses
Fecha de Terminación	30 de diciembre de 2025

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001385 H3 2024	
Valor de Contrato	\$2.407.194.389,00

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

1.3. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL PROFESIONAL.

1.3.1. Personal del Contratista de Obra

A continuación, se presenta la relación del personal por parte del Contratista, acorde con lo establecido en el Formato 8 Especificaciones Técnicas - contrato No. 24001333 H3 DE 2024.

Tabla 1-3. Directorio telefónico del personal del Consultor

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	ESTADO
DIRECTOR DE PROYECTO	MIGUEL ANGEL VARGAS PINZON	3203657195	miguel.vargas@cmconsultores.com.co	APROBADO
GERENTE O COORDINADOR DE PROYECTO	FAVIOLA ANDREA GUERRA	3004260034	andrea.guerra@cmconsultores.com.co	APROBADO
EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO AIRE	FRANCISO GUERRERO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA	NICOLAS GÓMEZ ANGARITA	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
EXPERTO EN PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS AERONÁUTICOS Y EN ESTUDIOS AERONÁUTICOS	JIMMY ENRIQUEZ	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
EXPERTO EN MODELOS DE TRANSPORTE	OSCAR CUELLAR	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE	LEONARDO RONDEROS	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSE ALARCON	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES	OSCAR MORENO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN ENERGÍA Y ELECTROMECÁNICA	GINA MILDRED BRICEÑO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	HEBERT ALEXIS ARIAS CANO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	EDISSON EDUARDO VALENCIA GÓMEZ	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	ABELINO GARCIA GUACANEME	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	ESTADO
ESPECIALISTA GEOTECNIA	ANDRES FELIPE GONZALEZ CATIBLANCO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	CRISTHIAN FELIPE DURAN CASTAÑO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN FINANCIACIÓN PÚBLICA	GERMAN ANDRES CASTRO GAONA	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	MARISOL CALDAS GONZALEZ	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	RICARDO IVAN RAVE IMEDIO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA ESPECIALIZADA (ILE)	LUIS HEINER GONZÁLEZ GALVIS	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN RIESGOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR LAUREANO ROSERO JIMÉNE	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO, URBANISMO Y CONECTIVIDAD	CAROLINA MÉNDEZ GONZÁLEZ	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS, FINANZAS PÚBLICAS Y ASPECTOS TRIBUTARIOS	WILLIAM RICAURTE ALZATE HERNANDEZ	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA	LUIS CAMILO SIERRA GOMEZ	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	CLAUDIA ELIZABETH TORRES PINEDA	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
EPECIALISTA AMBIENTAL	DIANA CAROLINA ORJUELA GARCIA	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA COORDINADOR APOYO SOCIAL	GRETTE NATELIE ACOSTA SICACHA	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
ESPECIALISTA COORDINADOR PREDIAL, CATASTRAL Y GEODESIA	ANDRES MAURICIO AGUIRRE CANO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
PROFESIONAL BIÓLOGO	YOHOLIMA MARTINEZ GUERRERO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
PROFESIONAL ARQUEÓLOGO	MARTHA YANNETH BONILLA USECHE	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	ESTADO
BIM MANAGER	ANDRES FELIPE GONZALEZ PARRA	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
COORDINADOR BIM	LUIS ESTEBAN DUREN CARRILLO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
MODELADOR BIM	KAREN JOHANNA CORDERO MARQUEZ	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
TOPÓGRAFO	JHOHAN ALEXANDER ORTIZ SANTOS	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO
CADENERO	JULIÁN LEGUIZAMÓN BAQUERO	6017434850	correspondencia.NS@cmconsultores.com.co	APROBADO

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

En el periodo del presente informe, el consultor, mediante comunicación NS-076, solicito el cambio de los siguientes profesionales:

Tabla 1-4. Cambio de Profesionales Consultor. Oficio NS-076

CARGO	PROFESIONAL APROBADO	PROFESIONAL PROPUESTO PARA CAMBIO
EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA	ORLANDO GÓMEZ	NICOLAS GÓMEZ ANGARITA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ ALARCÓN	ORLANDO GÓMEZ LAVERDE

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Una vez revisadas las hojas de vida de los profesionales propuestos, se remite a la consultoría la comunicación C155-CE-049-2025, indicando lo siguiente:

Tabla 1-5. Concepto de solicitud de cambio de profesionales.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO	OBSERVACIONES
NICOLAS GÓMEZ ANGARITA	EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA	79.968.987	APROBADO	
ORLANDO GÓMEZ	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	19.062.733	NO APROBADO	Formación Académica Solicitada: - Pregrado en Ingeniería y/o carrera afín. NO CUMPLE - Posgrado nivel de especialización y/o maestría en Diseño Geométrico. NO CUMPLE

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

1.3.2. Personal de Interventoría.

A continuación, se presenta la relación del personal de la Interventoría acorde con lo establecido en el Anexo 8. Especificaciones Técnicas - contrato No. 24001333 H3 DE 2024.

Tabla 1-6. Directorio telefónico del personal de Interventoría

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	ESTADO
DIRECTOR DE PROYECTO / INTERVENTORIA	PEDRO LUIS JIMENEZ	79346619	3153086383	direccion.interpma@ingeplan.co	APROBADO
GERENTE/COORDINADOR DE PROYECTO / INTEVENTORÍA	GINA PAOLA GONZALEZ	1032413025	3007221360	gina.gonzalez@ingeplan.co	APROBADO
EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO AIRE	ALEXANDER OSORIO	18386945	3148325409	int.ladoairens@ingeplan.co	APROBADO
EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA	JAIME BALAGUERA	19332574	3102715867	int.ladoairens@ingeplan.co	APROBADO
EXPERTO EN PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS AERONÁUTICOS Y EN ESTUDIOS AERONÁUTICOS	ARTURO GARCIA	6757277	3116302706	agarciatorres77@hotmail.com	APROBADO
EXPERTO EN MODELOS DE TRANSPORTE	OSCAR ARBELAEZ	71381356	3006598703	oarbelaez@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE	MAGDA ROJAS	52517597	3102640144	mfrojasr@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN	EFRAIN SERRANO	91541593	3212084669	efrainserrano11@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTE EN TELECOMUNICACIONES	EDWIN FORERO	80029906	3106132150	edwinmaximinoforerobohorquez@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA EN ENERGÍA Y ELECTROMECÁNICA	LUIS ALEJANDRO GARCÍA	80728167	3173715352	alejogarcia.ch@gmail.com	EN AEROCIVIL
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JUAN RICARDO TORRES	79406449	3118205475	juan.torres@jrtestructurales.com	APROBADO

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	ESTADO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	FRANCISCO MONTES	17416594	3212032304	francisco@pavimentosygeotecnia.com	APROBADO
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	OLGA TORRES	52269174	3212179758	olgatorr@yahoo.com	APROBADO
ESPECIALISTA GEOTECNIA	VIVIANA GONZALEZ	52386154	3158775484	vivianagonzaleza@hotmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	PABLO SEGURA	79243465	3158840844	pseguraa@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA EN FINANCIACIÓN PÚBLICA	ALVARO HERNANDO FLOREZ FORERO	79979910	3176372359	alvaroflorez@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	CAROLINA CARDOZO	52778495	3125829082	carolina.cardozo@ingeplan.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	NICOLAS CRISTOBAL URIBE GRANADOS	80762147	3185865177	nicolasuribegranados@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA LOGISTICA ESPECIALIZADA (ILE)	JHON CASTAÑO ALZATE	79428888	6016754055	interventoria.planmaestro@ingeplan.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN RIESGOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ROGELIO PINEDA	10276616	3117644154	rogeliopinedamurillo@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO, URBANISMO Y CONECTIVIDAD	MARLON CHANGÜENDO	16929597	6016754055	interventoria.planmaestro@ingeplan.co	APROBADO
ESPECIALISTA JURÍDICO EN PRESUPUESTOS, FINANZAS PÚBLICAS Y ASPECTOS TRIBUTARIOS	EDICSON PEREZ JIMENEZ	80721283	3013498178	interventoria.planmaestro@ingeplan.co	APROBADO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA	JUAN CAMILO BURGOS	1020742243	3008320435	juan_c_burgos@hotmail.com	EN AEROCIVIL
ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA	GUSTAVO SANCHEZ	79968574	3184334345	gustanchez@hotmail.com	APROBADO

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	ESTADO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	JOSE LUIS VERGARA	1044101106	3148031036	jluisveta@gmail.com	APROBADO
ESPECIALISTA COORDINADOR APOYO SOCIAL	ALEXANDRA ORTIZ	52963629	3123169331	profesional.social@ingeplan.co	APROBADO
ESPECIALISTA COORDINADOR PREDIAL, CATASTRAL Y GEODÉSIA	LIZBETH ROCIO GONZALEZ BOGOTA	52954720	3103128225	lizabethgonzalezb@gmail.com	APROBADO
PROFESIONAL BIOLOGO	CESAR AUGUSTO RIAÑO	80419322	3162990116	cesar.riano@gmail.com	APROBADO
PROFESIONAL ARQUEOLOGO	ANGELA MORALES	1053778196	6016754055	interventoria.planmaestro@ingeplan.co	APROBADO
BIM MANAGER	JOSE JOAQUIN CORTES	1052382838	6016754055	interventoria.planmaestro@ingeplan.co	APROBADO
COORDINADOR BIM	ANDRES VILLAMIL	1018450051	6016754055	interventoria.planmaestro@ingeplan.co	APROBADO
TOPÓGRAFO	DIEGO LEON QUEBRADA	1013664945	3057629505	diegoleon0202@gmail.com	APROBADO
CADENERO	ZUZETTE SANTANA	1098749111	3172348265	zuzette.santana@ingeplan.co	APROBADO

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Es importante destacar que la columna “estado” refleja la información con corte a 31 de marzo de 2025.

Mediante la comunicación de la Aerocivil 1628863 con radicado 2025260020009981 del 11 de marzo de 2025, la Interventoría recibió la aprobación de las hojas de vida presentadas en la comunicación C155-CE-029-2024 del 27 de febrero de 2025 con radicado de la Entidad No. 2025190010024864.

El 26 de marzo de 2025, mediante la comunicación C155-CE-052-2025, la interventoría remitió a la Entidad la solicitud de cambio de los siguientes profesionales de la interventoría:

CARGO	PROFESIONAL APROBADO	PROFESIONAL PROPUESTO PARA CAMBIO
ESPECIALISTA EN ENERGÍA Y ELECTROMECAICA	CRISTIAN CAMILO BOTELLO	LUIS ALEJANDRO GARCÍA

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

CARGO	PROFESIONAL APROBADO	PROFESIONAL PROPUESTO PARA CAMBIO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA	GINNA PAOLA GARCÍA BOHORQUEZ	JUAN CAMILO BURGOS

A la fecha de corte del presente informe, no se cuenta con la aprobación por parte de la Entidad de las hojas de vida propuestas para cambio de profesionales.

Nota: Los oficios de aprobación del personal postulado por la Interventoría en caso de presentarse, serán relacionados en el Anexo No. 6.

1.3.3. Profesionales del AEROCIVIL asignados como Supervisión y Apoyo para el desarrollo del proyecto.

La tabla a continuación presenta los profesionales designados por la Entidad para realizar la supervisión del contrato:

Tabla 1-7. Directorio telefónico personal del AEROCIVIL asignados como Apoyo a la Supervisión

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTACTO	CORREO ELECTRONICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JUAN CARLOS VALENCIA RIVEROS	3002285828	juan.valenciar@aerocivil.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN	PABLO ALEJANDRO GIRALDO	3113054041	pablo.agiraldo@aerocivil.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LIZ MILENA SANCHEZ PACHECO	3114054783	liz.sanchez@aerocivil.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDGAR CAMILO MARIN LAGOS	3502409963	edgar.marin@aerocivil.gov.co

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

A continuación, se presenta el estado actual de las garantías y el estado financiero de los contratos de obra y de la Interventoría.

2.1. SEGUIMIENTO A GARANTIAS Y VIGENCIAS

2.1.1. Contrato de Consultoría

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 18 - Garantías del Contrato No. 24001333 H3 2024, a continuación, se presenta el estado actual de las pólizas generadas para el contrato, teniendo en cuenta que se amparan los perjuicios derivados del incumplimiento en desarrollo del proyecto.

Las vigencias y valores asegurados en dichas pólizas se registran en la siguiente tabla. La información correspondiente a las garantías y vigencias del contrato de consultoría se encuentra incluida en el Anexo No. 1.

Tabla 2-1. Pólizas Contrato de Consultoría

AMPARO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CAUSA MODIFICACIÓN
				Desde	Hasta	
Cumplimiento de Contrato	Seguros del Estado	11-44-101245333	\$ 1.895.301.453,40	31/12/2024	01/05/2026	Acta No 1. de Inicio del Contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado	11-44-101245333	\$ 1.895.301.453,40	31/12/2024	31/12/2028	Acta No 1. de Inicio del Contrato
Calidad de servicio	Seguros del Estado	11-44-101245333	\$ 2.842.952.180,10	31/12/2025	31/12/2030	Acta No 1. de Inicio del Contrato
Responsabilidad Civil Extracontractual, Predios, Laborales y Operacionales	Seguros del Estado	11-40-101072808	\$ 650.000.000	27/01/2025	27/01/2026	Acta No 1. de Inicio del Contrato

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Las referidas garantías fueron publicadas en SECOPII, a la fecha no se cuenta con la aprobación por parte de la Entidad.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

2.1.2. Contrato de Interventoría

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 17 - Garantías del Contrato No. 24001385 H3 2024, a continuación, se presenta el estado actual de las pólizas generadas para el contrato.

Las vigencias y valores asegurados en dichas pólizas se registran en la siguiente tabla. La información correspondiente a las garantías y vigencias del contrato de Interventoría se encuentra incluida en el Anexo No. 2.

Tabla 2-2. Pólizas Contrato de Interventoría

AMPARO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CAUSA MODIFICACIÓN
				Desde	Hasta	
Cumplimiento de Contrato	Seguros del Estado	65-44-101236550	\$ 481.438.877,80	31/12/2024	01/05/2026	Acta de Inicio
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado	65-44-101236550	\$ 481.438.877,80	31/12/2024	31/12/2028	Acta de Inicio
Calidad de servicio	Seguros del Estado	65-44-101236550	\$ 481.438.877,80	31/12/2025	31/12/2030	Acta de Inicio
Responsabilidad Civil Extracontractual, Predios, Laborales y Operacionales	Seguros del Estado	65-40-101079550	\$ 390.000.000	31/12/2024	31/12/2025	Acta de Inicio

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Las referidas garantías se encuentran actualizadas en SECOPII, a la fecha no se cuenta con la validación por parte de la Entidad.

2.2. ADICIONES, MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS.

2.2.1. Contrato de Consultoría

Para el presente periodo no se presentaron Adiciones, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas, para el contrato de consultoría 24001333 H3 DE 2024.

2.2.2. Contrato de Interventoría

Para el presente periodo no se presentaron Adiciones, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas, para el contrato de interventoría 24001385 H3 2024.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

2.3. CONTROL LEGAL.

A continuación, se presentan los cuadros de control legal de los Contratos de Consultoría y de la Interventoría.

2.3.1. Contrato de Consultoría

En la siguiente tabla se presenta la relación de actas legales suscritas por el Consultor a la fecha de corte del periodo en evaluación. Ver Anexo No. 1.

Tabla 2-3. Actas suscritas contrato de Consultoría

ACTA No.	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	Acta de Inicio de contrato de Consultoría	31/12/2024

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

2.3.2. Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se presenta la relación de actas legales suscritas por la Interventoría a la fecha de corte del periodo en evaluación. Ver Anexo No. 2.

Tabla 2-4. Actas suscritas contrato de Interventoría

ACTA No.	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	Acta de Inicio de contrato de Interventoría	31/12/2024

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

2.4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

2.4.1. Contrato de Consultoría

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. 24001333 H3 DE 2024, en donde se destacan las siguientes etapas para el desarrollo del proyecto:

Tabla 2-5. Etapas de desarrollo del proyecto.

ETAPA I. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Componente 1 - Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de contrato y presentación del equipo consultor.
Componente 2 - Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

Componente 3 - Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).
Componente 4 - Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario (índice) - Contenido mínimo y capítulo de Introducción.
Componente 5 - Diagnóstico de la situación actual (levantamiento de inventario, fichas y DOFA).
ETAPA II. DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO.
Componente 6 - Levantamiento topográfico método tradicional, levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del aeropuerto y modelo digital del terreno. Análisis Tecnológico Actual Versus La Tecnología Requerida para optimizar la operación Aeroportuaria.
Componente 7 – Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.
Componente 8 - Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.
Componente 9 - Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres del (los) aeropuerto(s).
Componente 10 - Estudios Operacionales;
10.1. Análisis de obstáculos dentro de los estudios operacionales.
10.2. Análisis del estudio operacional del sistema aeroportuario de la región.
Componente 11 – Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.
Componente 12 – Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas
ETAPA III. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD.
Componente 13 - Alternativa de desarrollo e impactos.
Componente 14 - Presentación de alternativas.
Componente 15 – Levantamiento Topográfico de Alternativas.
Componente 16 - Estrategias de Desarrollo CAME – DOFA por fases Análisis Jerárquico (AHP Analytic Hierarchy Process).
Componente 17 - Desarrollo de la alternativa seleccionada y Requisitos de las Instalaciones a prefactibilidad.
Componente 18- Elaboración de estudios de capacidad operacional, ATM (GESTION DE TRANSITO AEREO) Y CNS (COMUNICACIÓN NAVEGACION Y VIGILANCIA), Análisis de obstáculos dentro los estudios operacionales del (los) Aeropuerto(s), Modelo Digital LiDAR SLO.
Componente 19 - Análisis Económico y Social del sector.
Componente 20 - Análisis de impacto Urbano, social, la conectividad al (los) aeropuerto(s) intermodal y multimodalmente.
Componente 21 - Propuesta técnica y jurídica para implantar el uso de infraestructuras logísticas especializadas (ILE) del (los) aeropuerto(s).

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

Componente 22 - Estudios Geotécnicos y Geomorfológicos.
Componente 23 y 24 - Estimación de costos integrales – Programa de Mejoras.
Componente 25 - Modelos de simulación de los escenarios con recomendaciones propuestas y conclusiones. Componente 26 - Diseño de las Instalaciones Recomendadas Renders y Video Institucional.
Componente 27 - Socialización de los productos de LA CONSULTORÍA a la Dirección General, la Subdirección General, la Oficina de Gestión de Proyectos, la Secretaría de Servicios Aeroportuarios, la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, la Secretaría General y aprobación por parte de las Secretarías de AEROCIVIL.
Componente 28. Documento final y Publicación.
ETAPA IV. DESARROLLO DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD.
Componente 29 - Estudios y diseños a nivel de Factibilidad. subcomponentes de acuerdo con el Anexo de Factibilidad
ETAPA V. VIABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA
Componente 30 - LA CONSULTORÍA deberá realizar las actividades y entregar los productos finales detallados en el Anexo Jurídico y Financiero del contrato de consultoría

Fuente: FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINITIVOS

Durante el presente periodo, el Consultor adelantó las actividades relacionadas con las obligaciones contractuales establecidas, razón por la cual, no se presentaron presuntos incumplimientos.

2.4.2. Contrato de Interventoría

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos precontractuales del proceso; Concurso de Méritos No. 24001385 H3 2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

Durante el periodo en evaluación, la Interventoría cumplió con las obligaciones contractuales establecidas.

2.5. BALANCE FINANCIERO

2.5.1. Contrato de Consultoría.

El valor del contrato es por la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$9.476.507.267) incluido IVA, equivalentes a 7.289,62 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		 INTER PMA NORTE CONSORCIO
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

Tabla 2-6. Vigencia presupuestal

VIGENCIA	VALOR
2024	\$ 880.796.185
2025	\$ 8.595.711.082

Fuente: Minuta del Contrato 24001333 H3 DE 2024.

“(...) El Consultor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. (...)”

De acuerdo con la oferta económica presentada por el consultor se tiene un presupuesto independiente para cada aeropuerto, a continuación, se presenta de forma resumida la propuesta económica para cada uno de ellos:

2.5.1.1. Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena.

Tabla 2-7. Propuesta económica Aeropuerto SKSA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	ETAPA I CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS (Componentes 1, 2, 3, 4 y 5)	\$ 349.164.978
2	ETAPA II DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO (Componentes 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)	\$ 711.456.457
3	ETAPA III ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (Componentes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28)	\$ 727.208.259
4	ETAPA IV DESARROLLO DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Componente 29)	\$ 719.331.358
5	ETAPA V - VIABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA (Componente 30)	\$ 118.138.526
VALOR TOTAL		\$ 2.625.299.578
VALOR TOTAL CON IVA		\$ 3.124.106.498

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

2.5.1.2. Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca.

Tabla 2-8. Propuesta económica Aeropuerto SKUC.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	ETAPA I CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS (Componentes 1, 2, 3, 4 y 5)	\$ 383.343.110
2	ETAPA II DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO (Componentes 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)	\$ 781.097.615
3	ETAPA III ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (Componentes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28)	\$ 798.391.287
4	ETAPA IV DESARROLLO DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Componente 29)	\$ 789.743.448
5	ETAPA V - VIABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA (Componente 30)	\$ 129.702.556
VALOR TOTAL		\$ 2.882.278.016
VALOR TOTAL CON IVA		\$ 3.429.910.839

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

2.5.1.3. Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña

Tabla 2-9. Propuesta económica Aeropuerto SKOC.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	ETAPA I CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS (Componentes 1, 2, 3, 4 y 5)	\$ 326.631.360
2	ETAPA II DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO (Componentes 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)	\$ 665.542.094
3	ETAPA III ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (Componentes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28)	\$ 680.277.344
4	ETAPA IV DESARROLLO DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Componente 29)	\$ 672.908.723
5	ETAPA V - VIABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA (Componente 30)	\$ 110.514.370
VALOR TOTAL		\$ 2.455.873.891
VALOR TOTAL CON IVA		\$ 2.922.489.930

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

Se aclara que, de acuerdo con la Clausula 6. Anticipo y/o Pago Anticipado, para este contrato la Entidad no entregará al consultor ningún pago por este concepto.

La forma de pago para todos los Aeropuertos se realizará conforme con la Cláusula 8. Forma de Pago del contrato de consultoría 24001333 H3 DE 2024, como se describe a continuación:

Tabla 2-10. Forma de pago contrato de consultoría.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	% DE PAGO	TOTAL PAGO
1	ETAPA I CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS (Componentes 1, 2, 3, 4 y 5)	9.29%	\$ 880.367.525
2	ETAPA II DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO (Componentes 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)	20.86%	\$ 1.976.799.416
3	ETAPA III ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (Componentes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28)	20.82%	\$ 1.973.008.813
4	ETAPA IV DESARROLLO DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Componente 29)	34.14%	\$ 3.235.279.581
5	ETAPA V - VIABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA (Componente 30)	14.89%	\$ 1.411.051.932
VALOR TOTAL CON IVA			\$ 9.476.507.267

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

2.5.2. Contrato de Interventoría

El valor del contrato es por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.407.194.389) incluido IVA, equivalentes a 1.851 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Tabla 2-11. Vigencia presupuestal

VIGENCIA	VALOR
2024	\$ 220.199.046
2025	\$2.186.995.343

Fuente: Minuta del Contrato 24001385 H3 2024.

“(…) El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. (...)”

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

Se aclara que, de acuerdo con la Clausula 6. Anticipo y/o Pago Anticipado, para este contrato la Entidad no entregará al interventor ningún pago por este concepto.

La asignación presupuestal para el Contrato de Interventoría cuenta con la siguiente distribución, resumida, de acuerdo con el proceso de adjudicación:

Tabla 2-12. Propuesta económica contrato interventoría.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
A	COSTOS DIRECTOS	
1	PERSONAL PLAN MAESTRO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.011.212.720
B	OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 11.639.708
VALOR TOTAL		\$ 2.022.852.428
VALOR IVA		\$ 384.341.961
VALOR TOTAL CON IVA		\$ 2.407.194.389

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Tabla 2-13. Forma de pago contrato de consultoría.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	% DE PAGO	TOTAL PAGO
1	ETAPA I CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS (Componentes 1, 2, 3, 4 y 5)	9.15%	\$ 220.258.287
2	ETAPA II DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO (Componentes 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)	21.23%	\$ 511.047.369
3	ETAPA III ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (Componentes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28)	24.38%	\$ 586.873.992
4	ETAPA IV DESARROLLO DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Componente 29)	35.66%	\$ 858.405.519
5	ETAPA V - VIABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA (Componente 30)	9.58%	\$ 230.609.222
VALOR TOTAL CON IVA			\$ 9.476.507.267

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

2.6. CONTROL FINANCIERO

2.6.1. Contrato de Consultoría.

A la fecha de corte del presente informe, la Consultoría NO ha tramitado ningún acta de pago.

2.6.2. Contrato de Interventoría.

A la fecha de corte del presente informe, la Interventoría NO ha tramitado ningún acta de pago.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA
		30/11/2024

3. INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO

3.1. CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO

Para el presente periodo aún no se cuenta con el cronograma detallado aprobado por parte de la interventoría, la tabla a continuación presenta el resumen de las versiones presentadas por parte de la consultoría y revisadas por la Interventoría:

Tabla 3-1. Estado de entregas EDT.

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA DE ENVIO	ESTADO CON CORTE A INFORME No. 3
--	Entrega versión D – Cronograma detallado.	04/03/2025	Se solicito al consultor incluir en el cronograma tiempo de revisión para la interventoría mediante correo electrónico el 14/03/2025.
NS-079	Entrega NS-079 Propuesta Cronograma Versión D	18/03/2025	Se aprueba el cronograma detallado en versión D, mediante comunicación: C155-CE-046-2025 del 25/03/2025.

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

A la fecha del presente informe, se aprobó el cronograma detallado en su versión D, se presenta a continuación el resumen de las actividades principales.

Tabla 3-2. Cronograma detallado aprobado el 21/03/2025

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	CONTRATO DE CONSULTORÍA 24001333 H3 DE 2024	260 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25
1.1	INICIO CONSULTORÍA	0 días	jue 2/01/25	jue 2/01/25
1.2	PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA (36%)	260 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25
1.2.1	INICIO PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días	jue 2/01/25	jue 2/01/25
1.2.2	ETAPA I (CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)	78 días	jue 2/01/25	lun 21/04/25
1.2.3	ETAPA II (DIAGNÓSTICO AEROPUERTO)	60 días	mié 12/03/25	mié 4/06/25
1.2.4	ETAPA III (ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD)	93 días	jue 22/05/25	mar 30/09/25
1.2.5	ETAPA IV (DISEÑOS DE FACTIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA)	56 días	mar 16/09/25	mié 3/12/25
1.2.6	ETAPA V (VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA)	56 días	mar 16/09/25	mié 3/12/25
1.2.7	ENTREGA FINAL	20 días	jue 4/12/25	mié 31/12/25
1.2.8	FIN PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25
1.3	EPA LOS COLONIZADORES DE SARAVERA (33%)	260 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25
1.3.1	INICIO EPA LOS COLONIZADORES DE SARAVERA	0 días	jue 2/01/25	jue 2/01/25
1.3.2	ETAPA I (CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)	78 días	jue 2/01/25	lun 21/04/25
1.3.3	ETAPA II (DIAGNÓSTICO AEROPUERTO)	60 días	mié 12/03/25	mié 4/06/25
1.3.4	ETAPA III (ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD)	93 días	jue 22/05/25	mar 30/09/25

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1.3.5	ETAPA IV (DISEÑOS DE FACTIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA)	56 días	mar 16/09/25	mié 3/12/25
1.3.6	ETAPA V (VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA)	56 días	mar 16/09/25	mié 3/12/25
1.3.7	ENTREGA FINAL	20 días	jue 4/12/25	mié 31/12/25
1.3.8	FIN EPA LOS COLONIZADORES DE SARAVENA	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25
1.4	EPA AGUAS CLARAS OCAÑA (31%)	260 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25
1.4.1	INICIO EPA AGUAS CLARAS DE OCAÑA	0 días	jue 2/01/25	jue 2/01/25
1.4.2	ETAPA I (CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)	90 días	jue 2/01/25	mié 7/05/25
1.4.3	ETAPA II (DIAGNÓSTICO AEROPUERTO)	60 días	mié 12/03/25	mié 4/06/25
1.4.4	ETAPA III (ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD)	93 días	jue 22/05/25	mar 30/09/25
1.4.5	ETAPA IV (DISEÑOS DE FACTIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA)	56 días	mar 16/09/25	mié 3/12/25
1.4.6	ETAPA V (VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA)	56 días	mar 16/09/25	mié 3/12/25
1.4.7	ENTREGA FINAL	20 días	jue 4/12/25	mié 31/12/25
1.4.8	FIN EPA AGUAS CLARAS DE OCAÑA	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25
1.5	FIN CONSULTORÍA	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

A continuación, se presenta el seguimiento al cronograma desarrollado en conjunto con la consultoría, con corte al 30 de marzo de 2025.

Tabla 3-3. Seguimiento de Cronograma detallado. Corte 30 de marzo de 2025

No.	SEMANA	INICIO	FIN	DÍAS	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DESV
					% PROGR. SEMANAL	% PROGR. ACUMULADO	% EJEC. SEMANAL	% EJEC. ACUMULADO	
1	SEMANA 1	31/12/2024	10/01/2025	10,00					
2	SEMANA 2	11/01/2025	17/01/2025	17,00					
3	SEMANA 3	18/01/2025	24/01/2025	24,00					
4	SEMANA 4	25/01/2025	31/01/2025	31,00					
5	SEMANA 5	1/02/2025	7/02/2025	38,00					
6	SEMANA 6	8/02/2025	14/02/2025	45,00					
7	SEMANA 7	15/02/2025	21/02/2025	52,00					
8	SEMANA 8	22/02/2025	28/02/2025	59,00					
9	SEMANA 9	1/03/2025	7/03/2025	66,00					
10	SEMANA 10	8/03/2025	14/03/2025	73,00					
11	SEMANA 11	15/03/2025	21/03/2025	80,00	34,00%	34,00%	25,00%	25,00%	9,00%
12	SEMANA 12	22/03/2025	28/03/2025	87,00	2,00%	36,00%	1,00%	26,00%	10,00%


Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Nota: Los cortes para el seguimiento del contrato se hacen todos los domingos.

Una vez evaluados los porcentajes programados de acuerdo con el cronograma y los porcentajes ejecutados, conforme con los entregables y los avances documentales del consultor se construye la curva S como se presenta a continuación:

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

Ilustración 3-1. Curva S – Corte 30 de marzo de 2025.

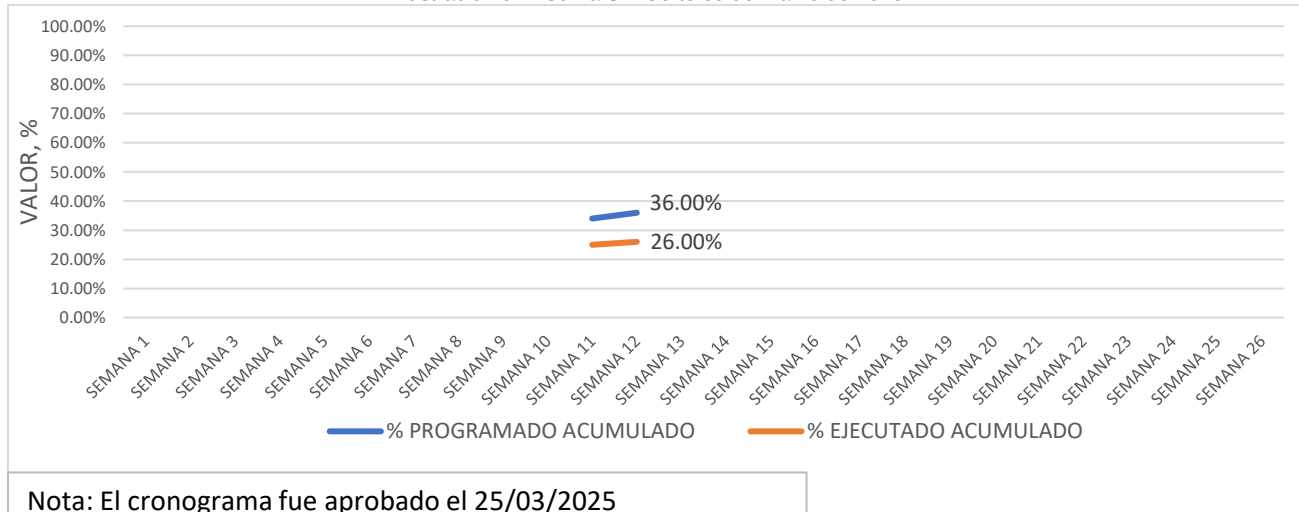

Para el reporte del presente periodo, se realizó seguimiento al cronograma con corte al 30 de marzo de 2025, según el cronograma aprobado por la Interventoría, se evidencia lo siguiente:

PROGRAMADO: 36%
EJECUTADO: 26%
ESTADO: -10%

De acuerdo con el comité de seguimiento del proyecto No 11, realizado el 1 de abril de 2025, se indicó a la consultoría que las actividades que presentan variación son:

- Componente 1: Metodologías de trabajo.
- Componente 4: Estructura Plan Maestro y/o Esquema de Planificación.
- Componente 6: Levantamiento Topográfico.

A lo cual la consultoría manifiesta al respecto que:

- Componente 1: Metodologías de trabajo.

El consultor ha dado respuesta a las observaciones de los componentes social, ambiental, predial y geotécnica, con relación a la comunicación de metodología general en la cual la interventoría solicitó la revisión de metodologías específicas, para lo cual el consultor informa que dará respuesta aclarando la procedencia de elaborar estas metodologías solicitadas. Se ha insistido en lograr estar a punto con el cronograma, para lo cual el consultor indicó que en algunos otros temas se está trabajando de tal manera cuando se

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

ajusten los documentos de metodología, se podrá nivelar el avance de acuerdo con el cronogramama.

Adicionalmente, solicita mesas de trabajo para revisar puntualmente las observaciones de las metodologías (red aeroportuaria, prognosis y cálculo de demanda), para determinar el alcance específico que se espera recibir por parte de la interventoría, con la participación de los especialistas que remitieron las observaciones. La interventoría ya gestiono dicha reunión con el fin de lograr tener en el menor tiempo dichas metodologías ajustadas.

- Componente 4: Estructura Plan Maestro y/o Esquema de Planificación.

Se aclara que esta entregado en versión B, y se encuentra en revisión de la interventoría.

- Componente 6: Levantamiento Topográfico.

El consultor, aclara con relación a los trabajos de campo del componente de levantamiento topográfico dieron inicio el 1 de abril de 2025.

Así las cosas, la interventoría ha realizado el respectivo seguimiento al avance del proyecto y ha solicitado a la consultoría determinar las estrategias para mitigar la desviación presentada a la fecha con el fin de no generar cambios en el cronograma de trabajo.

Se presenta el cronograma aprobado, así como el respectivo seguimiento, en los documentos de soporte en el Anexo No. 3.

3.1.1. Indicadores de Gestión

De acuerdo con el desarrollo del seguimiento del cronograma, del periodo No. 3 correspondiente al mes de marzo se presenta a continuación los indicadores de ejecución de actividades del proyecto:

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

Tabla 3-4 Indicadores de gestión. Corte 25 de marzo de 2025

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMAD O CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE PROGRAMAD O CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	EJECUTADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	OBJETIVO CUMPLIDO	OBS.
	CONTRATO DE CONSULTORÍA 24001333 H3 DE 2024	260	36%	26%	15,74%	12,02%	\$ 1.514.266.829	\$ 1.079.476.007		
	PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA (36%)	260	36%	26%	5,74%	4,38%	\$ 549.488.612	\$ 393.523.552		
	ETAPA II - CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS, EN LOS DIFERENTES HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.	78	96%	72%	4,62%	3,47%	\$ 437.931.169	\$ 328.448.377		
1	Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de contrato y presentación del equipo consultor.	57	100%	67%	0,65%	0,44%	\$ 61.738.417	\$ 41.364.739	NO	
2	Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental.	40	100%	82%	0,65%	0,53%	\$ 61.738.417	\$ 50.625.502	NO	
3	Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).	50	74%	74%	0,46%	0,46%	\$ 43.148.293	\$ 43.148.293		
4	Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario (índice) - Contenido mínimo y capítulo de Introducción.	20	100%	85%	1,48%	1,26%	\$ 140.626.394	\$ 119.532.435	NO	
5	Diagnóstico de la situación actual (levantamiento de inventario, fichas y DOFA).	43	83%	83%	1,17%	1,17%	\$ 111.026.253	\$ 111.026.253		

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMAD O CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE PROGRAMAD O CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	EJECUTADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	OBJETIVO CUMPLIDO	OBS.
	ETAPA II - DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO	60	12%	7%	1,18%	0,69%	\$ 111.557.444	\$ 65.075.175		
6	Levantamiento topográfico método tradicional y levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del (los) aeropuerto(s).	33	18%	0%	0,52%	0,00%	\$ 49.467.368	\$ -		
7	Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.	45	27%	27%	0,27%	0,27%	\$ 25.842.435	\$ 25.842.435		
8	Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.	20	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
9	Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres del (los) aeropuerto(s).	15	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
10	Estudios Operacionales	35	40%	40%	0,48%	0,48%	\$ 45.108.175	\$ 45.108.175		
11	Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.	15	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
12	Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas.	17	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE PROGRAMADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	EJECUTADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	OBJETIVO CUMPLIDO	OBS.
	EPA LOS COLONIZADORES DE SARAVERA (33%)	260	36%	38%	5,23%	4,10%	\$ 500.482.053	\$ 358.428.876		
	ETAPA II - CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS, EN LOS DIFERENTES HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.	78	96%	72%	4,21%	3,16%	\$ 398.886.071	\$ 299.164.553		
1	Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de contrato y presentación del equipo consultor.	57	100%	67%	0,59%	0,40%	\$ 56.233.938	\$ 37.676.739	NO	
2	Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental.	40	100%	85%	0,59%	0,50%	\$ 56.233.938	\$ 47.798.848	NO	
3	Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).	50	74%	74%	0,41%	0,41%	\$ 39.301.275	\$ 39.301.275		
4	Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario (índice) - Contenido mínimo y capítulo de Introducción.	20	100%	100%	1,35%	1,35%	\$ 128.088.416	\$ 128.088.416	NO	
5	Diagnóstico de la situación actual (levantamiento de inventario, fichas y DOFA).	43	83%	83%	1,07%	1,07%	\$ 101.127.366	\$ 101.127.366		

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO O CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE PROGRAMADO O CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	EJECUTADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	OBJETIVO CUMPLIDO	OBS.
	ETAPA II - DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO	60	12%	7%	1,07%	0,63%	\$ 101.595.982	\$ 59.264.323		
6	Levantamiento topográfico método tradicional y levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del (los) aeropuerto(s).	33	18%	0%	0,47%	0,00%	\$ 44.987.151	\$ -		
7	Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.	45	27%	27%	0,25%	0,25%	\$ 23.618.254	\$ 23.618.254		
8	Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.	20	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
9	Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres del (los) aeropuerto(s).	15	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
10	Estudios Operacionales	35	40%	40%	0,44%	0,44%	\$ 41.238.221	\$ 41.238.221		
11	Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.	15	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
12	Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas.	17	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
	VERSIÓN No. 0	FECHA	30/11/2024

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO O CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE PROGRAMADO O CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	EJECUTADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	OBJETIVO CUMPLIDO	OBS.
	EPA AGUAS CLARAS DE OCAÑA (31%)	260	35%	26%	4,77%	3,54%	\$ 464.296.164	\$ 327.523.579		
	ETAPA II - CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS, EN LOS DIFERENTES HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.	90	95%	70%	3,90%	2,87%	\$ 369.256.752	\$ 272.083.923		
1	Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de contrato y presentación del equipo consultor.	57	100%	67%	0,56%	0,37%	\$ 52.604.840	\$ 35.245.243		
2	Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental.	40	85%	50%	0,47%	0,28%	\$ 44.714.114	\$ 26.302.420	NO	
3	Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).	50	50%	55%	0,26%	0,29%	\$ 24.841.174	\$ 27.325.292	NO	
4	Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario (índice) - Contenido mínimo y capítulo de Introducción.	20	100%	85%	1,26%	1,07%	\$ 119.822.135	\$ 101.848.815		
5	Diagnóstico de la situación actual (levantamiento de inventario, fichas y DOFA).	43	83%	80%	1,00%	0,96%	\$ 94.601.038	\$ 91.181.723	NO	

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
	VERSIÓN No. 0	FECHA	30/11/2024

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMAD O CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE PROGRAMAD O CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	EJECUTADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	OBJETIVO CUMPLIDO	OBS.
	ETAPA II - DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO.	60	12%	7%	1,00%	0,59%	\$ 95.039.411	\$ 55.439.656		
6	Levantamiento topográfico método tradicional y levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del (los) aeropuerto(s).	33	18%	0%	0,44%	0,00%	\$ 42.083.872	\$ -		
7	Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.	45	27%	27%	0,23%	0,23%	\$ 22.094.033	\$ 22.094.033		
8	Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.	20	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
9	Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres del (los) aeropuerto(s).	15	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
10	Estudios Operacionales	35	40%	40%	0,41%	0,41%	\$ 38.576.883	\$ 38.576.883		
11	Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.	15	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
12	Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas.	17	0%	0%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Se presenta el cuadro (2025.04.27) Indicadores de Cumplimiento, en los documentos de soporte en el Anexo No. 3.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	 INTER PMA NORTE CONSORCIO
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.2.1. Contrato de Consultoría.

En el presente periodo, el consultor en el cumplimiento de sus obligaciones ejecuto las siguientes actividades para el desarrollo de los componentes del proyecto:

Tabla 3-5. Actividades Ejecutada en el periodo comprendido entre 1 y 31 de marzo de 2025.

ACTIVIDADES U OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTE
ETAPA 1 - CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS, EN LOS DIFERENTES HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.		
Componente 1	Se dio aprobación del cronograma en versión D. El consultor se encuentra trabajando en la actualización de las Metodologías: - BEP - Topografía - Social - Ambiental - Predial - Geotecnia	Comunicaciones de Consultor: NS-079. 02 Correspondencia recibida Comunicación de aprobación: C155-CE-046-2025. 01 Correspondencia enviada
Componente 2	El consultor remitió a la interventoría la versión inicial del componente 2, dicha información se encuentra en revisión.	Comunicaciones de Consultor: NS-078. 02 Correspondencia recibida
Componente 3	En el presente periodo no se recibió información del componente.	
Componente 4	El consultor remitió a la interventoría la atención de observaciones del componente, dicha información se encuentra en revisión.	Comunicaciones de Consultor: NS-074. 02 Correspondencia recibida
Componente 5	En el presente periodo no se recibió información del componente.	

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Para el periodo que comprende el presente informe, se informa que la consultoría realizó la entrega de los componentes correspondientes a las Etapas 1 y 2 e informe mensual, como se presenta a continuación:

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

Tabla 3-6. Estado de entrega de componentes en el periodo comprendido entre 1 y 30 de abril de 2025.

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE	FECHA DE ENTREGA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	EN REVISIÓN
ETAPA I - CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS, EN LOS DIFERENTES HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.				
Componente 1: CRONOGRAMA (NS-079)	18/03/2025	APROBADO C155-CE-046-2025	25/03/2025	
Componente 1: METODOLOGÍA EDT- PLAN DE RIESGOS BEP (NS-064)	4/03/2025	N/A	N/A	Entregado mediante comunicación NS-064, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Componente 1: METODOLOGÍA EDT- PLAN DE RIESGOS Topografía (NS-068)	26/03/2025	N/A	N/A	Entregado mediante comunicación NS-068, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Componente 1: METODOLOGÍA EDT- PLAN DE RIESGOS Social (NS-094) Ambiental (NS-094) Predial (NS-094) Geotecnia (NS-094)	25/03/2025	N/A	N/A	Entregado mediante comunicación NS-094, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Componente 1: METODOLOGÍA EDT- PLAN DE RIESGOS Riesgos (NS-073)	11/03/2025	N/A	N/A	Entregado mediante comunicación NS-073, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Componente 2 - Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental. (NS-078)	18/03/2025	N/A	N/A	Entregado mediante comunicación NS-078, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Componente 3 - Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings). (NS-067)	5/03/2025	N/A	N/A	Entregado mediante comunicación NS-067, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Componente 4 - Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario (índice) - Contenido mínimo y capítulo de Introducción. (NS-074)	11/03/2025	N/A	N/A	Entregado mediante comunicación NS-074, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

3.2.1.1. Actividades de Orden Técnico

En el presente periodo, el consultor desarrolló las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- ✓ La consultoría mediante correo electrónico del 1 de marzo de 2025, remitió a la interventoría el informe semanal No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de febrero al 2 de marzo de 2025.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-061, del 4 de marzo de 2025, remitió la atención de las observaciones a la comunicación C155-CE-021-2025 relacionadas con la propuesta de áreas y metodología topografía y levantamiento LiDAR.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-064, del 4 de marzo de 2025, remitió la atención de las observaciones a la comunicación C155-CE-018-2025 relacionadas con el plan de ejecución BIM (BEP).
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-065, del 3 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, la solicitud de carnetización para el ingreso a los aeropuertos Los Colonizadores de Saravena y Aguas Claras de Ocaña.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-067, del 5 de marzo de 2025, remitió la entrega en versión A del componente 3 correspondiente a la Matriz de Interesados.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-069, del 6 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, la solicitud de carnetización para el ingreso al Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-070, del 7 de marzo de 2025, remitió la respuesta a la comunicación C155-CE-036-2025 con la programación actualizada del plan de visitas del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-071, del 7 de marzo de 2025, remitió la atención de observaciones del Informe Mensual No. 1, correspondiente al mes de enero de 2025.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-072, del 7 de marzo de 2025, remitió la entrega del informe mensual No.2, correspondiente al mes de febrero de 2025,

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

- ✓ La consultoría mediante correo electrónico del 4 de marzo de 2025, remitió el avance de la atención de las observaciones realizadas por la interventoría sobre el cronograma, en una mesa de trabajo llevada a cabo el 28 de febrero de 2025.
- ✓ La consultoría el 3 y el 4 de marzo de 2025, realizó actividades para el levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena, Arauca, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.), con el fin de adelantar las fichas de inventarios de la Etapa I.
- ✓ La consultoría mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2025, remitió a la interventoría el informe semanal No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 3 y el 9 de marzo de 2025.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-070, del 9 de marzo de 2025, remitió la programación de las visitas de socialización en el Aeropuerto Aguas Claras de la ciudad de Ocaña, indicando los interesados a los que se les remitirá invitación para las reuniones previstas.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-073, del 11 de marzo de 2025, remitió la entrega en versión A de la metodología específica de riesgos.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-074, del 11 de marzo de 2025, dio respuesta a la comunicación C155-CE-032-2025, con la atención de observaciones del componente 4.
- ✓ Entre el 8 y el 14 de marzo de 2025, la consultoría remitió las invitaciones para la socialización del proyecto en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las siguientes personas y/o entidades: Dirección regional Aeronáutica Nororiental, Gerente Aeroportuario, Gobernación Norte de Santander, Secretaría de Planeación Norte de Santander, Secretaría de Gestión de Riesgo Norte de Santander, Secretaría de Turismo Norte de Santander, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad de Norte de Santander, Alcaldía de Ocaña, Secretaría de Infraestructura Ocaña, Secretaría de Gobierno Ocaña, Unidad Técnica Ambiental, Secretaría de Movilidad y Tránsito Ocaña, Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Ocaña, Secretaría de vías, infraestructura y vivienda Ocaña, Alcaldía Aguachica, Alcaldía Río de Oro, Alcaldía de González, Alcaldía Convención, Alcaldía Teorama, Alcaldía San Calixto, Alcaldía Abrego, Alcaldía Villa Caro, Alcaldía del Carmen, Alcaldía Hacarí, Alcaldía la Playa de Belén, Personería Municipal de Ocaña, Cámara de Comercio Ocaña, Cámara de Comercio Cucuta,

<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>	
<p align="center">VERSIÓN No. 0</p>		<p align="center">FECHA</p> <p align="right">30/11/2024</p>

Coordinador Salud Pública, Comandancia Policía Ocaña, Procuraduría Provincial de Ocaña, Corporación Ambiental, Gerencia Seccional Norte de Santander Andí, Fenalco, Searca, Aerollanos del Oriente, Aerolans, Coomulpinort, Empresa de Servicios Público, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Metrogas, Asomunicipios, Representantes Vereda Cristo Rey, Representante JAC Corregimiento Aguas Claras, Representantes Vereda Las Chircas, Representante JAC Vereda el Limón.

- ✓ La consultoría el 11 y el 12 de marzo de 2025, realizó actividades para el levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.), con el fin de adelantar las fichas de inventarios de la Etapa I.
- ✓ La consultoría mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2025, remitió a la interventoría el informe semanal No. 6 correspondiente al periodo comprendido entre el 10 y el 16 de marzo de 2025.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-077, del 18 de marzo de 2025, remitió un oficio al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-078, del 18 de marzo de 2025, remitió a la interventoría la Entrega de componente 2, en su versión A, correspondiente a la revisión de la información existente y debida diligencia.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-079, del 18 de marzo de 2025, remitió a la interventoría la atención de observaciones al cronograma detallado en versión D.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-080, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición al MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS. solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-081, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ESPO S.A. E.S.P. solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-082, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa CENS S.A. E.S.P. solicitando información base para el proyecto.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-083, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-084, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa de telecomunicaciones TELECOM OCAÑA solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-085, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa EMSERPA E.I.C.E. E.S.P solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-086, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ENELAR E.S.P solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-087, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ALCANOS DE COLOMBIA, Arauca, solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-088, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa EMPASTEL solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-089, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ECAAAS E.S.P solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-090, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ENERGARA S.A E.S.P. solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-091, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ALCANOS DE COLOMBIA, Saravena, solicitando información base para el proyecto.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-092, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa de telecomunicaciones TELECOM SARAVERA solicitando información base para el proyecto.

<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>	
<p align="center">VERSIÓN No. 0</p>		<p align="center">FECHA</p> <p align="right">30/11/2024</p>

- ✓ La consultoría mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2025, remitió a la interventoría el informe semanal No. 7 correspondiente al periodo comprendido entre el 17 y el 23 de marzo de 2025.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-068, del 26 de marzo de 2025, remitió a la interventoría la respuesta a las comunicaciones C155-CE-025-2025 y C155-CE-042-2025, correspondiente a la atención de observaciones a la metodología de topografía, conforme con la mesa de trabajo desarrollada el 19 de marzo de 2025.
- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-094, del 25 de marzo de 2025, remitió a la interventoría la respuesta a la comunicación C155-CE-041-2025, correspondiente a la atención de observaciones a las metodologías específicas de los componentes Ambiental, Social, Predial y Geotecnia.
- ✓ Durante el periodo del presente informe la consultoría realizó las diferentes reuniones de socialización del proyecto, entre 26 al 28 de marzo de 2025, en las instalaciones del Aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña, con participación de la Alcaldía de Ocaña, Gobernación de Norte de Santander, Gestión del Riesgo, Cámara de Comercio de Cúcuta, Ejército de Colombia, Policía Nacional, Satena y representantes de las comunicades.

3.2.1.2. Actividades de Orden Legal

Para el presente período, no se adelantaron actividades de orden legal por parte del consultor.

3.2.1.3. Actividades de Orden Administrativo y Financiero

En el presente periodo, el Interventor desarrolló las siguientes actividades en cumplimiento a las obligaciones contractuales:

- ✓ La consultoría mediante comunicado NS-076, del 14 de marzo de 2025, remitió solicitud de cambio de personal para el experto de planificación lado tierra y especialista diseño geométrico.

3.2.2. Contrato de Interventoría.

En el presente periodo, el consultor en el cumplimiento de sus obligaciones ejecuto las siguientes actividades para el desarrollo de los componentes del proyecto:

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

Tabla 3-7. Estado de Actividades ejecutadas – cumplimiento de obligaciones.

PERIODO: 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	De acuerdo con la Minuta del Contrato de Interventoría 24001385 H3, se han cumplido parcialmente todas las condiciones establecidas en los anexos contractuales. Se realizó la revisión de la información correspondiente a la Etapa I, del componente 1 al 5.	Comunicaciones de Consultor: 02_Correspondencia recibida Comunicaciones de Interventoría: 01_Correspondencia enviada
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	En el presente periodo se llevaron a cabo las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado. Etapa I. - Componente 1, se revisó la atención de observaciones de las metodologías específicas. - Componente 2, se inició la revisión de la atención de observaciones de la debida diligencia. - Componente 3, se revisó la primera versión de la identificación de partes interesadas. - Componente 4, se revisó la primera versión esquema para la presentación de PMA y EPA.	Comunicaciones de Consultor: 02_Correspondencia recibida Comunicaciones de Interventoría: 01_Correspondencia enviada
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el Anexo de Especificaciones Técnicas, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.	En el presente periodo, la interventoría ha garantizado la calidad de los servicios prestados, así como de los productos, en el ejercicio de la vigilancia del Contrato de Consultoría 24001333 H3 de 2024, así las cosas, la consultoría ha remitido las versiones con atención de observaciones de los productos de la Etapa I: - Componente 1, metodologías. - Componente 2, versión A. - Componente 3, versión A.	Comunicaciones de Consultor: 02_Correspondencia recibida Comunicaciones de Interventoría: 01_Correspondencia enviada
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que	En el periodo reportado la Interventoría no ha presentado	Comunicaciones de Consultor: 02_Correspondencia recibida

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

PERIODO: 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	cualquier reclamación que directa o indirectamente tenga efectos sobre el objeto del contrato. Se reportaron problemas de seguridad que podían afectar el desarrollo de las actividades de campo, sin embargo, junto con la consultoría se plantearon estrategias para no tener afectación en el cronograma.	
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.	En el periodo de reporte la Interventoría no ordenó ni aprobó ningún trabajo y/o actividad adicional a lo establecido en los términos contractuales establecidos por la Aeronáutica Civil.	N/A
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.	En el presente periodo se recibió comunicación 1628863 con radicado 2025260020009981 del 11 de marzo de 2025, de la Entidad, mediante la cual se da aprobación de los profesionales presentados con la comunicación C155-CE-029-2025 del 27 de febrero de 2025, con radicado de la Entidad 2025190010024864.	Comunicaciones de Aerocivil: Aerocivil
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato.	En el periodo reportado se cuenta con el apoyo de un inspector, para el acompañamiento de las labores de campo en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Quien es de la zona.	N/A
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	En el periodo reportado se cuenta con el apoyo de un inspector, para el acompañamiento de las labores de campo en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Quien es de la zona.	N/A
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	La interventoría ha dado cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	N/A
10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que	Durante el presente periodo no se han identificado y/o informado	N/A

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

PERIODO: 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	situaciones que impliquen modificaciones del estado de los riesgos existentes en el Contrato.	
11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo no se han identificado y/o informado situaciones que impliquen modificaciones en el Contrato.	N/A
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	En las actividades de campo el personal se encuentra dotado de los correspondientes elementos de protección personal (EPP).	N/A
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.	Durante el presente periodo no se presentaron cambios de la composición del capital social de la persona jurídica, por parte de la consultoría e Interventoría.	N/A

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

PERIODO: 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	Durante el periodo reportado la Interventoría ha cumplido con las obligaciones laborales que corresponda al respectivo personal.	N/A
15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.	En el presente periodo se recibió comunicación 1628863 con radicado 2025260020009981 del 11 de marzo de 2025, de la Entidad, mediante la cual se da aprobación de los profesionales presentados con la comunicación C155-CE-029-2025 del 27 de febrero de 2025, con radicado de la Entidad 2025190010024864.	Comunicaciones de Aerocivil: Aerocivil
16. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de estos contenidas en el Anexo No. 3 – Matriz de Riesgos.	Durante el periodo de reporte no se presentaron riesgos contenidos en el Anexo No. 3 – Matriz de Riesgos, la Interventoría tienen conocimiento de los riesgos estipulados.	N/A
17. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libres de cloro elemental.	Durante el periodo reportado, la interventoría remitió las comunicaciones correspondientes a la Consultoría y a la Aerocivil, de forma digital. Así mismo se remitió a la Entidad los informes semanales de seguimiento, igualmente el informe mensual, elaborados por el mismo.	Comunicaciones de Interventoría: 01 Correspondencia enviada

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

PERIODO: 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.	Se ha presentado el cumplimiento de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal.	N/A
19. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	La interventoría ha manejado con la debida confidencialidad la información a la que tiene acceso, así como la generada resultado de la ejecución del contrato.	N/A
20. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.	La interventoría ha dado respuesta a los requerimientos presentados por la Entidad.	N/A
21. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico" en los plazos acordados con la Entidad.	En el presente periodo se recibió comunicación 1628863 con radicado 2025260020009981 del 11 de marzo de 2025, de la Entidad, mediante la cual se da aprobación de los profesionales presentados con la comunicación C155-CE-029-2025 del 27 de febrero de 2025, con radicado de la Entidad 2025190010024864.	Comunicaciones de Aerocivil: Aerocivil
22. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud	En el presente periodo la Interventoría ha cumplido con los protocolos de Bioseguridad	N/A

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA 30/11/2024

PERIODO: 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemento o sustituya.	estipulados en la Resolución 312 de 2019.	
23. Incorporar como mínimo el cien por ciento (100%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.	En el presente periodo se recibió comunicación 1628863 con radicado 2025260020009981 del 11 de marzo de 2025, de la Entidad, mediante la cual se da aprobación de los profesionales presentados con la comunicación C155-CE-029-2025 del 27 de febrero de 2025, con radicado de la Entidad 2025190010024864.	Comunicaciones de Aerocivil: Aerocivil
24. Responder ante LA AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto	Durante el periodo reportado no se han presentado comunicaciones relacionadas con fallas por parte de la Interventoría con respecto al objeto del contrato.	N/A
25. Responder ante LA AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de 24001385 H3 de 2024.	Durante el periodo reportado no se han presentado comunicaciones relacionadas con fallas por parte de la Interventoría con respecto al objeto del contrato.	N/A
26. A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.	Durante el periodo reportado no se han presentado comunicaciones relacionadas con fallas por parte de la Interventoría con respecto al objeto del contrato.	N/A

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

En el presente periodo, el Interventor desarrolló las siguientes actividades en cumplimiento a las obligaciones contractuales:

- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-036-2025, del 6 de marzo de 2025, dio traslado a la consultoría de la comunicación 1623912 con radicado 202560020008897 emitida por la Entidad, en la cual se acepta la propuesta del consultor para la reprogramación de las visitas de socialización en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

- ✓ La interventoría, los días 3 y 4 de marzo de 2025, realizó acompañamiento a las actividades para el levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena, Arauca, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.).
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-040-2025, del 12 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, el informe semanal No 9, para el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de marzo de 2025. Radicado 2025190010030025.
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-041-2025, del 14 de marzo de 2025, remitió a la consultoría la respuesta con observaciones al oficio NS-058, relacionado con las metodologías específicas de los componentes social, ambiental, predial y geotecnia.
- ✓ La interventoría, los días 11 y 12 de marzo de 2025, realizó acompañamiento a las actividades para el levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.).
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-038-2025, del 14 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, los informes de las visitas de socialización realizadas en los Aeropuertos Los Colonizadores de Saravena y Santiago Pérez Quiroz de Arauca. Con el radicado 2025190010031874.
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-042-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, con copia a la Entidad, la respuesta a las comunicaciones NS-061 y NS-075 relacionada con la propuesta a la Metodología de Topografía, solicitando la atención de las observaciones en completitud y calidad para poder dar inicio a las actividades de campo. Radicado de la Aerocivil (2025190010033218).
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-043-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, con copia a la Entidad, la respuesta a la comunicación NS-062 relacionada con la actualización de la metodología y el cronograma detallado, solicitando la atención de las observaciones en completitud y calidad. Radicado de la Aerocivil (2025190010033284).

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-044-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, el informe semanal No 10, para el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2025. Radicado de la Aerocivil (2025190010033765).
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-046-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, la aprobación del cronograma detallado en versión D, para realizar el seguimiento del proyecto.
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-047-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, el cronograma detallado aprobado en versión D, con el cual se realizará el seguimiento del proyecto.
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-048-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, la respuesta a la comunicación NS-060 relacionada con las metodologías específicas Financiera, Prognosis, Capacidad y Demanda, Análisis Operacional y Red Aeroportuaria, se remitieron las observaciones encontradas por los especialistas.
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-049-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, la respuesta a la comunicación NS-076 relacionada con el cambio de los profesionales Experto en planificación lado tierra y Especialista en diseño geométrico, después de la revisión se dio aprobación del cambio del Experto lado tierra y se remitieron observaciones al profesional propuesto para el especialista de diseño geométrico.
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-051-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, la aprobación del informe mensual No. 1 correspondiente al mes de Enero, toda vez que las observaciones remitidas fueron atendidas en su totalidad.
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-052-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, la solicitud del cambio de los profesionales de Estructuración jurídica y Especialista en energía y electromecánica, para revisión y aprobación por parte de la Aerocivil. Radicado de la Aerocivil (2025190010037556).
- ✓ Durante el periodo del presente informe, los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de las metodologías específicas de los siguientes componentes: Social, Ambiental, Predial, Geotecnia, Capacidad de Demanda, Red Aeroportuaria, Jurídico, Análisis Operacional, Financiero y Prognosis.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

- ✓ Durante el periodo del presente informe, los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la metodología general, cronograma detallado, propuesta levantamiento LiDAR y actualización BEP.
- ✓ Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la atención de observaciones del informe mensual 1, del componente 4, así mismo, se está trabajando en la revisión de la versión A del informe mensual No 2.
- ✓ Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la Entrega del Componente 3 (Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).
- ✓ Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la Entrega del Componente 2 (Revisión de la información existente y debida diligencia documental).
- ✓ Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de las metodologías específicas del componente de Riesgos.
- ✓ Durante el periodo del presente informe se realizó acompañamiento por parte de la interventoría a las reuniones de socialización del proyecto, llevadas a cabo del 26 al 28 de marzo de 2025, en las instalaciones del Aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña.
- ✓ El 4 de marzo de 2025, se llevó a cabo el comité presencial de seguimiento del contrato, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. El consultor mencionó que se encontraban proyectando la respuesta con la propuesta para el levantamiento Lida, así como el levantamiento topográfico convencional, adicionalmente se solicitó a la Entidad su pronunciamiento con relación a la propuesta del consultor para la reprogramación de las reuniones de socialización en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña debido a problemas de orden público.
- ✓ El 11 de marzo de 2025, se llevó a cabo el comité presencial de seguimiento del contrato, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. El consultor mencionó que se encontraban proyectando un alcance para la propuesta para el levantamiento LiDAR. La Entidad informó que se programara una reunión para la definición de los lineamientos BIM del proyecto, para el lunes 17 de marzo de 2025.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

- ✓ El 17 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión virtual, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. La Aerocivil presentó los lineamientos a considerar en la implementación de la metodología BIM para que el consultor y la interventoría las tenga en cuenta en el desarrollo del proyecto. El consultor mencionó que la última versión del BEP entregada a la interventoría ya cuenta con las consideraciones solicitadas por la Entidad.
- ✓ El 18 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión presencial, con la participación de la consultoría y la Interventoría, la cual tuvo como objetivo la socialización de las metodologías de los componentes financieros, se dieron a conocer a la consultoría la consideraciones y hallazgos más significativos evidenciados por la interventoría para ser atendidas.
- ✓ El 18 de marzo de 2025, se llevó a cabo el comité virtual de seguimiento del contrato, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. El consultor mencionó que se encontraban atendiendo las observaciones del cronograma detallado en versión D. La interventoría informo que el 19 de marzo de 2025 se programó mesa de trabajo para la revisión de la propuesta presentada para los levantamientos a desarrollar en el proyecto.
- ✓ El 19 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión presencial, con la participación de la consultoría y la Interventoría, en la cual se revisó en detalle la propuesta presentada por el consultor con relación a los levantamientos a desarrollar en el proyecto, se identificaron claramente el tipo de levantamientos a desarrollar de acuerdo con la etapa y el alcance de los mismos, por lo cual el consultor informó que se entregara la propuesta actualizada y completa de las metodologías el miércoles 26 de marzo de 2025, para revisión de la interventoría.
- ✓ El 21 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión virtual, con la participación de la consultoría y la Interventoría, donde la consultoría expuso a la interventoría el análisis que ha desarrollado a la fecha de las pre-alternativas para el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, esto considerando las condiciones existentes.
- ✓ El 25 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión virtual, con la participación de la consultoría y la Interventoría, para la revisión del seguimiento con el cronograma aprobado en su versión D.
- ✓ El 25 de marzo de 2025, se llevó a cabo el comité virtual de seguimiento del contrato, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. El consultor informó que se presentará la atención de observaciones de la metodología de

<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>	
<p align="center">VERSIÓN No. 0</p>		<p align="center">FECHA</p> <p align="right">30/11/2024</p>

topografía en 26 de marzo de 2025, por otro lado, la Entidad, solicito que se presente el seguimiento de forma gráfica.

- ✓ El 27 de marzo de 2025, se llevaron a cabo reunión presencial para la socialización del proyecto, en las instalaciones del Aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña, con participación de la consultoría, la interventoría, la Entidad, la Alcaldía de Ocaña, Gobernación de Norte de Santander, Gestión del Riesgo, Cámara de Comercio de Cúcuta, Ejército de Colombia, Policía Nacional, Satena y representantes de las comunicades.
- ✓ El 28 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión presencial en campo, con la participación de la consultoría y la Interventoría, donde se revisaron las pre-alternativas para el desarrollo del EPA del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, posterior al recorrido realizado en las instalaciones, con el fin de evaluar la viabilidad de las alternativas analizadas por el consultor.

3.2.2.1. Actividades de Orden Legal

Las actividades adelantadas en el presente periodo para cumplir las obligaciones legales establecidas fueron las siguientes.

- ✓ La Interventoría verificó que las actuaciones del contratista se mantuvieran dentro del marco normativo que rige el contrato.

3.2.2.2. Actividades de Orden Administrativo y Financiero

- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-045-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, aclaración de la hoja de vida del profesional electromecánico. Radicado de la Aerocivil (2025190010033381).
- ✓ La interventoría mediante comunicado C155-CE-050-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, la solicitud de los carnets de ingreso al Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, para los profesionales que acompañaran la socialización del proyecto en campo. Radicado de la Aerocivil (2025190010035517).
- ✓ En el presente periodo no se llevaron a cabo actividades específicas del componente financiero.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

3.3. ALCANCE DE ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS POR COMPONENTE

3.3.1. Componente Técnico

En el presente periodo se desarrollaron actividades de revisión de la información presentada por el consultor con relación a los componentes que hacen parte de la ETAPA I. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, a continuación, se presenta el estado:

Tabla 3-8. Estado metodologías de los Componente Etapa I.

VERSIÓN VIGENTE	ENTREGA	ASUNTO	ESPECIALISTA INTERVENTORIA	ESTADO	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN O DEVOLUCIÓN
C01-A	NS-058 21/02/2025	METODOLOGÍAS - Social - Ambiental - Predial - Geotecnia	- Director/Coordinación - Especialista Social - Especialista Ambiental - Especialista Biólogo - Especialista Predial, Catastral y Geodesia - Especialista Geotecnia - Especialista Pavimentos	Observada	C155-CE-041-2025 25/03/2025
C01-A	NS-060 25/02/2025	METODOLOGÍAS - Financiera - Prognosis - Cap_Demanda - Red_Aeroportuaria - Análisis_Operacional - Jurídica	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra - Especialista en Estructuración Financiera - Especialista Oferta/Demanda - Experto en Operaciones - Especialista Jurídico	Observada	C155-CE-048-2025 25/03/2025
C01-B	NS-061 04/03/2025	METODOLOGÍAS - Topografía	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra - Topógrafo	Observada	C155-CE-042-2025 19/03/2025
C01-C	NS-062 26/02/2025	METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra	Observada	C155-CE-043-2025 19/03/2025
C01-B	NS-064 04/03/2025	BEP	- BIM Manager	En Revisión	
C03-A	NS-067 05/03/2025	COMPONENTE 3	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra	Observada	C155-CE-060-2025 11/02/2025
C01-C	NS-061 04/03/2025	METODOLOGÍAS - Topografía	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra - Topógrafo	Observada	
--	NS-071 07/03/2025	INFORME MENSUAL 1	- Director/Coordinación	Aprobada	C155-CE-051-2025 25/03/2025

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

VERSIÓN VIGENTE	ENTREGA	ASUNTO	ESPECIALISTA INTERVENTORIA	ESTADO	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN O DEVOLUCIÓN
--	NS-072 07/03/2025	INFORME MENSUAL 2	- Director/Coordinación	En Revisión	
C01-C	NS-073 11/03/2025	METODOLOGÍAS - Riesgos	- Director/Coordinación - Especialista en Riesgos	En Revisión	
C04-B	NS-074 11/03/2025	COMPONENTE 4	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra	En Revisión	
C01-B	NS-075 11/03/2025	METODOLOGÍAS - Topografía	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra - Topógrafo	Observada	C155-CE-042-2025 19/03/2025
C02-A	NS-078 18/03/2025	COMPONENTE 2	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra	En Revisión	
C01-D	NS-079 18/03/2025	CRONOGRAMA	- Director/Coordinación - Experto Lado Aire - Experto Lado Tierra	Aprobada	C155-CE-046-2025 25/03/2025
C01-B	NS-094 25/03/2025	METODOLOGÍAS - Social - Ambiental - Predial - Geotecnia	- Director/Coordinación - Especialista Social - Especialista Ambiental - Especialista Biólogo - Especialista Predial, Catastral y Geodesia - Especialista Geotecnia - Especialista Pavimentos	En Revisión	

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Una vez se tengan las metodologías de trabajo aprobadas se incluirán en los documentos de soporte en el Anexo No. 8.

3.3.1.1. Mesa de trabajo Stakeholders.

En el presente periodo se completaron las jornadas de socialización con la visita al Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, desarrollada del 26 al 28 de marzo de 2025, a continuación, se presenta el análisis de dichas reuniones de presentación del proyecto.

Previo al desarrollo de las sesiones de socialización, el consultor desarrollo una matriz con la identificación preliminar de los Stakeholders en cada uno de los aeropuertos, la cual posteriormente fue remitida a la Entidad y a la interventoría para ser revisada, validada y complementada en caso de ser necesario, una vez se confirmó la lista de invitados se remitieron las diferentes citaciones, con la ayuda de los gerentes aeroportuarios.

De acuerdo con la evaluación se clasificaron en tres (3) tipos de interesados:

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

- *Autoridades gubernamentales y gremios:* relacionados con el transporte aéreo, construcción, turismo, exportadores, comerciantes, entre otras actividades.
- *Comunidad aeroportuaria:* Compuesta por todas las empresas, organizaciones y entidades que desarrollan su actividad en los Aeropuertos objeto.
- *Comunidades:* aledañas a los Aeropuertos y compuestas por veedurías ciudadanas relacionadas con la expansión aeroportuaria, juntas de acción comunal, instituciones educativas, hospitales, entre otros.

Las invitaciones para las socializaciones de los Aeropuertos Los Colonizadores de Saravena, Arauca y Santiago Pérez Quiroz de Arauca, se remitieron entre el 7 y el 13 de febrero de 2025, indicando la fecha, hora y lugar dispuesto para el desarrollo de cada una de las sesiones, posterior a esto el equipo de consultoría hizo el seguimiento y confirmación de la asistencia de los interesados, a continuación, se presenta un resumen de la logística y participación de las reuniones:

- *Aeropuerto Los Colonizadores, Saravena, Arauca.*

Tabla 3-9. Tabla resumen socialización ATO Los Colonizadores, Saravena.

Tipo de Interesado	Aeropuerto	No de Invitados	Confirmados	Asistentes
Autoridades Gubernamentales y Gremios	Los Colonizadores, Saravena	20	3	8
Comunidad Aeroportuaria	Los Colonizadores, Saravena	4	3	4
Comunidades	Los Colonizadores, Saravena	0	0	0
Total, de Invitaciones		27	6	12
Porcentaje por Invitación enviada			22%	44%
Total participación, por grupo de Interesado		18		12
Porcentaje participación por grupo de Interesado				67%

Fuente: Resumen socializaciones NS – Balance – CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Cabe resaltar que, de acuerdo con lo informado por el consultor, para el Aeropuerto Los Colonizadores no se consideró en esta primera sesión la participación de las comunidades, debido a que no se presentan dificultades con predios y la ubicación del aeropuerto no afecta ninguna Junta de Acción Comunal.

Se evidencia que, en el proceso de confirmación de asistencia, vía telefónica, algunos de los números de contacto que se contaban en la base de datos no son válidos y en otros casos no se confirmó la asistencia por parte de los invitados, sin embargo, en las jornadas de socialización se contó con la participación de delegados de las entidades identificadas.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

Con relación a la asistencia de los actores interesados, se tiene que, si bien los invitados particulares no tuvieron la participación esperada, se contó con la presencia de delegados de las diferentes entidades y representantes de la comunidad aeroportuaria, logrando un porcentaje de 67%.

Ilustración 3-2. Jornada de Socialización ATO Los Colonizadores, Saravena – 17-02-2025.



Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Ilustración 3-3. Jornada de Socialización ATO Los Colonizadores, Saravena – 18-02-2025.



Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024	
VERSIÓN No. 0		FECHA
		30/11/2024

Ilustración 3-4 Jornada de Socialización ATO Los Colonizadores, Saravena – 18-02-2025.



Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

- *Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, Arauca.*

Tabla 3-10. Tabla resumen socialización ATO Santiago Pérez Quiroz, Arauca.

Tipo de Interesado	Aeropuerto	No de Invitados	Confirmados	Asistentes
Autoridades Gubernamentales y Gremios	Los Colonizadores, Saravena	16	3	6
Comunidad Aeroportuaria	Los Colonizadores, Saravena	14	8	12
Comunidades	Los Colonizadores, Saravena	8	6	7
	Total, de Invitaciones	38	17	25
	Porcentaje por Invitación enviada		40%	70%
	Total participación, por grupo de Interesado	22		14
	Porcentaje participación por grupo de Interesado			64%

Fuente: Resumen socializaciones NS – Balance – CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Se evidencia que, en el proceso de confirmación de asistencia, vía telefónica, algunos de los números de contacto que se contaban en la base de datos no son válidos y en otros casos no se confirmó la asistencia por parte de los invitados, sin embargo, en las jornadas de socialización se contó con la participación de delegados de las entidades identificadas.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

Con relación a la asistencia de los actores interesados, se tiene que, si bien los invitados particulares no tuvieron la participación esperada, se contó con la presencia de delegados de las diferentes entidades y representantes de la comunidad aeroportuaria, logrando un porcentaje de 64%.

Ilustración 3-5. Jornada de Socialización ATO Santiago Pérez Quiroz, Arauca – 20-02-2025.



Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Ilustración 3-6. Jornada de Socialización ATO Santiago Pérez Quiroz, Arauca – 20-02-2025.



Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

- Aeropuerto Aguas Claras, Ocaña.

Las invitaciones para las socializaciones del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, se remitieron entre el 12 y el 13 de marzo de 2025, indicando la fecha, hora y lugar dispuesto para el desarrollo de cada una de las sesiones, posterior a esto el equipo de consultoría hizo el seguimiento y confirmación de la asistencia de los interesados, a continuación, se presenta un resumen de la logística y participación de las reuniones:

Tabla 3-11. Tabla resumen socialización ATO Aguas Claras, Ocaña.

Tipo de Interesado	Aeropuerto	No de Invitados	Confirmados	Asistentes
Autoridades Gubernamentales y Gremios	Aguas Claras, Ocaña	41	14	13
Comunidad Aeroportuaria	Aguas Claras, Ocaña	10	5	1
Comunidades	Aguas Claras, Ocaña	8	5	5
Total, de Invitaciones		38	24	19
Porcentaje por Invitación enviada			40%	70%
Total participación, por grupo de Interesado		40		10
Porcentaje participación por grupo de Interesado				25%

Fuente: Resumen socializaciones NS – Balance – CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Se evidencia que, en el proceso de confirmación de asistencia, vía telefónica, algunos de los números de contacto que se contaban en la base de datos no son válidos y en otros casos no se confirmó la asistencia por parte de los invitados, adicionalmente en el caso de este Aeropuerto se recibió confirmación por parte de los operadores (Satena, All Colombia, Aero Torcoroma y Lans) para la jornada del 26 de marzo de 2025, sin embargo, a la hora de la reunión no se presentaron, debido a esto la consultoría se comunicó con estos actores y les brindo la alternativa de asistir a la sesión prevista para el 27 de marzo de 2025 a las 9:00 am, en la cual se contó con la participación de Satena y Aero Torcoroma.

Con relación a la asistencia de los actores interesados, se tiene que, no se contó con la participación esperada, se evidenció un porcentaje de 25%, siendo muy inferior a la asistencia en las jornadas de socialización de los otros 2 aeropuertos objetos del contrato, lo que indica que la estrategia implementada para la convocatoria no tuvo los mismos efectos, considerando que este aeropuerto inició nuevamente operaciones a partir del 21 de marzo de 2025.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

Ilustración 3-7 Jornada de Socialización ATO Aguas Claras, Ocaña – 27-03-2025.



Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Ilustración 3-8. Jornada de Socialización ATO Aguas Claras, Ocaña – 27-03-2025.



Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Dado lo anterior, como parte del análisis de las jornadas de socialización de los Aeropuertos Los Colonizadores de Saravena, Santiago Pérez Quiroz de Arauca y Aguas Claras de Ocaña se tienen las siguientes consideraciones:

- La consultoría contaba con la presentación del proyecto con toda la información relacionada, sin embargo, el lenguaje implementado en algunos de los escenarios pudo ser técnico que dificultan la comprensión de todos los actores.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

- A pesar de la baja asistencia de los invitados en las mesas de socialización, con relación a lo esperado, la participación fue activa y las jornadas permitieron recopilar información que no se había evidenciado previamente.
- La herramienta del QR para la recopilación de la información para el diligenciamiento de la DOFA, solo conto con 18 entradas para los 3 aeropuertos, por lo cual se identifica que es importante complementar la información con otras alternativas de recolección de datos.
- Es importante aclarar que el consultor tuvo acercamientos a la comunidad por parte de los profesionales social y ambiental, en las actividades de levantamiento de inventarios, en las cuales igualmente se socializó el proyecto y se logró obtener información adicional.
- Las estrategias de convocatoria y socialización para cada uno de los Aeropuertos deben ser evaluadas de forma específica, considerando que la operación actualmente no se comporta igual y los interesados pueden tener percepciones diferentes a los proyectos desarrollados en el Aeropuerto de su Municipio.
- De acuerdo con lo evidenciado principalmente en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, la interventoría solicitó al consultor determinar las estrategias adecuadas para poder informar a los actores que no pudieron participar de las sesiones, con lo cual el consultor realizó nuevamente una convocatoria y remitió las invitaciones para la sesión virtual a desarrollar el 23 de abril de 2025 a las 9:00 am.
- Se evidenció que, aunque se contó con participación de los operadores en las reuniones, las personas que asistieron no contaban con toda la información de detalle con relación a las necesidades y/o requerimientos para sus aeronaves, por lo cual se determinó que es importante generar el espacio en Bogotá con los representantes de las diferentes Aerolíneas que puedan operar en estos Aeropuertos, dicha reunión se programara en coordinación y con apoyo de la Entidad.

La asistencia por debajo de la expectativa implicó que la interventoría, planteará esta situación al consultor y solicitó un esfuerzo adicional, con herramientas y mecanismos diferentes a los ya utilizados, por lo que se solicitó y se acordó con la consultoría entre otras cosas lo siguiente:

- Se efectúe un seguimiento y comunicación con los actores, que identificados no asistieron, pero con los cuales se puede obtener información vía e-mail o por comunicación directa.
- Establecer un mecanismo para la reunión con actores institucionales como alcaldes o gobernadores que asegure su participación, para ello en las próximas reuniones se debe acudir a las alcaldías o gobernaciones de tal manera que se facilite la comunicación con las entidades regionales.
- Establecer una convocatoria regional entendiendo que los aeropuertos dinamicen las relaciones entre municipios y regionales.
- Efectuar con operadores una reunión en Bogotá, en la cual participe también la Aeronáutica, de tal manera que se incluya manejadores de carga, o charter que

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

asegure, al realizarse en Bogotá se podría asegura que sean personales tomadores de decisión, quienes asistan.

- En el Anexo No. 9 se encuentra el cuadro de control detallado con la información de los invitados a las socializaciones.

3.3.2. Componente Ambiental

- ✓ En el presente periodo la interventoría remitió a la consultoría la respuesta con observaciones al oficio NS-058, relacionado con las metodologías específicas del componente, mediante comunicación C155-CE-041-2025, del 14 de marzo de 2025.
- ✓ En el presente periodo se realizaron actividades de campo para el levantamiento de inventarios, en los cuales se contó con la participación del profesional del componente ambiental del consultor.
- ✓ En el presente periodo la consultoría remitió a la interventoría mediante comunicación NS-094 con fecha del 25 de marzo de 2025, la atención de observaciones de la metodología específica del componente ambiental, la cual a la fecha de corte de este informe se encuentra en revisión por parte del especialista.

3.3.3. Componente Predial

- ✓ En el presente periodo la interventoría remitió a la consultoría la respuesta con observaciones al oficio NS-058, relacionado con las metodologías específicas del componente, mediante comunicación C155-CE-041-2025, del 14 de marzo de 2025.
- ✓ En el presente periodo la consultoría remitió a la interventoría mediante comunicación NS-094 con fecha del 25 de marzo de 2025, la atención de observaciones de la metodología específica del componente predial, la cual a la fecha de corte de este informe se encuentra en revisión por parte del especialista.

3.3.4. Componente Social

- ✓ En el presente periodo la interventoría remitió a la consultoría la respuesta con observaciones al oficio NS-058, relacionado con las metodologías específicas del componente, mediante comunicación C155-CE-041-2025, del 14 de marzo de 2025.
- ✓ En el presente periodo se realizaron actividades de campo para el levantamiento de inventarios, en los cuales se contó con la participación del profesional del componente social del consultor.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

- ✓ En el presente periodo la consultoría remitió a la interventoría mediante comunicación NS-094 con fecha del 25 de marzo de 2025, la atención de observaciones de la metodología específica del componente social, la cual a la fecha de corte de este informe se encuentra en revisión por parte del especialista.

3.3.5. Componente Riesgos

- ✓ En el presente periodo la consultoría remitió a la interventoría mediante comunicación NS-073 con fecha del 11 de marzo de 2025, la propuesta de la metodología específica del componente de riesgos, la cual a la fecha de corte de este informe se encuentra en revisión por parte del especialista.

3.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO

En el Anexo No. 4 se encuentra el registro fotográfico de las actividades más relevantes desarrolladas semanalmente durante este período.

3.5. FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

A fecha de corte del presente informe, se han desarrolla 4 informes semanales de seguimiento al contrato 24001333 H3 DE 2024. En el Anexo No. 5 se incluyen los formatos debidamente diligenciados y actualizados en las fechas correspondientes.

Tabla 3-12. Estado informes seguimiento semanal.

PERIODO	No DE INFORME	PERIODO DE INFORME	ESTADO	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN O DEVOLUCIÓN
Marzo 2025	Semana 9	1/03/2025 al 7/03/2025	Entregado	C155-CE-040-2025 12/03/2025
Marzo 2025	Semana 10	8/03/2025 al 14/03/2025	Entregado	C155-CE-044-2025 19/03/2025
Marzo 2025	Semana 11	15/03/2025 al 21/03/2025	Entregado	C155-CE-053-2025 31/03/2025
Marzo 2025	Semana 12	22/02/2025 al 28/02/2025	Entregado	C155-CE-054-2025 8/04/2025

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

3.6. ACTAS DE COMITES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL PERIODO

En cumplimiento a las obligaciones del Contrato de Interventoría 24001385 H3 2024, durante el periodo reportado, se programaron y llevaron a cabo diferentes comités de seguimiento al proyecto. En el Anexo No. 7 se encuentran las respectivas actas.

3.7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

3.7.1. Correspondencia Enviada

En cumplimiento a las obligaciones del Contrato de Interventoría 24001385 H3 2024, a continuación, se presenta la relación de la correspondencia enviada a los involucrados del proyecto, durante el periodo reportado. En el Anexo No. 7 se encuentran las comunicaciones enviadas por la interventoría.

Tabla 3-13. Estado de correspondencia enviada.

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DE SALIDA	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO	RADICADO
CE-155-037-2025	10 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-037-2025 REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 2	2025190010033112.
CE-155-038-2025	10 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-038-2025 REMISIÓN INFORMES VISITAS DE SOCIALIZACIÓN	2025190010031874.
CE-155-039-2025	11 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-039-2025 CARNE INGRESO SKOC - INSPECTOR	N/A
CE-155-040-2025	10 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-040-2025 REMISIÓN INFORME SEMANAL No 9	N/A
CE-155-041-2025	14 de marzo de 2025	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	OFICIO C155-CE-041-2025 RE NS 058 METOD APENDICE 1	N/A
CE-155-042-2025	19 de marzo de 2025	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	OFICIO C155-CE-042-2025 RE NS 061 Y NS 075 METD TOPOGRAFIA	Con copia a AEROCIVIL 2025190010033218

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DE SALIDA	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO	RADICADO
CE-155-043-2025	19 de marzo de 2025	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	OFICIO C155-CE-043-2025 RE NS 062 C01 METD_EDT_CRONOGRAMA	Con copia a AEROCIVIL 2025190010033284
CE-155-044-2025	19 de marzo de 2025	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	OFICIO C155-CE-044-2025 REMISION INFORME SEMANAL 10	2025190010033765.
CE-155-045-2025	19 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-045-2025 PROFESIONAL ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	2025190010033381.
CE-155-046-2025	21 de marzo de 2025	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	OFICIO C155-CE-046-2025 RE NS 079 CRONOGRAMA VD	N/A
CE-155-047-2025	21 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-047-2025 APROBACIÓN CRONOGRAMA VD	2025190010035507.
CE-155-048-2025	21 de marzo de 2025	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	OFICIO C155-CE-048-2025 RE NS 060 METOD APENDICE 1	N/A
CE-155-049-2025	21 de marzo de 2025	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	OFICIO C155-CE-049-2025 RE NS 076 CAMBIO DE PROFESIONAL	N/A
CE-155-050-2025	21 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-050-2025 CARNETS DE INGRESO SKOC - PROFESIONALES	2025190010035517.
CE-155-051-2025	21 de marzo de 2025	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	OFICIO C155-CE-051-2025 RE NS 071 OBS INFORME MENSUAL 1	N/A

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DE SALIDA	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO	RADICADO
CE-155-052-2025	28 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-052-2025 CAMBIO HOJAS DE VIDA	2025190010037556.
CE-155-053-2025	31 de marzo de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-053-2025 REMISION INFORME SEMANAL 11	2025190010038082.
CE-155-054-2025	8 de abril de 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	OFICIO C155-CE-054-2025 REMISION INFORME SEMANAL 12	N/A

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

3.7.2. Correspondencia Recibida

En cumplimiento a las obligaciones del Contrato de Interventoría 24001385 H3 2024 a continuación se presenta la relación de la correspondencia recibida por los involucrados del proyecto, durante el periodo reportado. En el Anexo No. 7 encuentran las comunicaciones recibidas por la interventoría.

Tabla 3-14. Estado de correspondencia recibida del consultor.

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DE ENTRADA	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO
NS-068	4 de febrero de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-068 Respuesta comunicaciones C155-CE-025-2025 y C155-CE-042- 2025 de asunto: observaciones

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DE ENTRADA	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO
			metodología de topografía, alcance comunicación NS-075 de asunto: NS-061, RESPUESTA OFICIO C155-CE-021-2025, PROPUESTA LIDAR. NS-075, ALCANCE COMUNICACIÓN NS-061,
NS-069	26 de marzo de 2025	AEROCIVIL LOCAL	NS-065 Solicitud de carnetización SKOC - ENVIADO DIRECTAMENTE A LA ENTIDAD
NS-070	6 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-070 Respuesta oficio C155-CE-036-2025 actualización plan de visitas SKOC.
NS-071	7 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-071 Respuesta comunicación C155-CE-028-2025. – RESPUESTA AL COMUNICADO NS-036, INFORME MENSUAL No. 1.
NS-072	7 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-072 Informe mensual de consultoría No. 2
NS-073	7 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-073 Entrega Componente N.º 01 Metodologías y Plan de Trabajo (Apéndices) - Apéndice No. 13
NS-074	11 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-074 Respuesta comunicación C155-CE-032-2025, Observaciones Componente 4.
NS-075	11 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-075 Alcance comunicación NS-061. Propuesta vuelo LIDAR
NS-076	11 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-076 Cambio de personal No. 2'
NS-077	14 de marzo de 2025	IGAC	NS-077 Solicitud de información catastral para las áreas de influencia de los aeropuertos Santiago Pérez Quiroz en el municipio de Arauca y Los Colonizadores en el municipio de Saravena.
NS-078	18 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-078 Entrega Componente No. 2, versión A.
NS-079	18 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-079 Propuesta Cronograma Versión D
NS-080	18 de marzo de 2025	MINISTERIO DEL INTERIOR - ASUNTOS ÉTNICOS	NS-080 Solicitud de información base para ejecución del proyecto.
NS-081	20 de marzo de 2025	ESPO S.A. E.S.P.	NS-081 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-082	20 de marzo de 2025	CENS S.A. E.S.P	NS-082 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DE ENTRADA	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO
NS-083	20 de marzo de 2025	GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P.	NS-083 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-084	20 de marzo de 2025	TELECOM OCAÑA	NS-084 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-085	20 de marzo de 2025	EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.	NS-085 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-086	20 de marzo de 2025	ENELAR E.S.P.	NS-086 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-087	20 de marzo de 2025	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	NS-087 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-088	20 de marzo de 2025	EMPASTEL	NS-088 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-089	20 de marzo de 2025	ECAAAS E.S.P.	NS-089 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-090	20 de marzo de 2025	ENERGARA S.A. E.S.P	NS-090 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-091	20 de marzo de 2025	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	NS-091 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.
NS-092	20 de marzo de 2025	SARAVENA TELECOMUNICACIONES	NS-092 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información sobre infraestructura de redes de servicios públicos en el área del proyecto en referencia.

CONSORCIO INTER PMA NORTE	CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024		
VERSIÓN No. 0		FECHA	30/11/2024

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DE ENTRADA	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO
NS-093	20 de marzo de 2025	CORPORINOQUIA	Reiteración de petición, solicitud de información base para ejecución del proyecto
NS-094	26 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-094 Respuesta comunicación C155-CE-041-2025
NS-095	25 de marzo de 2025	AEROCIVIL LOCAL	Solicitud de carnetización 3 - Ocaña
NS-096	25 de marzo de 2025	MADS	Reiteración de petición, solicitud de información base para ejecución del proyecto Proyecto PENDIENTE RESPUESTA
NS-097	26 de marzo de 2025	AEROCIVIL LOCAL	Solicitud de carnetización 4 - Ocaña
NS-098	26 de marzo de 2025	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	NS-098 Reiteración de petición, solicitud de información base para ejecución del proyecto NS-028
NS-099	31 de marzo de 2025	ANT	Reiteración de petición, solicitud de información base para ejecución del proyecto
NS-100	26 de marzo de 2025	MINCULTURA	Reiteración de petición, solicitud de información base para ejecución del proyecto
NS-101	26 de marzo de 2025	AEROCIVIL LOCAL	Notificación de inicio de actividades de topografía y solicitud de carnetización No. 5
NS-102	26 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	NS-102 Levantamiento topográfico – Trabajos en campo.

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

Tabla 3-15. Estado de correspondencia recibida de la Entidad.

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DE ENTRADA	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO
1628152	11 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	Su oficio C155-CE-039-2025 – Contrato de Interventoría No. 24001385 de 2024. 1628152 (2025235070009842)
1628863	12 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	Revisión y emisión de observaciones hojas de vida del personal de la interventoría. 1628863 (2025260020009981)
1639106	26 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	Su oficio C155-CE-050-2025 - Contrato de Interventoría No 24001385 de 2024. 1639106 (2025235070011947)
1639681	27 de marzo de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	Su oficio Nro. Radicado: 2025190010035517 Id: 1637839 1639681 (2025235070012046)

Fuente: Elaboración propia – CONSORCIO INTER PMA NORTE

<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p align="center">CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>	
<p align="center">VERSIÓN No. 0</p>		<p align="center">FECHA</p> <p align="right">30/11/2024</p>

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Las garantías fueron cargadas en la plataforma SECOPII, a la fecha no se cuenta con la validación por parte de la Entidad.
- ✓ Para el presente periodo se aprobó el cronograma detallado, el 21 de marzo de 2025, el cual se remitió a la Entidad mediante comunicación C155-CE-047-2025 del 25 de marzo de 2025, con radicado de No. 2025190010035507.
- ✓ Para el presente periodo se realiza seguimiento al cronograma con corte al 25 de marzo de 2025, evidenciando lo siguiente:

Avance físico, el cual es medido de acuerdo con el avance de las actividades, considerando el nivel de maduración de cada componente:

% Programado: 36%

% Ejecutado: 26%

% Desviación: - 10%

Avance financiero, el cual es medido de acuerdo con el peso financiero asignado a cada uno de los componentes, de acuerdo con la propuesta económica:

% Programado: 15,74% - \$ 1.514.266.829

% Ejecutado: 12,02% - \$ 1.079.476.007

% Desviación: - 3,72%

La desviación está asociada a la entrega y aprobaciones de las metodologías del componente 1 y la entrega y aprobación del componente 4, correspondiente a la estructura de los documentos PMA y EPA, así mismo se evidencia una variación por el inicio de las actividades de levantamiento topográfico del componente 6.

- ✓ Teniendo en cuenta la desviación presentada en el avance del contrato, en los comités de seguimiento se le solicita al consultor presentar las estrategias necesarias para mitigar este porcentaje en esta etapa temprana para no generar demoras en el cronograma en etapas futuras.
- ✓ Es importante gestionar la información solicitada por parte del consultor, la cual, es esencial para el desarrollo de las actividades establecidas en la Etapa I.
- ✓ Es importante determinar las áreas para el levantamiento LiDAR, conjuntamente con la Entidad, teniendo en cuenta los requerimientos contractuales. En este punto se

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

han desarrollado varias reuniones, para comprender tanto la funcionalidad exigida por la entidad, así como las herramientas de levantamientos que podrían ser más idóneas para ello, sin embargo, las variaciones que puedan resultar en el alcance de estas actividades deberán ser consultadas con la entidad, con la opinión técnica de la interventoría, cuidando mantener el objeto inicial del contrato.

- ✓ La interventoría en el ejercicio de la vigilancia del contrato mediante comunicado C155-CE-042-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, con copia a la Entidad, la respuesta a las comunicaciones NS-061 y NS-075 relacionada con la propuesta a la Metodología de Topografía, solicitando a la consultoría, entre otras cosas, que la atención de las observaciones de la metodología sea elaborada y/o revisada expresamente por los especialistas desde el componente técnico, con el objetivo de garantizar la oportunidad y la calidad de los productos a entregar, con este fin la interventoría ofrece su concurso y disponibilidad, si es necesario, para el desarrollo de mesas de trabajo específicas entre especialistas, con el fin de agilizar los acuerdos técnicos para lograr los alcances del contrato.
- ✓ Las revisiones metodológicas de todas las áreas se están llevando a cabo, en primer lugar, con cada especialista, y luego se concretan con reuniones con el grupo coordinador, para finalmente producir las observaciones y recomendaciones desde la dirección de interventoría, la consultoría se ha demorado en la entrega de la totalidad de las propuestas de metodología, en la medida que han llegado a las interventorías se han revisado oportunamente.
- ✓ En las socializaciones desarrolladas en el Aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña, se evidenció baja participación por parte de los interesados, por lo cual se le solicitó al consultor realizar el seguimiento y comunicación con los actores que no asistieron con el fin de obtener sus aportes vía telefónica o correo electrónico, así mismo establecer las estrategias adecuadas para la reunión con actores institucionales como alcaldes o gobernadores que asegure su participación. Finalmente se solicita que tomen las medidas necesarias para mejorar la participación de todos los actores interesados en las siguientes socializaciones.

Actividades Aeropuerto Aguas Claras:

- ✓ El 26 de marzo de 2025, se tenía proyecta la reunión presencial de socialización del proyecto, con los operadores, sin embargo, estos no se hicieron presentes a la citación.

<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE</div>	<div>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO: 23001385 H3 2024</div>		<div></div>
<div>VERSIÓN No. 0</div>		<div>FECHA</div>	<div>30/11/2024</div>

- ✓ El 27 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión presencial de socialización del proyecto, con la participación de la Aerocivil, Consultor, Interventoría, Satena, Cámara de Comercio de Cúcuta, Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de Ocaña, Alcaldía de González, Aero Torcoroma, Ejército de Colombia y Policía Nacional, en la jornada de la mañana.
- ✓ El 27 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión presencial de socialización del proyecto, con la participación de la Aerocivil, Consultor, Interventoría, Comunidad Vereda El Limón, Comunidad Vereda Cristo Rey y Comunidad Corregimiento Aguas Claras, en la jornada de la tarde.
- ✓ El 26 de marzo de 2025, se llevó a cabo el recorrido general de reconocimiento de las instalaciones del Aeropuerto.
- ✓ El 28 de marzo de 2025, se llevó a cabo reunión presencial en campo, con la participación de la consultoría y la Interventoría, donde se revisaron las pre-alternativas para el desarrollo del EPA del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, posterior al recorrido realizado en las instalaciones, con el fin de evaluar la viabilidad de las alternativas analizadas por el consultor.

Actividades Aeropuerto Los Colonizadores:

- ✓ Entre el 3 y el 4 de marzo de 2025, se adelantaron las actividades de levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena, Arauca, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.).

Actividades Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz:

- ✓ Entre el 11 y el 12 de marzo de 2025, se adelantaron las actividades de levantamiento de inventarios y de información en las instalaciones del aeropuerto, así como en las zonas aledañas.

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 1. Documentos legales contrato Consultoría 01_Pólizas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101245333		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
27 01 2025			27 12 2024			00:00	27 12 2030			23:59	ANEXO DE MODIFICACION						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 24001333 H3 DE 2024 CUYO OBJETO REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON FORMATO 61 ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 24001333 H3 DE 2024, SE AJUSTA EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR LO TANTO, SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA Y SUS RESPECTIVOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$(43,798,599.00)	\$****(25,000.00)	\$*(8,326,483.00)	\$***** (52,150,083.00)	\$**(6,633,555,086.90)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PEREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	4722	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101245333

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101245333	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 01 2025	27 12 2024		00:00	27 12 2030		23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4251000
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ (43,798,599.00)	GASTOS EXPEDICIÓN \$ ****(25,000.00)	IVA \$ *(8,326,483.00)	TOTAL A PAGAR \$ *****52,150,083.00)	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ **(6,633,555,086.90)	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PEREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	4722	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.POLIZA 11-44-101245333		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
27 01 2025			27 12 2024			00:00	27 12 2030			23:59	ANEXO DE MODIFICACION						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5			
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3203657195		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3			
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4251000		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

SCADIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA AEROPORTUARIA DE INGENIERIA Y

CONSULTORA CAPITAL SAS - BIC

CONSULTORA CENTRAL SAS BIC

IDENTIFICACION

800141827-0

901480564-9

901665975-8

PARTICIPACION

40.00

50.00

10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101245333

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

YULIMORTIZ



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101245333		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
27 01 2025			31 12 2024			00:00	31 12 2030			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 24001333 H3 DE 2024 CUYO OBJETO REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	01/05/2026	\$1,895,301,453.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/12/2030	\$2,842,952,180.10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	31/12/2028	\$1,895,301,453.40	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON FORMATO 61 ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 24001333 H3 DE 2024, SE AJUSTA EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR LO TANTO, SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA Y SUS RESPECTIVOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ **43,798,599.00	\$ *****25,000.00	\$ ***8,326,483.00	\$ *****52,150,083.00	\$ ****6,633,555,086.90	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PEREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	4722	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101245333

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101245333	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 01 2025	31 12 2024		00:00	31 12 2030		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4251000
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ **43,798,599.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****25,000.00	IVA \$ ***8,326,483.00	TOTAL A PAGAR \$ *****52,150,083.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****6,633,555,086.90	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PEREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	4722	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11000628792898 (3900) 000052150083 (96) 20251231

REFERENCIA
PAGO:
1100062879289-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101245333		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
27	01	2025	31	12	2024	00:00	31	12	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5			
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3203657195		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3			
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4251000		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

SCADIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA AEROPORTUARIA DE INGENIERIA Y

CONSULTORA CAPITAL SAS - BIC

CONSULTORA CENTRAL SAS BIC

IDENTIFICACION

800141827-0

901480564-9

901665975-8

PARTICIPACION

40.00

50.00

10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101245333

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

YULIMORTIZ



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101072808		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
27 01 2025			27 12 2024			00:00	27 12 2025			23:59	ANEXO DE MODIFICACION						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4251000
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 24001333 H3 DE 2024 CUYO OBJETO REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, CON NIT 899.999.059-3.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
---------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON FORMATO 61 ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 24001333 H3 DE 2024, SE AJUSTA EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR LO TANTO, SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA Y SUS RESPECTIVOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$(1,235,000.00)	\$(20,000.00)	\$(238,450.00)	\$(1,493,450.00)	\$(650,000,000.00)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PEREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	4722	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072808

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-40-101072808	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 01 2025	27 12 2024		00:00	27 12 2025		23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4251000
BENEFICIARIO:	

**PAGINA WEB****CORRESPONSALES BANCARIOS****Pagos con convenio *No aplica para transferencias****Banco de Bogotá**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *(1,235,000.00)	GASTOS EXPEDICIÓN \$ ****(20,000.00)	IVA \$ ***(238,450.00)	TOTAL A PAGAR \$ ***** (1,493,450.00)	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****(650,000,000.00)	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PEREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	4722	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ				COD.SUC 11		NO.POLIZA 11-40-101072808		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
27 01 2025			27 12 2024			00:00	27 12 2025			23:59	ANEXO DE MODIFICACION				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5			
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3203657195		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3			
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4251000		

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SCADIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA AEROPORTUARIA DE INGENIERIA Y	800141827-0	40.00
CONSULTORA CAPITAL SAS - BIC	901480564-9	50.00
CONSULTORA CENTRAL SAS BIC	901665975-8	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-40-101072808

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

YULIMORTIZ



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101072808		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
27 01 2025			27 01 2025			00:00	27 01 2026			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4251000
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 24001333 H3 DE 2024 CUYO OBJETO REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, CON NIT 899.999.059-3.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/01/2025	27/01/2026	\$650,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/01/2025	27/01/2026	\$650,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/01/2025	27/01/2026	\$650,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON FORMATO 61 ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 24001333 H3 DE 2024, SE AJUSTA EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR LO TANTO, SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA Y SUS RESPECTIVOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***1,235,000.00	\$ *****20,000.00	\$ *****238,450.00	\$ *****1,493,450.00	\$ *****650,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PEREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	4722	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072808

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO			
NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	4251000

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/01/2025	27/01/2026	\$650,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/01/2025	27/01/2026	\$650,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/01/2025	27/01/2026	\$650,000,000.00	

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072808

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FERMATOMAT OF

YULIMORTIZ

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-40-101072808	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 01 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 27 01 2025			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 27 01 2026	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203657195

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4251000
BENEFICIARIO:	

**PAGINA WEB****CORRESPONSALES BANCARIOS****Pagos con convenio *No aplica para transferencias****Banco de Bogotá****Grupo Bancolombia****Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445****Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189**

VALOR PRIMA NETA \$ ***1,235,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****238,450.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1,493,450.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****650,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE PEREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	CLAVE 4722	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11000628792938 (3900) 000001493450 (96) 20260127

REFERENCIA
PAGO:
1100062879293-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA				COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101072808		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			HORAS	DÍA MES AÑO			HORAS					
27 01 2025			27 01 2025			00:00	27 01 2026			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.898.961-5	
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 96 - 67						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3203657195	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4251000	

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

SCADIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA AEROPORTUARIA DE INGENIERIA Y

CONSULTORA CAPITAL SAS - BIC

CONSULTORA CENTRAL SAS BIC

IDENTIFICACION

800141827-0

901480564-9

901665975-8

PARTICIPACION

40.00

50.00

10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072808

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

YULIMORTIZ

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 1. Documentos legales contrato Consultoría 02_Acta de inicio

 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 1500.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	No. 24001333 H3 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	Consultoría
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS NIT 901.898.961-5
OBJETO	REALIZAR CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER
VALOR	NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.476.507.267) INCLUIDO IVA
PLAZO	12 MESES
CDP	No. 91824 del 17 de mayo de 2024
RP	Compromiso Presupuestal de Gasto No. 413324 del 28 de diciembre de 2024 Compromiso de vigencia futura No. 3724 del 28 de diciembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	Aprobación Póliza de Garantías – 31 de diciembre de 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER PMA NORTE NIT 901.900.799-6

A los 31 días del mes de diciembre de 2024 se reunieron, de un lado, **MIGUEL ÁNGEL VARGAS PINZÓN** identificado con cédula de ciudadanía 79.613.873, representante legal

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 1500.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2

suplente del **CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS** identificado con NIT 901.898.961-5; de otro, **JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE** identificado con cédula de ciudadanía 80.854.607 representante legal del **CONSORCIO INTER PMA NORTE** identificado con NIT 901.900.799-6, interventor del presente contrato; y, de otro, **ÉDGAR IVÁN CANO MONROY**, en su calidad de Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ordenador del gasto y supervisor para el presente contrato, conforme a las competencias delegadas para el efecto de ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dar inicio al Contrato No. 24001333 H3 DE 2024, previa verificación del cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

Para constancia se firma por quienes intervinieron, a los 31 días del mes de diciembre de 2024.


Miguel Ángel Vargas (Dec 31, 2024 13:32 EST)

MIGUEL ÁNGEL VARGAS PINZÓN
 C.C. 79.613.873
 Representante Legal
 CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS


ÉDGAR IVÁN CANO MONROY
 Jefe Oficina Gestión de Proyectos
 Supervisor Contrato 23001385 H3 DE 2024


JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
 C.C. 80.854.607
 Representante Legal
 CONSORCIO INTER PMA NORTE

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 2. Documentos legales contrato Interventoría 01_Pólizas



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-44-101236550	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 15 01 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 30 12 2024		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2030		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4043339
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 24001385 H3 2024, RELACIONADO CON REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO N 24001385 H3 2024, SE DEJA CONSTANCIA DEL AJUSTE A LAS VIGENCIAS COMENZANDO A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *(8,379,806.00)	\$ ****(20,000.00)	\$ *(1,595,963.00)	\$ ***** (9,995,769.00)	\$ ** (1,444,316,633.40)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101236550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Firmado digitalmente por JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153840A

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101236550		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
15 01 2025			30 12 2024			00:00	30 12 2030			23:59	ANEXO DE MODIFICACION						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4043339

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *(8,379,806.00)	GASTOS EXPEDICIÓN \$ ****(20,000.00)	IVA \$ *(1,595,963.00)	TOTAL A PAGAR \$ ***** (9,995,769.00)	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ** (1,444,316,633.40)	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.POLIZA 65-44-101236550	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
15 01 2025	30 12 2024			00:00	30 12 2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.900.799-6
DIRECCIÓN:	CL 104A NRO. 47 A - 58	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	4043339

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE
INGEPLAN CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC
INCOPLAN IN S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
800169622-1	40.00
901472564-5	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101236550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Firmado digitalmente por
JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA TOMADOR

DLF153840A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101236550, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 15 días del mes de ENERO de 2025

65-44-101236550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-44-101236550	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 15 01 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 12 2024		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2030		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4043339

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 24001385 H3 2024, RELACIONADO CON REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	01/05/2026	\$481,438,877.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	31/12/2028	\$481,438,877.80	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/12/2030	\$481,438,877.80	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO N 24001385 H3 2024, SE DEJA CONSTANCIA DEL AJUSTE A LAS VIGENCIAS COMENZANDO A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***8,379,806.00	\$ *****20,000.00	\$ ***1,595,963.00	\$ *****9,995,769.00	\$ ****1,444,316,633.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101236550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Firmado digitalmente por JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153840A

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101236550		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
15 01 2025			31 12 2024			00:00	31 12 2030			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4043339

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***8,379,806.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ ***1,595,963.00	TOTAL A PAGAR \$ *****9,995,769.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,444,316,633.40	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11012619668971 (3900) 000009995769 (96) 20251231

REFERENCIA PAGO:

1101261966897-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.POLIZA 65-44-101236550	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
15 01 2025	31 12 2024			00:00	31 12 2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT:	901.900.799-6
DIRECCIÓN:	CL 104A NRO. 47 A - 58	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT:	899.999.059-3
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	4043339

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE
INGEPLAN CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC
INCOPLAN IN S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
800169622-1	40.00
901472564-5	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101236550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Firmado digitalmente por JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA TOMADOR

DLF153840A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101236550, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 15 días del mes de ENERO de 2025

65-44-101236550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-40-101079550	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
15 01 2025	30 12 2024		00:00	30 12 2025		23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4043339
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 24001385 H3 2024, RELACIONADO CON REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACION DE PMA ATO SKUC Y ELABORACION BPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER.

ASEGURADOS: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL Y CONSORCIO INTER PMA NORTE
BENEFICIARIOS: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
---------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO N 24001385 H3 2024, SE DEJA CONSTANCIA DEL AJUSTE A LAS VIGENCIAS COMENZANDO A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***(780,000.00)	\$ ****(20,000.00)	\$ ***(152,000.00)	\$ ***** (952,000.00)	\$ *****(390,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101079550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Firmado digitalmente por
JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153840A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-40-101079550		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
15 01 2025			30 12 2024			00:00	30 12 2025			23:59	ANEXO DE MODIFICACION						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6			
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3209391842		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3						
DIRECCIÓN:		AV EL DORADO NRO. 103 - 15		CIUDAD:		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO		4043339	
BENEFICIARIO:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***(780,000.00)	GASTOS EXPEDICIÓN \$ ****(20,000.00)	IVA \$ ***(152,000.00)	TOTAL A PAGAR \$ ***** (952,000.00)	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****(390,000,000.00)	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN				COD.SUC 65		NO.POLIZA 65-40-101079550		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
15 01 2025			30 12 2024			00:00	30 12 2025			23:59	ANEXO DE MODIFICACION				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6			
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3209391842		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL										IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4043339	
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL											

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE
INGEPLAN CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC
INCOPLAN IN S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
800169622-1	40.00
901472564-5	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101079550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Firmado digitalmente por
JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA TOMADOR

DLF153840A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-40-101079550	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
15 01 2025	31 12 2024		00:00	31 12 2025		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4043339
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 24001385 H3 2024, RELACIONADO CON REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACION DE PMA ATO SKUC Y ELABORACION BPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER.

ASEGURADOS:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL Y CONSORCIO INTER PMA NORTE
BENEFICIARIOS:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	31/12/2025	\$390,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	31/12/2025	\$390,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	31/12/2025	\$390,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO N 24001385 H3 2024, SE DEJA CONSTANCIA DEL AJUSTE A LAS VIGENCIAS COMENZANDO A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****780,000.00	\$ *****20,000.00	\$ *****152,000.00	\$ *****952,000.00	\$ *****390,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101079550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



JUAN
PABLO
MUÑOZ
ANDRADE

Firmado
digitalmente
por JUAN
PABLO MUÑOZ
ANDRADE

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153840A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.POLIZA 65-40-101079550		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
15 01 2025			31 12 2024			00:00	31 12 2025			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6			
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3209391842		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL										IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4043339		
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	31/12/2025	\$390,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	31/12/2025	\$390,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	31/12/2025	\$390,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101079550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Firmado digitalmente por JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA TOMADOR

DLP153840A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-40-101079550		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
15 01 2025			31 12 2024			00:00	31 12 2025			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3209391842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4043339
BENEFICIARIO:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****780,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****152,000.00	TOTAL A PAGAR \$ *****952,000.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****390,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11012619669006 (3900) 000000952000 (96) 20251231

REFERENCIA
PAGO:

1101261966900-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.POLIZA 65-40-101079550		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
15	01	2025	31	12	2024	00:00	31	12	2025	23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER PMA NORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.799-6		
DIRECCIÓN: CL 104A NRO. 47 A - 58						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3209391842	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL			IDENTIFICACIÓN		NIT: 899.999.059-3						
DIRECCIÓN:				AV EL DORADO NRO. 103 - 15		CIUDAD:		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO:		4043339	
BENEFICIARIO:		899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL											

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE
INGEPLAN CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC
INCOPLAN IN S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
800169622-1	40.00
901472564-5	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101079550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Firmado digitalmente por
JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA TOMADOR

DLF153840A

3

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 2. Documentos legales contrato Interventoría 02_Acta de inicio

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 1500.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2


NÚMERO DE CONTRATO	No. 24001385 H3 2024
CLASE DE CONTRATO	Interventoría
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER PMA NORTE NIT 901.900.799-6
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER
VALOR	DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.407.194.389) INCLUIDO IVA
PLAZO	12 MESES
CDP	No. 91924 - 17 de mayo de 2024
RP	Compromiso Presupuestal de Gasto No. 414224 del 30 de diciembre de 2024 Compromiso de vigencia futura No. 4524 del 30 de diciembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	Aprobación Póliza de Garantías – 31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR	ÉDGAR IVÁN CANO MONROY

En la ciudad de Bogotá a los 31 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, de un lado, **JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE** identificado con cédula de ciudadanía 80.854.607 representante legal del **CONSORCIO INTER PMA NORTE** identificado con el NIT

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 1500.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2

901.900.799-6; y, de otro, **ÉDGAR IVÁN CANO MONROY**, en su calidad de Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ordenador del gasto y supervisor para el presente contrato, conforme a las competencias delegadas para el efecto de ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dar inicio al Contrato No. 24001385 H3 2024, previa verificación del cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

Para constancia se firma por quienes intervinieron, a los 31 días del mes de diciembre de 2024.



JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
 C.C. 80.854.607
 Representante Legal
 CONSORCIO INTER PMA NORTE


EDGAR IVÁN CANO MONROY
 Jefe Oficina Gestión de Proyectos
 Supervisor Contrato No. 24001385 H3 2024

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 3. Cronograma detallado de contrato 00_Cronograma Aprobado

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																		
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	tri 1, 2025 dic ene feb mar tri 2, 2025 abr may jun tri 3, 2025 jul ago sep tri 4, 2025 oct nov dic tri 1, 2026 ene														
1	1	CONTRATO DE CONSULTORÍA 24001333 H3 DE 2024	260 días															0%
2	1.1	INICIO CONSULTORÍA	0 días	2/01														
3	1.2	PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA (36%)	260 días															0%
4	1.2.1	INICIO PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días	2/01														
5	1.2.2	ETAPA I (CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)	78 días	2/01														0%
6	1.2.2.1	INICIO ETAPA I	0 días	2/01														0%
7	1.2.2.2	METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	57 días	2/01														0%
8	1.2.2.2.1	INICIO METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	0 días	2/01														
9	1.2.2.2.2	TOPOGRAFÍA	52 días	0%														
10	1.2.2.2.3	SOCIAL	52 días	0%														
11	1.2.2.2.4	AMBIENTAL	52 días	0%														
12	1.2.2.2.5	PREDIAL	52 días	0%														
13	1.2.2.2.6	GEOTECNIA	52 días	0%														
14	1.2.2.2.7	ANALISIS DE ALTERNATIVAS	52 días	0%														
15	1.2.2.2.8	FINANCIERA	52 días	0%														
16	1.2.2.2.9	PROGNOSIS	52 días	0%														
17	1.2.2.2.10	CAPACIDAD DE DEMANDA	52 días	0%														
18	1.2.2.2.11	ANALISIS OPERACIONAL	52 días	0%														
19	1.2.2.2.12	RED AEROPORTUARIA	52 días	0%														
20	1.2.2.2.13	JURIDICA	52 días	0%														
21	1.2.2.2.14	RIESGOS	52 días	0%														
22	1.2.2.2.15	INFORMACIÓN PRIMARIA	52 días	0%														
23	1.2.2.2.16	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días	0%														
24	1.2.2.2.17	FIN METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	0 días	21/03														
25	1.2.2.3	GESTIÓN ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	40 días	22/01														0%
26	1.2.2.3.1	INICIO GESTIÓN ANTES LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	0 días	0%														
27	1.2.2.3.2	TRÁMITES Y GESTIÓN ENTIDADES E INTERESADOS	30 días	0%														
28	1.2.2.3.3	REVISIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA (TÉCNICA, LEGAL, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA, REGIONAL, NACIONAL, ETC)	20 días	0%														
29	1.2.2.3.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días	0%														
30	1.2.2.3.5	FIN GESTIÓN ANTES LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	0 días	19/03														
31	1.2.2.4	IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	50 días	0%														
		Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva								
		División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo								
		Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo								
		Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite								
		División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo										
Página 1																		

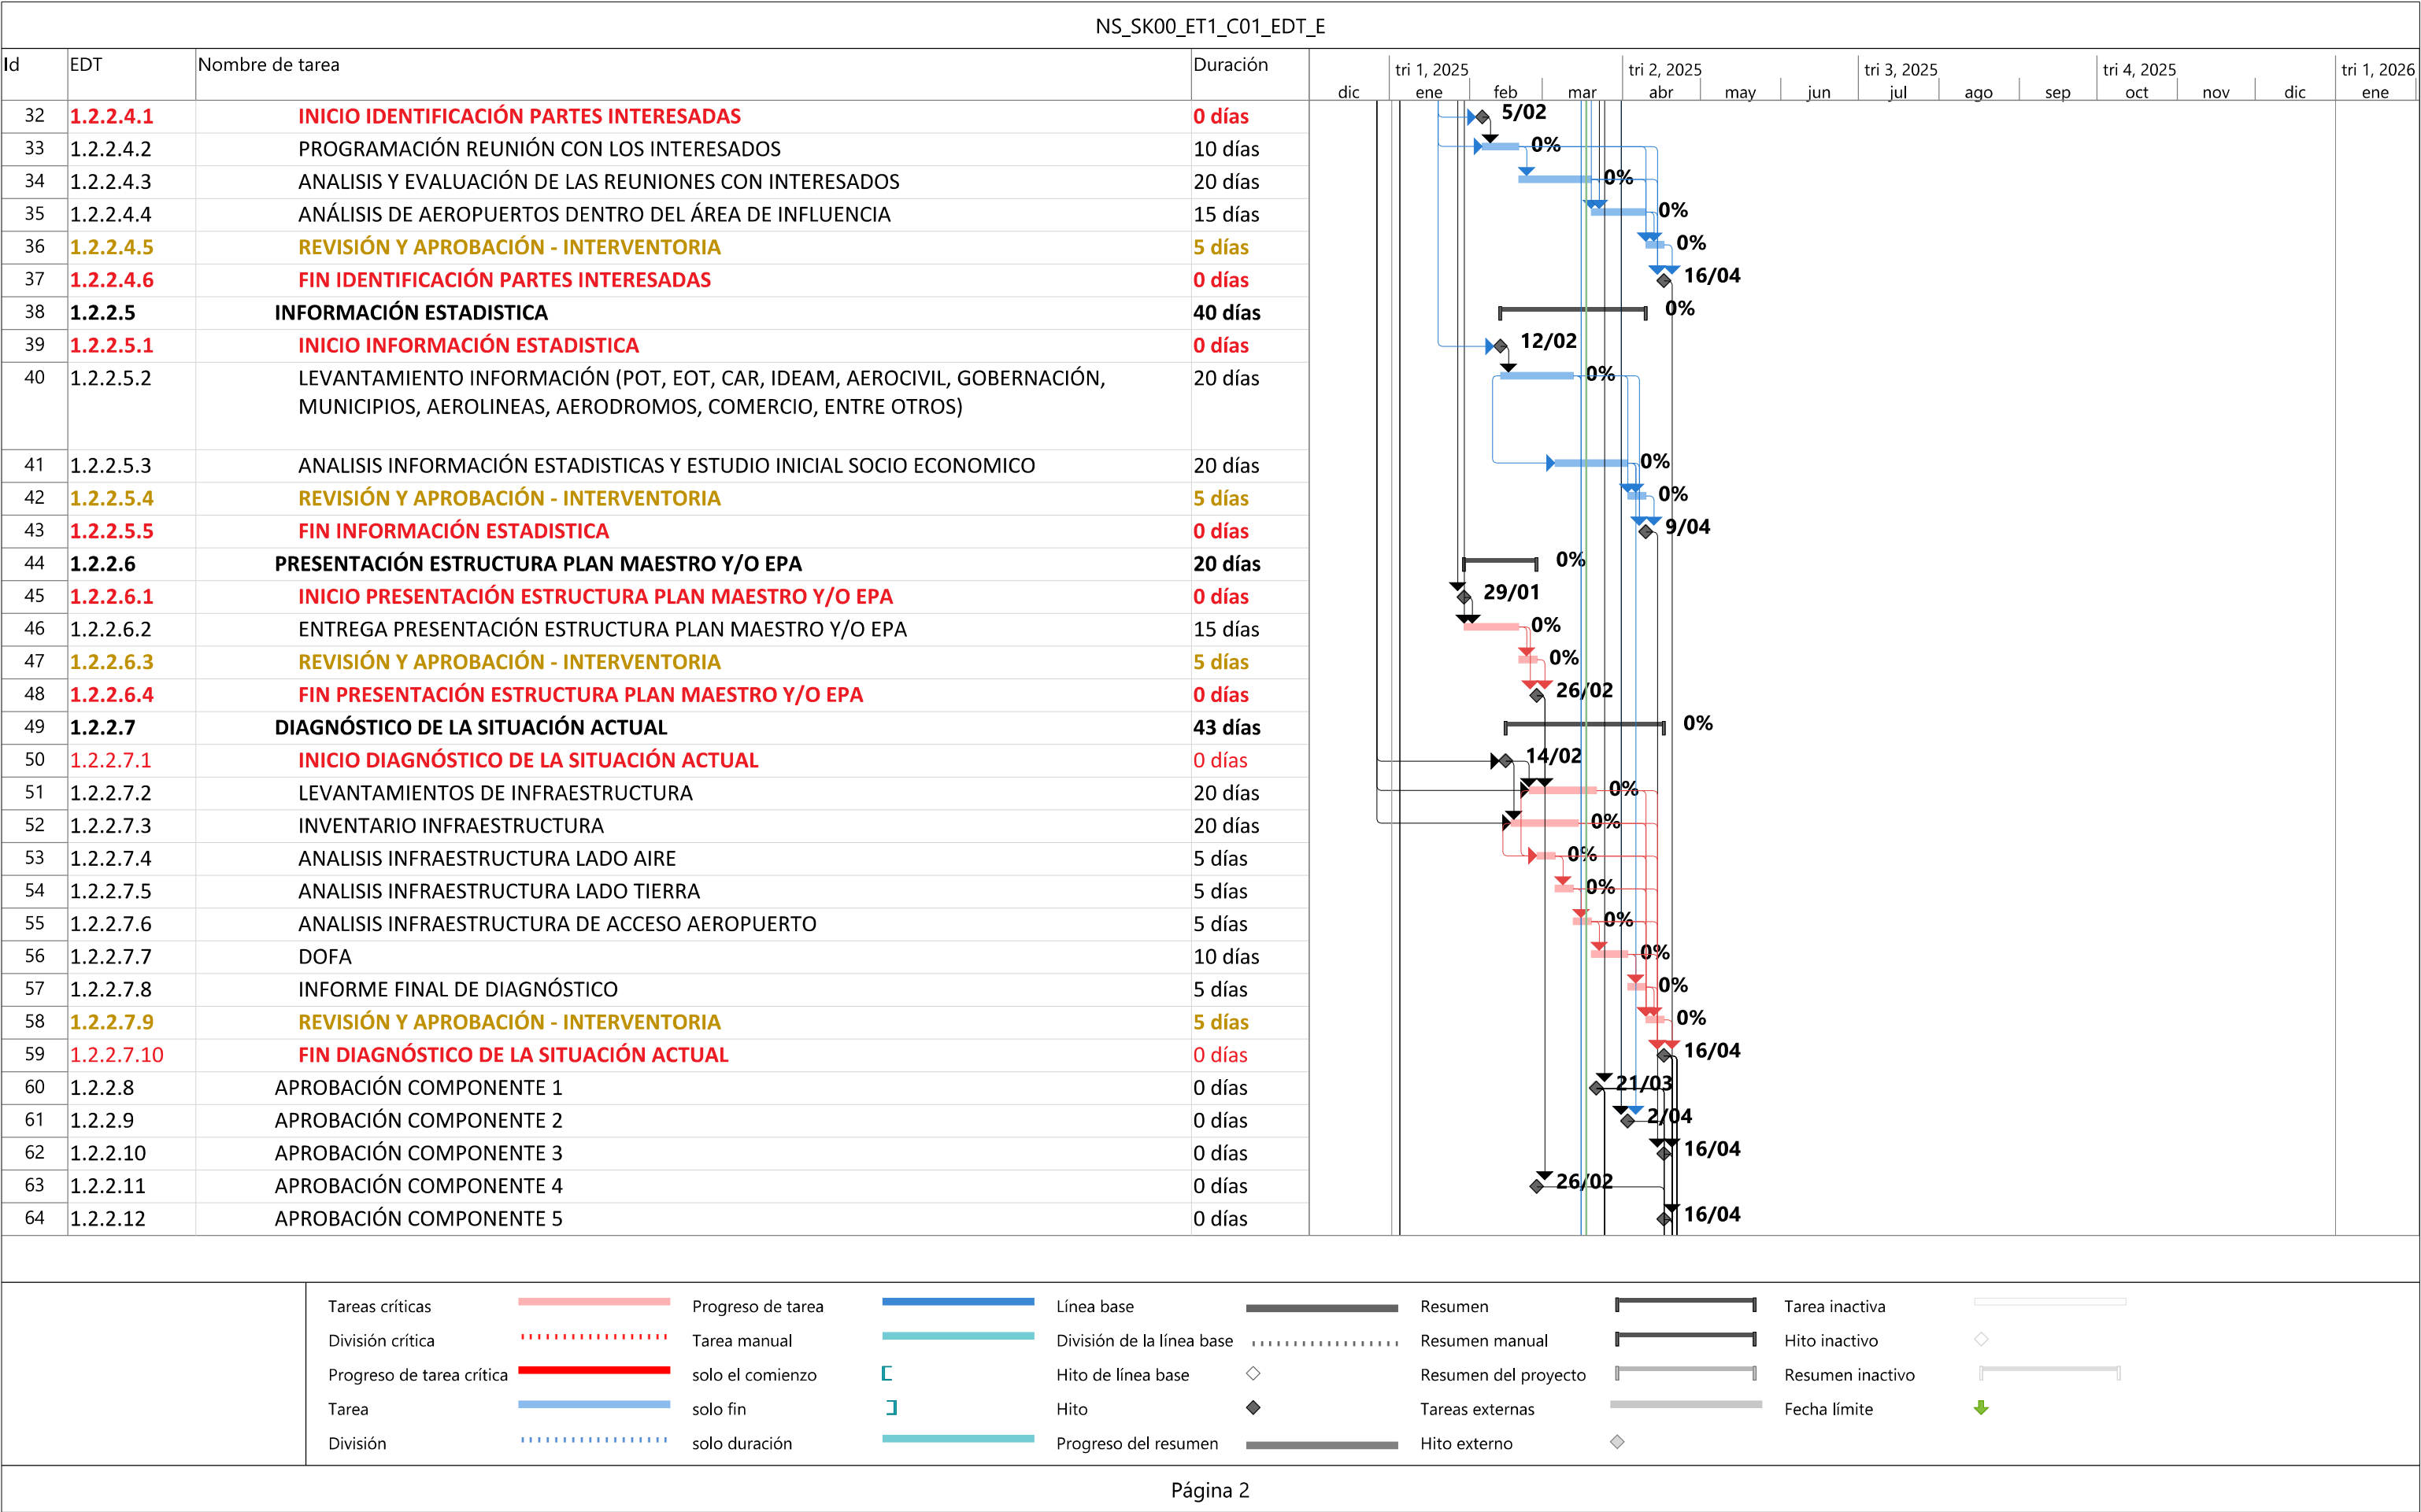

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																						
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun	tri 3, 2025	jul	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene
65	1.2.2.13	ENTREGA DE LOS CAPITULOS DEL PMA INTRODUCCIÓN, INVENTARIOS, ESTADISTICAS Y ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO	3 días																			
66	1.2.2.14	FIN ETAPA I	0 días																			
67	1.2.3	ETAPA II (DIAGNÓSTICO AEROPUERTO)	60 días																			
68	1.2.3.1	INICIO ETAPA II	0 días																			
69	1.2.3.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	33 días																			
70	1.2.3.2.1	INICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	0 días																			
71	1.2.3.2.2	LEVANTAMIENTO LADO AIRE	20 días																			
72	1.2.3.2.3	LEVANTAMIENTO LADO TIERRA	20 días																			
73	1.2.3.2.4	LEVANTAMIENTO ACCESO Y REDES	20 días																			
74	1.2.3.2.5	ANÁLISIS TECNOLOGIA ACTUAL LADO AIRE VERSUS LA REQUERIDA	10 días																			
75	1.2.3.2.6	ANÁLISIS TECNOLOGIA ACTUAL LADO TIERRA VERSUS LA REQUERIDA	10 días																			
76	1.2.3.2.7	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
77	1.2.3.2.8	FIN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	0 días																			
78	1.2.3.3	PRONÓSTICO DE TRÁFICO	45 días																			
79	1.2.3.3.1	INICIO PRONÓSTICO DE TRÁFICO	0 días																			
80	1.2.3.3.2	PRONOSTICO DE TRÁFICO	25 días																			
81	1.2.3.3.3	APROBACIÓN PRONOSTICO DE TRÁFICO	15 días																			
82	1.2.3.3.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
83	1.2.3.3.5	FIN PRONÓSTICO DE TRÁFICO	0 días																			
84	1.2.3.4	EVALUACIÓN OPERACIONAL	55 días																			
85	1.2.3.4.1	INICIO EVALUACIÓN OPERACIONAL	0 días																			
86	1.2.3.4.2	ANÁLISIS OBSTACULOS	30 días																			
87	1.2.3.4.3	ANÁLISIS ESTUDIO OPERACIONAL DEL SISTEMA AEROPORTUARIOS	20 días																			
88	1.2.3.4.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
89	1.2.3.4.5	FIN EVALUACIÓN OPERACIONAL	0 días																			
90	1.2.3.5	ESTUDIO DE IMPACTOS	15 días																			
91	1.2.3.5.1	INICIO ESTUDIO DE IMPACTOS	0 días																			
92	1.2.3.5.2	ESTUDIO ALTERNATIVA AMBIENTAL	10 días																			
93	1.2.3.5.3	ESTUDIO ALTERNATIVA URBANA	10 días																			
94	1.2.3.5.4	ESTUDIO ALTERNATIVA SOCIAL	10 días																			
95	1.2.3.5.5	ESTUDIO ALTERNATIVA PREDIAL	10 días																			
96	1.2.3.5.6	LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	10 días																			
97	1.2.3.5.7	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
98	1.2.3.5.8	FIN ESTUDIO DE IMPACTOS	0 días																			
99	1.2.3.6	CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	15 días																			
		Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva												
		División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo												
		Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo												
		Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite												
		División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo														
Página 3																						

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración													
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025		
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
100	1.2.3.6.1	INICIO CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	0 días					16/04								
101	1.2.3.6.2	LADO AIRE	10 días					0%								
102	1.2.3.6.3	LADO TIERRA	10 días					0%								
103	1.2.3.6.4	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	10 días					0%								
104	1.2.3.6.5	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días					0%								
105	1.2.3.6.6	FIN CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	0 días					7/05								
106	1.2.3.7	REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	17 días					0%								
107	1.2.3.7.1	INICIO REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	0 días					7/05								
108	1.2.3.7.2	LADO AIRE	12 días					0%								
109	1.2.3.7.3	LADO TIERRA	12 días					0%								
110	1.2.3.7.4	ACCESO AEROPUERTO	12 días					0%								
111	1.2.3.7.5	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	12 días					0%								
112	1.2.3.7.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días					0%								
113	1.2.3.7.7	FIN REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	0 días					30/05								
114	1.2.3.8	APROBACIÓN COMPONENTE 6	0 días					7/05								
115	1.2.3.9	APROBACIÓN COMPONENTE 7	0 días					14/05								
116	1.2.3.10	APROBACIÓN COMPONENTE 8	0 días					28/05								
117	1.2.3.11	APROBACIÓN COMPONENTE 9	0 días					12/05								
118	1.2.3.12	APROBACIÓN COMPONENTE 10	0 días					28/05								
119	1.2.3.13	APROBACIÓN COMPONENTE 11	0 días					7/05								
120	1.2.3.14	APROBACIÓN COMPONENTE 12	0 días					30/05								
121	1.2.3.15	ENTREGA DE LOS CAPITULOS DEL PMA PRÓNOSTICO DE TRÁFICO, ANÁLISIS DE DEMANDA, ANÁLISIS DE CAPACIDAD, ANÁLISIS ALTERNATIVAS	3 días					0%								
122	1.2.3.16	FIN ETAPA II	0 días					30/05								
123	1.2.4	ETAPA III (ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD)	93 días					0%								
124	1.2.4.1	INICIO ETAPA III	0 días					22/05								
125	1.2.4.2	IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO	15 días					0%								
126	1.2.4.2.1	INICIO IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO	0 días					30/05								
127	1.2.4.2.2	AMBIENTAL	10 días					0%								
128	1.2.4.2.3	SOCIAL	10 días					0%								
129	1.2.4.2.4	URBANO Y CONECTIVIDAD	10 días					0%								
130	1.2.4.2.5	PREDIAL	10 días					0%								
131	1.2.4.2.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días					0%								
132	1.2.4.2.7	FIN IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO	0 días					20/06								
133	1.2.4.3	PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS ANTE LA AEROCIVIL	7 días					0%								
134	1.2.4.3.1	INCIO PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS ANTE LA AEROCIVIL	0 días					20/06								
		Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva						
		División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo						
		Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo						
		Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite						
		División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo								
Página 4																

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun	tri 3, 2025	jul	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene
135	1.2.4.3.2	ENTREGA ALTERNATIVAS ANTE LA AEROCIVIL	2 días																			
136	1.2.4.3.3	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA/AEROCIVIL	5 días																			
137	1.2.4.3.4	FIN PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS ANTE LA AEROCIVIL	0 días																			
138	1.2.4.4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTERNATIVAS	25 días																			
139	1.2.4.4.1	INICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTERNATIVAS	0 días																			
140	1.2.4.4.2	LADO AIRE	20 días																			
141	1.2.4.4.3	LADO TIERRA	20 días																			
142	1.2.4.4.4	ACCESOS	20 días																			
143	1.2.4.4.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	20 días																			
144	1.2.4.4.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
145	1.2.4.4.7	FIN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTERNATIVAS	0 días																			
146	1.2.4.5	ANÁLISIS MULTICRITERIO	23 días																			
147	1.2.4.5.1	INICIO ANÁLISIS MULTICRITERIO	0 días																			
148	1.2.4.5.2	ANÁLISIS DOFA - CAME ALTERNATIVAS	5 días																			
149	1.2.4.5.3	EVALUACIÓN MULTICRITERIO	5 días																			
150	1.2.4.5.4	SELECCIÓN RECOMENDADA	3 días																			
151	1.2.4.5.5	SELECCIÓN ALTERNATIVA (POR AEROCIVIL)	5 días																			
152	1.2.4.5.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
153	1.2.4.5.7	FIN ANÁLISIS MULTICRITERIO	0 días																			
154	1.2.4.6	DESARROLLO ALTERNATIVA SELECCIONADA	22 días																			
155	1.2.4.6.1	INICIO DESARROLLO ALTERNATIVA SELECCIONADA	0 días																			
156	1.2.4.6.2	DESARROLLO ALTERNATIVA I (FASEADO Y DISEÑOS PREFACTIBILIDAD)	7 días																			
157	1.2.4.6.3	DESARROLLO ALTERNATIVA II (SOCIO-ECONOMICO, IMPACTOS, CONECTIVIDAD INTERMODAL Y MULITIMODAL, ILES)	7 días																			
158	1.2.4.6.4	ESTIMACIÓN COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE MEJORAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	10 días																			
159	1.2.4.6.5	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
160	1.2.4.6.6	FIN DESARROLLO ALTERNATIVA SELECCIONADA	0 días																			
161	1.2.4.7	ESTUDIO DE CAPACIDAD OPERACIONAL, ATM, CNS	18 días																			
162	1.2.4.7.1	INICIO ESTUDIO DE CAPACIDAD OPERACIONAL, ATM, CNS	0 días																			
163	1.2.4.7.2	ALTERNATIVA I	13 días																			
164	1.2.4.7.3	ALTERNATIVA II	13 días																			
165	1.2.4.7.4	ALTERNATIVA III	13 días																			
166	1.2.4.7.5	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
167	1.2.4.7.6	FIN ESTUDIO DE CAPACIDAD OPERACIONAL, ATM, CNS	0 días																			
168	1.2.4.8	ESTUDIO GEOTECNICO Y GEOMORFOLOGICO	65 días																			

Tareas críticas

Progreso de tarea

Línea base

Resumen

Tarea inactiva

División crítica

Tarea manual

División de la línea base

Resumen manual

Hito inactivo

Progreso de tarea crítica

solo el comienzo

Hito de línea base

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Tarea

solo fin

Hito

Tareas externas

Fecha límite

División

solo duración

Progreso del resumen

Hito externo


Página 5

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración													
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025		
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
202	1.2.4.24	APROBACIÓN COMPONENTE 25	0 días													
203	1.2.4.25	APROBACIÓN COMPONENTE 26	0 días													
204	1.2.4.26	APROBACIÓN COMPONENTE 27	0 días													
205	1.2.4.27	APROBACIÓN COMPONENTE 28	0 días													
206	1.2.4.28	FIN ETAPA III	0 días													
207	1.2.5	ETAPA IV (DISEÑOS DE FACTIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA)	56 días													
208	1.2.5.1	INICIO ETAPA IV	0 días													
209	1.2.5.2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	49 días													
210	1.2.5.2.1	INICIO ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días													
211	1.2.5.2.2	TOPOGRAFÍA	44 días													
212	1.2.5.2.3	ANALISIS Y CONCEPTO OPERACIONAL	44 días													
213	1.2.5.2.4	ESTUDIOS PEDIALES Y JURIDICOS, DILIGENCIAS PEDIALES	44 días													
214	1.2.5.2.5	VIABILIDAD URBANA, DISEÑO URBANO, PAISAJISMO Y ARQUITECTURA	44 días													
215	1.2.5.2.6	GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	44 días													
216	1.2.5.2.7	METEOROLOGÍA	44 días													
217	1.2.5.2.8	HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	44 días													
218	1.2.5.2.9	ESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURA AREONAUTICA	44 días													
219	1.2.5.2.10	DISEÑO GEOMETRICO	44 días													
220	1.2.5.2.11	DISEÑO DE PAVIMENTOS	44 días													
221	1.2.5.2.12	DISEÑO DE REDES HUMEDAS	44 días													
222	1.2.5.2.13	DISEÑO DE REDES SECAS	44 días													
223	1.2.5.2.14	EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS	44 días													
224	1.2.5.2.15	AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS	44 días													
225	1.2.5.2.16	SST	44 días													
226	1.2.5.2.17	GESTIÓN SOCIAL	44 días													
227	1.2.5.2.18	ESTUDIOS DE TRAFICO AREONAUTICO Y AEROPORTUARIO	44 días													
228	1.2.5.2.19	ESPECIFICACIONES, CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	44 días													
229	1.2.5.2.20	GESTIÓN DE RIESGOS	44 días													
230	1.2.5.2.21	ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL	44 días													
231	1.2.5.2.22	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL	44 días													
232	1.2.5.2.23	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días													
233	1.2.5.2.24	FIN ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días													
234	1.2.5.3	APROBACIÓN COMPONENTE 29	0 días													
235	1.2.5.4	ENTREGA DE LOS CAPITULOS DEL PMA PRESUPUESTOS, PLANOS, DOCUMENTO PLAN MAESTRO	51 días													
236	1.2.5.5	FIN ETAPA IV	0 días													

Tareas críticas	<div></div>	Progreso de tarea	<div></div>	Línea base	<div></div>	Resumen	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>
División crítica	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	División de la línea base	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>
Progreso de tarea crítica	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Hito de línea base	<div></div>	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>
Tarea	<div></div>	solo fin	<div></div>	Hito	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
División	<div></div>	solo duración	<div></div>	Progreso del resumen	<div></div>	Hito externo	<div></div>		


Página 7

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																						
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Gantt Chart																		
				dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun	tri 3, 2025	jul	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene
237	1.2.6	ETAPA V (VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA)	56 días																			
238	1.2.6.1	INICIO ETAPA V	0 días																			
239	1.2.6.2	COMPONENTE 30	56 días																			
240	1.2.6.2.1	INICIO COMPONENTE 30	0 días																			
241	1.2.6.2.2	DOCUMENTOS ANEXO JURIDICO	56 días																			
242	1.2.6.2.3	DOCUMENTOS ANEXO FINANCIERO	30 días																			
243	1.2.6.2.4	FIN COMPONENTE 30	0 días																			
244	1.2.6.3	FIN ETAPA V	0 días																			
245	1.2.7	ENTREGA FINAL	20 días																			
246	1.2.8	FIN PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días																			
247	1.3	EPA LOS COLONIZADORES DE SARAVERA (33%)	260 días																			
248	1.3.1	INICIO PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días																			
249	1.3.2	ETAPA I (CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)	78 días																			
250	1.3.2.1	INICIO ETAPA I	0 días																			
251	1.3.2.2	METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	57 días																			
252	1.3.2.2.1	INICIO METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	0 días																			
253	1.3.2.2.2	TOPOGRAFÍA	52 días																			
254	1.3.2.2.3	SOCIAL	52 días																			
255	1.3.2.2.4	AMBIENTAL	52 días																			
256	1.3.2.2.5	PREDIAL	52 días																			
257	1.3.2.2.6	GEOTECNIA	52 días																			
258	1.3.2.2.7	ANALISIS DE ALTERNATIVAS	52 días																			
259	1.3.2.2.8	FINANCIERA	52 días																			
260	1.3.2.2.9	PROGNOSIS	52 días																			
261	1.3.2.2.10	CAPACIDAD DE DEMANDA	52 días																			
262	1.3.2.2.11	ANALISIS OPERACIONAL	52 días																			
263	1.3.2.2.12	RED AEROPORTUARIA	52 días																			
264	1.3.2.2.13	JURIDICA	52 días																			
265	1.3.2.2.14	RIESGOS	52 días																			
266	1.3.2.2.15	INFORMACIÓN PRIMARIA	52 días																			
267	1.3.2.2.16	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
268	1.3.2.2.17	FIN METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	0 días																			
269	1.3.2.3	GESTIÓN ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	40 días																			
<div><div><div>Tareas críticas</div><div>División crítica</div><div>Progreso de tarea crítica</div><div>Tarea</div><div>División</div></div><div><div>Progreso de tarea</div><div>Tarea manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>solo duración</div></div><div><div>Línea base</div><div>División de la línea base</div><div>Hito de línea base</div><div>Hito</div><div>Progreso del resumen</div></div><div><div>Resumen</div><div>Resumen manual</div><div>Resumen del proyecto</div><div>Tareas externas</div><div>Hito externo</div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Fecha límite</div></div></div>																						
Página 8																						

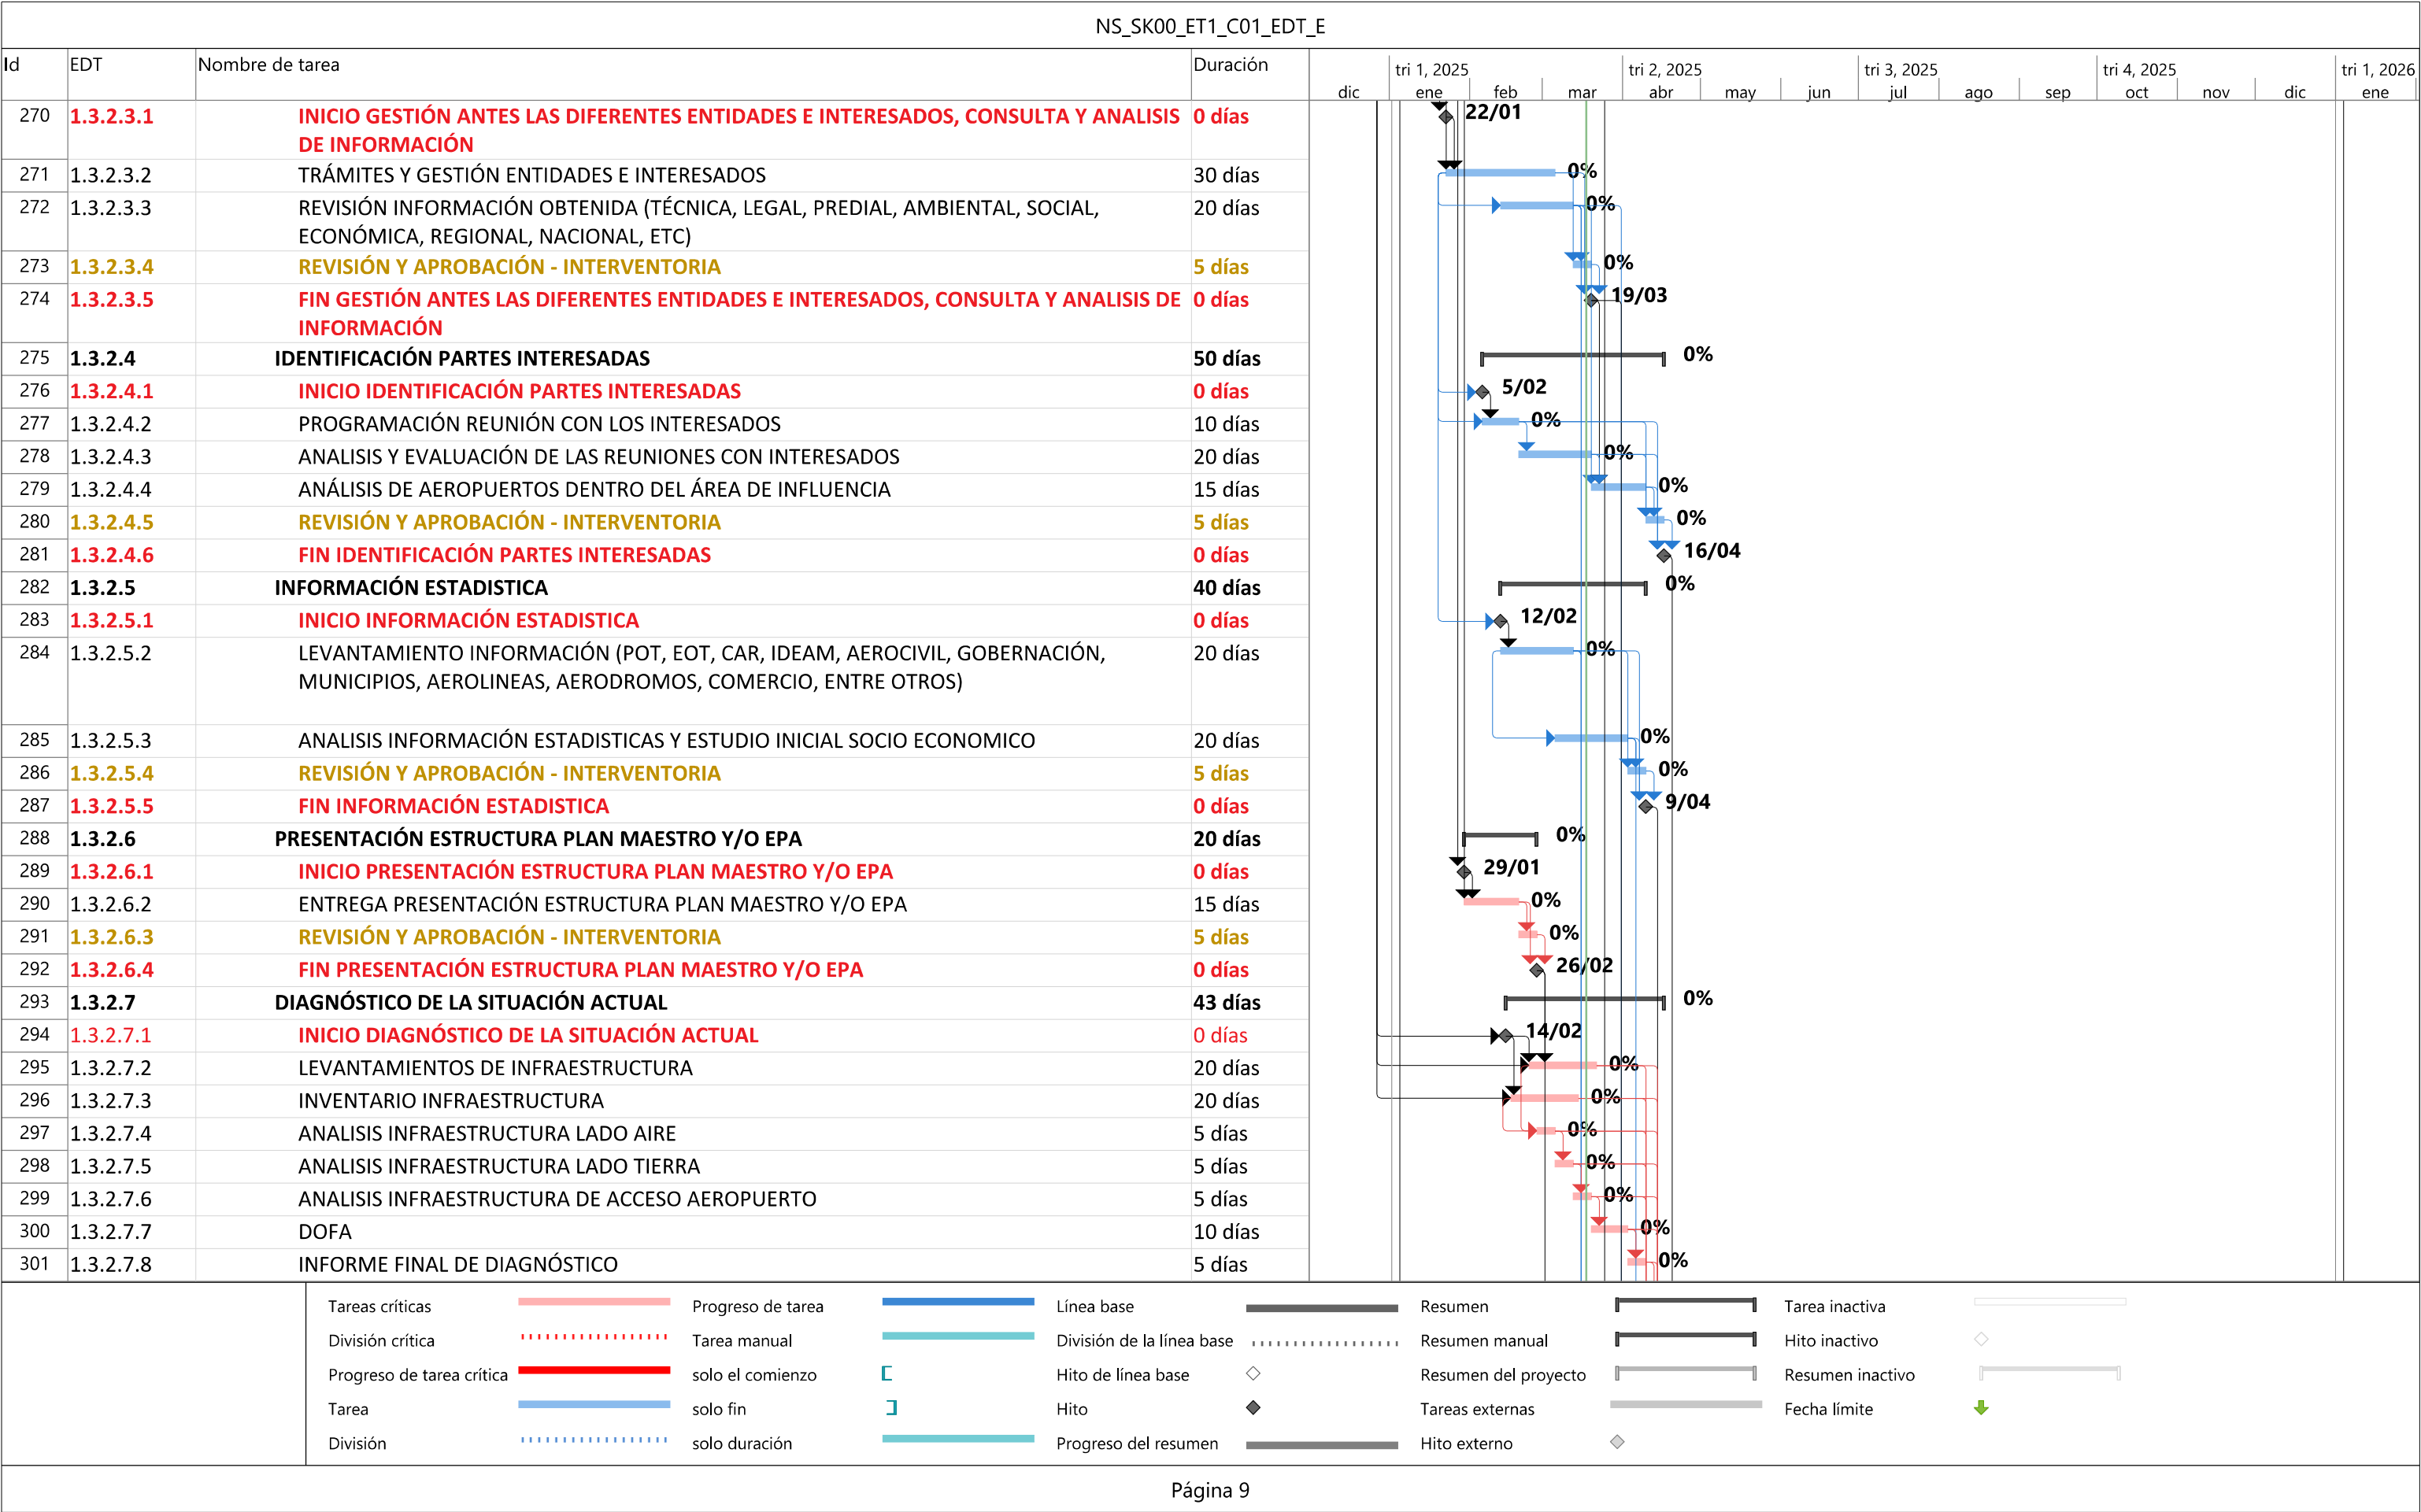

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																	
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración														
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025			tri 1, 2026
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
302	1.3.2.7.9	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días														
303	1.3.2.7.10	FIN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	0 días														
304	1.3.2.8	APROBACIÓN COMPONENTE 1	0 días														
305	1.3.2.9	APROBACIÓN COMPONENTE 2	0 días														
306	1.3.2.10	APROBACIÓN COMPONENTE 3	0 días														
307	1.3.2.11	APROBACIÓN COMPONENTE 4	0 días														
308	1.3.2.12	APROBACIÓN COMPONENTE 5	0 días														
309	1.3.2.13	ENTREGA DE LOS CAPITULOS DEL PMA INTRODUCCIÓN, INVENTARIOS, ESTADISTICAS Y ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO	3 días														
310	1.3.2.14	FIN ETAPA I	0 días														
311	1.3.3	ETAPA II (DIAGNÓSTICO AEROPUERTO)	60 días														
312	1.3.3.1	INICIO ETAPA II	0 días														
313	1.3.3.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	33 días														
314	1.3.3.2.1	INICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	0 días														
315	1.3.3.2.2	LEVANTAMIENTO LADO AIRE	20 días														
316	1.3.3.2.3	LEVANTAMIENTO LADO TIERRA	20 días														
317	1.3.3.2.4	LEVANTAMIENTO ACCESO Y REDES	20 días														
318	1.3.3.2.5	ANÁLISIS TECNOLOGIA ACTUAL LADO AIRE VERSUS LA REQUERIDA	10 días														
319	1.3.3.2.6	ANÁLISIS TECNOLOGIA ACTUAL LADO TIERRA VERSUS LA REQUERIDA	10 días														
320	1.3.3.2.7	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días														
321	1.3.3.2.8	FIN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	0 días														
322	1.3.3.3	PRONÓSTICO DE TRÁFICO	45 días														
323	1.3.3.3.1	INICIO PRONÓSTICO DE TRÁFICO	0 días														
324	1.3.3.3.2	PRONOSTICO DE TRÁFICO	25 días														
325	1.3.3.3.3	APROBACIÓN PRONOSTICO DE TRÁFICO	15 días														
326	1.3.3.3.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días														
327	1.3.3.3.5	FIN PRONÓSTICO DE TRÁFICO	0 días														
328	1.3.3.4	EVALUACIÓN OPERACIONAL	55 días														
329	1.3.3.4.1	INICIO EVALUACIÓN OPERACIONAL	0 días														
330	1.3.3.4.2	ANÁLISIS OBSTACULOS	30 días														
331	1.3.3.4.3	ANÁLISIS ESTUDIO OPERACIONAL DEL SISTEMA AEROPORTUARIOS	20 días														
332	1.3.3.4.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días														
333	1.3.3.4.5	FIN EVALUACIÓN OPERACIONAL	0 días														
334	1.3.3.5	ESTUDIO DE IMPACTOS	15 días														
335	1.3.3.5.1	INICIO ESTUDIO DE IMPACTOS	0 días														
336	1.3.3.5.2	ESTUDIO ALTERNATIVA AMBIENTAL	10 días														
		<div><div><div>Tareas críticas</div><div>División crítica</div><div>Progreso de tarea crítica</div><div>Tarea</div><div>División</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Progreso de tarea</div><div>Tarea manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Línea base</div><div>División de la línea base</div><div>Hito de línea base</div><div>Hito</div><div>Progreso del resumen</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Resumen</div><div>Resumen manual</div><div>Resumen del proyecto</div><div>Tareas externas</div><div>Hito externo</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Fecha límite</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>															
Página 10																	

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																			
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración																
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025		tri 3, 2025			tri 4, 2025			tri 1, 2026			
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene		
337	1.3.3.5.3	ESTUDIO ALTERNATIVA URBANA	10 días						0%										
338	1.3.3.5.4	ESTUDIO ALTERNATIVA SOCIAL	10 días						0%										
339	1.3.3.5.5	ESTUDIO ALTERNATIVA PREDIAL	10 días						0%										
340	1.3.3.5.6	LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	10 días						0%										
341	1.3.3.5.7	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días						0%										
342	1.3.3.5.8	FIN ESTUDIO DE IMPACTOS	0 días						12/05										
343	1.3.3.6	CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	15 días						0%										
344	1.3.3.6.1	INICIO CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	0 días						16/04										
345	1.3.3.6.2	LADO AIRE	10 días						0%										
346	1.3.3.6.3	LADO TIERRA	10 días						0%										
347	1.3.3.6.4	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	10 días						0%										
348	1.3.3.6.5	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días						0%										
349	1.3.3.6.6	FIN CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	0 días						7/05										
350	1.3.3.7	REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	17 días						0%										
351	1.3.3.7.1	INICIO REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	0 días						7/05										
352	1.3.3.7.2	LADO AIRE	12 días						0%										
353	1.3.3.7.3	LADO TIERRA	12 días						0%										
354	1.3.3.7.4	ACCESO AEROPUERTO	12 días						0%										
355	1.3.3.7.5	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	12 días						0%										
356	1.3.3.7.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días						0%										
357	1.3.3.7.7	FIN REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	0 días						30/05										
358	1.3.3.8	APROBACIÓN COMPONENTE 6	0 días						7/05										
359	1.3.3.9	APROBACIÓN COMPONENTE 7	0 días						14/05										
360	1.3.3.10	APROBACIÓN COMPONENTE 8	0 días						28/05										
361	1.3.3.11	APROBACIÓN COMPONENTE 9	0 días						12/05										
362	1.3.3.12	APROBACIÓN COMPONENTE 10	0 días						28/05										
363	1.3.3.13	APROBACIÓN COMPONENTE 11	0 días						7/05										
364	1.3.3.14	APROBACIÓN COMPONENTE 12	0 días						30/05										
365	1.3.3.15	ENTREGA DE LOS CAPITULOS DEL PMA PRÓNOSTICO DE TRÁFICO, ANÁLISIS DE DEMANDA, ANÁLISIS DE CAPACIDAD, ANÁLISIS ALTERNATIVAS	3 días						0%										
366	1.3.3.16	FIN ETAPA II	0 días						30/05										
367	1.3.4	ETAPA III (ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD)	93 días						0%										
368	1.3.4.1	INICIO ETAPA III	0 días						22/05										
369	1.3.4.2	IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO	15 días						0%										
370	1.3.4.2.1	INICIO IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO	0 días						30/05										
371	1.3.4.2.2	AMBIENTAL	10 días						0%										
<div><div><div><div>Tareas críticas</div><div>División crítica</div><div>Progreso de tarea crítica</div><div>Tarea</div><div>División</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Progreso de tarea</div><div>Tarea manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>solo duración</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Línea base</div><div>División de la línea base</div><div>Hito de línea base</div><div>Hito</div><div>Progreso del resumen</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Resumen</div><div>Resumen manual</div><div>Resumen del proyecto</div><div>Tareas externas</div><div>Hito externo</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Fecha límite</div><div></div></div></div></div></div>																			
Página 11																			

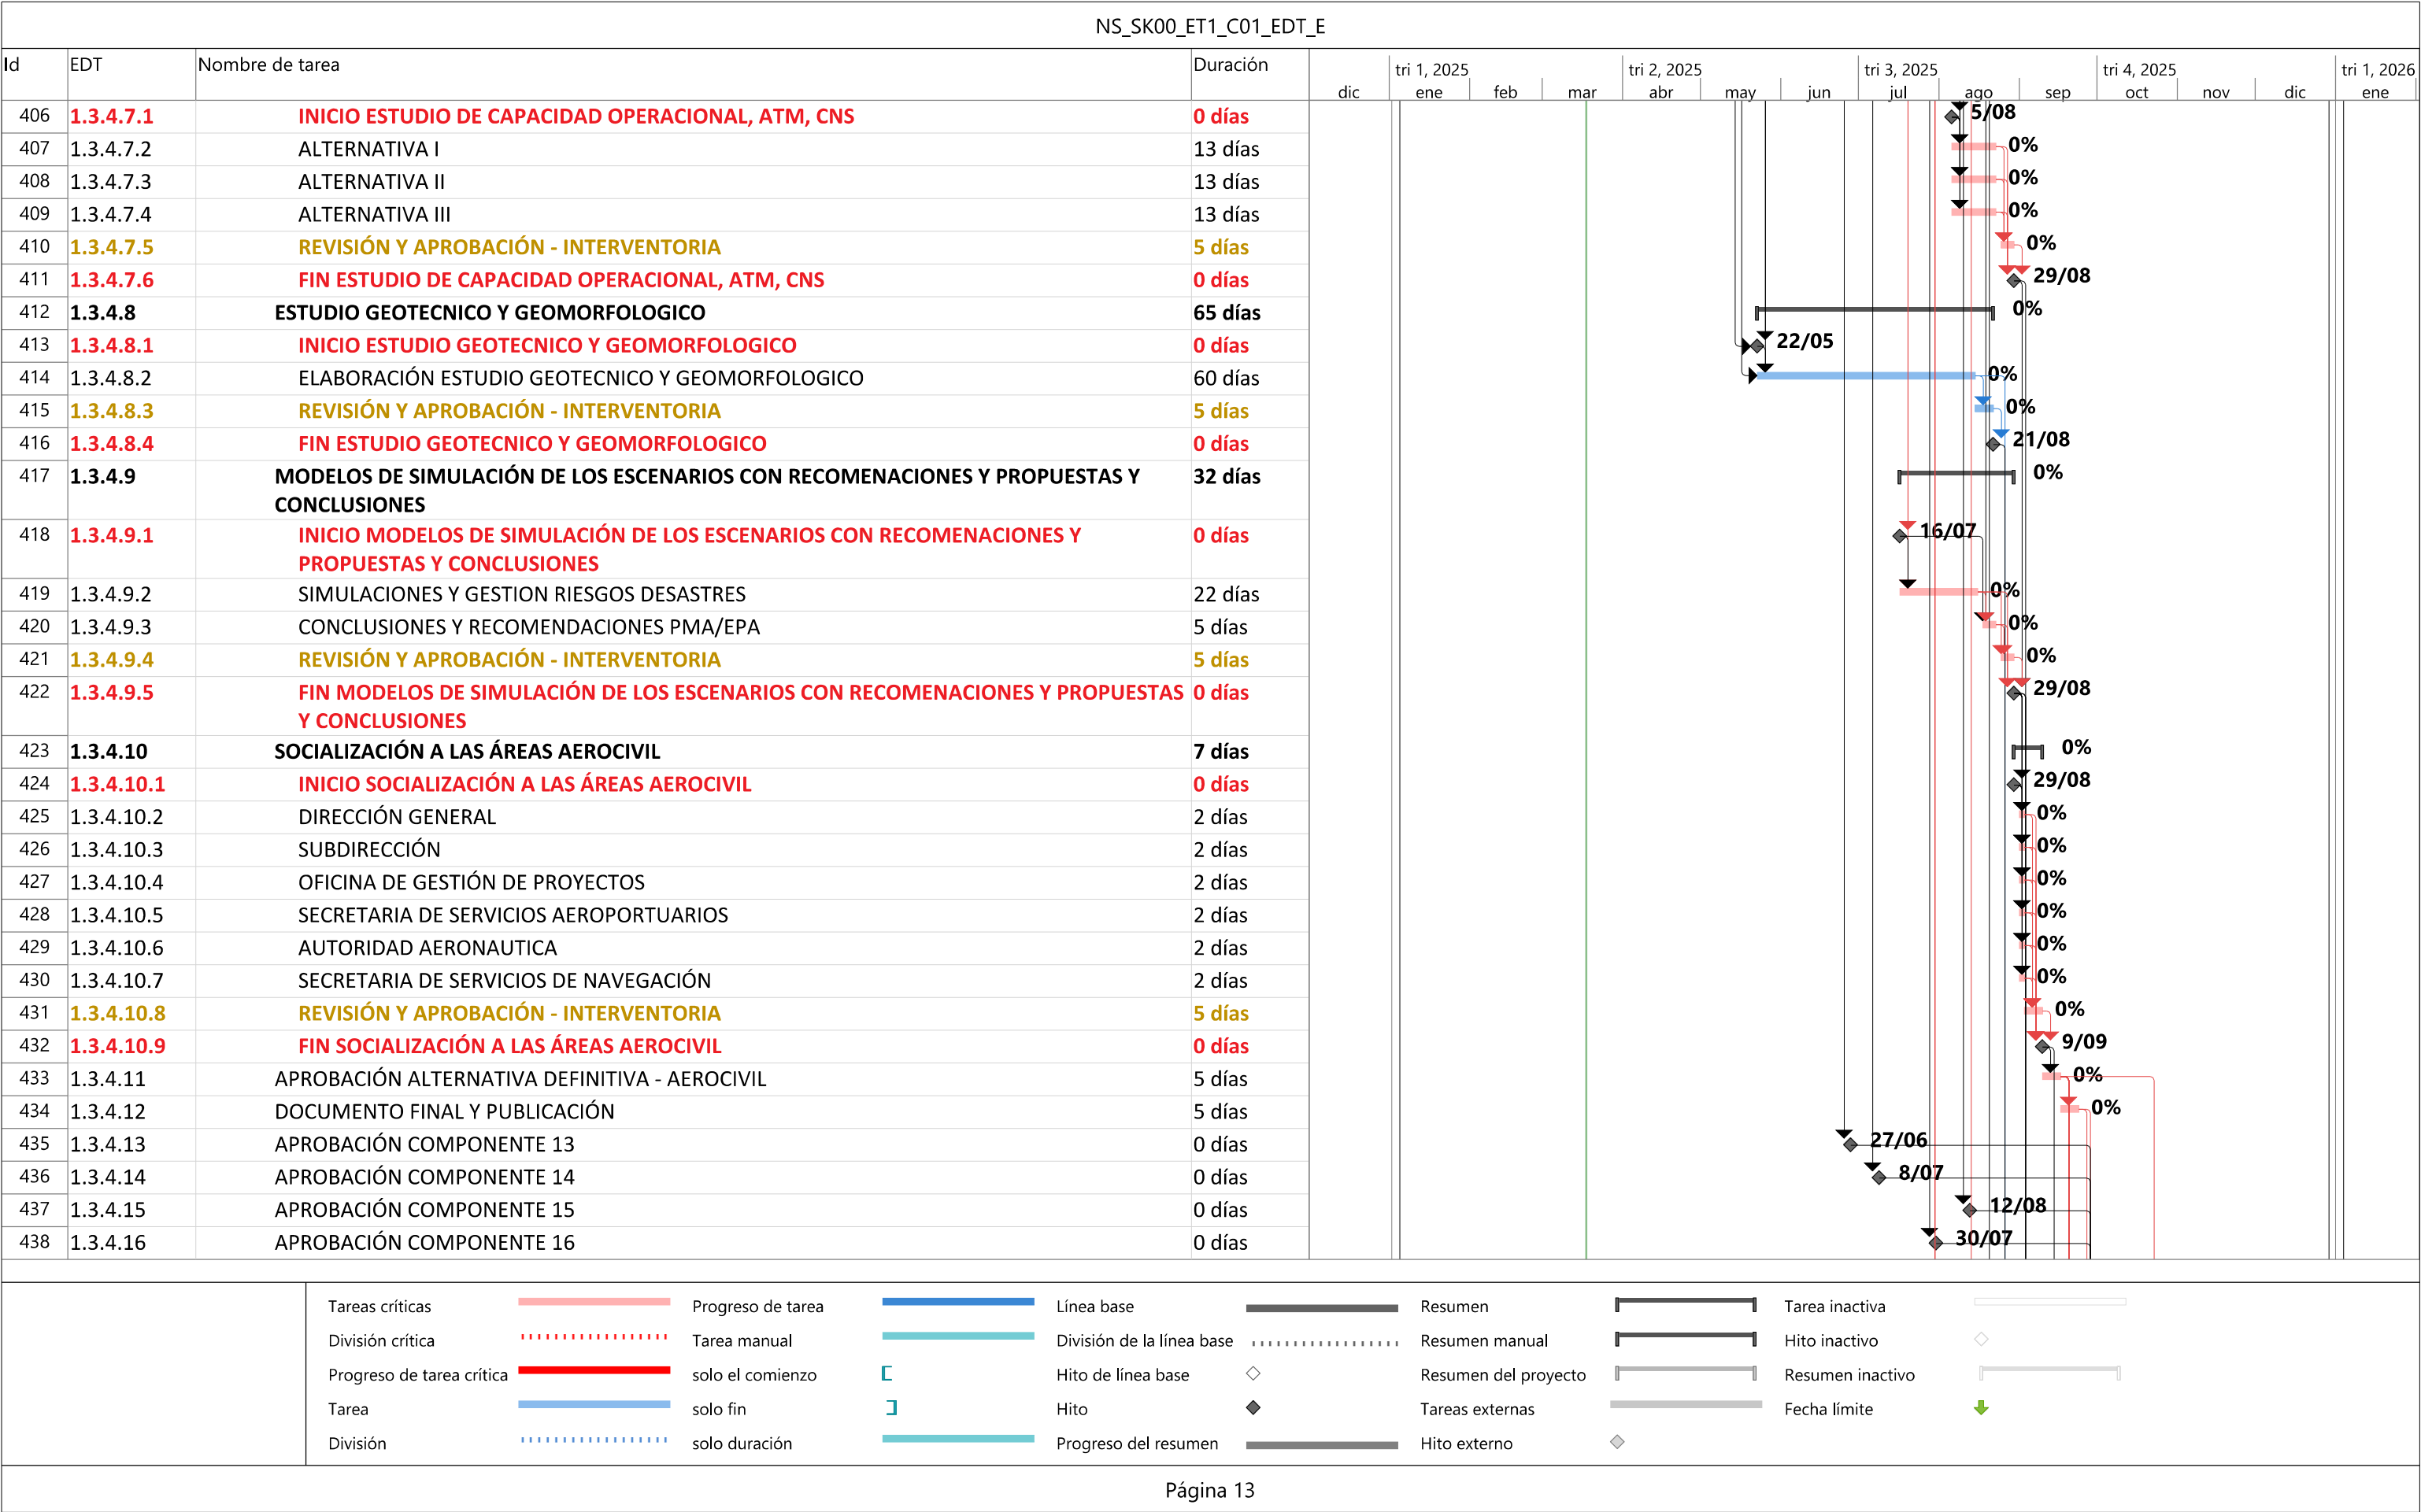

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																			
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración																
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025			tri 1, 2026		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene		
439	1.3.4.17	APROBACIÓN COMPONENTE 17	0 días																
440	1.3.4.18	APROBACIÓN COMPONENTE 18	0 días																
441	1.3.4.19	APROBACIÓN COMPONENTE 19	0 días																
442	1.3.4.20	APROBACIÓN COMPONENTE 20	0 días																
443	1.3.4.21	APROBACIÓN COMPONENTE 21	0 días																
444	1.3.4.22	APROBACIÓN COMPONENTE 22	0 días																
445	1.3.4.23	APROBACIÓN COMPONENTE 23 y 24	0 días																
446	1.3.4.24	APROBACIÓN COMPONENTE 25	0 días																
447	1.3.4.25	APROBACIÓN COMPONENTE 26	0 días																
448	1.3.4.26	APROBACIÓN COMPONENTE 27	0 días																
449	1.3.4.27	APROBACIÓN COMPONENTE 28	0 días																
450	1.3.4.28	FIN ETAPA III	0 días																
451	1.3.5	ETAPA IV (DISEÑOS DE FACTIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA)	56 días																
452	1.3.5.1	INICIO ETAPA IV	0 días																
453	1.3.5.2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	49 días																
454	1.3.5.2.1	INICIO ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días																
455	1.3.5.2.2	TOPOGRAFÍA	44 días																
456	1.3.5.2.3	ANALISIS Y CONCEPTO OPERACIONAL	44 días																
457	1.3.5.2.4	ESTUDIOS PEDIALES Y JURIDICOS, DILIGENCIAS PEDIALES	44 días																
458	1.3.5.2.5	VIABILIDAD URBANA, DISEÑO URBANO, PAISAJISMO Y ARQUITECTURA	44 días																
459	1.3.5.2.6	GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	44 días																
460	1.3.5.2.7	METEOROLOGÍA	44 días																
461	1.3.5.2.8	HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	44 días																
462	1.3.5.2.9	ESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURA AREONAUTICA	44 días																
463	1.3.5.2.10	DISEÑO GEOMETRICO	44 días																
464	1.3.5.2.11	DISEÑO DE PAVIMENTOS	44 días																
465	1.3.5.2.12	DISEÑO DE REDES HUMEDAS	44 días																
466	1.3.5.2.13	DISEÑO DE REDES SECAS	44 días																
467	1.3.5.2.14	EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS	44 días																
468	1.3.5.2.15	AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS	44 días																
469	1.3.5.2.16	SST	44 días																
470	1.3.5.2.17	GESTIÓN SOCIAL	44 días																
471	1.3.5.2.18	ESTUDIOS DE TRAFICO AREONAUTICO Y AEROPORTUARIO	44 días																
472	1.3.5.2.19	ESPECIFICACIONES, CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	44 días																
473	1.3.5.2.20	GESTIÓN DE RIESGOS	44 días																
474	1.3.5.2.21	ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL	44 días																
<div><div><div><div>Tareas críticas</div><div>División crítica</div><div>Progreso de tarea crítica</div><div>Tarea</div><div>División</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Progreso de tarea</div><div>Tarea manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Línea base</div><div>División de la línea base</div><div>Hito de línea base</div><div>Hito</div><div>Progreso del resumen</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Resumen</div><div>Resumen manual</div><div>Resumen del proyecto</div><div>Tareas externas</div><div>Hito externo</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Fecha límite</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>																			
Página 14																			

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																						
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración																			
				dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun	tri 3, 2025	jul	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene
475	1.3.5.2.22	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL	44 días																			
476	1.3.5.2.23	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
477	1.3.5.2.24	FIN ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días																			
478	1.3.5.3	APROBACIÓN COMPONENTE 29	0 días																			
479	1.3.5.4	ENTREGA DE LOS CAPITULOS DEL PMA PRESUPUESTOS, PLANOS, DOCUMENTO PLAN MAESTRO	51 días																			
480	1.3.5.5	FIN ETAPA IV	0 días																			
481	1.3.6	ETAPA V (VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA)	56 días																			
482	1.3.6.1	INICIO ETAPA V	0 días																			
483	1.3.6.2	COMPONENTE 30	56 días																			
484	1.3.6.2.1	INICIO COMPONENTE 30	0 días																			
485	1.3.6.2.2	DOCUMENTOS ANEXO JURIDICO	56 días																			
486	1.3.6.2.3	DOCUMENTOS ANEXO FINANCIERO	30 días																			
487	1.3.6.2.4	FIN COMPONENTE 30	0 días																			
488	1.3.6.3	FIN ETAPA V	0 días																			
489	1.3.7	ENTREGA FINAL	20 días																			
490	1.3.8	FIN PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días																			
491	1.4	EPA AGUAS CLARAS OCAÑA (31%)	260 días																			
492	1.4.1	INICIO PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días																			
493	1.4.2	ETAPA I (CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)	90 días																			
494	1.4.2.1	INICIO ETAPA I	0 días																			
495	1.4.2.2	METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	57 días																			
496	1.4.2.2.1	INICIO METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	0 días																			
497	1.4.2.2.2	TOPOGRAFÍA	52 días																			
498	1.4.2.2.3	SOCIAL	52 días																			
499	1.4.2.2.4	AMBIENTAL	52 días																			
500	1.4.2.2.5	PREDIAL	52 días																			
501	1.4.2.2.6	GEOTECNIA	52 días																			
502	1.4.2.2.7	ANALISIS DE ALTERNATIVAS	52 días																			
503	1.4.2.2.8	FINANCIERA	52 días																			
504	1.4.2.2.9	PROGNOSIS	52 días																			
505	1.4.2.2.10	CAPACIDAD DE DEMANDA	52 días																			
506	1.4.2.2.11	ANALISIS OPERACIONAL	52 días																			
507	1.4.2.2.12	RED AEROPORTUARIA	52 días																			
508	1.4.2.2.13	JURIDICA	52 días																			
<div><div><div>Tareas críticas</div><div>División crítica</div><div>Progreso de tarea crítica</div><div>Tarea</div><div>División</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Progreso de tarea</div><div>Tarea manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Línea base</div><div>División de la línea base</div><div>Hito de línea base</div><div>Hito</div><div>Progreso del resumen</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Resumen</div><div>Resumen manual</div><div>Resumen del proyecto</div><div>Tareas externas</div><div>Hito externo</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Fecha límite</div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>																						
Página 15																						

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración																			
509	1.4.2.2.14	RIESGOS	52 días	dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun	tri 3, 2025	jul	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene
510	1.4.2.2.15	INFORMACIÓN PRIMARIA	52 días																			
511	1.4.2.2.16	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
512	1.4.2.2.17	FIN METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	0 días																			
513	1.4.2.3	GESTIÓN ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	40 días																			
514	1.4.2.3.1	INICIO GESTIÓN ANTES LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	0 días																			
515	1.4.2.3.2	TRÁMITES Y GESTIÓN ENTIDADES E INTERESADOS	30 días																			
516	1.4.2.3.3	REVISIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA (TÉCNICA, LEGAL, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA, REGIONAL, NACIONAL, ETC)	20 días																			
517	1.4.2.3.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
518	1.4.2.3.5	FIN GESTIÓN ANTES LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	0 días																			
519	1.4.2.4	IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	50 días																			
520	1.4.2.4.1	INICIO IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	0 días																			
521	1.4.2.4.2	PROGRAMACIÓN REUNIÓN CON LOS INTERESADOS	10 días																			
522	1.4.2.4.3	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS REUNIONES CON INTERESADOS	20 días																			
523	1.4.2.4.4	ANÁLISIS DE AEROPUERTOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	15 días																			
524	1.4.2.4.5	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
525	1.4.2.4.6	FIN IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	0 días																			
526	1.4.2.5	INFORMACIÓN ESTADISTICA	40 días																			
527	1.4.2.5.1	INICIO INFORMACIÓN ESTADISTICA	0 días																			
528	1.4.2.5.2	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN (POT, EOT, CAR, IDEAM, AEROCIVIL, GOBERNACIÓN, MUNICIPIOS, AEROLINEAS, AERODROMOS, COMERCIO, ENTRE OTROS)	20 días																			
529	1.4.2.5.3	ANALISIS INFORMACIÓN ESTADISTICAS Y ESTUDIO INICIAL SOCIO ECONOMICO	20 días																			
530	1.4.2.5.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
531	1.4.2.5.5	FIN INFORMACIÓN ESTADISTICA	0 días																			
532	1.4.2.6	PRESENTACIÓN ESTRUCTURA PLAN MAESTRO Y/O EPA	20 días																			
533	1.4.2.6.1	INICIO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA PLAN MAESTRO Y/O EPA	0 días																			
534	1.4.2.6.2	ENTREGA PRESENTACIÓN ESTRUCTURA PLAN MAESTRO Y/O EPA	15 días																			
535	1.4.2.6.3	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
536	1.4.2.6.4	FIN PRESENTACIÓN ESTRUCTURA PLAN MAESTRO Y/O EPA	0 días																			
537	1.4.2.7	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	43 días																			
538	1.4.2.7.1	INICIO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	0 días																			

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Tarea manual

solo el comienzo

solo fin

solo duración

Línea base

División de la línea base

Hito de línea base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen manual

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo


Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Fecha límite

Página 16

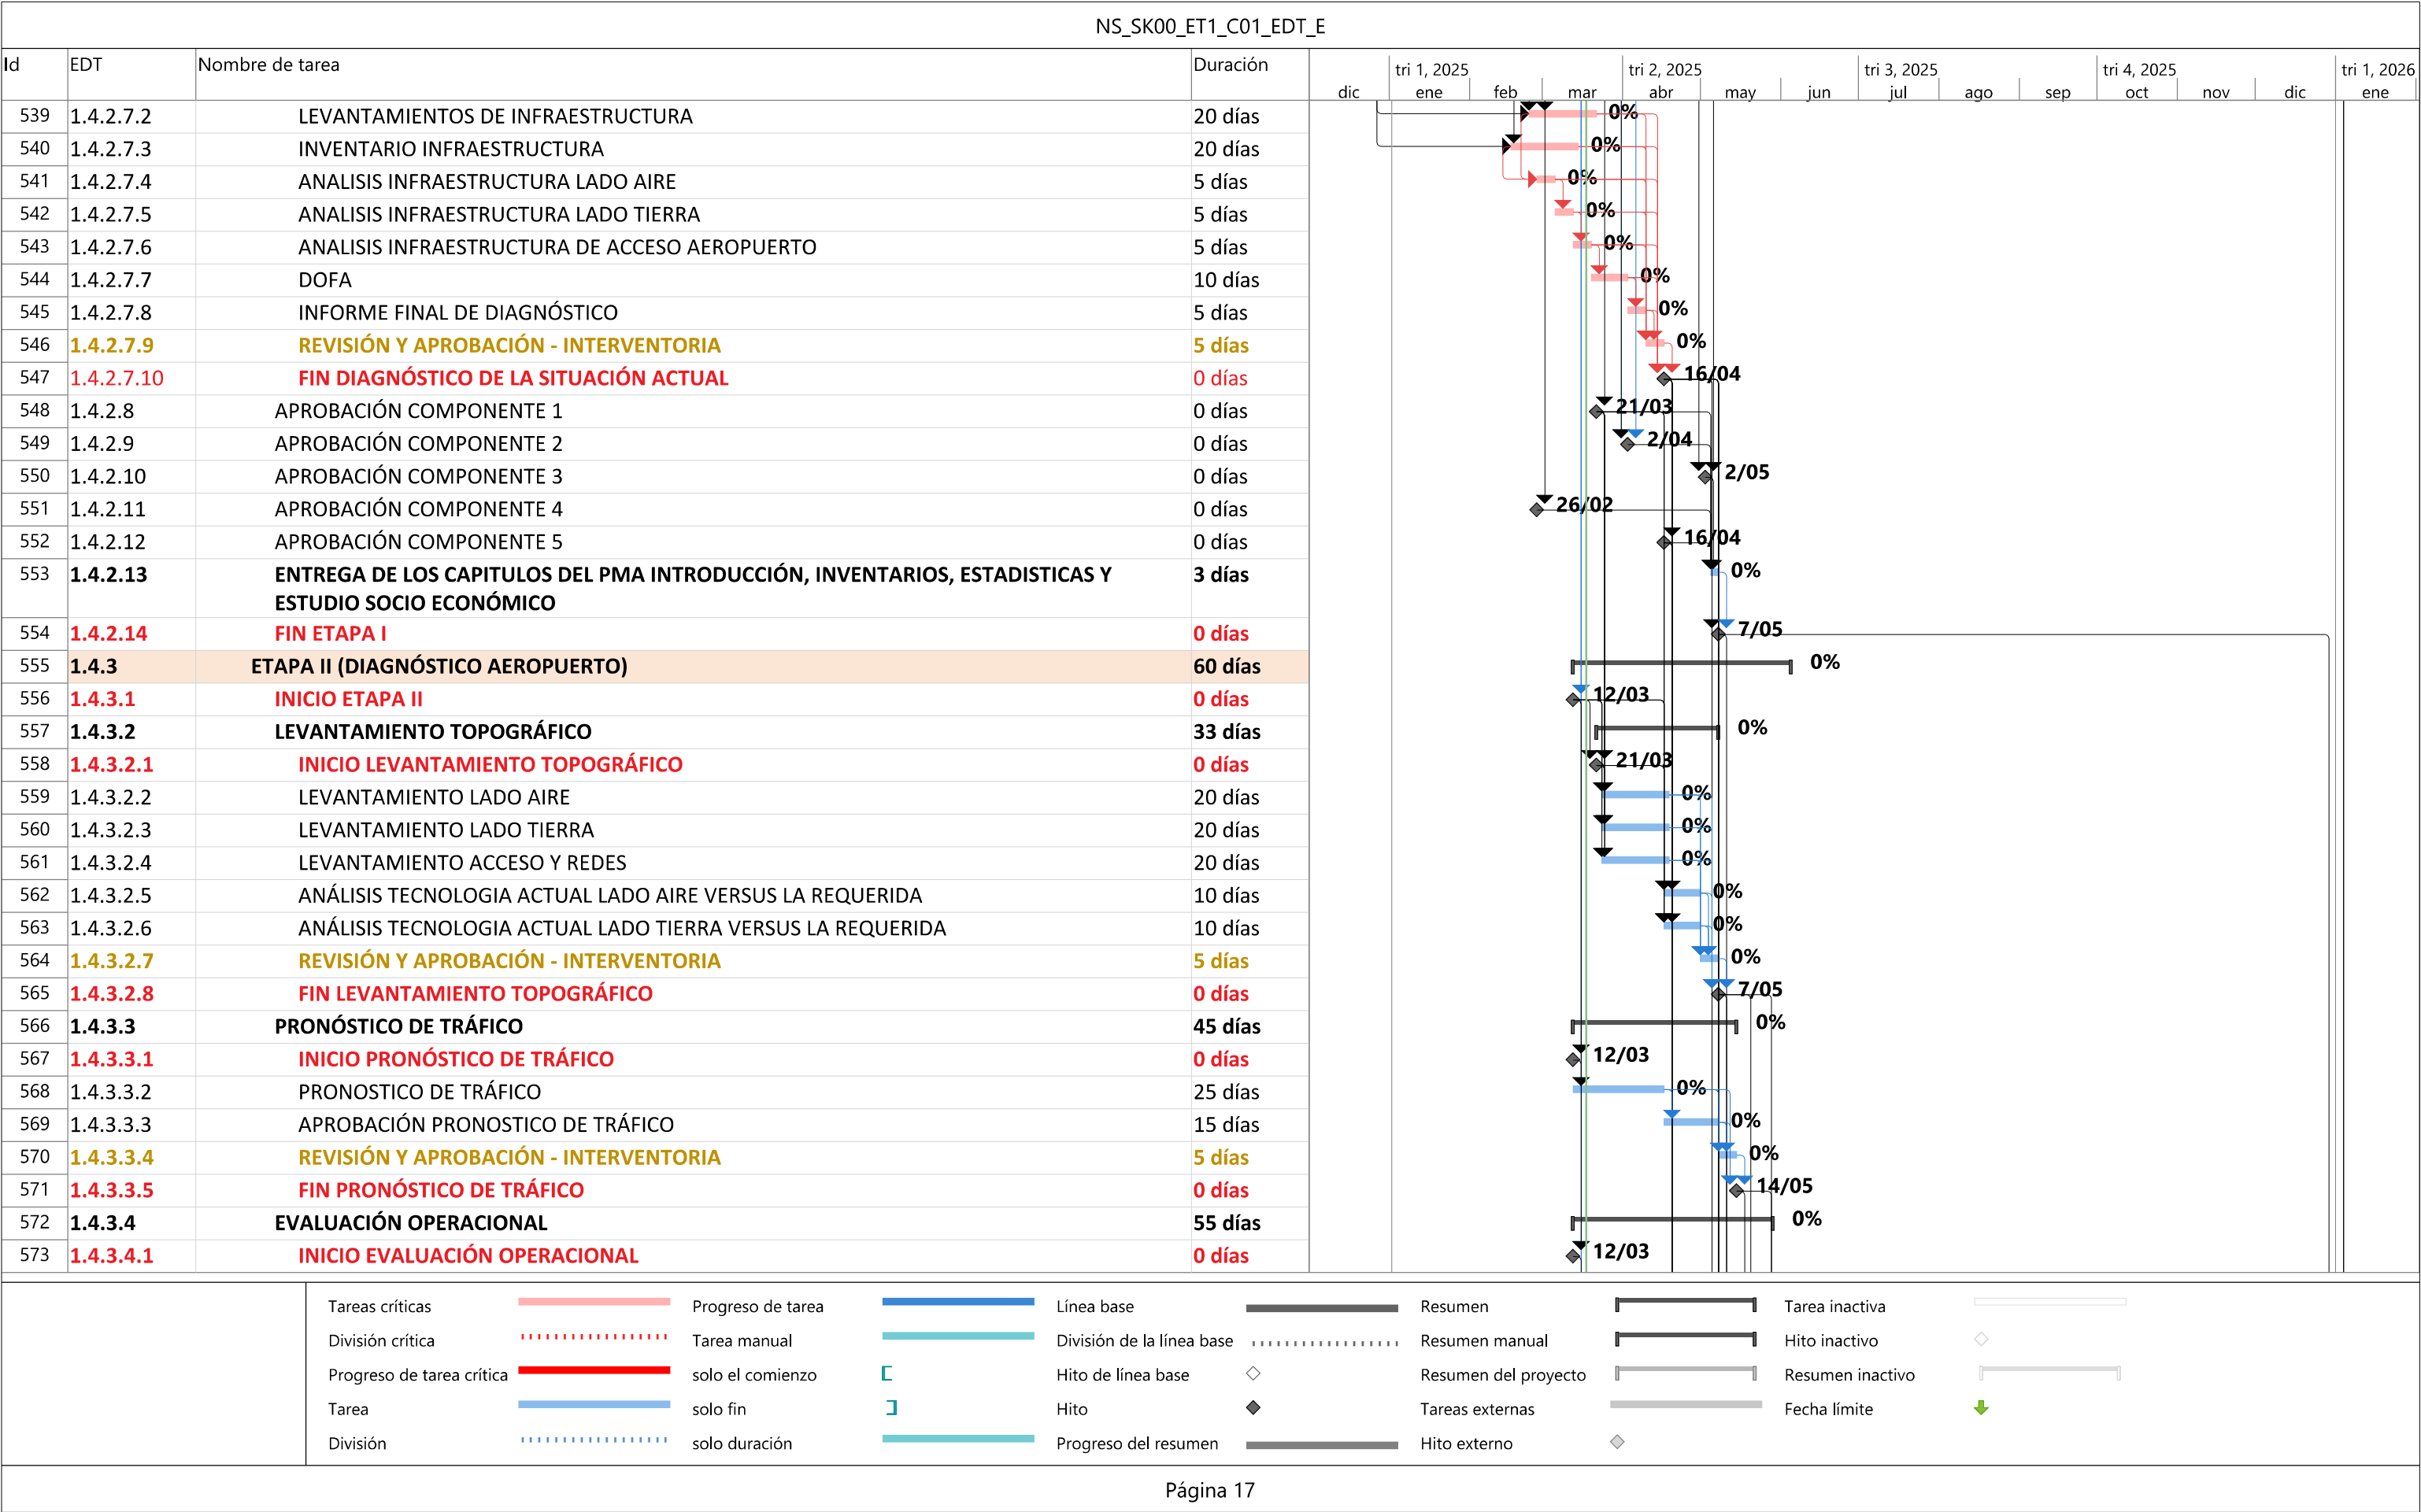

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																						
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun	tri 3, 2025	jul	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene
574	1.4.3.4.2	ANÁLISIS OBSTACULOS	30 días																			
575	1.4.3.4.3	ANÁLISIS ESTUDIO OPERACIONAL DEL SISTEMA AEROPORTUARIOS	20 días																			
576	1.4.3.4.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
577	1.4.3.4.5	FIN EVALUACIÓN OPERACIONAL	0 días																			
578	1.4.3.5	ESTUDIO DE IMPACTOS	15 días																			
579	1.4.3.5.1	INICIO ESTUDIO DE IMPACTOS	0 días																			
580	1.4.3.5.2	ESTUDIO ALTERNATIVA AMBIENTAL	10 días																			
581	1.4.3.5.3	ESTUDIO ALTERNATIVA URBANA	10 días																			
582	1.4.3.5.4	ESTUDIO ALTERNATIVA SOCIAL	10 días																			
583	1.4.3.5.5	ESTUDIO ALTERNATIVA PREDIAL	10 días																			
584	1.4.3.5.6	LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	10 días																			
585	1.4.3.5.7	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
586	1.4.3.5.8	FIN ESTUDIO DE IMPACTOS	0 días																			
587	1.4.3.6	CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	15 días																			
588	1.4.3.6.1	INICIO CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	0 días																			
589	1.4.3.6.2	LADO AIRE	10 días																			
590	1.4.3.6.3	LADO TIERRA	10 días																			
591	1.4.3.6.4	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	10 días																			
592	1.4.3.6.5	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
593	1.4.3.6.6	FIN CÁLCULO DE CAPACIDAD VERSUS DEMANDA	0 días																			
594	1.4.3.7	REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	17 días																			
595	1.4.3.7.1	INICIO REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	0 días																			
596	1.4.3.7.2	LADO AIRE	12 días																			
597	1.4.3.7.3	LADO TIERRA	12 días																			
598	1.4.3.7.4	ACCESO AEROPUERTO	12 días																			
599	1.4.3.7.5	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	12 días																			
600	1.4.3.7.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																			
601	1.4.3.7.7	FIN REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS	0 días																			
602	1.4.3.8	APROBACIÓN COMPONENTE 6	0 días																			
603	1.4.3.9	APROBACIÓN COMPONENTE 7	0 días																			
604	1.4.3.10	APROBACIÓN COMPONENTE 8	0 días																			
605	1.4.3.11	APROBACIÓN COMPONENTE 9	0 días																			
606	1.4.3.12	APROBACIÓN COMPONENTE 10	0 días																			
607	1.4.3.13	APROBACIÓN COMPONENTE 11	0 días																			
608	1.4.3.14	APROBACIÓN COMPONENTE 12	0 días																			
		Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva												
		División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo												
		Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo												
		Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite												
		División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo														
Página 18																						

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																											
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración																								
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025			jun			tri 3, 2025			tri 4, 2025			dic			tri 1, 2026				
609	1.4.3.15	ENTREGA DE LOS CAPITULOS DEL PMA PRÓNOTICO DE TRÁFICO, ANÁLISIS DE DEMANDA, ANÁLISIS DE CAPACIDAD, ANÁLISIS ALTERNATIVAS	3 días																								
610	1.4.3.16	FIN ETAPA II	0 días																								
611	1.4.4	ETAPA III (ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD)	93 días																								
612	1.4.4.1	INICIO ETAPA III	0 días																								
613	1.4.4.2	IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO	15 días																								
614	1.4.4.2.1	INICIO IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO	0 días																								
615	1.4.4.2.2	AMBIENTAL	10 días																								
616	1.4.4.2.3	SOCIAL	10 días																								
617	1.4.4.2.4	URBANO Y CONECTIVIDAD	10 días																								
618	1.4.4.2.5	PREDIAL	10 días																								
619	1.4.4.2.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																								
620	1.4.4.2.7	FIN IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO	0 días																								
621	1.4.4.3	PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS ANTE LA AEROCIVIL	7 días																								
622	1.4.4.3.1	INCIO PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS ANTE LA AEROCIVIL	0 días																								
623	1.4.4.3.2	ENTREGA ALTERNATIVAS ANTE LA AEROCIVIL	2 días																								
624	1.4.4.3.3	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA/AEROCIVIL	5 días																								
625	1.4.4.3.4	FIN PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS ANTE LA AEROCIVIL	0 días																								
626	1.4.4.4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTERNATIVAS	25 días																								
627	1.4.4.4.1	INICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTERNATIVAS	0 días																								
628	1.4.4.4.2	LADO AIRE	20 días																								
629	1.4.4.4.3	LADO TIERRA	20 días																								
630	1.4.4.4.4	ACCESOS	20 días																								
631	1.4.4.4.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	20 días																								
632	1.4.4.4.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																								
633	1.4.4.4.7	FIN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTERNATIVAS	0 días																								
634	1.4.4.5	ANALISIS MULTICRITERIO	23 días																								
635	1.4.4.5.1	INICIO ANALISIS MULTICRITERIO	0 días																								
636	1.4.4.5.2	ANÁLISIS DOFA - CAME ALTERNATIVAS	5 días																								
637	1.4.4.5.3	EVALUACIÓN MULTICRITERIO	5 días																								
638	1.4.4.5.4	SELECCIÓN RECOMENDADA	3 días																								
639	1.4.4.5.5	SELECCIÓN ALTERNATIVA (POR AEROCIVIL)	5 días																								
640	1.4.4.5.6	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																								
641	1.4.4.5.7	FIN ANALISIS MULTICRITERIO	0 días																								
642	1.4.4.6	DESARROLLO ALTERNATIVA SELECCIONADA	22 días																								
643	1.4.4.6.1	INICIO DESARROLLO ALTERNATIVA SELECCIONADA	0 días																								
		Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva																	
		División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo																	
		Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo																	
		Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite																	
		División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo																			
Página 19																											

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración													
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025		
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
644	1.4.4.6.2	DESARROLLO ALTERNATIVA I (FASEADO Y DISEÑOS PREFACTIBILIDAD)	7 días													
645	1.4.4.6.3	DESARROLLO ALTERNATIVA II (SOCIO-ECONOMICO, IMPACTOS, CONECTIVIDAD INTERMODAL Y MULTIMODAL, ILES)	7 días													
646	1.4.4.6.4	ESTIMACIÓN COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE MEJORAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	10 días													
647	1.4.4.6.5	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días													
648	1.4.4.6.6	FIN DESARROLLO ALTERNATIVA SELECCIONADA	0 días													
649	1.4.4.7	ESTUDIO DE CAPACIDAD OPERACIONAL, ATM, CNS	18 días													
650	1.4.4.7.1	INICIO ESTUDIO DE CAPACIDAD OPERACIONAL, ATM, CNS	0 días													
651	1.4.4.7.2	ALTERNATIVA I	13 días													
652	1.4.4.7.3	ALTERNATIVA II	13 días													
653	1.4.4.7.4	ALTERNATIVA III	13 días													
654	1.4.4.7.5	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días													
655	1.4.4.7.6	FIN ESTUDIO DE CAPACIDAD OPERACIONAL, ATM, CNS	0 días													
656	1.4.4.8	ESTUDIO GEOTECNICO Y GEOMORFOLOGICO	65 días													
657	1.4.4.8.1	INICIO ESTUDIO GEOTECNICO Y GEOMORFOLOGICO	0 días													
658	1.4.4.8.2	ELABORACIÓN ESTUDIO GEOTECNICO Y GEOMORFOLOGICO	60 días													
659	1.4.4.8.3	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días													
660	1.4.4.8.4	FIN ESTUDIO GEOTECNICO Y GEOMORFOLOGICO	0 días													
661	1.4.4.9	MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS ESCENARIOS CON RECOMENACIONES Y PROPUESTAS Y CONCLUSIONES	32 días													
662	1.4.4.9.1	INICIO MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS ESCENARIOS CON RECOMENACIONES Y PROPUESTAS Y CONCLUSIONES	0 días													
663	1.4.4.9.2	SIMULACIONES Y GESTION RIESGOS DESASTRES	22 días													
664	1.4.4.9.3	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PMA/EPA	5 días													
665	1.4.4.9.4	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días													
666	1.4.4.9.5	FIN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS ESCENARIOS CON RECOMENACIONES Y PROPUESTAS Y CONCLUSIONES	0 días													
667	1.4.4.10	SOCIALIZACIÓN A LAS ÁREAS AEROCIVIL	7 días													
668	1.4.4.10.1	INICIO SOCIALIZACIÓN A LAS ÁREAS AEROCIVIL	0 días													
669	1.4.4.10.2	DIRECCIÓN GENERAL	2 días													
670	1.4.4.10.3	SUBDIRECCIÓN	2 días													
671	1.4.4.10.4	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	2 días													
672	1.4.4.10.5	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	2 días													
673	1.4.4.10.6	AUTORIDAD AERONAUTICA	2 días													
674	1.4.4.10.7	SECRETARIA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN	2 días													
675	1.4.4.10.8	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días													
		<div><div><div>Tareas críticas</div><div>División crítica</div><div>Progreso de tarea crítica</div><div>Tarea</div><div>División</div></div><div><div><div>Progreso de tarea</div><div>Tarea manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>solo duración</div></div><div><div><div>Línea base</div><div>División de la línea base</div><div>Hito de línea base</div><div>Hito</div><div>Progreso del resumen</div></div><div><div><div>Resumen</div><div>Resumen manual</div><div>Resumen del proyecto</div><div>Tareas externas</div><div>Hito externo</div></div><div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Fecha límite</div></div></div></div></div></div></div>														
Página 20																

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración																	
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025			tri 1, 2026			
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene			
676	1.4.4.10.9	FIN SOCIALIZACIÓN A LAS ÁREAS AEROCIVIL	0 días																	
677	1.4.4.11	APROBACIÓN ALTERNATIVA DEFINITIVA - AEROCIVIL	5 días																	
678	1.4.4.12	DOCUMENTO FINAL Y PUBLICACIÓN	5 días																	
679	1.4.4.13	APROBACIÓN COMPONENTE 13	0 días																	
680	1.4.4.14	APROBACIÓN COMPONENTE 14	0 días																	
681	1.4.4.15	APROBACIÓN COMPONENTE 15	0 días																	
682	1.4.4.16	APROBACIÓN COMPONENTE 16	0 días																	
683	1.4.4.17	APROBACIÓN COMPONENTE 17	0 días																	
684	1.4.4.18	APROBACIÓN COMPONENTE 18	0 días																	
685	1.4.4.19	APROBACIÓN COMPONENTE 19	0 días																	
686	1.4.4.20	APROBACIÓN COMPONENTE 20	0 días																	
687	1.4.4.21	APROBACIÓN COMPONENTE 21	0 días																	
688	1.4.4.22	APROBACIÓN COMPONENTE 22	0 días																	
689	1.4.4.23	APROBACIÓN COMPONENTE 23 y 24	0 días																	
690	1.4.4.24	APROBACIÓN COMPONENTE 25	0 días																	
691	1.4.4.25	APROBACIÓN COMPONENTE 26	0 días																	
692	1.4.4.26	APROBACIÓN COMPONENTE 27	0 días																	
693	1.4.4.27	APROBACIÓN COMPONENTE 28	0 días																	
694	1.4.4.28	FIN ETAPA III	0 días																	
695	1.4.5	ETAPA IV (DISEÑOS DE FACTIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA)	56 días																	
696	1.4.5.1	INICIO ETAPA IV	0 días																	
697	1.4.5.2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	49 días																	
698	1.4.5.2.1	INICIO ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días																	
699	1.4.5.2.2	TOPOGRAFÍA	44 días																	
700	1.4.5.2.3	ANALISIS Y CONCEPTO OPERACIONAL	44 días																	
701	1.4.5.2.4	ESTUDIOS PEDIALES Y JURIDICOS, DILIGENCIAS PEDIALES	44 días																	
702	1.4.5.2.5	VIABILIDAD URBANA, DISEÑO URBANO, PAISAJISMO Y ARQUITECTURA	44 días																	
703	1.4.5.2.6	GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	44 días																	
704	1.4.5.2.7	METEOROLOGÍA	44 días																	
705	1.4.5.2.8	HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	44 días																	
706	1.4.5.2.9	ESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURA AREONAUTICA	44 días																	
707	1.4.5.2.10	DISEÑO GEOMETRICO	44 días																	
708	1.4.5.2.11	DISEÑO DE PAVIMENTOS	44 días																	
709	1.4.5.2.12	DISEÑO DE REDES HUMEDAS	44 días																	
710	1.4.5.2.13	DISEÑO DE REDES SECAS	44 días																	
711	1.4.5.2.14	EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS	44 días																	

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

</

Progreso de tarea

Tarea manual

solo el comienzo

solo fin

solo duración

</

Línea base

División de la línea base

Hito de línea base

Hito

Progreso del resumen

</

Resumen

Resumen manual

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

</

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Fecha límite

</

Página 21

NS_SK00_ET1_C01_EDT_E																			
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración																
				dic	tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025			tri 1, 2026		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene		
712	1.4.5.2.15	AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS	44 días																
713	1.4.5.2.16	SST	44 días																
714	1.4.5.2.17	GESTIÓN SOCIAL	44 días																
715	1.4.5.2.18	ESTUDIOS DE TRAFICO AREONAUTICO Y AEROPORTUARIO	44 días																
716	1.4.5.2.19	ESPECIFICACIONES, CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	44 días																
717	1.4.5.2.20	GESTIÓN DE RIESGOS	44 días																
718	1.4.5.2.21	ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL	44 días																
719	1.4.5.2.22	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL	44 días																
720	1.4.5.2.23	REVISIÓN Y APROBACIÓN - INTERVENTORIA	5 días																
721	1.4.5.2.24	FIN ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días																
722	1.4.5.3	APROBACIÓN COMPONENTE 29	0 días																
723	1.4.5.4	ENTREGA DE LOS CAPITULOS DEL PMA PRESUPUESTOS, PLANOS, DOCUMENTO PLAN MAESTRO	51 días																
724	1.4.5.5	FIN ETAPA IV	0 días																
725	1.4.6	ETAPA V (VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA)	56 días																
726	1.4.6.1	INICIO ETAPA V	0 días																
727	1.4.6.2	COMPONENTE 30	56 días																
728	1.4.6.2.1	INICIO COMPONENTE 30	0 días																
729	1.4.6.2.2	DOCUMENTOS ANEXO JURIDICO	56 días																
730	1.4.6.2.3	DOCUMENTOS ANEXO FINANCIERO	30 días																
731	1.4.6.2.4	FIN COMPONENTE 30	0 días																
732	1.4.6.3	FIN ETAPA V	0 días																
733	1.4.7	ENTREGA FINAL	20 días																
734	1.4.8	FIN PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días																
735	1.5	FIN CONSULTORÍA	0 días																
<div><div></div></div>																			
		Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva									
		División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo									
		Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo									
		Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite									
		División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo											
Página 22																			

NS_SK00_ET1_C01_EDT_D

Informe de auditoría final

2025-03-20

Fecha de creación:	2025-03-20 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAmihy407QdSEhE5wz8XFnSyS763usoSwb

Historial de “NS_SK00_ET1_C01_EDT_D”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-20 - 9:01:20 CDT- Dirección IP: 190.28.74.234.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a miguel.vargas@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-20 - 9:02:30 CDT
-  miguel.vargas@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-20 - 10:24:01 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  El firmante miguel.vargas@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de miguel Vargas
2025-03-20 - 10:24:27 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  miguel Vargas (miguel.vargas@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-20 - 10:24:29 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  Documento completado.
2025-03-20 - 10:24:29 CDT

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 3. Cronograma detallado de contrato 01_Seguimiento Cronograma Aprobado

ÍTEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	VALOR CONTRATO (SIN IVA)	VALOR CONTRATO (CON IVA)	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA		PORCENTAJE PROGRAMADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	EJECUTADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	OBJETIVO CUMPLIDO	OBSERVACIONES
	CONTRATO DE CONSULTORÍA 24001333 H3 DE 2024	260	\$ 7.963.451.485	\$ 9.476.507.267	36%	26%		15,74%	12,02%	\$ 1.514.266.829	\$ 1.079.476.007		
	PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA (36%)	260	\$ 2.882.278.016	\$ 3.429.910.839	36%	26%		5,74%	4,38%	\$ 549.488.612	\$ 393.523.552		
	ETAPA I - CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS, EN LOS DIFERENTES HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.	78	\$ 383.343.110	\$ 456.178.301	96%	72%	4,81%	4,62%	3,47%	\$ 437.931.169	\$ 328.448.377		
1	Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de contrato y presentación del equipo consultor.	57	\$ 51.881.023	\$ 61.738.417	100%	67%	0,65%	0,65%	0,44%	\$ 61.738.417	\$ 41.364.739		
2	Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental.	40	\$ 51.881.023	\$ 61.738.417	100%	82%	0,65%	0,65%	0,53%	\$ 61.738.417	\$ 50.625.502		
3	Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).	50	\$ 48.998.743	\$ 58.308.504	74%	74%	0,62%	0,46%	0,46%	\$ 43.148.293	\$ 43.148.293		
4	Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario (índice) - Contenido mínimo y capítulo de Introducción.	20	\$ 118.173.440	\$ 140.626.394	100%	85%	1,48%	1,48%	1,26%	\$ 140.626.394	\$ 119.532.435		
5	Diagnóstico de la situación actual (levantamiento de inventario, fichas y DOFA).	43	\$ 112.408.882	\$ 133.766.570	83%	83%	1,41%	1,17%	1,17%	\$ 111.026.253	\$ 111.026.253		
	ETAPA II - DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO.	60	\$ 781.097.615	\$ 929.506.162	12%	7%	9,81%	1,18%	0,69%	\$ 111.557.444	\$ 65.075.175		
6	Levantamiento topográfico método tradicional y levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del (los) aeropuerto(s).	33	\$ 230.582.322	\$ 274.392.963	18%	0%	2,90%	0,52%	0,00%	\$ 49.467.368	\$ -		
7	Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.	45	\$ 80.703.813	\$ 96.037.537	27%	27%	1,01%	0,27%	0,27%	\$ 25.842.435	\$ 25.842.435		
8	Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.	20	\$ 54.763.301	\$ 65.168.328	0%	0%	0,69%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
9	Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres del (los) aeropuerto(s).	15	\$ 48.998.743	\$ 58.308.504	0%	0%	0,62%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
10	Estudios Operacionales	35	\$ 95.115.208	\$ 113.187.098	40%	40%	1,19%	0,48%	0,48%	\$ 45.108.175	\$ 45.108.175		
11	Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.	15	\$ 152.760.788	\$ 181.785.338	0%	0%	1,92%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
12	Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas.	17	\$ 118.173.440	\$ 140.626.394	0%	0%	1,48%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
	EPA LOS COLONIZADORES DE SARAVERA (33%)	260	\$ 2.625.299.578	\$ 3.124.106.498	36%	38%		5,23%	4,10%	\$ 500.482.053	\$ 358.428.876		
	ETAPA I - CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS, EN LOS DIFERENTES HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.	78	\$ 349.164.978	\$ 415.506.324	96%	72%	4,38%	4,21%	3,16%	\$ 398.886.071	\$ 299.164.553		
1	Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de contrato y presentación del equipo consultor.	57	\$ 47.255.411	\$ 56.233.938	100%	67%	0,59%	0,59%	0,40%	\$ 56.233.938	\$ 37.676.739		
2	Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental.	40	\$ 47.255.411	\$ 56.233.938	100%	85%	0,59%	0,59%	0,50%	\$ 56.233.938	\$ 47.798.848		
3	Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).	50	\$ 44.630.110	\$ 53.109.831	74%	74%	0,56%	0,41%	0,41%	\$ 39.301.275	\$ 39.301.275		
4	Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario (índice) - Contenido mínimo y capítulo de Introducción.	20	\$ 107.637.324	\$ 128.088.416	100%	100%	1,35%	1,35%	1,35%	\$ 128.088.416	\$ 128.088.416		
5	Diagnóstico de la situación actual (levantamiento de inventario, fichas y DOFA).	43	\$ 102.386.723	\$ 121.840.200	83%	83%	1,29%	1,07%	1,07%	\$ 101.127.366	\$ 101.127.366		
	ETAPA II - DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO.	60	\$ 711.456.457	\$ 846.633.184	12%	7%	8,93%	1,07%	0,63%	\$ 101.595.982	\$ 59.264.323		
6	Levantamiento topográfico método tradicional y levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del (los) aeropuerto(s).	33	\$ 210.024.046	\$ 249.928.615	18%	0%	2,64%	0,47%	0,00%	\$ 44.987.151	\$ -		

ÍTEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	VALOR CONTRATO (SIN IVA)	VALOR CONTRATO (CON IVA)	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO CON BASE EN LA ACTIVIDAD ESPECIFICA		PORCENTAJE PROGRAMADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO CON BASE EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	EJECUTADO FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)	OBJETIVO CUMPLIDO	OBSERVACIONES
7	Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.	45	\$ 73.508.416	\$ 87.475.015	27%	27%	0,92%	0,25%	0,25%	\$ 23.618.254	\$ 23.618.254		
8	Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.	20	\$ 49.880.711	\$ 59.358.046	0%	0%	0,63%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
9	Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres del (los) aeropuerto(s).	15	\$ 44.630.110	\$ 53.109.831	0%	0%	0,56%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
10	Estudios Operacionales	35	\$ 86.634.919	\$ 103.095.554	40%	40%	1,09%	0,44%	0,44%	\$ 41.238.221	\$ 41.238.221		
11	Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.	15	\$ 139.140.931	\$ 165.577.708	0%	0%	1,75%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
12	Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas.	17	\$ 107.637.324	\$ 128.088.416	0%	0%	1,35%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
EPA AGUAS CLARAS DE OCAÑA (31%)		260	\$ 2.455.873.891	\$ 2.922.489.930	35%	26%		4,77%	3,54%	\$ 464.296.164	\$ 327.523.579		
ETAPA I - CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS, EN LOS DIFERENTES HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.		90	\$ 326.631.360	\$ 388.691.318	95%	70%	4,10%	3,90%	2,87%	\$ 369.256.752	\$ 272.083.923		
1	Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de contrato y presentación del equipo consultor.	57	\$ 44.205.748	\$ 52.604.840	100%	67%	0,56%	0,56%	0,37%	\$ 52.604.840	\$ 35.245.243		
2	Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental.	40	\$ 44.205.748	\$ 52.604.840	85%	50%	0,56%	0,47%	0,28%	\$ 44.714.114	\$ 26.302.420		
3	Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).	50	\$ 41.749.873	\$ 49.682.349	50%	55%	0,52%	0,26%	0,29%	\$ 24.841.174	\$ 27.325.292		
4	Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario (Índice) - Contenido mínimo y capítulo de Introducción.	20	\$ 100.690.870	\$ 119.822.135	100%	85%	1,26%	1,26%	1,07%	\$ 119.822.135	\$ 101.848.815		
5	Diagnóstico de la situación actual (levantamiento de inventario, fichas y DOFA).	43	\$ 95.779.121	\$ 113.977.154	83%	80%	1,20%	1,00%	0,96%	\$ 94.601.038	\$ 91.181.723		
ETAPA II - DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO.		60	\$ 665.542.094	\$ 791.995.092	12%	7%	8,36%	1,00%	0,59%	\$ 95.039.411	\$ 55.439.656		
6	Levantamiento topográfico método tradicional y levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del (los) aeropuerto(s).	33	\$ 196.469.991	\$ 233.799.289	18%	0%	2,47%	0,44%	0,00%	\$ 42.083.872	\$ -		
7	Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.	45	\$ 68.764.497	\$ 81.829.751	27%	27%	0,86%	0,23%	0,23%	\$ 22.094.033	\$ 22.094.033		
8	Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.	20	\$ 46.661.623	\$ 55.527.331	0%	0%	0,59%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
9	Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres del (los) aeropuerto(s).	15	\$ 41.749.873	\$ 49.682.349	0%	0%	0,52%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
10	Estudios Operacionales	35	\$ 81.043.871	\$ 96.442.206	40%	40%	1,02%	0,41%	0,41%	\$ 38.576.883	\$ 38.576.883		
11	Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.	15	\$ 130.161.369	\$ 154.892.029	0%	0%	1,63%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		
12	Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas.	17	\$ 100.690.870	\$ 119.822.135	0%	0%	1,26%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -		

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 4. Registro fotográfico del contrato



CONSORCIO INTER PMA NORTE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER

INFORME DE VISITA - AEROPUERTO LOS COLONIZADORES, SARAVERA - ARAUCA

Objetivo de la Visita:	FECHA: Del : 17/02/2025		AL: 18/02/2025
	Socialización de Stakeholders		
	Participantes de la Interventoría:	Jaime Balaguera Melo	Experto Lado Tierra
		Gina Paola Gonzalez	Coordinadora Interventoría

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

REALIZAR CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto N°:	1		
Fecha de Toma	17/2/2025	Hora:	5:30 p. m.
Localización	Oficina de gerencia de Aeropuerto - Aeropuerto Los Colonizadores - Saravena, Arauca		
Descripción	Primera socialización con interesados, presentación del proyecto.		



Foto N°:	2		
Fecha de Toma	18/2/2025	Hora:	9:30 a. m.
Localización	Pista de Aeropuerto - Aeropuerto Los Colonizadores - Saravena, Arauca		
Descripción	Recorrido de reconocimiento de instalaciones del Aeropuerto.		



Foto N°:	3		
Fecha de Toma	18/2/2025	Hora:	9:35 a. m.
Localización	Pista de Aeropuerto - Aeropuerto Los Colonizadores - Saravena, Arauca		
Descripción	Recorrido de reconocimiento de instalaciones del Aeropuerto.		



Foto N°:	4		
Fecha de Toma	18/2/2025	Hora:	9:40 a. m.
Localización	Pista de Aeropuerto - Aeropuerto Los Colonizadores - Saravena, Arauca		
Descripción	Recorrido de reconocimiento de instalaciones del Aeropuerto.		



Foto N°:	5		
Fecha de Toma	18/2/2025	Hora:	10:25 p. m.
Localización	Sala de Llegada de Aeropuerto - Aeropuerto Los Colonizadores - Saravena, Arauca		
Descripción	Segunda socialización con interesados, presentación del proyecto.		



Foto N°:	6		
Fecha de Toma	18/2/2025	Hora:	3:06 p. m.
Localización	Oficina de la Cámara de Comercio de Arauca - Saravena, Arauca		
Descripción	Tercera socialización con interesados, presentación del proyecto.		



**CONSORCIO INTER PMA NORTE
INTERVENTORÍA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER

INFORME DE VISITA - AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ, ARAUCA - ARAUCA

Objetivo de la Visita:	Socialización de Stakeholders	FECHA: Del :	20/02/2025	AL:	20/02/2025
Participantes de la Interventoría:	Jaime Balaguera Melo Ángel Galindo Pedro Luis Jiménez	Experto Lado Tierra Coordinador Interventoría Director Interventoría			

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER

REGISTRO FOTOGRAFICO

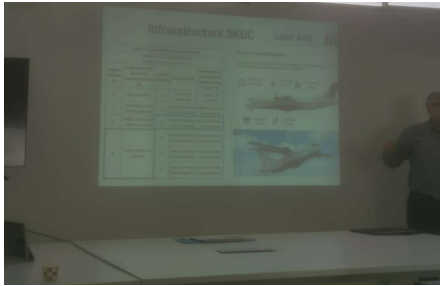


Foto N°:	1		
Fecha de Toma	20/2/2025	Hora:	9:00 a. m.
Localización	Oficina de gerencia de Aeropuerto - Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz - Arauca, Arauca		
Descripción	Primera socialización con interesados, presentación del proyecto.		



Foto N°:	2		
Fecha de Toma	20/2/2025	Hora:	2:00 p. m.
Localización	Oficina de gerencia de Aeropuerto - Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz - Arauca, Arauca		
Descripción	Segunda socialización con interesados, presentación del proyecto.		



Foto N°:	3		
Fecha de Toma	20/2/2025	Hora:	4:00 p. m.
Localización	Cuartos técnicos - Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz - Arauca, Arauca		
Descripción	Recorrido de reconocimiento de instalaciones del Aeropuerto.		

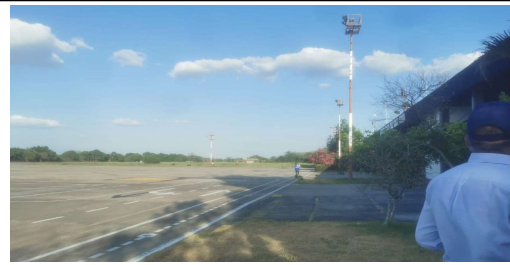


Foto N°:	4		
Fecha de Toma	20/2/2025	Hora:	4:10 p. m.
Localización	Pista Aeropuerto - Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz - Arauca, Arauca		
Descripción	Recorrido de reconocimiento de instalaciones del Aeropuerto.		



Foto N°:	5		
Fecha de Toma	20/2/2025	Hora:	4:10 a. m.
Localización	Pista Aeropuerto - Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz - Arauca, Arauca		
Descripción	Recorrido de reconocimiento de instalaciones del Aeropuerto.		



Foto N°:	6		
Fecha de Toma	20/2/2025	Hora:	4:10 a. m.
Localización	Planta Eléctrica - Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz - Arauca, Arauca		
Descripción	Recorrido de reconocimiento de instalaciones del Aeropuerto.		

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 5. Informes semanales

FORMATO				
<div><div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div></div>				
Principio de Procedencia: 4602.375		Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020
				Página: ____ de #
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS				
Semana No 9		Del : 1/03/25	AL: 7/03/25	FECHA: 8/03/25
Plazo Total 12 meses		360 días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 66 días				
porcentaje del tiempo transcurrido(%) 18,33%				
Nombre del Supervisor :				
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA				
REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL ATO SKUC Y LA ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DEL NORTE DE SANTANDER				
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN				
ARAUCA - SARAVENA - OCANA				
(%) Programado	Semanal 0.00%	Acumulado 0.00%	(%) Ejecutado	Semanal 0.00%
Valor programado (\$)	\$ 0.00	\$ 0.00	Valor ejecutado (\$)	\$ 0.00
			Evaluación	Porcentaje Atraso 0.00%
				Valor Atraso \$ 0.00
CONTRATO DE OBRA		DATOS CONTRACTUALES		
Contratista: CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS		CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contrato No: 23001333 H3 DE 2024		Contratista: CONSORCIO INTER PMA NORTE		
Valor inicial: \$ 9.476.507.267		Contrato No: 23001385 H3 2024		
Valor Actualizado al modificadorio : \$ 9.476.507.267		Valor inicial: \$ 2.407.194.389		
Valor actualizado 2: \$ 9.476.507.267		Valor Actualizado al modificadorio : \$ 2.407.194.389		
Plazo inicial: DOCE (12) MESES		Valor actualizado 2: \$ 2.407.194.389		
Plazo actualizado: DOCE (12) MESES		Plazo inicial: DOCE (12) MESES		
Fecha de iniciación: 31-dic-24		Plazo actualizado: DOCE (12) MESES		
Fecha de vencimiento: 30-dic-25		Fecha de iniciación: 31-dic-24		
Modificadorio No. Prórroga No. -		Fecha de vencimiento: 30-dic-25		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. -		Modificadorio No. Prórroga No. -		
Suspensión No. -		Fecha de Terminación Según Prórroga No. -		
Periodo de Suspensión No. -		Suspensión No. -		
Levantamiento de la suspensión No. -		Periodo de Suspensión No. -		
Nueva fecha de terminación 30-dic-25		Levantamiento de la suspensión No. -		
Valor total actual del contrato \$ 9.476.507.267		Nueva fecha de terminación 30-dic-25		
		Valor total actual del contrato \$ 2.407.194.389		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES PRESENTE SEMANA				
Actividades realizadas por la interventoría:				
<p>- La interventoría mediante comunicado C155-CE-036-2025, del 6 de marzo de 2025, dio traslado a la consultoría de la comunicación 1623912 con radicado 202560020008897 emitida por la Entidad, en la cual se acepta la propuesta del consultor para la reprogramación de las visitas de socialización en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.</p> <p>- La interventoría, los días 3 y 4 de marzo de 2025, realizó acompañamiento a las actividades para el levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena, Arauca, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.).</p> <p>- Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de las metodologías específicas de los siguientes componentes: Social, Ambiental, Predial, Geotecnía, Capacidad de Demanda, Red Aeroportuaria, Jurídico, Análisis Operacional, Financiero y Prognosis.</p>				
Actividades realizadas por la consultoría:				
<p>- La consultoría mediante correo electrónico del 1 de marzo de 2025, remitió a la interventoría el informe semanal No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de febrero al 2 de marzo de 2025.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-061, del 4 de marzo de 2025, remitió la atención de las observaciones a la comunicación C155-CE-021-2025 relacionadas con la propuesta de áreas y metodología topografía y levantamiento LIDAR.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-064, del 4 de marzo de 2025, remitió la atención de las observaciones a la comunicación C155-CE-018-2025 relacionadas con el plan de ejecución BIM (BEP).</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-065, del 3 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, la solicitud de carnetización para el ingreso a los aeropuertos Los Colonizadores de Saravena y Aguas Claras de Ocaña.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-067, del 5 de marzo de 2025, remitió la entrega en versión A del componente 3 correspondiente a la Matriz de Interesados.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-069, del 6 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, la solicitud de carnetización para el ingreso al Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-070, del 7 de marzo de 2025, remitió la respuesta a la comunicación C155-CE-036-2025 con la programación actualizada del plan de visitas del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-071, del 7 de marzo de 2025, remitió la entrega en versión A del componente 3 correspondiente a la Matriz de Interesados.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-072, del 7 de marzo de 2025, remitió la entrega del informe mensual No.2, correspondiente al mes de febrero de 2025.</p> <p>- La consultoría mediante correo electrónico del 4 de marzo de 202, remitió el avance de la atención de las observaciones realizadas por la interventoría sobre el cronograma, en una mesa de trabajo llevada a cabo el 28 de febrero de 2025.</p> <p>- La consultoría el 3 y el 4 de marzo de 2025, realizó actividades para el levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena, Arauca, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.), con el fin de adelantar las fichas de inventarios de la Etapa I.</p>				
Reuniones				
<p>- El 4 de marzo de 2025, se llevo a cabo el comité presencial de seguimiento del contrato, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. El consultor mencionó que se encontraban proyectando la respuesta con la propuesta para el levantamiento Lida, así como el levantamiento topográfico convencional, adicionalmente se solicitó a la Entidad su pronunciamiento con relación a la propuesta del consultor para la reprogramación de las reuniones de socialización en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña debido a problemas de orden público.</p>				



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia:	4602.375
---------------------------	----------

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 01/MARZO/2020

Página: ____ de #

Actividades Aeropuerto Los Colonizadores:

- Los días 3 y 4 de marzo de 2025, se llevaron a cabo las actividades del levantamiento de inventarios, en general se desarrollaron recorridos y visitas a las edificaciones, se tomó registro fotográfico, así mismo se realizaron algunas consultas de las necesidades y/o requerimientos, con el personal de planta del aeropuerto.

Actividades Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz:

- No se adelantaron actividades en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Aguas Claras:

(Una vez se tengan actividades específicas para este aeropuerto se informarán en este espacio)

REVISIÓN PROGRAMACIÓN POR FRENTES DE TRABAJO



Nota: Una vez se tenga un cronograma aprobado se mostrará la curva S en este espacio

ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO

Actividades Aeropuerto Los Colonizadores - Saravena, Arauca:

- Levantamiento de inventarios.

AVANCE DE CONSULTORÍA

- El 4 de marzo de 2025, mediante correo electrónico, la consultoría remitió el avance de la atención de las observaciones realizadas por la interventoría sobre el cronograma, en una mesa de trabajo llevada a cabo el 28 de febrero de 2025.

- La consultoría informó que continúa atendiendo las observaciones a la metodología de topografía y al área de vuelo LIDAR.

- El 4 de marzo de 2025, mediante el oficio NS-064 se remitió a la interventoría la atención de observaciones del BEP.

- El 5 de marzo de 2025, mediante el oficio NS-067 se remitió la versión A del componente 3, para revisión de la interventoría

FINANCIERO:

NA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- En los trabajos desarrollados en el levantamiento de inventarios del Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena, tanto el equipo de trabajo de la consultoría como el profesional de acompañamiento por parte de la interventoría contaron con los elementos de protección personal adecuados para dicha actividad.

AVANCE FINANCIERO DE CONSULTORÍA

Acta Parcial de costos No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1			Valor Total Contrato Obra	
2			\$ 9.476.507.267,00	
3			Valor facturado Contrato Obra	
4			\$ 0,00	
			% Avance facturado Acumulado	
			0,00%	
Total Acumulado	\$ 0,00			

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.					
1				Valor Total Contrato interventoría	
2				\$ 2.407.194.389,00	
3				Valor facturado Contrato Interventoría	
4				\$ 0,00	
				% Avance facturado Acumulado	
				0,00%	
Total Acumulado		\$ 0,00			

OBSERVACIONES

La interventoría emitió observaciones a la consultoría sobre el cronograma presentado por la consultoría, por lo tanto, no se tiene un porcentaje programado ni ejecutado para el presente informe semanal. Adicionalmente, en los informes semanales se presentará el cuadro control y curva S en la hoja "Ctrl" del archivo editable del presente informe una vez se cuente con el cronograma aprobado.

Pharyngodon

PEDRO LUIS JIMENEZ



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19

PERIODO

15/11/24

PÁGINA

DE

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS - 3 MAR -2025



LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS - 4 MAR -2025

FORMATO					
<div>  <div> AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small> </div> </div> <div> INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA </div>					
Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: ____ de #	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS					
Semana No 10		Del : 8/03/2025	FECHA: 15/03/2025 AL: 14/03/2025		
Plazo Total 12 meses		Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 360 días			
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		73 días			
Nombre del Supervisor :		20,28%			
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA					
REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL ATO SKUC Y LA ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DEL NORTE DE SANTANDER					
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
ARAUCA - SARAVERENA - OCAÑA					
(%) Programado	Semanal 0.00%	Acumulado 0.00%	(%) Ejecutado	Semanal 0.00%	
Valor programado (\$)	\$ 0.00	\$ 0.00	Valor ejecutado (\$)	\$ 0.00	
			Evaluación	Porcentaje Atraso 0.00%	
			Valor Atraso	\$ 0.00	
CONTRATO DE OBRA		DATOS CONTRACTUALES			
CONTRATO DE INTERVENTORIA					
Contratista:	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS		Contratista:	CONSORCIO INTER PMA NORTE	
Contrato No:	23001333 H3 DE 2024		Contrato No:	23001385 H3 2024	
Valor Inicial:	\$ 9.476.507.267		Valor Inicial:	\$ 2.407.194.389	
Valor Actualizado al modificadorio :	\$ 9.476.507.267		Valor Actualizado al modificadorio :	\$ 2.407.194.389	
Valor actualizado 2:	\$ 9.476.507.267		Valor actualizado 2:	\$ 2.407.194.389	
Plazo inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo inicial:	DOCE (12) MESES	
Plazo actualizado:	DOCE (12) MESES		Plazo actualizado:	DOCE (12) MESES	
Fecha de iniciación:	31-dic-24		Fecha de iniciación:	31-dic-24	
Fecha de vencimiento:	30-dic-25		Fecha de vencimiento:	30-dic-25	
Modificadorio No. Prórroga No.	-		Modificadorio No. Prórroga No.	-	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	-		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	-	
Suspensión No.	-		Suspensión No.	-	
Periodo de Suspensión No.	-		Periodo de Suspensión No.	-	
Levantamiento de la suspensión No.	-		Levantamiento de la suspensión No.	-	
Nueva fecha de terminación	30-dic-25		Nueva fecha de terminación	30-dic-25	
Valor total actual del contrato	\$ 9.476.507.267		Valor total actual del contrato	\$ 2.407.194.389	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES PRESENTE SEMANA					
Actividades realizadas por la interventoría:					
- La interventoría mediante comunicado C155-CE-040-2025, del 12 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, el informe semana No 9, para el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de marzo de 2025. Radicado 2025190010030025. - La interventoría mediante comunicado C155-CE-041-2025, del 14 de marzo de 2025, remitió a la consultoría la respuesta con observaciones al oficio NS-058, relacionada con las metodologías específicas de los componentes social, ambiental, predial y geotecnia. - La Interventoría, los días 11 y 12 de marzo de 2025, realizó acompañamiento a las actividades para el levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.). - La Interventoría mediante comunicado C155-CE-038-2025, del 14 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, los informes de las visitas de socialización realizadas en los Aeropuertos Los Colonizadores de Saravena y Santiago Pérez Quitoz de Arauca. Radicado 2025190010031874. - Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de las metodologías específicas de los siguientes componentes: Capacidad de Demanda, Red Aeroportuaria, Jurídico, Análisis Operacional, Financiero, Prognosis y riesgos. - Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la metodología general, cronograma detallado, alcance a la propuesta para el levantamiento LIDAR y actualización BEP. - Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la atención de observaciones del informe mensual, del componente 4, así mismo, se esta trabajando en la revisión de la versión A del informe mensual No 2 y de la entrega del componente 3.					
Actividades realizadas por la consultoría:					
- La consultoría mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2025, remitió a la interventoría el informe semanal No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 3 y el 9 de marzo de 2025. - La consultoría mediante comunicado NS-070, del 9 de marzo de 2025, remitió la programación de las visita de socialización en el Aeropuerto Aguas Claras de la ciudad de Ocaña, indicando los interesados a los que se les remitirá invitación para las reuniones previstas. - La consultoría mediante comunicado NS-073, del 11 de marzo de 2025, remitió la entrega en versión A de la metodología específica de riesgos. - La consultoría mediante comunicado NS-074, del 11 de marzo de 2025, dio respuesta a la comunicación C155-CE-032-2025, con la atención de observaciones del componente 4. - La consultoría mediante comunicado NS-075, del 11 de marzo de 2025, dio alcance a la comunicación NS-061, relacionada con la propuesta de la cobertura para el desarrollo del levantamiento LIDAR. - La consultoría mediante comunicado NS-076, del 14 de marzo de 2025, remitió solicitud de cambio de personal para el experto de planificación lado tierra y especialista diseño geométrico. - En el presente periodo la consultoría remitió las invitaciones para la socialización del proyecto en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las siguientes personas y/o entidades: Dirección regional Aeronautica Nororiental, Gerente Aeroportuario, Gobernación Norte de Santander, Secretaría de Planeación Norte de Santander, Secretaría de Gestión de Riesgo Norte de Santander, Secretaría de Turismo Norte de Santander, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad de Norte de Santander, Alcaldía de Ocaña, Secretaría de Infraestructura Ocaña, Secretaría de Gobierno Ocaña, Unidad Técnica Ambiental, Secretaría de Movilidad y Tránsito Ocaña, Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Ocaña, Secretaría de vías, infraestructura y vivienda Ocaña, Alcaldía Aguachica, Alcaldía Rio de Oro, Alcaldía de González, Alcaldía Convención, Alcaldía Teorama, Alcaldía San Calixto, Alcaldía Abrego, Alcaldía Villa Caro, Alcaldía del Carmen, Alcaldía Hacarí, Alcaldía la Playa de Belén, Personería Municipal de Ocaña, Cámara de Comercio Ocaña, Cámara de Comercio Cucuta, Coordinador Salud Pública, Comandancia Policía Ocaña, Procuraduría Provincial de Ocaña, Corporación Ambiental, Gerencia Seccional Norte de Santander Andí, Fenalco, Searca, Aerollanos del Oriente, Aerolans, Coomulpinort, Empresa de Servicios Público, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Metrogas, Asomunicipios, Representantes Vereda Cristo Rey, Representante JAC Corregimiento Aguas Claras, Representantes Vereda Las Chircas, Representante JAC Vereda el Limón. - La consultoría el 11 y el 12 de marzo de 2025, realizó actividades para el levantamiento de inventarios y de información técnica en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander, se adelantaron recorridos al interior de las instalaciones (terminal, edificios de soporte, parqueaderos, pista, calles de rodaje, etc.), con el fin de adelantar las fichas de inventarios de la Etapa I.					
Reuniones					
- El 11 de marzo de 2025, se llevo a cabo el comité presencial de seguimiento del contrato, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. El consultor mencionó que se encontraban proyectando un alcance para la propuesta para el levantamiento LIDAR. La Entidad informó que se programara una reunión para la definición de los lineamientos BIM del proyecto, para el lunes 17 de marzo de 2025.					

Actividades Aeropuerto Los Colonizadores:
- No se adelantaron actividades en el presente periodo.


Actividades Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz:

- Los días 11 y 12 de marzo de 2025, se llevaron a cabo las actividades del levantamiento de inventarios, en general se desarrollaron recorridos y visitas a las edificaciones, se tomó registro fotográfico, así mismo se realizaron algunas consultas de las necesidades y/o requerimientos, con el personal de planta del aeropuerto.

Actividades Aeropuerto Aguas Claras:

(Una vez se tengan actividades específicas para este aeropuerto se informarán en este espacio)

REVISIÓN PROGRAMACIÓN POR FRENTE DE TRABAJO



Nota: Una vez se tenga un cronograma aprobado se mostrará la curva S en este espacio

ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO

Actividades Aeropuerto Aguas Claras - Ocaña, Norte de Santander:

- Levantamiento de inventarios.

AVANCE DE CONSULTORÍA

- El 12 y 13 de marzo de 2025, mediante correo electrónico, la consultoría remitió las invitaciones a los interesados para la socialización del proyecto en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, las cuales se realizaron del 26 al 27 de marzo de 2025.

- La consultoría informó que dio alcance atendiendo las observaciones a la propuesta del área de vuelo LIDAR.

FINANCIERO:

NA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- En los trabajos desarrollados en el levantamiento de inventarios del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, tanto el equipo de trabajo de la consultoría como el profesional de acompañamiento por parte de la interventoría contaron con los elementos de protección personal adecuados para dicha actividad.

AVANCE FINANCIERO DE CONSULTORÍA

Acta Parcial de costos No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1			Valor Total Contrato Obra	
2			\$ 9.476.507.267,00	
3			Valor facturado Contrato Obra	
4			\$ 0,00	
			% Avance facturado Acumulado	
			0,00%	
Total Acumulado		\$ 0,00		

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1			Valor Total Contrato interventoría	
2			\$ 2.407.194.389,00	
3			Valor facturado Contrato Interventoría	
4			\$ 0,00	
			% Avance facturado Acumulado	
			0,00%	
Total Acumulado		\$ 0,00		

OBSERVACIONES

La interventoría emitió observaciones a la consultoría sobre el cronograma presentado, por lo tanto, no se tiene un porcentaje programado ni ejecutado para el presente informe semanal. Adicionalmente, en los informes semanales se presentará el cuadro control y curva S en la hoja "Ctrl" del archivo editable del presente informe una vez se cuente con el cronograma aprobado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

PEDRO LUIS JIMENEZ



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19

PERIODO

15/11/2024

PÁGINA

DE


REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS OCAÑA - 11 Y 12 MAR -2025



LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS OCAÑA - 11 Y 12 MAR -2025

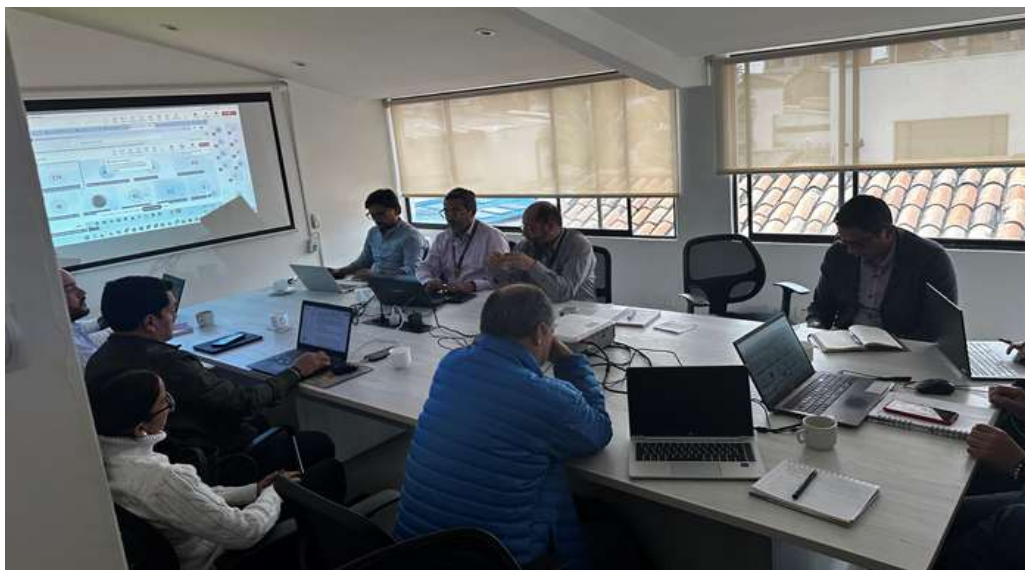

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 8 - 11 MAR - 2025

FORMATO				
<div><div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div></div>				
Principio de Procedencia: 4602.375		Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020
Página: ____ de #				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS				
Semana No 11		Del : 15/03/2025	FECHA: 22/03/2025	
Plazo Total 12 meses		360 días	AL: 21/03/2025	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		80 días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		22,22%		
Nombre del Supervisor :				
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA				
REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL ATO SKUC Y LA ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DEL NORTE DE SANTANDER				
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN				
ARAUCA - SARAVERENA - OCAÑA				
Semanal		Acumulado		
(%) Programado	34,00%	34,00%		
Valor programado (\$)	\$ 3.222.012.470,78	\$ 3.222.012.470,78		
Semanal		Acumulado		
(%) Ejecutado	25,00%	25,00%		
Valor ejecutado (\$)	\$ 2.369.126.816,75	\$ 2.369.126.816,75		
Evaluación		Porcentaje Atraso		
		-9,00%		
		Valor Atraso		
		-\$ 852.885.654,03		
CONTRATO DE OBRA		DATOS CONTRACTUALES		
CONTRATO DE INTERVENTORIA				
Contratista: CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS		Contratista: CONSORCIO INTER PMA NORTE		
Contrato No: 23001333 H3 DE 2024		Contrato No: 23001385 H3 2024		
Valor Inicial: \$ 9.476.507.267		Valor Inicial: \$ 2.407.194.389		
Valor Actualizado al modificadorio : \$ 9.476.507.267		Valor Actualizado al modificadorio : \$ 2.407.194.389		
Valor actualizado 2: \$ 9.476.507.267		Valor actualizado 2: \$ 2.407.194.389		
Plazo inicial: DOCE (12) MESES		Plazo inicial: DOCE (12) MESES		
Plazo actualizado: DOCE (12) MESES		Plazo actualizado: DOCE (12) MESES		
Fecha de iniciación: 31-dic-24		Fecha de iniciación: 31-dic-24		
Fecha de vencimiento: 30-dic-25		Fecha de vencimiento: 30-dic-25		
Modificadorio No. Prórroga No. -		Modificadorio No. Prórroga No. -		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. -		Fecha de Terminación Según Prórroga No. -		
Suspensión No. -		Suspensión No. -		
Periodo de Suspensión No. -		Periodo de Suspensión No. -		
Levantamiento de la suspensión No. -		Levantamiento de la suspensión No. -		
Nueva fecha de terminación 30-dic-25		Nueva fecha de terminación 30-dic-25		
Valor total actual del contrato \$ 9.476.507.267		Valor total actual del contrato \$ 2.407.194.389		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES PRESENTE SEMANA				
Actividades realizadas por la interventoría:				
<p>- La interventoría mediante comunicado C155-CE-042-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, con copia a la Entidad, la respuesta a las comunicaciones NS-061 y NS-075 relacionada con la propuesta a la Metodología de Topografía, solicitando la atención de las observaciones en completitud y calidad para poder dar inicio a las actividades de campo. Radicado de la Aerocivil (2025190010033218).</p> <p>- La interventoría mediante comunicado C155-CE-043-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, con copia a la Entidad, la respuesta a la comunicación NS-062 relacionada con la actualización de la metodología y el cronograma detallado, solicitando la atención de las observaciones en completitud y calidad. Radicado de la Aerocivil (2025190010033284).</p> <p>- La interventoría mediante comunicado C155-CE-045-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, aclaración de la hoja de vida del profesional electromecánico. Radicado de la Aerocivil (2025190010033381).</p> <p>- La interventoría mediante comunicado C155-CE-044-2025, del 19 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, el informe semana No 10, para el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2025. Radicado de la Aerocivil (2025190010033765).</p> <p>- Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de las metodologías específicas de los siguientes componentes: Capacidad de Demanda, Red Aeroportuaria, Jurídico, Análisis Operacional, Financiero, Prognosis y riesgos.</p> <p>- Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la Entrega del Componente 3 (Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).</p> <p>- Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la Entrega del Componente 2 (Revisión de la información existente y debida diligencia documental).</p> <p>- Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoría han adelantado la revisión de la atención de observaciones del informe mensual, del componente 4, así mismo, se esta trabajando en la revisión de la versión A del informe mensual No 2.</p>				
Actividades realizadas por la consultoría:				
<p>- La consultoría mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2025, remitió a la interventoría el informe semanal No. 6 correspondiente al periodo comprendido entre el 10 y el 16 de marzo de 2025.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-077, del 18 de marzo de 2025, remitió un oficio al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-078, del 18 de marzo de 2025, remitió a la interventoría la Entrega de componente 2, en su versión A, correspondiente a la revisión de la información existente y debida diligencia.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-079, del 18 de marzo de 2025, remitió a la interventoría la atención de observaciones al cronograma detallado en versión D.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-080, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición al MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS. solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-081, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ESPO S.A. E.S.P. solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-082, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa CENS S.A. E.S.P. solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-083, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-084, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa de telecomunicaciones TELECOM OCAÑA solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-085, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa EMSESPA E.I.C.E. E.S.P. solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-086, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ENELAR E.S.P. solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-087, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ALCANOS DE COLOMBIA, Arauca, solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-088, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa EMPASTEL solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-089, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ECAAAS E.S.P. solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-090, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ENERGARA S.A.E.S.P. solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-091, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa ALCANOS DE COLOMBIA, Saravena, solicitando información base para el proyecto.</p> <p>- La consultoría mediante comunicado NS-092, del 20 de marzo de 2025, remitió derecho de petición a la empresa de telecomunicaciones TELECOM SARAVERENA solicitando información base para el proyecto.</p>				
Reuniones				
<p>- El 17 de marzo de 2025, se llevo a cabo reunión virtual, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. La Aerocivil presentó los lineamientos a considerar en la implementación de la metodología BIM para que el consultor y la interventoría las tenga en cuenta en el desarrollo del proyecto. El consultor mencionó que la ultima versión del BEP entregada a la Interventoría ya cuenta con las consideraciones solicitadas por la Entidad.</p> <p>- El 18 de marzo de 2025, se llevo a cabo reunión presencial, con la participación de la consultoría y la Interventoría, la cual tuvo como objetivo la socialización de las metodologías de los componentes financieros, se dieron a conocer a la consultoría la consideraciones y hallazgos mas significativos evidenciados por la interventoría para ser atendidas.</p> <p>- El 18 de marzo de 2025, se llevo a cabo el comité virtual de seguimiento del contrato, con la participación de la consultoría, la Entidad y la Interventoría. El consultor mencionó que se encontraban atendiendo las observaciones del cronograma detallado en versión D. La interventoría informo que el 19 de marzo de 2025 se programó mesa de trabajo para la revisión de la propuesta presentada para los levantamientos a desarrollar en el proyecto.</p> <p>- El 19 de marzo de 2025, se llevo a cabo reunión presencial, con la participación de la consultoría y la Interventoría, en la cual se revisó en detalle la propuesta presentada por el consultor con relación a los levantamientos a desarrollar en el proyecto, se identificaron claramente el tipo de levantamientos a desarrollar de acuerdo con la etapa y el alcance de los mismos, por lo cual el consultor informó que se entregara la propuesta actualizada y completa de las metodologías el miércoles 26 de marzo de 2025, para revisión de la interventoría.</p> <p>- El 21 de marzo de 2025, se llevo a cabo reunión virtual, con la participación de la consultoría y la Interventoría, donde la consultoría expuso a la interventoría el análisis que ha desarrollado a la fecha de las pre-alternativas para el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, esto considerando las condiciones existentes.</p>				

Actividades Aeropuerto Los Colonizadores:
- No se adelantaron actividades específicas en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz:
- No se adelantaron actividades específicas en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Aguas Claras:
- No se adelantaron actividades específicas en el presente periodo.

REVISIÓN PROGRAMACIÓN POR FRENTES DE TRABAJO

VALOR, %

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

SEMANA 9

SEMANA 10

SEMANA 11

SEMANA 12

SEMANA 13

SEMANA 14

SEMANA 15

SEMANA 16

SEMANA 17

SEMANA 18

SEMANA 19

SEMANA 20

SEMANA 21

SEMANA 22

SEMANA 23

SEMANA 24

SEMANA 25

SEMANA 26

% PROGRAMADO ACUMULADO

% EJECUTADO ACUMULADO

Nota: El cronograma fue aprobado el 25/03/2025

ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO

Actividades Aeropuerto Los Colonizadores:
- No se adelantaron actividades de campo en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz:
- No se adelantaron actividades de campo en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Aguas Claras:
- No se adelantaron actividades de campo en el presente periodo.

AVANCE DE CONSULTORÍA

- La consultoría remitió para revisión la Entrega del componente 2, correspondiente a la revisión de la información existente y la debida diligencia.

- La consultoría informó a la interventoría en mesa de trabajo las pre-alternativas analizadas del Aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña, de acuerdo con la información recolectada tanto en levantamientos de inventarios como en información previa disponible.

FINANCIERO:
NA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

AVANCE FINANCIERO DE CONSULTORÍA

Acta Parcial de costos No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1			Valor Total Contrato Obra	
2			\$ 9.476.507.267,00	
3			Valor facturado Contrato Obra	
4			\$ 0,00	
			% Avance facturado Acumulado	
			0,00%	
Total Acumulado		\$ 0,00		

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1			Valor Total Contrato interventoría	
2			\$ 2.407.194.389,00	
3			Valor facturado Contrato Interventoría	
4			\$ 0,00	
			% Avance facturado Acumulado	
			0,00%	
Total Acumulado		\$ 0,00		

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

La interventoría dio aprobación al cronograma detallado de trabajo, por lo cual, se inicio con el seguimiento de este. Adicionalmente, se presenta el cuadro control y curva S en la hoja "Cur" del archivo editable del presente informe.

PEDRO LUIS JIMENEZ



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19


PERIODO

15/11/2024


PÁGINA

DE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

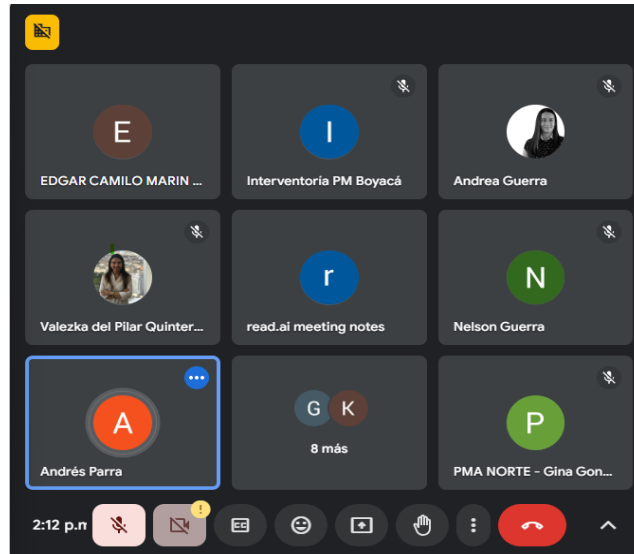

REUNIÓN LINEAMIENTOS BIM - 17 MAR -2025

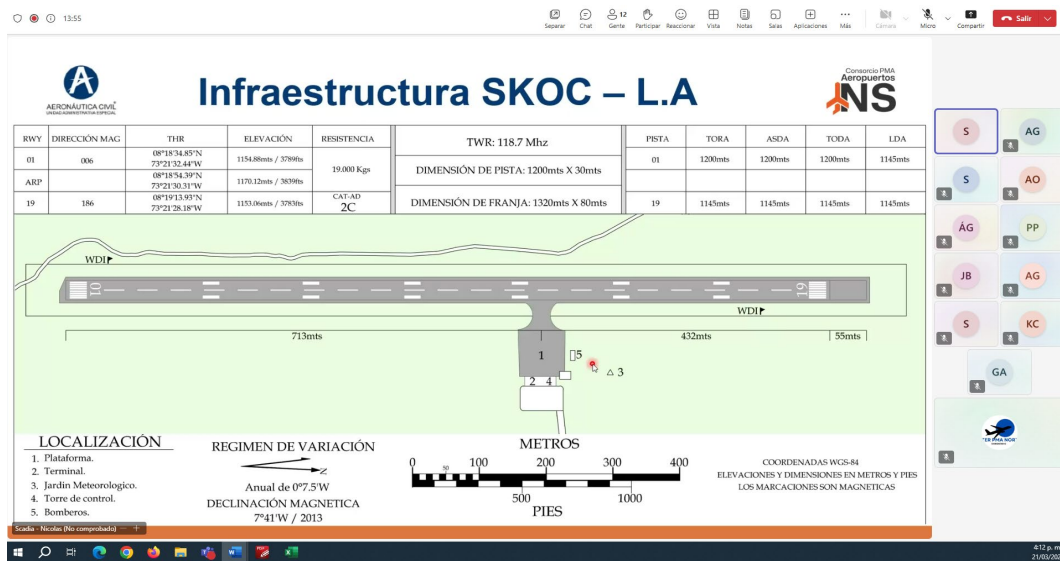

SOCIALIZACIÓN DE PRE-ALTERNATIVAS OCAÑA - 21 MAR -2025


FORMATO			
<div>  <div> AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small> </div> </div> <div> INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA </div>			
Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS		FECHA: 29/03/2025	
Semana No 12	Del : 22/03/2025	AL: 28/03/2025	
Plazo Total 12 meses	360 días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	87 días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	24,17%		
Nombre del Supervisor : -			
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA			
REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL ATO SKUC Y LA ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DEL NORTE DE SANTANDER			
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN			
ARAUCA - SARAVERA - OCAÑA			
Semanal (%) Programado 2,00% Valor programado (\$) \$ 189.530.145,34		Acumulado 36,00% \$ 3.411.542.616,12	
Semanal (%) Ejecutado 1,00% Valor ejecutado (\$) \$ 94.765.072,67		Acumulado 26,00% \$ 2.463.891.889,42	
Evaluación		Porcentaje Atraso -10,00% Valor Atraso \$ 947.650.726,70	
DATOS CONTRACTUALES			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	Contratista:	CONSORCIO INTER PMA NORTE
Contrato No:	23001333 H3 DE 2024	Contrato No:	23001385 H3 2024
Valor Inicial:	\$ 9.476.507.267	Valor Inicial:	\$ 2.407.194.389
Valor Actualizado al modificadorio :	\$ 9.476.507.267	Valor Actualizado al modificadorio :	\$ 2.407.194.389
Valor actualizado 2:	\$ 9.476.507.267	Valor actualizado 2:	\$ 2.407.194.389
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo actualizado:	DOCE (12) MESES	Plazo actualizado:	DOCE (12) MESES
Fecha de iniciación:	31-dic-24	Fecha de iniciación:	31-dic-24
Fecha de vencimiento:	30-dic-25	Fecha de vencimiento:	30-dic-25
Modificadorio No. Prórroga No.	-	Modificadorio No. Prórroga No.	-
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	-	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	-
Suspensión No.	-	Suspensión No.	-
Periodo de Suspensión No.	-	Periodo de Suspensión No.	-
Levantamiento de la suspensión No.	-	Levantamiento de la suspensión No.	-
Nueva fecha de terminación	30-dic-25	Nueva fecha de terminación	30-dic-25
Valor total actual del contrato	\$ 9.476.507.267	Valor total actual del contrato	\$ 2.407.194.389
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
ACTIVIDADES PRESENTE SEMANA			
Actividades realizadas por la interventoria: - La interventoria mediante comunicado C155-CE-046-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, la aprobación del cronograma detallado en versión D, para realizar el seguimiento del proyecto. - La interventoria mediante comunicado C155-CE-047-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, el cronograma detallado aprobado en versión D, con el cual se realizará el seguimiento del proyecto. - La interventoria mediante comunicado C155-CE-048-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, la respuesta a la comunicación NS-060 relacionada con las metodologías específicas Financiera, Prognosis, Capacidad y Demanda, Análisis Operacional y Red Aeroportuaria, se remitiéron las observaciones encontradas por los especialistas. - La interventoria mediante comunicado C155-CE-049-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, la respuesta a la comunicación NS-076 relacionada con el cambio de los profesionales Experto en planificación lado tierra y Especialista en diseño geométrico, después de la revisión se dio aprobación del cambio del Experto lado tierra y se remitiéron observaciones al profesional propuesto para el especialista de diseño geométrico. - La interventoria mediante comunicado C155-CE-050-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, la solicitud de los camets de ingreso al Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, para los profesionales que acompañaran la socialización del proyecto en campo. Radicado de la Aerocivil (2025190010035517). - La interventoria mediante comunicado C155-CE-051-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la consultoría, la aprobación del informe mensual No. 1 correspondiente al mes de Enero, toda vez que las observaciones remitidas fueron atendidas en su totalidad. - La interventoria mediante comunicado C155-CE-052-2025, del 21 de marzo de 2025, remitió a la Entidad, la solicitud del cambio de los profesionales de Estructuración jurídica y Especialista en energía y electromecánica, para revisión y aprobación por parte de la Aerocivil. Radicado de la Aerocivil (2025190010037556). - Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoria han adelantado la revisión de las metodologías específicas de los siguientes componentes: Jurídico y riesgos. - Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoria han adelantado la revisión de la Entrega del Componente 3 (Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings). - Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoria han adelantado la revisión de la Entrega del Componente 2 (Revisión de la información existente y debida diligencia documental). - Durante el periodo del presente informe los profesionales de la interventoria han adelantado la revisión de la atención de observaciones del informe mensual, del componente 4, así mismo, se esta trabajando en la revisión de la versión A del informe mensual No 2. - Durante el periodo del presente informe se realizó acompañamiento por parte de la interventoria a las reuniones de socialización del proyecto, llevadas a cabo del 26 al 28 de marzo de 2025, en las instalaciones del Aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña.			
Actividades realizadas por la consultoría: - La consultoría mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2025, remitió a la interventoria el informe semanal No. 7 correspondiente al periodo comprendido entre el 17 y el 23 de marzo de 2025. - La consultoría mediante comunicado NS-068, del 26 de marzo de 2025, remitió a la interventoria la respuesta a las comunicaciones C155-CE-025-2025 y C155-CE-042-2025, correspondiente a la atención de observaciones a la metodología de topografía, conforme con la mesa de trabajo desarrollada el 19 de marzo de 2025. - La consultoría mediante comunicado NS-094, del 25 de marzo de 2025, remitió a la interventoria la respuesta a la comunicación C155-CE-041-2025, correspondiente a la atención de observaciones a las metodologías específicas de los componentes Ambiental, Social, Predial y Geotecnía. - Durante el periodo del presente informe la consultoría realizó las diferentes reuniones de socialización del proyecto, entre 26 al 28 de marzo de 2025, en las instalaciones del Aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña, con participación de la Alcaldía de Ocaña, Gobernación de Norte de Santander, Gestión del Riesgo, Cámara de Comercio de Cúcuta, Ejército de Colombia, Policía Nacional, Satena y representantes de las comunidades.			
Reuniones - El 25 de marzo de 2025, se llevo a cabo reunión virtual, con la participación de la consultoría y la interventoria, para la revisión del seguimiento con el cronograma aprobado en su versión D. - El 25 de marzo de 2025, se llevo a cabo el comité virtual de seguimiento del contrato, con la participación de la consultoría, la Entidad y la interventoria. El consultor informó que se presentará la atención de observaciones de la metodología de topografía en 26 de marzo de 2025, por otro lado la Entidad, solicito que se presente el seguimiento de forma gráfica. - El 27 de marzo de 2025, se llevaron a cabo reunión presencial para la socialización del proyecto, en las instalaciones del Aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña, con participación de la consultoría, la interventoria, la Entidad, la Alcaldía de Ocaña, Gobernación de Norte de Santander, Gestión del Riesgo, Cámara de Comercio de Cúcuta, Ejército de Colombia, Policía Nacional, Satena y representantes de las comunidades. - El 28 de marzo de 2025, se llevo a cabo reunión presencial en campo, con la participación de la consultoría y la Interventoria, donde se revisaron las pre-alternativas para el desarrollo del EPA del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, posterior al recorrido realizado en las instalaciones, con el fin de evaluar la viabilidad de las alternativas analizadas por el consultor			

Actividades Aeropuerto Los Colonizadores:
- No se adelantaron actividades específicas en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz:
- No se adelantaron actividades específicas en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Aguas Claras:
- El 27 de marzo de 2025, se llevaron a cabo las reuniones de socialización del proyecto, con los actores interesados (Entes gubernamentales, Aerolíneas, Comunicados, etc.)

REVISIÓN PROGRAMACIÓN POR FRENTE DE TRABAJO



Nota: El cronograma fue aprobado el 25/03/2025

Fecha de corte de seguimiento: 30 de marzo de 2025.

ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO

Actividades Aeropuerto Los Colonizadores:
- No se adelantaron actividades de campo en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz:
- No se adelantaron actividades de campo en el presente periodo.

Actividades Aeropuerto Aguas Claras:
- Se adelantó recorrido de reconocimiento general de las instalaciones por parte de los especialistas de la consultoría, interventoría y la Entidad, con el fin de evidenciar las condiciones existentes para el desarrollo del proyecto.

AVANCE DE CONSULTORÍA
- La consultoría remitió para revisión de la interventoría la atención de observaciones de la Metodología de Topografía, de acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 19 de marzo de 2025.
- La consultoría informó a la interventoría que se iniciarán las actividades de topografía convencional, para lo cual remitirá la programación prevista para dichas actividades.

FINANCIERO:
NA


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
- En el recorrido general de reconocimiento en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, tanto el equipo de trabajo de la consultoría como los profesionales de la interventoría contaron con los elementos de protección personal adecuados para dicha actividad.

AVANCE FINANCIERO DE CONSULTORÍA

Acta Parcial de costos No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1			Valor Total Contrato Obra	
2			\$ 9.476.507.267,00	
3			Valor facturado Contrato Obra	
4			\$ 0,00	
			% Avance facturado Acumulado	
			0,00%	
Total Acumulado		\$ 0,00		

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1			Valor Total Contrato Interventoría	
2			\$ 2.407.194.389,00	
3			Valor facturado Contrato Interventoría	
4			\$ 0,00	
			% Avance facturado Acumulado	
			0,00%	
Total Acumulado		\$ 0,00		

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
La interventoría desarrolló el seguimiento al proyecto con el Cronograma Detallado en versión D, aprobado el 25 de marzo de 2025. Adicionalmente, se presenta el cuadro control y curva S en la hoja "Ctrl" del archivo editable del presente informe.	 PEDRO LUIS JIMÉNEZ



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19

PERIODO

15/11/2024

PÁGINA

DE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acta de Comité No. 10... Carga Bloqueada

Reunión No.: 10

Nombre de la sesión: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 24001333 H3 DE 2024 "REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD, ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER"

Fecha de realización: 25/03/25

Hora reunión: 02:00 PM

Sitio reunión: Virtual - Teams

ASISTENTES:


Nombre	Cargo	Empresa
Arq. Juan Carlos Valencia Riveros	Supervisor del contrato	AERONÁUTICA CIVIL

Página 1 de 4 423 palabras

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 10 - 25 MAR -2025



SOCIALIZACIÓN ATO AGUAS CLARAS - OCAÑA, ENTES GUBERNAMENTALES - 27 MAR -2025

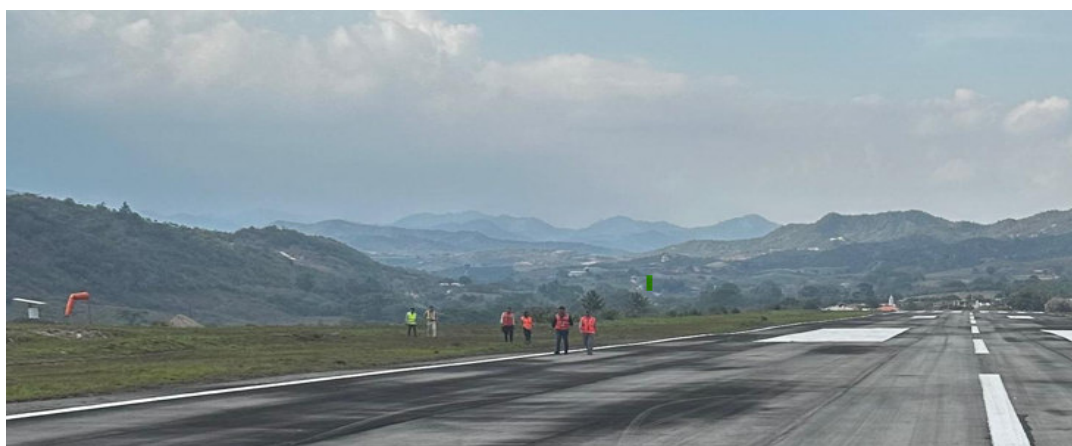

RECORRIDO RECONOCIMIENTO ATO AGUAS CLARAS - OCAÑA - 26 MAR -2025



SOCIALIZACIÓN ATO AGUAS CLARAS - OCAÑA, COMUNIDADES - 27 MAR -2025

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 6. Aprobación hojas de vida 01_Consultor

Bogotá, 20 de marzo de 2025

C155-CE-049-2025

Señores

CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Atn:Dr. FRANCISCO JOSÉ MEDINA BARRAGÁN
Representante legal
francisco.medina@cmconsultores.com.co

Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría No 24001385 de 2024 “*REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER*”

Asunto: Contrato de Consultoría No. 24001333 H3 DE 2024 “*REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER*” – **RESPUESTA AL COMUNICADO NS-076, CAMBIO DE PERSONAL No. 2**

Respetados Señores,

En atención a la comunicación NS-076, remitida el 14 de marzo de 2025, mediante la cual la consultoría solicita el cambio de los profesionales EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA Y ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, así:

CARGO	PROFESIONAL APROBADO	PROFESIONAL PROPUESTO PARA CAMBIO
EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA	ORLANDO GÓMEZ	NICOLAS GÓMEZ ANGARITA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ ALARCÓN	ORLANDO GÓMEZ LAVERDE

El CONSORCIO INTER PMN NORTE, en ejecución de sus funciones en la interventoría, informa que una vez revisado y verificado el **FORMATO 8**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del contrato 24001333 H3 DE 2024, se tienen las siguientes consideraciones para el personal presentado:

NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO	OBSERVACIONES
NICOLAS GÓMEZ ANGARITA	EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA	79.968.987	APROBADO	
ORLANDO GÓMEZ	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	19.062.733	NO APROBADO	Formación Académica Solicitada: - Pregrado en Ingeniería y/o carrera afín. NO CUMPLE - Posgrado nivel de especialización y/o maestría en Diseño Geométrico. NO CUMPLE

Así las cosas, no se aprueba el cambio del Especialista en Diseño Geométrico propuesto.

Cordialmente,



PEDRO LUIS JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER PMA NORTE

Anexos: []
C.C: Consecutivo
Elaboró: [Gina González]
Revisó: [Ángel Galindo]
Aprobó: [Pablo Segura]

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 6. Aprobación hojas de vida **02_Interventoría**



Al contestar cite Radicado 2025260020009981 Id: 1628863
Folios: 7 Fecha: 2025-03-12 10:45:53
Anexos: 0
Remitente: GRUPO PLANIFICACION AEROPORTUARIA
Destinatario: CONSORCIO INTER PMA NORTE

MEMORANDO

Bogotá D.C, 11 de marzo de 2025.

Señores

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
CONSORCIO INTER PMA NORTE
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Contrato No. 24001385 H3 de 2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER”

Referencia: Revisión y emisión de observaciones hojas de vida del personal de la interventoría.

Estimado Dr. Juan Pablo,

En atención a la documentación allegada mediante comunicación C155-CE-029-2025, una vez realizada la revisión de las hojas de vidas presentadas, la supervisión se permite emitir las observaciones y aprobaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y los demás anexos técnicos condiciones contractuales.

De la documentación revisada se constata presentación de los siguientes perfiles:

Equipo Mínimo de Trabajo			
N o.	Rol	Profesiona l	Presentado/N o presentado/C ambio de profesional
7	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE	MAGDA FABIOLA ROJAS RAMIREZ	Cambio de profesional
1 0	ESPECILISTA EN ENERGÍA Y ELECTROMECAÁNICA	CRISTIAN CAMILO BOTELLO	Cambio de profesional

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 - 15 Bogotá, D.C., Colombia

Para raditaciones <https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR>

Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Línea WhatsApp: (+57) 317 5455847

Equipo Mínimo de Trabajo			
N o.	Rol	Profesional	Presentado/N o presentado/C ambio de profesional
11	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JUAN RICARDO TORRES	Presenta subsanaciones
12	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	LUIS FRANCISCO MONTES	Cambio de profesional
16	ESPECIALISTA EN FINANCIACIÓN PÚBLICA	ALVARO HERNAN DO FLOREZ FORERO	Cambio de profesional
18	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	NICOLAS CRISTOBAL URIBE GRANADOS	Cambio de profesional
21	ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO, URBANISMO Y CONECTIVIDAD	MARLON JAIR CHAGUENDO GOMEZ	Cambio de profesional
22	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS, FINANZAS PÚBLICAS Y ASPECTOS TRIBUTARIOS	EDICSON PEREZ JIMENEZ	Cambio de profesional
25	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JOSE LUIS VERGARA TAPIAS	Presenta subsanaciones
27	ESPECIALISTA COORDINADOR PREDIAL, CATASTRAL Y GEODÉSIA	LIZBETH ROCIO GONZALEZ BOGOTA	Cambio de profesional

De los profesionales presentados se tienen las siguientes observaciones:

Equipo Mínimo de Trabajo			
N o.	Rol	Profesional	Observación
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PEDRO LUIS	Cumple

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 - 15 Bogotá, D.C., Colombia

Para raditaciones <https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR>

Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Línea WhatsApp: (+57) 317 5455847

Equipo Mínimo de Trabajo			
N o .	Rol	Profesio nal	Obser vación
		JIMENEZ	
2	GERENTE O COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	GINA PAOLA GONZALEZ REYES	Cumple
3	EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO AIRE	ALEXANDER OSORIO PATIÑO	Cumple
4	EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA	JAIME BALAGUERA MELO	Cumple
5	EXPERTO EN PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS AERONÁUTICOS Y EN ESTUDIOS AERONÁUTICOS.	JOSE ARTURO GARCIA TORRES	Cumple
6	EXPERTO EN MODELOS DE TRANSPORTE	OSCAR EMILIO ARBELAEZ ARENAS	Cumple
7	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE	MAGDA FABIOLA ROJAS RAMIREZ	Cumple
8	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA	Cumple
9	ESPECIALISTE EN TELECOMUNICACIONES	EDWIN MAXIMINO FORERO	Cumple

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 - 15 Bogotá, D.C., Colombia

Para raditaciones <https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR>

Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Línea WhatsApp: (+57) 317 5455847

Equipo Mínimo de Trabajo			
N o .	Rol	Profesio nal	Obser vación
		BOHOR QUEZ	
1 0	ESPECIALISTA EN ENERGÍA Y ELECTROMECAÁNICA	CRISTI AN CAMIL O BOTEL LO	Cumpl e
1 1	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JUAN RICAR DO TORRE S	Cumpl e
1 2	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	LUIS FRANCI SCO MONTE S	Cumpl e
1 3	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	OLGA LUCIA TORRE S CAMAR GO	Cumpl e
1 4	ESPECIALISTA GEOTECNIA	EDNA VIVIAN A GONZA LEZ ARELL ANO	Cumpl e
1 5	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	PABLO ENRIQ UE SEGUR A ACEVE DO	Cumpl e
1 6	ESPECIALISTA EN FINANCIACIÓN PÚBLICA	ALVAR O HERNA NDO FLORE Z FORER O	Cumpl e

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 – 15 Bogotá, D.C., Colombia

Para raditaciones <https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR>

Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Línea WhatsApp: (+57) 317 5455847

Equipo Mínimo de Trabajo			
N o .	Rol	Profesio nal	Obser vación
17	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	SANDRA CAROLINA CARDOSO PEREZ	Cumple
18	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	NICOLAS CRISTOBAL URIBE GRANADOS	Cumple
19	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA LOGISTICA ESPECIALIZADA (ILE)	JOHN CASTAÑO ALZATE	Cumple
20	ESPECIALISTA EN RIESGOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ROGELIO PINEDA MURILLO	Cumple
21	ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO, URBANISMO Y CONECTIVIDAD	MARLON JAIR CHAGUENDO GOMEZ	Cumple
22	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS, FINANZAS PÚBLICAS Y ASPECTOS TRIBUTARIOS	EDICSON PEREZ JIMENEZ	Cumple
23	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA	GINA PAOLA GARCÍA BOHÓRQUEZ	Cumple
24	ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ	Cumple

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 – 15 Bogotá, D.C., Colombia

Para radicaciones <https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR>

Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Línea WhatsApp: (+57) 317 5455847

Equipo Mínimo de Trabajo			
N o .	Rol	Profesio nal	Obser vación
		ARRIG UI	
2 5	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JOSE LUIS VERGA RA TAPIAS	Cumpl e.
2 6	ESPECIALISTA COORDINADOR APOYO SOCIAL	EIDY ALEXA NDRA ORTIZ GARCÍ A	Cumpl e
2 7	ESPECIALISTA COORDINADOR PREDIAL, CATASTRAL Y GEODÉSIA	LIZBET H ROCIO GONZA LEZ BOGOT A	Cumpl e
2 8	PROFESIONAL BIOLOGO	CESAR AUGUS TO RIAÑO VELEZ	Cumpl e
2 9	PROFESIONAL ARQUEÓLOGO	ANGEL A PATRIC IA MORAL ES RAMIR EZ	Cumpl e
3 0	BIM MANAGER	JOSE JOAQUI N CORTE S HERNA NDEZ	Cumpl e
3 1	COORDINADOR BIM	ANDRE S VILLA MIL VALLEJ O	Cumpl e

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 – 15 Bogotá, D.C., Colombia

Para raditaciones <https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR>

Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Línea WhatsApp: (+57) 317 5455847

Equipo Mínimo de Trabajo			
N o .	Rol	Profesio nal	Obser vación
3 2	TOPÓGRAFO	DIIGO LEON QUEBR ADA ARISTI ZABAL	Cumpl e.
3 3	CADENERO	DORIA N ZUZET TE SANTA NA GOMEZ	Cumpl e

En este sentido, se informa que las hojas de vida presentadas cumplen con los requisitos de formación, experiencia general y experiencia específica establecidos en los pliegos de condiciones del contrato.

Cordialmente,



JUAN CARLOS VALENCIA RIVEROS
Coordinador Grupo Planificación Aeronáutica
Supervisor Designado Contrato No. 24001385 H3 de 2024

Copia: Edgar Iván Cano Monroy - jefe Oficina de Gestión ne Proyectos

Proyectó: Edgar Camilo Marin Lagos - Contratista Oficina de Gestión de Proyectos

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 7. Correspondencia enviada y recibida **01_Correspondencia enviada**

QUIEN ENVÍA				DESTINO			CONTENIDO Y ARCHIVO					
NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE SALIDA	REMITENTE	DESTINATARIO (Nombre de la Persona)	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	DIRECCION/email	ASUNTO	ANEXOS	CANTIDAD DE ANEXOS	CANTIDAD DE FOLIOS	LINK DE CARPETA DCTO	OBSERVACIONES A LA RESPUESTA O RADICADO
CE-155-055-2025	martes, 1 de abril de 2025	miércoles, 9 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	FRANCISCO MEDINA	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	francisco.medina@cmconsultores.com.co	OFICIO C155-CE-055-2025 RS NS 074 OBS COMP 4	NO	0	4	C155-CE-055-2025 RS NS 074 OBS COMPONENTE 4	N/A
CE-155-056-2025	jueves, 3 de abril de 2025	miércoles, 9 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	FRANCISCO MEDINA	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	francisco.medina@cmconsultores.com.co	OFICIO C155-CE-056-2025 REQUERIMIENTO SOCIALIZACIONES	NO	0	2	C155-CE-056-2025 REQUERIMIENTO SOCIALIZACIONES	
CE-155-057-2025	jueves, 3 de abril de 2025	miércoles, 9 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	FRANCISCO MEDINA	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	francisco.medina@cmconsultores.com.co	OFICIO C155-CE-057-2025 ALCANCE C155-CE-048-2025 - RE NS 060	SI	1	2	C155-CE-057-2025 ALCANCE C155-CE-048-2025 - RE NS 060	
CE-155-059-2025	viernes, 4 de abril de 2025	miércoles, 9 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	FRANCISCO MEDINA	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	francisco.medina@cmconsultores.com.co	OFICIO C155-CE-059-2025 RS NS 064 BEP VB	NO	0	3	C155-CE-059-2025 RS NS 064 BEP VB	N/A
CE-155-060-2025	viernes, 4 de abril de 2025	miércoles, 9 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	FRANCISCO MEDINA	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	francisco.medina@cmconsultores.com.co	OFICIO C155-CE-060-2025 RS NS 067 Y NS 103 COMPONENTE 3 VA	NO	0	3	C155-CE-060-2025 RS NS 067 Y NS 103 COMPONENTE 3 VA	
CE-155-061-2025	lunes, 7 de abril de 2025	martes, 8 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	Juan Carlos Valencia Riveros	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL	juan.valenciar@aerocivil.gov.co	OFICIO C155-CE-061-2025 REMISION INFORME SEMANAL 13	SI	2	1	C155-CE-061-2025 REMISION INFORME SEMANAL 13	N/A
CE-155-062-2025	jueves, 10 de abril de 2025	viernes, 11 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	FRANCISCO MEDINA	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS	francisco.medina@cmconsultores.com.co	OFICIO C155-CE-062-2025 RS NS 094 METOD APENDICE 1 VB	NO	0	5	C155-CE-062-2025 RS NS 094 METOD APENDICE 1 VB	N/A

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 7. Correspondencia enviada y recibida **02_Correspondencia recibida**

CONSECUTIVO			DESTINATARIO	INFORMACION DEL DOCUMENTO										
Nº CONSECUTIVO	AÑO	FECHA INGRESO DE CORRESPONDENCIA	RAZÓN SOCIAL A QUIEN VA DIRIGIDO	FECHA DEL DOCUMENTO	ASUNTO	NUMERO DEL OFICIO	CANTIDAD DE FOLIOS	ANEXOS	CANTIDAD DE ANEXOS	REQUIERE RESPUESTA (SI/NO)	DÍAS DE PLAZO PARA RESPUESTA	FECHA DE VENCIMIENTO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	
103	2025	2 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	2/4/2025	NS-103 Alcance comunicación NS-067 de asunto: Entrega Componente No. 3, versión A.	NS-103	2	SI	9	SI	3	7 de abril de 2025	NS-103 ALC NS-067 COMPONENTE 3	
104	2025	2 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	2/4/2025	NS-104 Solicitud bloques base - Planos topográficos	NS-104	2	NO	0	NO	NA	NA	NS-104 SOLICITUD BLOQUES BASE	
105	2025	2 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	2/4/2025	NS-105 Cambio de personal No. 3	NS-105	2	SI	1	SI	3	7 de abril de 2025	NS-105 CAMBIO PERSONAL 3	
106	2025	2 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	2/4/2025	NS-106 Entrega Componente N.º 01 Metodologías y Plan de Trabajo (Apéndices No.6 y No.14).	NS-106	2	SI	2	SI	3	7 de abril de 2025	NS-106 ENTREGA COMPONENTE 1 - APENDICES	
107	2025	1 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	1/4/2025	Notificación de inicio de actividades de topografía y solicitud de carnetización No. 6	NS-107			0	NO	NA	NA	NA	
108	2025	4 de abril de 2025	SATENA	4/4/2025	NS-108 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información. - SATENA	NS-108	3	NO	0	NO	NA	NA	NS-108 DP INFORMACIÓN SATENA	
109	2025	4 de abril de 2025	CLIC	4/4/2025	NS-109 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información. - CLIC	NS-109	3	NO	0	NO	NA	NA	NS-109 DP INFORMACIÓN CLIC	
110	2025	4 de abril de 2025	AVIANCA	4/4/2025	NS-110 DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información. - AVIANCA	NS-110	3	NO	0	NO	NA	NA	NS-110 DP INFORMACIÓN AVIANCA	
111	2025	7 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	8/4/2025	NS-111 Respuesta comunicación C155-CE-043-2025 de asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO NS-062, RESPUESTA A COMUNICACIÓN C155-CE-017-2025 OBSERVACIONES C01: METODOLOGÍA / EDT/ CRONOGRAMA	NS-111	4	SI	1	SI	3	10 de abril de 2025	NS-111 RS C155-CE-043-2025 MET GRAL	
112	2025	7 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	8/4/2025	NS-112 Respuesta comunicación C155-CE-049-2025 de asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO NS-076, CAMBIO DE PERSONAL No. 2	NS-112	2	SI	1	SI	3	10 de abril de 2025	NS-112 RS C155-CE-049-2025 CAMBIO PERSONAL	
113	2025	7 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	8/4/2025	NS-113 Informe mensual de consultoría No. 3	NS-113	2	SI	1	SI	3	10 de abril de 2025	NS-113 INFORME MENSUAL No. 3	
114	2025	8 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	8/4/2025	NS-114 Propuesta Pre-Alternativas SKOC	NS-114	3	SI	1	SI	3	11 de abril de 2025	NS-114 PROPUESTA PRE-ALTERNATIVAS SKOC	
115	2025	10 de enero de 1900	CONSORCIO INTER PMA NORTE	10/1/1900	NS-115 Solicitud de información catastral para las áreas de influencia del aeropuerto Aguas Claras en el municipio de Ocaña	NS-115	2	NO	0	NO	NA	NA	NS-115 INFORMACIÓN IGAC	
116	2025	10 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	10/4/2025	NS-116 Respuesta comunicación C155-CE-048-2025 de asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO NS-060, ENTREGA COMPONENTE No. 1 METODOLOGÍAS Y PLAN DE TRABAJO APÉNDICES PROGNOSIS, FINANCIERA Y CAPACIDAD Y DEMANDA	NS-116	2	SI	4	SI	3	15 de abril de 2025	NS-116 RS C155-CE-048-2025 METD - APENDICES	
117	2025	10 de abril de 2025	CONSORCIO INTER PMA NORTE	10/4/2025	NS-117 Entrega Componente No. 5, versión A	NS-117	2	SI	3	SI	3	15 de abril de 2025	NS-117 ENTREGA COMPONENTE 5 VA	

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 7. Correspondencia enviada y recibida **03_Actas de comité**

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Reunión No.:	07
Nombre de la sesión:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 24001333 H3 DE 2024 "REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER"
Fecha de realización:	4/03/25
Hora reunión:	04:00 PM
Sitio reunión:	Presencial – Oficinas C&M

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	Empresa
Camilo Marin	Apoyo a la supervisión	AERONÁUTICA CIVIL
Miguel Ángel Vargas	Director de consultoría	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Andrea Guerra	Gerente de proyecto	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Iván Darío Ortiz	Coordinador de proyecto	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Karen Cordero	Profesional de proyectos	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Pedro Luis Jiménez	Director de interventoría	CONSORCIO INTER PMA NORTE
Gina Paola González	Coordinadora de proyectos	CONSORCIO INTER PMA NORTE
Edison Giovany Rocha Alarcón	Profesional de Proyectos	CONSORCIO INTER PMA NORTE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los cuatro (4) días del mes de marzo de 2025, se reunieron de manera presencial, los Profesionales: por parte del Consultor CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS, La Aerocivil y CONSORCIO INTER PMA NORTE, como Interventor del Contrato; con el fin de realizar seguimiento al contrato de consultoría No. 24001333 H3 2024, según el orden del día antes indicado, así:

- ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato de Consultoría, firmo su Acta de inicio, a partir del 31/12/2024, es decir, ha transcurrido cuarenta y dos (56) días de desarrollo, lo que representa un 16% del plazo consumido; a la fecha, no se tiene un cronograma aprobado por interventoría. Una vez aprobado, se informará el estado del contrato en este ítem.

- COMPROMISOS ANTERIORES

Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha final/Estado
Reunión Aerocivil-Interventoría 11 am	Aerocivil-Interventoría	13/02/25	Cumplido
Estado información recibida	Consultor	11/02/25	Cumplido
Metodología geotecnia	Consultoría	28/01/2025	Cumplido
Entrega información proyecto en SKUC - Arauca	Aerocivil	28/01/2025	Cumplido

- SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS

Si bien, no se tiene un cronograma aprobado por la interventoría, en el EDT preliminar se presentan actividades que deben estar en ejecución o finalizadas a la fecha, a continuación, se muestra la lista de las actividades:

CONSULTORÍA

La interventoría menciona que para el levantamiento LiDAR se propone realizar levantamiento con imágenes satelitales submétricas, las cuales tienen un error de 1/10000. (Las satelitales dan modelos de superficie, no de terreno)

La interventoría menciona que se debe buscar la manera de realizar los levantamientos de tal manera que se usen las tecnologías más convenientes en consideración con las ventajas de cada uno de los métodos de levantamientos.

La consultoría menciona que realizará la propuesta en donde se definen los polígonos, entendiendo que la propuesta considera 17000 Hectáreas.

La consultoría menciona que en el presupuesto se consideran 150 Millones de pesos para los levantamientos, sin embargo, cotizando para las 40000 Hectáreas, el precio incluso con imágenes satelitales puede llegar a 1000 o 1500 millones de pesos.

La interventoría solicita a la Aerocivil conceptuar y llevar a cabo las acciones necesarias para resolver contractualmente teniendo en cuenta el concepto de la interventoría sobre el área de levantamiento LiDAR.

La consultoría menciona que se tienen los polígonos de ampliación de los 3 aeropuertos. Se considera que se tienen algunas dificultades que hace necesario tomar algunas decisiones respecto a la proyección de ampliación. Topográficamente, existen dificultades respecto a la ampliación del aeropuerto. La ingeniería para proyectar el aeropuerto para un ATR-72 es inviable económicamente, la consultoría propone realizar una proyección para un ATR-42.

En Saravena está el equipo de inventarios realizando los levantamientos. Para Ocaña, se programó para el 11 y 12 de marzo de 2025.

AEROCIVIL

La Aeronáutica menciona que se tome la referencia de las cartas de navegación para el área de las rutas de aproximación como partida para los levantamientos.


Compromisos definidos en la Reunión:

Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha final/Estado
Reunión de topografía (Levantamiento LiDAR)	Aerocivil – Consultor-Interventoría	04/03/25	Por definir
Respuesta propuesta de visitas	Aerocivil	04/03/25	05/03/25



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FIRMAS aceptación del acta:

Nombre	Firma
Miguel Ángel Vargas	 Miguel Vargas (27 mar., 2025 18:24 CDT)
Andrea Guerra	 AG (28 mar., 2025 21:23 CDT)
Iván Darío Ortiz	
Karen Cordero	 Karen Cordero (31 mar., 2025 12:45 CDT)
Luna Rozo	
Pedro Luis Jiménez	
Gina Paola Gonzalez Reyes	
Edison Giovany Rocha Alarcón	

Acta de Comité No. 7 PMA

Informe de auditoría final

2025-03-31

Fecha de creación:	2025-03-25 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAsrnF-gRI3Md2AIHOGgnhEvlumtLnQw0r

Historial de “Acta de Comité No. 7 PMA”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-25 - 22:57:32 CDT- Dirección IP: 181.78.209.198.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a miguel.vargas@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-25 - 22:58:12 CDT
-  miguel.vargas@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-27 - 18:23:47 CDT- Dirección IP: 191.156.242.188.
-  El firmante miguel.vargas@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Miguel vargas
2025-03-27 - 18:24:13 CDT- Dirección IP: 191.156.242.82.
-  Miguel vargas (miguel.vargas@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-27 - 18:24:15 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.242.82.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a andrea.guerra@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-27 - 18:24:16 CDT
-  andrea.guerra@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-28 - 21:23:29 CDT- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  El firmante andrea.guerra@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de AG
2025-03-28 - 21:23:42 CDT- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  AG (andrea.guerra@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-28 - 21:23:44 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a coordinacion@scadia-consultores.com para su firma.
2025-03-28 - 21:23:46 CDT
-  coordinacion@scadia-consultores.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-31 - 12:31:40 CDT- Dirección IP: 186.155.135.88.



El firmante coordinacion@scadia-consultores.com firmó con el nombre de Ivan Dario Ortiz

2025-03-31 - 12:33:01 CDT- Dirección IP: 186.155.135.88.



Ivan Dario Ortiz (coordinacion@scadia-consultores.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-31 - 12:33:03 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.155.135.88.



El documento se ha enviado por correo electrónico a karen.cordero@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-31 - 12:33:05 CDT



karen.cordero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-31 - 12:44:28 CDT- Dirección IP: 200.118.63.78.



El firmante karen.cordero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Karen Cordero

2025-03-31 - 12:45:02 CDT- Dirección IP: 200.118.63.78.



Karen Cordero (karen.cordero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-31 - 12:45:04 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.118.63.78.



El documento se ha enviado por correo electrónico a luna.rozo@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-31 - 12:45:16 CDT



luna.rozo@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-31 - 15:59:31 CDT- Dirección IP: 181.51.220.226.



El firmante luna.rozo@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de luna

2025-03-31 - 16:28:32 CDT- Dirección IP: 181.51.220.226.



luna (luna.rozo@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-31 - 16:28:34 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.51.220.226.



Documento completado.

2025-03-31 - 16:28:34 CDT

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Reunión No.:	08
Nombre de la sesión:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 24001333 H3 DE 2024 "REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER"
Fecha de realización:	11/03/25
Hora reunión:	02:00 PM
Sitio reunión:	Oficinas Ingeplan - Interventoría

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	Empresa
Arq. Juan Carlos Valencia Riveros	Supervisor del contrato	AERONÁUTICA CIVIL
Pablo Alejandro Giraldo	Supervisor del contrato	
Edgar Marín	Apoyo a la supervisión	AERONÁUTICA CIVIL
Miguel Ángel Vargas	Director de consultoría	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Andrea Guerra	Gerente de proyecto	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Iván Darío Ortiz	Coordinador de proyecto	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Karen Cordero	Profesional de proyectos	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Luna Rozo	Profesional de proyectos	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Pedro Luis Jiménez	Director de interventoría	CONSORCIO INTER PMA NORTE
Gina Paola González	Coordinadora de proyectos	CONSORCIO INTER PMA NORTE
Edison Giovany Rocha Alarcón	Profesional de Proyectos	CONSORCIO INTER PMA NORTE

ORDEN DEL DIA:

1. Estado del contrato

2. Compromisos anteriores (documentos seguimiento al contrato)
3. Documentos pendientes por entregar
4. Varios
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los once (11) días del mes de febrero de 2025, se reunieron de manera virtual, los Profesionales: por parte del Consultor CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS, La Aerocivil y CONSORCIO INTER PMA NORTE, como Interventor del Contrato; con el fin de realizar seguimiento al contrato de consultoría No. 24001333 H3 2024, según el orden del día antes indicado, así:

- ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato de Consultoría, firmo su Acta de inicio, a partir del 31/12/2024, es decir, ha transcurrido setenta (70) días de desarrollo, lo que representa un 19% del plazo consumido; a la fecha, no se tiene un cronograma aprobado por interventoría. Una vez aprobado, se informará el estado del contrato en este ítem.

- COMPROMISOS ANTERIORES

Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha final/Estado
Reunión de topografía (Levantamiento LiDAR)	Aerocivil – Consultor-Interventoría	04/03/25	Por definir
Respuesta propuesta de visitas	Aerocivil	04/03/25	Cumplido
Entrega Cronograma/EDT – Metodología General Versión C	Consultor	25/02/25	Cumplido
Entrega Metodología LiDAR versión B	Consultor	25/02/25	Cumplido
Entrega Metodología topografía versión B	Consultor	25/02/25	Cumplido

Se mencionan los compromisos pactados en el comité anterior respecto a la definición de las áreas de vuelo LiDAR desde el punto de vista de la interpretación de lo enunciado contractualmente.

La interventoría para hacer el seguimiento, no le compete interpretar el contrato respecto a lo definido en cuanto al área del vuelo LiDAR. Le corresponde a la entidad definir las áreas de vuelo LiDAR.

CONSULTORÍA

La consultoría menciona que dentro de la propuesta LiDAR se ha considerado la calidad como un principal parámetro. Dentro de la propuesta se presentan 3 polígonos y diferentes niveles de calidad.

La interventoría menciona que se está trabajando una respuesta teniendo en cuenta que se debe realizar la topografía teniendo en cuenta:

Desde el componente 15, está definido como se debe realizar el levantamiento topográfico

Desde el componente 18, se debe realizar un LiDAR para la superficie libre de obstáculos

Desde la etapa de factibilidad, no es muy clara la tipología de topografía.

A partir de las superficies libres de obstáculos se debe definir la metodología de topografía. Las 40.000 Ha no están definidas como alcance, sino como tratamiento de datos.

En terminal, nivel de precisión alto, cono de aproximación nivel de precisión medio y nivel de precisión bajo en las demás zonas dentro del radio establecido.

Aún está pendiente la aprobación de la EDT. La interventoría realizó una reunión interna en la que se evaluó la metodología y se considera que está más cercana a las solicitudes que se han realizado previamente.

Las reuniones de socialización en Ocaña se realizarán desde el 26 hasta el 28 de marzo de 2025.

La consultoría menciona que propone un espacio para revisar el alcance de elaboración del EPA del aeropuerto SKOC teniendo en cuenta que desde un análisis previo, se considera que las obras necesarias para llevar el aeropuerto a operación de una aeronave ATR-72

AEROCIVIL

La Aerocivil considera que independientemente del tipo de levantamiento y área, se debe considerar que en caso de ampliación del aeropuerto, la precisión sea la adecuada para toda la ingeniería necesaria.



La Aerocivil solicita que la interventoría junto con la consultoría evalúe los métodos y procedimientos con base en la normatividad aplicable.

Compromisos definidos en la Reunión:



Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha final/Estado
Alcance topografía	Consultoría	11/03/2025	12/03/2025
Reunión BIM/BEP	Aerocivil, Consultoría e interventoría	11/03/2025	Viernes 14/03/2025

FIRMAS aceptación del acta:

Nombre	Firma
Arq. Juan Carlos Valencia Riveros	
Edgar Marín	
Miguel Ángel Vargas	 <small>Miguel Vargas (27 mar., 2025 18:23 CDT)</small>
Andrea Guerra	 <small>AG (28 mar., 2025 21:23 CDT)</small>
Iván Darío Ortiz	
Karen Cordero	<u>Karen Cordero</u> <small>Karen Cordero (31 mar., 2025 12:45 CDT)</small>
Luna Roza	<i>Luna Roza H.</i>
Pedro Luis Jiménez	
Ángel Eduardo Galindo Burgos	
Gina Paola Gonzalez Reyes	
Edison Giovany Rocha Alarcón	<i>Edison Giovany Rocha A.</i>

Acta de Comité No. 8 PMA

Informe de auditoría final

2025-03-31

Fecha de creación:	2025-03-25 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAlch4IDzLuEbnWBMjj10bnjAncbeqDpP

Historial de “Acta de Comité No. 8 PMA”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-25 - 22:54:31 CDT- Dirección IP: 181.78.209.198.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a miguel.vargas@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-25 - 22:55:11 CDT
-  miguel.vargas@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-27 - 18:22:54 CDT- Dirección IP: 191.156.242.188.
-  El firmante miguel.vargas@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Miguel vargas
2025-03-27 - 18:23:24 CDT- Dirección IP: 191.156.242.188.
-  Miguel vargas (miguel.vargas@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-27 - 18:23:26 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.242.188.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a andrea.guerra@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-27 - 18:23:28 CDT
-  andrea.guerra@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-28 - 21:22:59 CDT- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  El firmante andrea.guerra@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de AG
2025-03-28 - 21:23:10 CDT- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  AG (andrea.guerra@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-28 - 21:23:12 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a coordinacion@scadia-consultores.com para su firma.
2025-03-28 - 21:23:14 CDT
-  coordinacion@scadia-consultores.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-31 - 12:34:39 CDT- Dirección IP: 186.155.135.88.



El firmante coordinacion@scadia-consultores.com firmó con el nombre de Ivan Dario Ortiz

2025-03-31 - 12:37:33 CDT- Dirección IP: 186.155.135.88.



Ivan Dario Ortiz (coordinacion@scadia-consultores.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-31 - 12:37:35 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.155.135.88.



El documento se ha enviado por correo electrónico a karen.cordero@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-31 - 12:37:36 CDT



karen.cordero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-31 - 12:45:08 CDT- Dirección IP: 200.118.63.78.



El firmante karen.cordero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Karen Cordero

2025-03-31 - 12:45:29 CDT- Dirección IP: 200.118.63.78.



Karen Cordero (karen.cordero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-31 - 12:45:31 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.118.63.78.



El documento se ha enviado por correo electrónico a luna.rozo@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-31 - 12:45:33 CDT



luna.rozo@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-31 - 15:59:28 CDT- Dirección IP: 181.51.220.226.



El firmante luna.rozo@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de luna

2025-03-31 - 16:28:11 CDT- Dirección IP: 181.51.220.226.



luna (luna.rozo@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-31 - 16:28:13 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.51.220.226.



Documento completado.

2025-03-31 - 16:28:13 CDT

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Reunión No.:	09
Nombre de la sesión:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 24001333 H3 DE 2024 "REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER"
Fecha de realización:	18/03/25
Hora reunión:	02:00 PM
Sitio reunión:	Virtual - Teams

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	Empresa
Miguel Ángel Vargas	Director de consultoría	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Andrea Guerra	Gerente de proyecto	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Iván Darío Ortiz	Coordinador de proyecto	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Karen Cordero	Profesional de proyectos	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Luna Roza	Profesional de proyectos	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Pedro Luis Jiménez	Director de interventoría	CONSORCIO INTER PMA NORTE
Gina Paola González	Coordinadora de proyectos	CONSORCIO INTER PMA NORTE

ORDEN DEL DIA:

1. Estado del contrato
2. Compromisos anteriores (documentos seguimiento al contrato)
3. Documentos pendientes por entregar
4. Varios
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025, se reunieron de manera virtual, los Profesionales: por parte del Consultor CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS, La Aerocivil y CONSORCIO INTER PMA NORTE, como Interventor del Contrato; con el fin de realizar seguimiento al contrato de consultoría No. 24001333 H3 2024, según el orden del día antes indicado, así:

- ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato de Consultoría, firmo su Acta de inicio, a partir del 31/12/2024, es decir, ha transcurrido setenta y siete (77) días de desarrollo, lo que representa un 22% del plazo consumido; a la fecha, no se tiene un cronograma aprobado por interventoría. Una vez aprobado, se informará el estado del contrato en este ítem.

- COMPROMISOS ANTERIORES

Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha final/Estado
Reunión de topografía (Levantamiento LiDAR)	Aerocivil – Consultor-Interventoría	04/03/25	cumplido
Alcance topografía	Consultoría	11/03/2025	cumplido
Reunión BIM/BEP	Aerocivil, Consultoría e interventoría	11/03/2025	cumplido

ESTADO DEL PROJECT

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Observaciones
1	CONTRATO DE CONSULTORÍA 24001333 H3 DE 2024	260 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25	29%	
1.1	INICIO CONSULTORÍA	0 días	jue 2/01/25	jue 2/01/25	100%	
1.2	PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA (36%)	260 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25	29%	
1.2.1	INICIO PMA SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA	0 días	jue 2/01/25	jue 2/01/25	100%	



1.2.2	ETAPA I (CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)	75 días	jue 2/01/25	mié 16/04/25	95%	
1.2.2.1	INICIO ETAPA I	0 días	jue 2/01/25	jue 2/01/25	100%	
1.2.2.2	METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.1	INICIO METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	0 días	jue 2/01/25	jue 2/01/25	100%	
1.2.2.2.2	TOPOGRAFÍA	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.3	SOCIAL	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.4	AMBIENTAL	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.5	PREDIAL	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.6	GEOTECNIA	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.7	ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.8	FINANCIERA	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.9	PROGNOSIS	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.10	CAPACIDAD DE DEMANDA	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.11	ANÁLISIS OPERACIONAL	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.12	RED AEROPORTUARIA	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.13	JURIDICA	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.14	RIESGOS	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.15	INFORMACIÓN PRIMARIA	52 días	jue 2/01/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.2.16	FIN METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESENTACIÓN CONSULTOR	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.3	GESTIÓN ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	35 días	mié 22/01/25	mié 12/03/25	100%	
1.2.2.3.1	INICIO GESTIÓN ANTES LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	0 días	mié 22/01/25	mié 22/01/25	100%	
1.2.2.3.2	TRÁMITES Y GESTIÓN ENTIDADES E INTERESADOS	30 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25	100%	



1.2.2.3.3	REVISIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA (TÉCNICA, LEGAL, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA, REGIONAL, NACIONAL, ETC)	20 días	jue 13/02/25	mié 12/03/25	100%	
1.2.2.3.4	FIN GESTIÓN ANTES LAS DIFERENTES ENTIDADES E INTERESADOS, CONSULTA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	0 días	mié 12/03/25	mié 12/03/25	100%	
1.2.2.4	IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	45 días	mié 5/02/25	mié 9/04/25	64%	
1.2.2.4.1	INICIO IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	0 días	mié 5/02/25	mié 5/02/25	100%	
1.2.2.4.2	PROGRAMACIÓN REUNIÓN CON LOS INTERESADOS	10 días	jue 6/02/25	mié 19/02/25	100%	
1.2.2.4.3	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS REUNIONES CON INTERESADOS	20 días	jue 20/02/25	mié 19/03/25	95%	
1.2.2.5	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	35 días	mié 12/02/25	mié 2/04/25	73%	
1.2.2.5.1	INICIO INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	0 días	mié 12/02/25	mié 12/02/25	100%	
1.2.2.5.2	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN (POT, EOT, CAR, IDEAM, AEROCIVIL, GOBERNACIÓN, MUNICIPIOS, AEROLINEAS, AERODROMOS, COMERCIO, ENTRE OTROS)	20 días	jue 13/02/25	mié 12/03/25	100%	
1.2.2.5.3	ANÁLISIS INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS Y ESTUDIO INICIAL SOCIO ECONOMICO	20 días	jue 6/03/25	mié 2/04/25	45%	
1.2.2.6	PRESENTACIÓN ESTRUCTURA PLAN MAESTRO Y/O EPA	15 días	mié 29/01/25	mié 19/02/25	100%	
1.2.2.6.1	INICIO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA PLAN MAESTRO Y/O EPA	0 días	mié 29/01/25	mié 29/01/25	100%	
1.2.2.6.2	ENTREGA PRESENTACIÓN ESTRUCTURA PLAN MAESTRO Y/O EPA	15 días	jue 30/01/25	mié 19/02/25	100%	
1.2.2.6.3	FIN PRESENTACIÓN ESTRUCTURA PLAN MAESTRO Y/O EPA	0 días	mié 19/02/25	mié 19/02/25	100%	
1.2.2.7	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	40 días	vie 14/02/25	vie 11/04/25	74%	
1.2.2.7.1	INICIO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	0 días	vie 14/02/25	vie 14/02/25	100%	
1.2.2.7.2	LEVANTAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.7.3	INVENTARIO INFRAESTRUCTURA	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.7.4	ANÁLISIS INFRAESTRUCTURA LADO AIRE	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	100%	
1.2.2.7.5	ANÁLISIS INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.2.7.6	ANÁLISIS INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AEROPUERTO	5 días	lun 17/03/25	vie 21/03/25	40%	
1.2.2.8	APROBACIÓN COMPONENTE 1	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	100%	



1.2.2.11	APROBACIÓN COMPONENTE 4	0 días	mié 19/02/25	mié 19/02/25	100%	
1.2.3	ETAPA II (DIAGNÓSTICO AEROPUERTO)	53 días	mié 12/03/25	lun 26/05/25	4%	
1.2.3.1	INICIO ETAPA II	0 días	mié 12/03/25	mié 12/03/25	100%	
1.2.3.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	30 días	vie 14/03/25	vie 25/04/25	8%	
1.2.3.2.1	INICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	100%	
1.2.3.2.2	LEVANTAMIENTO LADO AIRE	20 días	lun 17/03/25	vie 11/04/25	10%	
1.2.3.2.3	LEVANTAMIENTO LADO TIERRA	20 días	lun 17/03/25	vie 11/04/25	10%	
1.2.3.2.4	LEVANTAMIENTO ACCESO Y REDES	20 días	lun 17/03/25	vie 11/04/25	10%	
1.2.3.3	PRONÓSTICO DE TRÁFICO	40 días	mié 12/03/25	mié 7/05/25	10%	
1.2.3.3.1	INICIO PRONÓSTICO DE TRÁFICO	0 días	mié 12/03/25	mié 12/03/25	100%	
1.2.3.3.2	PRONOSTICO DE TRÁFICO	25 días	jue 13/03/25	mié 16/04/25	16%	
1.2.3.4	EVALUACIÓN OPERACIONAL	50 días	mié 12/03/25	mié 21/05/25	8%	
1.2.3.4.1	INICIO EVALUACIÓN OPERACIONAL	0 días	mié 12/03/25	mié 12/03/25	100%	
1.2.3.4.2	ANÁLISIS OBSTACULOS	30 días	jue 13/03/25	mié 23/04/25	13%	

CONSULTORÍA

El consultor informa que en la versión B del BEP ya se encuentran incluidos todos los lineamientos de la Aerocivil solicitados en la reunión del 17 de marzo de 2025, por lo cual se aclara que no se dará alcance con una nueva versión.

La consultoría informa que está realizando la atención de observaciones de las metodologías Social, Ambiental, Predial y Geotecnia.

Se solicita a la interventoría la revisión de las metodologías.

El consultor informa que remitió la atención de las observaciones del cronograma en versión D, incluyendo la fase para la revisión por parte de la interventoría, esto sin afectar las fechas de la Etapa I.

El consultor solicita programación de mesa de trabajo para la socialización de las alternativas para el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, antes de la visita de socialización prevista del 26 al 28 de marzo de 2025, para lo cual la interventoría solicita la información previa para conocer la propuesta antes de realizar la mesa de trabajo, la cual se remitirá el 18 de marzo de 2025.

AEROCIVIL

Compromisos definidos en la Reunión:

Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha final/Estado
Remisión de Cronograma versión D	Consultor	18/03/25	18/03/25
Reunión definición de metodología topografía	Interventoría - Consultor	18/03/25	18/03/25
Atención de observaciones Metodologías Social, Ambiental, Predial y Geotecnia	Consultor	18/03/25	21/03/25
Envío de presentación pre-alternativas Aeropuerto Ocaña	Consultor	18/03/25	18/03/25

FIRMAS aceptación del acta:

Nombre	Firma
Miguel Ángel Vargas	 Miguel Vargas (27 mar., 2025 18:24 CDT)
Andrea Guerra	 AG (28 mar., 2025 21:22 CDT)
Iván Darío Ortiz	
Karen Cordero	 Karen Cordero (1 abr., 2025 17:42 CDT)
Luna Rozo	
Pedro Luis Jiménez	
Gina Paola González Reyes	

Acta de Comité No. 9 PMA

Informe de auditoría final

2025-04-02

Fecha de creación:	2025-03-25 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAqBMMRtqE53nQLXXtLJ032F4o3AgFTRwS

Historial de “Acta de Comité No. 9 PMA”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-25 - 22:58:45 CDT- Dirección IP: 181.78.209.198.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a miguel.vargas@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-25 - 22:59:25 CDT
-  miguel.vargas@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-27 - 18:24:28 CDT- Dirección IP: 191.156.242.188.
-  El firmante miguel.vargas@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Miguel vargas
2025-03-27 - 18:24:50 CDT- Dirección IP: 191.156.242.188.
-  Miguel vargas (miguel.vargas@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-27 - 18:24:52 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.242.188.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a andrea.guerra@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-27 - 18:24:54 CDT
-  andrea.guerra@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-28 - 21:22:30 CDT- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  El firmante andrea.guerra@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de AG
2025-03-28 - 21:22:42 CDT- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  AG (andrea.guerra@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-28 - 21:22:44 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.28.102.35.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a karen.cordero@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-28 - 21:22:46 CDT
-  karen.cordero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-04-01 - 17:41:59 CDT- Dirección IP: 191.156.235.190.



El firmante karen.cordero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Karen Cordero

2025-04-01 - 17:42:21 CDT- Dirección IP: 191.156.235.190.



Karen Cordero (karen.cordero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-04-01 - 17:42:23 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.235.190.



El documento se ha enviado por correo electrónico a coordinacion@scadia-consultores.com para su firma.

2025-04-01 - 17:42:24 CDT



coordinacion@scadia-consultores.com ha visualizado el correo electrónico.

2025-04-02 - 11:34:00 CDT- Dirección IP: 186.31.35.152.



El firmante coordinacion@scadia-consultores.com firmó con el nombre de Ivan Dario Ortiz

2025-04-02 - 11:34:43 CDT- Dirección IP: 186.31.35.152.



Ivan Dario Ortiz (coordinacion@scadia-consultores.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-04-02 - 11:34:45 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.31.35.152.



El documento se ha enviado por correo electrónico a luna.rozo@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-04-02 - 11:34:46 CDT



luna.rozo@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-04-02 - 12:26:02 CDT- Dirección IP: 181.51.220.226.



El firmante luna.rozo@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Luna Rozo

2025-04-02 - 12:27:06 CDT- Dirección IP: 181.51.220.226.



Luna Rozo (luna.rozo@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-04-02 - 12:27:08 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.51.220.226.



Documento completado.

2025-04-02 - 12:27:08 CDT

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Reunión No.:	10
Nombre de la sesión:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 24001333 H3 DE 2024 "REALIZAR CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACION EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANALISIS DE INTEGRACION OPERACIONAL, ECONOMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER"
Fecha de realización:	25/03/25
Hora reunión:	02:00 PM
Sitio reunión:	Virtual - Teams

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	Empresa
Arq. Juan Carlos Valencia Riveros	Supervisor del contrato	AERONÁUTICA CIVIL
Ing. Pablo Alejandro Giraldo	Supervisor del contrato	AERONÁUTICA CIVIL
Edgar Marín	Apoyo a la supervisión	AERONÁUTICA CIVIL
Miguel Ángel Vargas	Director de consultoría	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Andrea Guerra	Gerente de proyecto	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Iván Darío Ortiz	Coordinador de proyecto	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Karen Cordero	Profesional de proyectos	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Luna Roza	Profesional de proyectos	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS
Pedro Luis Jiménez	Director de interventoría	CONSORCIO INTER PMA NORTE
Gina Paola González	Coordinadora de proyectos	CONSORCIO INTER PMA NORTE

ORDEN DEL DIA:

1. Estado del contrato
2. Compromisos anteriores (documentos seguimiento al contrato)
3. Documentos pendientes por entregar

4. Varios
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2025, se reunieron de manera virtual, los Profesionales: por parte del Consultor CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS, La Aerocivil y CONSORCIO INTER PMA NORTE, como Interventor del Contrato; con el fin de realizar seguimiento al contrato de consultoría No. 24001333 H3 2024, según el orden del día antes indicado, así:

- **ESTADO DEL CONTRATO**

El Contrato de Consultoría, firmo su Acta de inicio, a partir del 31/12/2024, es decir, ha transcurrido ochenta y cuatro (84) días de desarrollo, lo que representa un 23.33% del plazo consumido; se dio aprobación del cronograma detallado el día de hoy 23/03/2025, a la fecha el estado del contrato es el siguiente, según el cronograma aprobado por la Interventoría:

PROGRAMADO: 34%

EJECUTADO: 25%

ESTADO: -9%

- **COMPROMISOS ANTERIORES**

Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha final/Estado
Remisión de Cronograma versión D	Consultor	18/03/25	cumplido
Reunión definición de metodología topografía	Interventoría - Consultor	18/03/25	cumplido
Atención de observaciones Metodologías Social, Ambiental, Predial y Geotecnia	Consultor	21/03/25	No cumplido
Envío de presentación pre-alternativas Aeropuerto Ocaña	Consultor	18/03/25	cumplido

CONSULTORÍA

El consultor aclara que la desviación del cronograma también se debe a las actividades a desarrollar en las visitas de socialización en el Aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña.

El consultor realiza la consulta si es posible compartir la información de las pre-alternativas del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en las reuniones de socialización, a lo cual la Entidad considera que no es prudente compartir dicha información.

Se informa que, en la comisión a desarrollar en el Aeropuerto de Ocaña, la consultoría y la interventoría revisará la forma de proceder a presentar las pre-alternativas de acuerdo con lo que se evidencie en las reuniones y recorridos previos.



AEROCIVIL

La Entidad, solicita que se presente el avance gráficamente.

Compromisos definidos en la Reunión:

Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha final/Estado
Atención de observaciones Metodologías Social, Ambiental, Predial y Geotecnia	Consultor	25/03/25	25/03/25
Entrega de actualización Metodología Topografía	Consultor	19/03/25	26/03/25

FIRMAS aceptación del acta:

Nombre	Firma
Arq. Juan Carlos Valencia Riveros	
Ing. Pablo Giraldo	
Edgar Marín	
Miguel Ángel Vargas	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Nombre	Firma
Andrea Guerra	 <small>AG (9 abr., 2025 15:59 CDT)</small>
Iván Darío Ortiz	
Karen Cordero	<u>Karen Cordero</u> <small>Karen Cordero (9 abr., 2025 07:58 CDT)</small>
Luna Rozo	<i>Luna Rozo H.</i>
Pedro Luis Jiménez	
Ángel Eduardo Galindo Burgos	
Gina Paola González Reyes	

Acta de Comité No. 10 PMA

Informe de auditoría final

2025-04-09

Fecha de creación:	2025-04-09 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAaOTKByXjNWngYjdbRjoghRdaSQTFmAmv

Historial de “Acta de Comité No. 10 PMA”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-04-09 - 14:55:59 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a andrea.guerra@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-04-09 - 14:56:28 CDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a luna.rozo@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-04-09 - 14:56:28 CDT
-  andrea.guerra@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-04-09 - 15:59:29 CDT- Dirección IP: 191.95.53.107.
-  El firmante andrea.guerra@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de AG
2025-04-09 - 15:59:56 CDT- Dirección IP: 191.95.53.107.
-  AG (andrea.guerra@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-04-09 - 15:59:58 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.53.107.
-  luna.rozo@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-04-09 - 17:25:21 CDT- Dirección IP: 181.51.220.226.
-  El firmante luna.rozo@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Luna Rozo
2025-04-09 - 17:25:47 CDT- Dirección IP: 181.51.220.226.
-  Luna Rozo (luna.rozo@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-04-09 - 17:25:49 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.51.220.226.
-  Documento completado.
2025-04-09 - 17:25:49 CDT

<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE</p>	<p>CONSORCIO INTER PMA NORTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO: 23001385 H3 2024</p>		
<p>VERSIÓN No. 0</p>		<p>FECHA</p>	<p>30/11/2024</p>

ANEXO 9. Seguimiento Socializaciones

<div>  <div> <div>INTERESADOS (Stakeholders)</div> <div>INVITACIONES VISITA SARAVENA, ARAUCA</div> </div> </div>													
No.	INTERESADO IDENTIFICADO												
	Nombre Organismo/Entidad/Institución	Dependencia	Dirección	Ciudad / Municipio	Nombre contacto (Si se conoce)	Cargo (Si se conoce)	Correo de contacto (Si se conocen)	Número de contacto (Si se conocen)	Confirmación de asistencia	Observaciones previas	Observaciones	Medio de confirmación	Fecha y hora de citación
1	Aerocivil local	Dirección	Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz	Arauca	GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO	Director Regional Aeronautico I	gloria.gallego@aerocivil.gov.co	No identificado	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	
2	Aerocivil local	Dirección	Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz	Arauca	SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO	Gerente Aeropuerto	saronny.pinilla@aerocivil.gov.co	3014279465	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	18/02/2025 9:00 a. m.
3	Gobernación de Arauca 1	Secretaría General / Despacho Gobernador	Calle 20 - Carrera 21 Esquina	Arauca	RENSON MARTÍNEZ PRADA	Gobernador Arauca	archivoGENERAL@arauca.gov.co	57- 6078851946	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
4	Gobernación de Arauca 2	Secretaría de Infraestructura	Calle 20 - Carrera 21 Esquina	Arauca	EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI	Secretaría de Infraestructura Física	obras@arauca.gov.co	3187773173	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
5	Gobernación de Arauca 3	Secretaría de Planeación	Calle 20 - Carrera 21 Esquina	Arauca	GERMÁN LEÓN CORONEL	Secretario de Planeación Departamental	planeacion@arauca.gov.co	3138496779	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
6	Gobernación de Arauca 4	Secretaría de Desarrollo Agropecuario sostenible	Calle 20 - Carrera 21 Esquina	Arauca	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS	Secretario de Agricultura y desarrollo sostenible	agricultura@arauca.gov.co	+57 607 8853231 +57 607 8854320	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
7	Alcaldía de Saravena 1	Secretaría General / Despacho Alcalde	Calle 25 # 15-40 Barrio Centro	Saravena	JUAN IGNACIO CIFUENTES	Alcalde Saravena	alcaldia@saravena-arauca.gov.co	3153608559 - 6078892056	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
8	Alcaldía de Saravena 2	Secretaría General / Despacho Alcalde	Calle 25 # 15-40 Barrio Centro	Saravena	CLAUDIA PATRICIA DURAN	Secretaría Ejecutiva Despacho	despacho@saravena-arauca.gov.co	6078892056	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
9	Alcaldía de Saravena 3	Secretaría General y de Gobierno	Calle 25 # 15-40 Barrio Centro	Saravena	IVAN AGUSTIN RANGEL	Secretario General y de Gobierno	gobierno@saravena-arauca.gov.co	6078892056	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
10	Alcaldía de Saravena 4	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Calle 25 # 15-40 Barrio Centro	Saravena	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA	Secretario de Despacho	planeacion@saravena-arauca.gov.co	3143650194	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
11	Alcaldía de Saravena 5	Secretaría de tránsito y transporte	Calle 25 # 15-40 Barrio Centro	Saravena	ASTRID JULIETH DUQUE	Secretario de Despacho	transito@saravena-arauca.gov.co	8892056	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
12	Alcaldía de Saravena 6	Secretaría de Desarrollo Social	Calle 25 # 15-40 Barrio Centro	Saravena	BRIGITTE FARLEY HERNANDEZ PRIETO	Secretario de Despacho	programasociales@saravena-arauca.gov.co	8892056-8892055	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
13	Personería Municipal de Saravena	Personería Municipal	Calle 27 # 15-40	Saravena	JOSE LUIS LASSO FONTECHA	Personero de Saravena	personeriamunicipaldesaravena@gmail.com	6078891465	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
14	CORPORINOQUIA Corporación Autónoma Regional de Orinoquia	Sede territorial de Arauca	Carrera 25 No. 15-69	Arauca	ROBINSON BARRAGAN	DIRECTOR TERRITORIAL ARAUCA	sedearauca@corporinoquia.gov.co	(7) 8852026 - 8853939	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Correo	18/02/2025 9:00 a. m.
15	Cámara de Comercio de Arauca	Cámara de comercio	Carrera 25 #18A-49 Edificio Aspa	Arauca	No identificado	No identificado	admincca@carauca.org.co	(607) 8853356	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
16	Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano	Cámara de comercio	Calle 30 No. 16a – 25	Saravena	DANIEL CORONEL	No identificado	contactenos@cpiedemonte.co	(607) 889 1988 / 889 2270 Cel: (+57) 320 302 1117	Contestó, no confirmo	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	18/02/2025 2:00 p. m.
17	Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca	Seccional Arauca	Calle 20 # 20-31/43	Arauca	ANA ZULEIMA MENDOZA NIÑO	No identificado	contacto@unisaludarauca.gov.co	3112122733	Contestó, no confirmo	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
18	BATALLON DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACION No.8	No identificado	GRUPO MECANIZADO REVEIZ PIZARRO	Saravena	EDIER MAURICIO LEON TRIANA	COMANDANTE	EDIER.LEON@EJERCITO.MIL.CO	3106029826	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.
19	CTH COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	No identificado	calle 14C No 123-31	BOGOTA	HECTOR HERNANDEZ	PRESIDENTE	presidencia@cthemadez.com	315.3311220	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	17/02/2025 4:00 p. m.
20	ENELAR ESP Empresa de Energía de Arauca	No identificada	Cra. 22 No. 22 - 46 Barrio 7 de Agosto	Arauca	No identificado	No identificado	archivo@enelar.com.co	+57 (607) 8852495	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	17/02/2025 4:00 p. m.
21	EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	No identificada	Carrera 24 entre calles 18 y 19, bloque 03	Arauca	No identificado	No identificado	notificaciones@emserpa.gov.co	3187921353	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	17/02/2025 4:00 p. m.
22	Aaraucana de gases SAS ESP	No identificada	Calle 19 # 25 -44 Barrio La Esperanza	Arauca	No identificado	No identificado	araucanadegasesssp@gmail.com	3026490545	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	17/02/2025 4:00 p. m.
23	Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo Saravena	No identificada	Calle 30 No. 15-30 Barrio San Luis	Saravena	No identificado	No identificado	atencionalusuario@ecaas.com.co	(7) 889 2058 889 2028 889 1191	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	17/02/2025 4:00 p. m.
24	SATENA Viajes Belencita	Comercial	Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz	Saravena	JORGE ENRIQUE CAMARGO	Agente Comercial	viajesbelencita@gmail.com	314 3583228	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	17/02/2025 4:00 p. m.
25	CLIC AIR	Servicio	Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz	Saravena	LUNA ALEJANDRA ARRIETA ARIAS	Agente de Servicio	luna.arrieta@clicair.co	No identificado	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	17/02/2025 4:00 p. m.
26	ECOPETROL	No identificado	Calle 35 # 7-59	Bogotá	Ricardo Roa Barragán	Director	participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co	(+057) 310 315 8600	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	18/02/2025 9:00 a. m.
27	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT	No identificado	Calle 28 No. 13 A – 15	Bogotá	No identificado	No identificado	https://www.mincit.gov.co/inicio	(+57)6016067676	Numero no valido	Se envía carta de invitación vía correo	N/A	N/A	18/02/2025 9:00 a. m.

	INTERESADOS (Stakeholders) INVITACIONES VISITA ARAUCA, ARAUCA
--	--

INTERESADO IDENTIFICADO													
No.	Nombre Organismo/Entidad/Institución	Dependencia	Dirección	Ciudad / Municipio	Nombre contacto (Si se conoce)	Cargo (Si se conoce)	Correo de contacto (Si se conocen)	Número de contacto (Si se conocen)	Confirmación de asistencia	Observaciones previas	Observaciones	Medio de confirmación	Fecha y hora de citación
1	Aerocivil local	DIRECCIÓN	Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz	Arauca	SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO	Gerente Aeropuerto	saronny.pinilla@aerocivil.gov.co	3014279465	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
2	Gobernación de Arauca 1	No identificado	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	Arauca	Luis Alberto Melo	Profesional universitario	lmelo@arauca.gov.co	3105694840	Numero no valido	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 9:00 a. m.
3	Gobernación de Arauca 2	SECRETARÍA GENERAL / DESPACHO GOBERNADOR	Calle 20 - Carrera 21 Esquina	Arauca	RENSON MARTÍNEZ PRADA	Gobernador Arauca	archivogeneral@arauca.gov.co	57- 6078851946	No contestó	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
4	Gobernación de Arauca 3	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Calle 20 - Carrera 21 Esquina	Arauca	EVERYNN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI	Secretaria de Infraestructura Física	obras@arauca.gov.co	3187773173	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 9:00 a. m.
5	Gobernación de Arauca 4	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Calle 20 - Carrera 21 Esquina	Arauca	GERMÁN LEÓN CORONEL	Secretario de Planeación Departamental	planeacion@arauca.gov.co	3138496779	No contestó	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
6	Alcaldía de Arauca 1	SECRETARÍA GENERAL / DESPACHO ALCALDE	Carrera 24 entre calles 18 y 19	Arauca	JUAN ALFREDO QUENZA	Alcalde Arauca	contactenos@arauca-arauca.gov.co alcalde@arauca-arauca.gov.co	(607)+ 7 + 8853156 ext. 100-105	Numero no valido	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
7	Alcaldía de Arauca 2	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Carrera 24 entre calles 18 y 19	Arauca	LISETH TATIANA PAÉZ	Secretaria de Infraestructura Física	obras@arauca-arauca.gov.co	6078853156	Numero no valido	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
8	Alcaldía de Arauca 3	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Carrera 24 entre calles 18 y 19	Arauca	LUIS ALBERTO ROJAS NEIRA	Secretario de Planeación	planeacion@arauca-arauca.gov.co	6078853156	Numero no valido	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
9	Alcaldía de Arauca 4	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Carrera 24 entre calles 18 y 19	Arauca	CESAR VALDERRAMA	Secretario de Gobierno	gobierno@arauca-arauca.gov.co	6078853156	Numero no valido	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 9:00 a. m.
10	Personería Municipal de Arauca	PERSONERÍA MUNICIPAL	Edificio CAM Torre C Piso 1	Arauca	ALEXANDER RIVERA ANDRADE	Personero de Arauca	personeria@arauca-arauca.gov.co	(+57) 885 5804	Numero no valido	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
11	Alcaldía de Arauca 6	Secretaria de Agricultura	No identificado	Arauca	Paul Bernal	Porfesor universitario	desarrolloeconomico@arauca-arauca.gov.co	3102732666	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	
12	Cámara de Comercio de Arauca	CÁMARA DE COMERCIO	Carrera 25 #18A-49 Edificio Aspa	Arauca	LINA PATRICIA MERCHAN RAMIREZ	No identificado	admcca@ccarauca.org.co	(607) 8853356	No contestó	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
13	COMITÉ INTEGRAL, COMERCIAL Y EMPRESARIAL DE ARAUCA	GERENCIA		Arauca	JOSE REYNALDO DELGADO	Presidente	No identificado	3204898915	Numero equivocado	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
14	Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca	SECCIONAL ARAUCA	Calle 20 # 20-31/43	Arauca	ANA ZULEIMA MENDOZA NIÑO	No identificado	contacto@unisaludarauca.gov.co	3112122733	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 9:00 a. m.
15	Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca	SECCIONAL ARAUCA	Calle 20 # 20-31/43	Arauca	Ludy Alvarez	No identificado	apoyodireccionesa@gmail.com	3112112750	No contestó	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
16	Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca	SECCIONAL ARAUCA	Calle 20 # 20-31/43	Arauca	Mario Rojas	No identificado	direccion@unisaludarauca.gov.co	3125155608	No contestó	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
17	CTH COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ		calle 14C No 123-31	BOGOTÁ	HECTOR HERNANDEZ	PRESIDENTE	presidencia@cthernadez.com	315 3311220	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 2:00 p. m.
18	ENELAR ESP Empresa de Energía de Arauca	GERENCIA	Cra. 22 No. 22 - 46 Barrio 7 de Agosto	Arauca	EDGAR ALFONZO REYES	Gerente	archivo@enelar.com.co; zonacentro@enelar.com.co	3183637599	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 2:00 p. m.
19	EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	GERENCIA	Carrera 24 entre calles 18 y 19, bloque 03	Arauca	CESAR ALESSANDER GUTIÉRREZ ROJAS	Gerente	notificaciones@emserpa.gov.co	3187921353	No contestó	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	N/A	20/02/2025 2:00 p. m.
20	ASOJUNTAS MUNICIPAL ARAUCA	ASOJUNTAS	No identificado	Arauca	ORLANDO BARAHONA RENDÓN	PRESIDENTE	No identificado	No identificado	Numero equivocado	Se elaboro carta	No asistió	N/A	20/02/2025 5:00 p. m.
21	JAC COMUNA 5	PRESIDENCIA	No identificado	ARAUCA	ORLANDO NIÑO VILLAMIZAR	PRESIDENTE	No identificado	3167621403	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 5:00 p. m.
22	JAC BARRIO FLOR DE MI LLANO	PRESIDENCIA	No identificado	ARAUCA	CIRO PINTO	PRESIDENTE	No identificado	3213107496	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 5:00 p. m.
23	JAC BARRIO SAN CARLOS	PRESIDENCIA	No identificado	ARAUCA	GABRIELA VERGAÑO	PRESIDENTE	No identificado	3219165586	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 5:00 p. m.
24	JAC BRISAS DEL LLANO	PRESIDENCIA	No identificado	ARAUCA	SANDRA CATIMAY	PRESIDENTE	No identificado	3106734527	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 5:00 p. m.
25	JAC MATA DE VENAO	PRESIDENCIA	No identificado	ARAUCA	DIXON CABRERA	PRESIDENTE	No identificado	3174601750	No contestó	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 5:00 p. m.
26	JAC BELLO HORIZONTE	PRESIDENCIA	No identificado	ARAUCA	EDITH RODRIGUEZ	PRESIDENTE	No identificado	3112650484	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 5:00 p. m.
27	JAC SAN VICENTE	PRESIDENCIA	No identificado	ARAUCA	ALBERTO ORTEGA	PRESIDENTE	No identificado	3212356941	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 5:00 p. m.
28	SUPER INTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE ARAUCA	Regional	No identificado	ARAUCA	DR. JOSE ELIAS REINA PEREZ	Delegado	No identificado	No identificado	Numero equivocado	Se elaboro carta	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
29	Proyecto Pista Interventoria	No identificado	No identificado	ARAUCA	Jaime Baloquera	No identificado	No identificado	No identificado	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 9:00 a. m.
30	Proyecto Pista Interventoria	No identificado	No identificado	ARAUCA	Luisa Fernanda Quevedo	Ingeniera de apoyo	aerocrc@estructurado.com	3212331916	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 9:00 a. m.
31	Proyecto Pista Interventoria	No identificado	No identificado	ARAUCA	Marcela Rios	Inspectoría SISOMA	aerocrc@estructurado.com	3013905517	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 9:00 a. m.
32	SATENA	Supervisión	Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz	ARAUCA	Jhon Jairo Rivas	Supervisor Aeropuerto	jhon.rivas@satena.com	3104228624	No contestó	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 2:00 p. m.
33	CLIC AIR	Supervisión	Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz	ARAUCA	Maria Victoria Paredes	Coordinadora Base AUC	maria.paredes@clcair.co	No identificado	Numero equivocado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	N/A	20/02/2025 2:00 p. m.
34	AVIANCA	Supervisión	Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz	ARAUCA	Edinson Ortega	Supervisor Servicio al Cliente	aeropuerto.auc@avianca.com	No identificado	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Correo	20/02/2025 2:00 p. m.
35	SierraCol Energy Arauca LLC	No identificado	No identificado	ARAUCA	Ricardo J. Peña / Martha Jauregui	Coordinador SCM	CLM-SCM-Sr-Supv@Sierracol.com; CharlieKatherine_Olaya@sierracol.com	No identificado	Confirmado	Se envia carta de invitación via correo	Asistió a socialización	Llamada	20/02/2025 2:00 p. m.
36	ECOPETROL	No identificado	Calle 35 # 7-59	Bogotá	Ricardo Roa Barragán	Director	participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co	(+057) 310 315 8600	Numero equivocado	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.
37	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT	No identificado	Calle 28 No. 13 A – 15	Bogotá	No identificado	No identificado	https://www.mincit.gov.co/inicio	(+57)6016067676	Numero equivocado	Se envia carta de invitación via correo	No asistió	N/A	20/02/2025 9:00 a. m.



INTERESADOS (Stakeholders)
INVITACIONES VISITA OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

No.	Nombre Organismo/Entidad/Institución	Dependencia	Dirección	Ciudad / Municipio	Nombre contacto	Cargo	Correo de contacto (Si se conoce)	Numero de contacto (Si se conoce)	Confirmación de asistencia	Observaciones previas	Observaciones	Medio de confirmación	Fecha y hora de citación
1	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINGIT	Vuarmirim	Calle 28 No. 13 A - 15	Bogotá	Correo Institucional	Correo Institucional	correo.institucional@mingit.gov.co	(+57) 601697676	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No contesta la llamada	N/A	27/03/2025 9:00AM
2	Aerolínea local	Dirección	Aeropuerto Aguas Claras	Ocaña	Cristian Isael Rochel Rieira	Gerente Aeropuertos I	cristian.rieira@nortedesantander.gov.co	264331863	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 9:00AM
3	Aerolínea Regional	Coordinación Infraestructura	Dirección Regional Aeronáutica Nororienté	Cúcuta	Wilmar Connel Gomez	Coordinador	wilmar.connel@nortedesantander.gov.co	312527878	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
4	Aerolínea ATSEP	Coordinación ATSEP	Dirección Regional Aeronáutica Nororienté	Cúcuta	Daniel Aguirre Becerra	Coordinador	daniel.aguirre@nortedesantander.gov.co	3183501262	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 9:00AM
5	Aerolínea Regional	Coordinación Servicios Tránsito Aéreo	Dirección Regional Aeronáutica Nororienté	Cúcuta	Pedro Edgar Herrera Diaz	Coordinador	pablo.herrera@nortedesantander.gov.co	3002182261	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
6	Gobernación de Norte de Santander 1	Secretaría General / Despacho	Avenida 5 esquina entre Calle 13 y 14	Cúcuta	William Vilmar Legado	Gobernador Norte de Santander	william.vilmar@nortedesantander.gov.co	+57 (807) 1966300	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No contesta estimación 1	N/A	27/03/2025 9:00AM
7	Gobernación de Norte de Santander 3	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	Avenida 21 N° 24-55 - Barrio García Herreiros.	Cúcuta	William Vera Astudillo	Secretario de despacho	william.vera@nortedesantander.gov.co	315 338652	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 9:00AM
8	Gobernación de Norte de Santander 5	Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad	Av. 5 entre calles 13 y 14. Esquina Segundo Piso.	Cúcuta	Cristhian Humberto Jiménez Arévalo	Secretario de despacho	cristhian.jimenez@nortedesantander.gov.co	874775710506, (62+762110590, Ext. 1175.	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	Numero no válido	N/A	27/03/2025 9:00AM
9	Gobernación de Norte de Santander 6	Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad	Av. 5 # 11 - 29 Quinto Piso.	Cúcuta	Olger Lopez	Secretario de despacho	No identificado	312651458	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 9:00AM
10	Alcaldía de Ocaña 1	Secretaría General / Despacho Alcalde	Cra. 12 No. 10 - 42 Pasaje Municipal	Ocaña	Emiro Calizares Plata	Alcalde Ocaña	emiro.calizares@nortedesantander.gov.co	3009121212 - 3236762407	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	27/03/2025 9:00AM
11	Alcaldía de Ocaña 3	Secretaría de Planeación	Cra. 12 No. 10 - 42 Pasaje Municipal	Ocaña	Wilmar Carrascal Muñoz	Secretario de Planeación	wilmar.carrascal@nortedesantander.gov.co	3009121212	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
12	Alcaldía de Ocaña 4	Secretaría de Gobierno	Cra. 12 No. 10 - 42 Pasaje Municipal	Ocaña	Freddy Arango	Secretario de Gobierno	freddy.arango@nortedesantander.gov.co	8075269300	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
13	Alcaldía de Ocaña 5	Unidad Técnica Ambiental UTA	Cra. 12 No. 10 - 42 Pasaje Municipal	Ocaña	Ledy Perez	Directora	ledy.perez@nortedesantander.gov.co	300 912 1212	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
14	Alcaldía de Ocaña 6	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Cra. 12 No. 10 - 42 Pasaje Municipal	Ocaña	Amanda Enrique Noguera	Secretaria de Movilidad y Tránsito	amanda.enrique@nortedesantander.gov.co	300 912 1212	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
15	Alcaldía de Ocaña 8	Secretaría de Vías, Infraestructura y vivienda	Cra. 12 No. 10 - 42 Pasaje Municipal	Ocaña	Gustavo Castilla Vergel	Secretario de despacho	gustavo.castilla@nortedesantander.gov.co	(7) 5626300	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	27/03/2025 9:00AM
16	Alcaldía de Aguachica	Secretaría General / Despacho Alcalde	Calle 4 No. 10-33 Parque San Roque	Cesar	Gresy Tatiana Requena Riquero	Alcalde de Aguachica	gresy.tatiana@aguachica.cesar.gov.co	+57(7) 609479403	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
17	Alcaldía de Rio Oro (Cesar)	Secretaría General / Despacho Alcalde	Carrera 31N° 10-56, Parque Principal del Municipio Rio Oro, Cesar	Rio de Oro, Cesar	Amoldis Ochoa	Alcalde Municipal	amoldis.ochoa@riooro.cesar.gov.co	(7) 5619130	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
18	Alcaldía de González (Cesar)	Alcaldía	Carrera 9 Calle 24 y 14 Parque Principal García Benítez, González, Cesar	González, Cesar	Katherine Mora Rosado	Alcalde Municipal	katherine.mora@gonzalez.cesar.gov.co	(57) 317764646	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Correo	27/03/2025 9:00AM
19	Alcaldía de Convención	Alcaldía	Carrera 6 No. 4 - 14 Parque Principal Esquina - Palacio Municipal	Convención	Alexander Buelto López	Alcalde Municipal	alexander.buelto@convencion.gov.co	(7) 930 840	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
20	Alcaldía Tesama	Alcaldía	Carrera 4 No. 330 Parque Principal Carlos Julio Gómez Molina, Tesama, Norte de Santander	Tesama	Uber Said Conde Serrano	Alcalde Municipal	uber.said@tesama.nortedesantander.gov.co	(57) 318 455022 - 311620001	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
21	Alcaldía San Calisto	Alcaldía	Palacio Municipal - Parque Principal - San Calisto - Norte de Santander	San Calisto	José Luis Balmaceda Pinzón	Alcalde Municipal	joseluis.balmaceda@san-calisto.nortedesantander.gov.co	(57) 3136343394	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
22	Alcaldía Aterajo	Alcaldía	Calle 14 con Calle 5 y Esquina Parque Principal - Palacio Municipal	Aterajo	Huber Sánchez	Alcalde Municipal	huber.sanchez@aterajo.nortedesantander.gov.co	(57) 322508900	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
23	Alcaldía Villa Caro	Alcaldía	calle 1 N° 3-59 Palacio Municipal Lucio Pablo Nuñez	Villa Caro	Jesus Arredio Sepúlveda Celis	Alcalde Municipal	jesus.arredio@villa-caro.nortedesantander.gov.co	(57) 302118063	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
24	Alcaldía del Carmen	Alcaldía	Carrera 3 # 6-33 - Parque Principal Rafael Uribe Uribe	El Carmen	Jesus Rafael Contreras Yareno	Alcalde Municipal	jesus.rafael@elcarmen.nortedesantander.gov.co	+57(7) 313694466	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
25	Alcaldía Hezari	Alcaldía	Carrera 3 # 6-33 - Parque Principal Rafael Uribe Uribe	Hezari	Rodolfo Muñoz Perez	Alcalde Municipal	rodolfo.munoz@hezari.nortedesantander.gov.co	(57) 302519569	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
26	Alcaldía La Playa de Belén	Alcaldía	KM 03 185 PALMCO MUNICIPAL, Calle 4 # 113 Casa Municipal, La Playa, Norte de Santander, Colombia	La Playa de Belén	Yoly Margarita Ruedes León	Alcalde Municipal	yoly.margarita@laplaya-norte-desantander.gov.co	(57) 318526325	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
27	Personería Municipal de Ocaña	Personería Municipal	Calle 10 No. 11 - 76	Ocaña	Jorge Amador Bahiquez	Personero de Ocaña	jorge.amador@nortedesantander.gov.co	(7) 5624483	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
28	CCO Cámara de Comercio de Ocaña	Cámara de comercio	Calle 11 # 15-33 Edificio Cámara de Comercio	Ocaña	Fabio Rincon Ortiz	Presidente	fabio.rincon@cco-ocana.com	+57(7) 607 5630105	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Correo	27/03/2025 9:00AM
29	CCO Cámara de Comercio de Cúcuta	Cámara de comercio	Edificio Cámara de Comercio de Cúcuta	Cúcuta	Gonzalo Medina Valderama	Presidente junta directiva	gonzalo.molina@cco-cucuta.com	+57(7) 607 562680	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	27/03/2025 9:00AM
30	Contratario General del Departamento de Norte de Santander	Dirección	Av 5 # 11 - 26 Plaza 1 y 3 Edif. Antiguo Banco de la República	Cúcuta	Cesar Uribe Uribe	Contratador Departamento de Norte de Santander	cesar.uribe@nortedesantander.gov.co	+57 (607) 8636440	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Correo	27/03/2025 9:00AM
31	Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres	Palacio Municipal - Alcaldía Ocaña	Cra. 28 #10A-30	Ocaña	Gustavo Pabla	Coordinador	gustavo.pabla@nortedesantander.gov.co	3188967172	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	Señala correo de Vía	N/A	27/03/2025 9:00AM
32	Instituto Departamental de Salud Norte de Santander - Ocaña	N/A	N/A	Ocaña	Miguel otero Meneses de cello	Coordinador Salud Publica	miguel.otero@insd-norte-desantander.gov.co	3226521656	Contestó, no confirmo	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	27/03/2025 9:00AM
33	Batalión Inferno No 15 Oj Francisco Paula Santander	Dirección	KM 1 VÍA OCAÑA	Ocaña	TC Nelson Cota Silva	Comandante	nelson.cota@nortedesantander.mil.co	315646818	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	N/A	27/03/2025 9:00AM
34	Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 3 (PONAL)	Dirección	KM 1 VÍA OCAÑA	Ocaña	TC Jairo Cabrera Comello	Comandante	jairo.cabrera@nortedesantander.mil.co	3156461439	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
35	Batalion Especial Energetico y Val No 21	Dirección	Base Esmeralda - Municipio Convención (NS)	Convención	TC. bañez	Comandante	bañez21@convencion.ns.gov.co	3104161439	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
36	Procuraduría provincial de Ocaña	Oficina Ocaña	Carrera 12 # 9 - 94	Ocaña	No identificado	No identificado	procuraduria@procuraduria.gov.co	No identificado	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
37	CORPONOR Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander - Territorial Ocaña	Corporación Ambiental	Barrio las Fejas Centro de Acopio	Ocaña	Eduin Enrique Torrado Torrado	Director Territorial	eduin.enrique@corponor.gov.co	(80) (7) 5828484 Ext. 702	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
38	CORPONOR Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander	Corporación Ambiental	Calle 13 Av. El Bosque #3E-278	Cúcuta	Rafael Humberto Camacho	Director	rafael.humberto@corponor.gov.co	+57(80) (7) 5828484	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
39	ANATO Asociación colombiana de agencias de viaje y turismo	Turismo	Carrera 19B # 83-63	Bogotá	Paula Cortés Calle	Presidente Ejecutiva	presidencia@anato.co	+57(601) 9143131	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
40	ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia	Empresarios	Calle 11 # 1E - 125 o Calle 11A # 1E - 124	Cúcuta	Francisco José Unda Lara	Gerente Seccional Norte de Santander	francisco.unda@andi.com.co	5755778	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
41	FENALCO Federación Nacional de Comerciantes	Regional Norte de Santander	Calle 10 #26 # 4	Cúcuta	Gladya Navarro Uribe	Directora	gladya.navarro@fenalco.com.co	60 7-595 6184	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 9:00AM
42	SEARGA	Bogotá	Aeropuerto El Dorado Nueva Zona de Activación General - Entrada 6 vía CATAM	Bogotá	MONICA ZAPATA	Operativa	monica.zapata@searga.com.co	312 204 8284	Contestó, no confirmo	Persona ya no está vinculada a la empresa			27/03/2025 9:00AM
43	AERO TORCORONA VUELOS CHARTER S.A.S	Ocaña	N/A	Ocaña	Jorge Eduardo Navarro	Gerente	No identificado	3227537608	Confirmado	Se elaboro carta	Confirmado	N/A	27/03/2025 9:00AM
44	AEROMAS	Bogotá	Aeropuerto Internacional El Dorado Punto 6, Ingreso Catán, Hanger 15	Bogotá	N/A	N/A	No identificado	+57(7) 316 692 8115	Contestó, no confirmo	Se elaboro carta	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
45	ALL COLOMBIA	No identificado	No identificado	N/A	N/A	N/A	perlanadecolombias@gmail.com	6761192	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
46	LANS	San Jose de Cucuta - Bucaramanga	Aeropuerto Palonegro Zona de Hangares (Bucaramanga) - Aeropuerto Camilo Daza Muelle de carga (San Jose de Cucuta)	San Jose de Cucuta - Bucaramanga	N/A	N/A	operacionescucuta@lans.com	(7) 5875231 313 4326037	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
47	COOMLPINORT	COOMLPINORT	Av. 0B N° 21-09	Cúcuta	No identificado	No identificado	coomlpinort@hotmail.com	(037) 5720321	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
48	SATENA	No identificado	No identificado	Cúcuta	Dorian Vizcaino	Comercial	No identificado	3161611802	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 9:00AM
49	Eso S.A Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Central Ocaña	Carrera 33 N°7A-11	Ocaña	Jesus Alfredo Contreras Mejia	Gerente	jesus.alfredo@eso.com.co	607-5611317	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
50	CENS Empresa de Energía Ocaña	Oficina Ocaña	Avenida Francisco Fernandez de Contreras	Ocaña	Edwin Tarazona	No identificado	edwin.tarazona@censo.com.co	3123883362	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
51	Metrogas	Ocaña	Calle 11 # 21-15 Local 7	Ocaña	No identificado	No identificado	metrogasnorte@metrogas.com.co	607(7) 569 1748	Numero no válido	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 9:00AM
52	Asocomunal Ocaña (Asuquitas)	Ocaña	N/A	Ocaña	Fernel Hacıp bañez	Presidente	No identificado	315700694	Confirmado	Se elaboro carta	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 2:00PM
53	Asociación De Municipios Del Catumbayo Y Sur Del Cesar	Ocaña	Calle 12 # 11-76	Ocaña	Hugo Armando Arévalo Franco	Director ejecutivo	hugo.armando@asomunicipios.gov.co	3004300794	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 2:00PM
54	JAC Vereda Cristo rey (Corregimiento Aguas Claras)	Vda. Cristo Rey	Vda. Cristo Rey	Ocaña	Darwin Santana	Presidente	darwin.santana39@gmail.com	3138245227	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 2:00PM
55	JAC Corregimiento Aguas Claras (Barrios)	Cgto. Aguas Claras	Cgto. Aguas Claras	Ocaña	Damaris Picon	Representante JAC	damaris.picon@hotmail.com	3164129346	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 2:00PM
56	Acueducto Cgto Aguas Claras	Cgto. Aguas Claras	Cgto. Aguas Claras	Ocaña	Damaris Picon	Coordinadora	damaris.picon@hotmail.com	3164129346	No contestó	Se envía carta de invitación vía correo	No asistió	N/A	27/03/2025 2:00PM
57	JAC Vereda Las Chircas	Vda. Las Chircas	Vda. Las Chircas	Ocaña	Maritza Pacheco	Presidente	maritza.pacheco70@gmail.com	3508806991	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 2:00PM
58	Jac Vereda El limon	Vda. El Limon	Vda. El Limon	Ocaña	Wilmer Acciano	Representante JAC	wilmer.acciano@acm.com	3202643313	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 2:00PM
59	Acueducto Comunal Cristo Rey	Vda. Cristo Rey	Vda. Cristo Rey	Ocaña	Darwin Santana	Presidente	darwin.santana39@gmail.com	3138245227	Confirmado	Se envía carta de invitación vía correo	Asistió a socialización	Llamada	27/03/2025 2:00PM

SKUC		SKSA		SKOC	
Invitado	Asistencia	Invitado	Asistencia	Invitado	Asistencia
JAC COMUNA 5	Asistió	Aerocivil local	Asistió	Ministerio de Comercio, Industr	No asistió
Aerocivil local	Asistió	Gobernación de Arauca	Asistió	Aerocivil local	Asistió
Alcaldía de Arauca	Asistió	Alcaldía de Saravena	Asistió	Aerocivil Regional	Asistió
ASOJUNTAS MUNICIPAL ARAUCA	No asistió	Personería Municipal de Sarave	Asistió	Gobernación de Norte de Santa	Asistió
AVIANCA	Asistió	CORPORINOQUIA Corporació	Asistió	Alcaldía de Ocaña	Asistió
Cámara de Comercio de Arauca	No asistió	Cámara de Comercio de Arauc	No asistió	Alcaldía de Aguachica	No asistió
CENRAL MEDICA	Asistió	Cámara de Comercio del Piede	Asistió	Alcaldía de Rio Oro (Cesar)	No asistió
CLIC AIR	Asistió	Unidad Administrativa Especial	Asistió	Alcaldía de Gonzalez (Cesar)	Asistió
COMITÉ INTEGREMIAL, COMERCIAL	No asistió	BATALLON DE MOVILIDAD Y	No asistió	Alcaldía Convencion	No asistió
CTH COMBUSTIBLES Y TRANSPOR	Asistió	CTH COMBUSTIBLES Y TRAN	Asistió	Alcaldía Teorama	No asistió
ECOPETROL	No asistió	ENELAR ESP Empresa de Ene	No asistió	Alcaldía San Calixto	No asistió
EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. Empresa M	Asistió	EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. Empr	Asistió	Alcaldía Abrego	No asistió
ENELAR ESP Empresa de Energía de	Asistió	Aaraucana de gases SAS ESP	No asistió	Alcaldía Villa Caro	No asistió
Gobernación de Arauca	Asistió	Empresa Comunitaria Acueduc	Asistió	Alcaldía del Carmen	No asistió
Juntas de acción Comunal	Asistió	SATENA Viajes Belencita	Asistió	Alcaldía Hacari	No asistió
Ministerio de Comercio, Industria y Tur	No asistió	CLIC AIR	No asistió	Alcaldía La Playa de Belen	No asistió
Personería Municipal de Arauca	No asistió	ECOPETROL	Asistió	Personería Municipal de Ocaña	No asistió
Proyecto Pista Interventoria	Asistió	Ministerio de Comercio, Industr	No asistió	CCO Cámara de Comercio de (	No asistió
SATENA	No asistió			CCO Camara de Comercio de (	No asistió
SierraCol Energy Arauca LLC	Asistió			Contraloría General del Depart	Asistió
SUPER INTENDENCIA DE PUERTOS	No asistió			Consejo Municipal para la Gest	Asistió
Unidad Administrativa Especial De Sal	Asistió			Instituto Departamental de Salu	Sistema correo de Voz
				Batallón Infantería No.15 Gr Fr	Asistió
				Fuerza de Despliegue PONAL	Asistió
				Batallon Especial Energetico y	No asistió
				Procuraduría provincial de Oca	No asistió
				CORPONOR Corporación Autó	No asistió
				ANATO Asociación colombiana	No asistió
				ANDI Asociación Nacional de E	No asistió
				Juntas de acción Comunal	Asistió
				SEARCA	No asistió
				AERO TORCOROMA VUELOS	No asistió
				AEROMAS	No asistió
				ALL COLOMBIA	No asistió
				LANS	No asistió
				COOMULPINORT	No asistió
				SATENA	No asistió
				Espo S.A Empresa de Acueduc	No asistió
				CENS Empresa de Energía Oc	No asistió
				Metrogas	No asistió
