



INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORME N°3 DE INTERVENTORÍA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA CV -N. ° 020-2023

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.



06 DE OCTUBRE DE 2023



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. JUSTIFICACIÓN	5
3. OBJETIVOS	6
3.1 GENERAL	6
3.2 ESPECÍFICOS:	6
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS	10
5.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA.	10
5.2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA:	11
5.3 PÓLIZAS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	12
5.3.1 PÓLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA	12
5.3.2 PÓLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA	14
6. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	16
6.1 COORDENADAS	17
7. INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	18
8. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	26
9. INFORME DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADO CON ACUMULADAS	27
10. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO EN OBRA	29
11. INFORMACIÓN FINANCIERA	30
11.1 EL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO DE OBRA:	30
11.2 EL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO DE INTERVENTORÍA:	32
12. COMPONENTES ADMINISTRATIVOS.	35
13. NOVEDADES DEL EQUIPO PROFESIONAL	36



14.	CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE OBRA	37
15.	CONTROL DIARIO DE INTERVENTORIA CON NOMBRE, CÉDULA Y NOVEDADES	38
16.	REGISTRÓ DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38
17.	CONTROL DIARIO DE LOS EQUIPOS DE INTERVENTORÍA.	39
18.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORÍA	40
19.	FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.	40
20.	CUADRO DE LLUVIAS	48
21.	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	49
21.1	CORRESPONDENCIA GENERAL ENVIADA	49
21.2	CORRESPONDENCIA GENERAL RECIBIDA	49
24.	INFORME EJECUTIVO DE ESPECIALISTAS	52
24.1	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL	52
24.2	INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	52
24.3	INFORME DE GESTIÓN SOCIAL	52
24.4	INFORME DE ESPECIALIDAD ESTRUCTURAL	52
25	LISTADO DE ANEXOS	53

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME DE INERVENTORÍA

1. INTRODUCCIÓN

La unidad deportiva del municipio de Dabeiba, es un ente deportivo el cual le aporta a la comunidad Dabeibana, un espacio de esparcimiento y recreación. Por ello la Administración Municipal, se interesó en realizar las adecuaciones necesarias para que este escenario siga siendo un referente de la región.

Para lograr esta meta, El municipio de Dabeiba, realizó una asociación estratégica con ASOMUDACAR como conveniente, mediante la modalidad de **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. N. ° 019-2023** y cuyo objeto contractual es el de **“ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA”**. Así mismo y velando siempre por los intereses de sus habitantes, se tiene una interventoría contratada a MASER, quien realizará las labores de supervisión en diferentes ámbitos que permitan la ejecución efectiva y eficaz del objeto del contrato.

Se busca contar con una infraestructura física segura, confiable y modernizada con el propósito de facilitar el desempeño de sus servidores y así tener funcionalidad y uso de un servicio institucional acorde de sus necesidades.

La Administración Municipal ha establecido unos contratos mediante los cuales se le cambiará la cara a este escenario a través de obras civiles y paisajismo que optimizarán cada rincón de este recinto y permitirán a la comunidad de este pueblo puedan disfrutar plenamente de un lugar apropiado para sus familias. Con esto se busca desde la administración que los habitantes de su municipio se identifiquen y apropien de este tipo de espacios que proporcionan bienestar a sus beneficiarios.

El presente informe, dará a conocer los aspectos técnicos, Ambientales, administrativos, financieros, contables y jurídicos del convenio de obra, permitiendo a la Administración Municipal, tener de primera mano, conocimiento exacto del avance de la obra en cada uno de estos aspectos y llevar a feliz término y de manera eficaz y eficiente, el objeto contractual.

El presente informe contempla el seguimiento y control del periodo contemplado entre el 7 de septiembre de 2023 al 6 de octubre de 2023.



2. JUSTIFICACIÓN

Para el cumplimiento de las obras que permitan terminar y poner en funcionamiento la unidad deportiva del municipio, se obtuvieron los estudios y diseños pertinentes que permitieron la implementación de las labores requeridas para lograr una puesta a punto de dicha unidad deportiva. Es por ello que la Administración Municipal a designado una supervisión externa al proyecto de la **“ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA”**.

Esta supervisión, consiste principalmente en la ejecución de actividades que permitan desarrollar eficientemente la interventoría mediante el control y seguimiento del objeto contractual. Por lo tanto y para lograr dicho objetivo, se tiene un convenio interadministrativo con la Asociación MASER (Municipios Asociados de la subregión de Embalse de los Rios Negro-Nare) y cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA”**, con el personal profesional pactado en los pliegos de condiciones, en los tiempos estipulados y con el acompañamiento de un supervisor de la Secretaria de Infraestructura Municipal de Dabeiba, el cual coordinará los distintos aspectos que se presenten y verificará el cumplimiento de los contratos en referencia.

Es por ello que se elabora y entrega este informe, en el que se hace revisión y acompañamiento a los procesos constructivos mediante control de la aplicación de normas, especificaciones, cronogramas y presupuesto de obra.

Con esto garantizamos la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos asignados a este contrato de obra. Asegurar que el contratista de cumplimiento a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas para la ejecución del objeto contractual.



3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Sustentar ante la Administración municipal de Dabeiba, el estado de ejecución de las actividades programadas y ejecutadas por el conveniente de obra, durante el periodo del informe, con los controles realizados por el conveniente de interventoría para el buen y correcto desarrollo de dichas actividades, cumpliendo con los requerimientos técnicos, financieros, Ambientales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2 ESPECÍFICOS:

- Verificar el cumplimiento a los requerimientos establecidos en el contrato.
- Realizar seguimiento al avance de obra.
- Realizar seguimiento a la calidad de las materias primas utilizadas en obra.
- Verificar el cumplimiento de los requerimientos legales colombianos.
- Revisar y aprobar hojas de vida del personal.
- Revisar y aprobar el cronograma presentado por el contratista.
- Revisar y aprobar el Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de manejo de residuos sólidos presentado por el contratista.
- Validar las Actas de vecindad elaboradas por el Contratista.
- Liderar los Comités de obra del proyecto.
- Realizar seguimiento y control a los ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas requeridas.
- Efectuar control del pago de aportes parafiscales y seguridad social o planillas de pago del contratista.
- Realizar seguimiento a las garantías vigentes del contrato.
- Elaborar informe semanal sobre el avance de obra.
- Elaborar los informes mensuales.
- Elaborar y mantener vigente la Bitácora del proyecto.



INFORME DE ACTIVIDADES	No. 3		
PERIODO	Del 7 de septiembre de 2023 al 6 de octubre de 2023		
FECHA DE ELABORACIÓN	Día	Mes	Año
	15	10	2023

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto “ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.”

El propósito de dar terminación a la unidad deportiva es que toda la población del municipio cuente con un mejor ambiente deportivo.

Se busca contar con una infraestructura física segura, confiable y modernizada con el propósito de facilitar el desempeño de sus servidores y así tener funcionalidad y uso de un servicio deportivo acorde de sus necesidades.

Para esto, se tiene dentro del alcance de obra por parque, lo siguiente:

- ✚ MOVIMIENTOS DE TIERRA, referentes a la localización y replanteo de la arquitectura diseñada para las graderías y andenes en el área a intervenir.
- ✚ ACEROS DE REFUERZO, contemplado para refuerzo de graderías a construir, senderos peatonales perimetrales y elementos de concretos que se necesiten para la estabilidad complementaria de las obras.
- ✚ HORMIGONES, con los que se construirán las losas horizontales de los asientos, vigas perimetrales, andenes perimetrales y las columnas de cierre soporte cubierta metálica.



- ✚ MAMPOSTERIA, contemplado para construir muro de cerramiento perimetral.
- ✚ CUBIERTA, contemplada para construir cerchas, columnas y tepleros, instalación de tejas standing metálica calibre 26, canoa metálica calibre 26 y colocación de embudos en laminas para graderías de futbol.
- ✚ ACERO ESTRUCTURAL, contemplado para refuerzo de graderías a construir, senderos peatonales perimetrales y elementos de concretos que se necesiten para la estabilidad complementaria de las obras.
- ✚ HORMIGONES, con los que se construirán zapatas, pedestales y vigas de fundación en la placa polideportiva.
- ✚ CUBIERTA, contemplada para construir cerchas, columnas y tepleros, instalación de tejas standing metálica calibre 26, canoa metálica calibre 26 y colocación de embudos en laminas para placa polideportiva.
- ✚ PRELIMINARES, referentes a la localización y replanteo de la arquitectura diseñada para la unidad deportiva.
- ✚ INSTALACIÓN DE GRAMA, tales como la instalación GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) MONOFILAMENTO con una altura de fibra 50 mm, protección UV, espesor entre 300-400 micrones, Dtex mayor o igual a 12000, mayor o igual a 8.500 puntadas por metro cuadrado, backing doble Incluye: relleno de arena de sílice fina (ángulo redondeado entre 0.2mm y 1.0mm y caucho granulado (SRB reciclado de llantas) de granulometría con partículas entre 0.5mm y 2.0mm, herramienta, equipo y mano de obra. Garantía de 8 años por estabilidad UV (exposición solar) y 5 años por defectos de fabricación y/o defectos en la instalación y funcionamiento. El fabricante de la grama será PREFERENCIAL FIF.
- ✚ CANCHA DE FUTBOL, entre las que se resaltan la instalación de las porterías principales de futbol, instalación de tubería de 8" Novafort para aguas lluvias, fabricación de cajas de empalme en concreto de 210 de 1x1x1 y la instalación de superficie sintética para pista de trote incluye señalización.
- ✚ OBRAS COMPLEMENTARIAS, tales como la localización trazado y replanteo del proyecto, construcción de cerramiento provisional en tela verde Sarán y postes de madera, rocería del terreno en forma manual, excavaciones en material heterogéneo, llenos en material orgánico para conformación, entresuelo en piedra



INFORME DE INVENTORÍA

para andenes, pisos y graderías, construcción de muro en gaviones h=2m, excavación en roca cualquier profundidad, renivelación de triturado existente según coordenadas topográficas, suministro, transporte e instalación de puerta peatonal de dos alas según diseño, instalación de triturado de 3/4" para cama filtrante de cancha de futbol E=0,15 M, riego de imprimación sobre la base granular compactada, Siembra de grama natural tipo esmeralda, demarcación de cancha según diseño, aplicación de pintura a base de aceite de primera calidad para cerramiento en malla eslabonad, instalación de pasamanos en tubería negra de 2" y 1-1/4 x 1,5 mm anclada a muro, instalación de rejas plásticas similares a las existentes de 40x70cm para cárcamo, corte de placa de piso con disco diamantado, cuneta en concreto, construcción de filtro en geotextil NT 2500 de 40x60cm. Incluye Tubería perforada PVC 4" y demolición de concreto reforzado de gradería occidental.

Para esta intervención se tienen asignados en costos directos un valor de **\$2.419.577.186** y una Administración de **\$655.432.753** y que es equivalente al 27,23% de los costos directos.

Adicional a los costos directos e indirectos del contrato, se tiene unos rubros asignados para:

Plan de Gestión Integral de Obra PAPSO, PMA y PMT (2%) por valor de **\$48.140.488** más.

Por consiguiente, el contrato tiene un costo total de **\$3.110.597.678**.

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

5.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se enumeran los datos más relevantes del contrato:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE- MASER
NIT O CEDULA:	800.108.848-6
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Nro. CV 020
OBJETO DEL CONTRATO:	“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.”.
FECHA DE INICIO:	7 de julio de 2023
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023
VALOR DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISIENOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ML (\$240.628.560) INCLUIDO TODOS LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPAL.
ESFUERZO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO:	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISIENOS PESOS ML (\$234.901.600)
ESFUERZO INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN:	CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ML (\$5.726.960) EN RECURSO ECONOMICO.



5.2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS, DEL URABA, DARIEN Y CARIBE- ASOMUDACAR.
NIT:	901.415.647-5
CONVENIO N°:	CV 019-2023
OBJETO DEL CONTRATO	“ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA”.
FECHA DE INICIO:	7 de julio de 2023
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023
OTRO SI N°1 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023:	OTROSI MODIFICATORIO DE LA FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION / OBRA N° CV-019 DE 2023, EN SU CLAUSULA QUINTA
VALOR DEL CONVENIO:	TRES MIL CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 3.110.597.679) INCLUIDO LOS IMPUESTOS Y TASAS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPAL A QUE HAYA LUGARANALISIS TECNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO.
ESFUERZO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO:	TRES MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESO ML (\$ 3.045.978.701)
SFUERZO INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN:	SESENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ML (\$ 64.618.978).



5.3 PÓLIZAS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

5.3.1 PÓLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA

	POLIZAS DE INTERVENTORIA INICIALES 28 DE JUNIO DEL 2023			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.:	CV 020			
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SIINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.			
OBJETO DEL SEGURO				
EL OBJETO DEL CONVENIO N° CV 020 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORÍA TECNICA- AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SIINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.				
COBERTURA	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Calidad de servicio	3682447-5	28-jun-23	28-die-23	\$ 48.125.712,00
Cumplimiento del contrato	3682447-5	28-jun-23	28-jun-24	\$ 48.125.712,00
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnización laboral	3682447-5	28-jun-23	28-dic-20	\$ 48.125.712,00

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME DE INERVENTORÍA



POLIZAS DE INTERVENTORIA ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO DEL 7 DE JULIO DE 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: CV 020

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBJETO DEL SEGURO

EL OBJETO DEL CONVENIO N° CV 020 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

COBERTURA	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Calidad de servicio	3682447-5	7-jul-23	6-ene-24	\$48.125.712,00
Cumplimiento del contrato	3682447-5	7-jul-23	7-jul-24	\$48.125.712,00
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnización laboral	3682447-5	7-jul-23	6-ene-27	\$48.125.712,00



[Anexo N°1 Pólizas actualizadas Interventoría y contratista de Obra](#)



INFORME DE INVENTORÍA

5.3.2 PÓLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA

 <p>ASOMUDACAR</p>	<p>POLIZAS DEL CONTRATISTA INICIALES 28 JUNIO DEL 2023</p>			
<p>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N: CV 019 - 2023</p>				
<p>OBJETO DEL CONTRATO:</p>	<p>ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.</p>			
<p>SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO</p>				
<p>OBJETO DEL SEGURO</p>				
<p>Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud del convenio interadministrativo de asociación CV-019-2023 de fecha del 28/06/2023 celebrado entre las partes, relacionado con ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.</p>				
<p>COBERTURA</p>	<p>NUMERO DE LA POLIZA</p>	<p>VIGENCIA DESDE</p>	<p>VIGENCIA HASTA</p>	<p>VALOR ASEGURADO</p>
RESPONSABILIDAD CIVIL	595-47-994000000146	28/06/2023	28-dic-23	\$ 464.000.000
<p>SEGURO CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES</p>				
<p>OBJETO DEL SEGURO</p>				
<p>El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del convenio interadministrativo de asociación CV-019-2023 de fecha del 28/06/2023 celebrado entre las partes, relacionado con ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA. NOTA ACLARATORIA: el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.</p>				
<p>COBERTURA</p>	<p>NUMERO DE LA POLIZA</p>	<p>VIGENCIA DESDE</p>	<p>VIGENCIA HASTA</p>	<p>VALOR ASEGURADO</p>
Cumplimiento del contrato	595-47-994000000748	28-jun-23	28-dic-24	\$ 622.119.535.80
Pago de salarios y prestaciones sociales e	595-47-994000000748	28-jun-23	28-dic-26	\$ 622.119.535.80
Estabilidad y calidad de la obra	595-47-994000000748	28-jun-23	28-dic-24	\$ 622.119.535.80



INFORME DE INVENTORÍA

 ASOMUDACAR	POLIZAS DE CONTRATISTA ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO DEL 7 JULIO DE 2023																				
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N: CV CV 019 - 2023																					
OBJETO DEL CONTRATO:	ANULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.																				
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO																					
OBJETO DEL SEGURO																					
Mediante el presente anexo y de acuerdo al acta se deja expresa constancia que el contrato dio inicio el 7 julio 2023. los demas terminos y condiciones no modificados continuan en vigor.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">COBERTURA</th> <th style="width: 15%;">NUMERO DE LA POLIZA</th> <th style="width: 15%;">VIGENCIA DESDE</th> <th style="width: 15%;">VIGENCIA HASTA</th> <th style="width: 20%;">VALOR ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad civil extracontractual</td> <td>595-47-994000000146</td> <td>28-dic-23</td> <td>7-ene-24</td> <td>\$ 484.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	COBERTURA	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	Responsabilidad civil extracontractual	595-47-994000000146	28-dic-23	7-ene-24	\$ 484.000.000											
COBERTURA	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO																	
Responsabilidad civil extracontractual	595-47-994000000146	28-dic-23	7-ene-24	\$ 484.000.000																	
SEGURO CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES																					
OBJETO DEL SEGURO																					
Mediante el presente anexo y de acuerdo al acta se deja expresa constancia que el contrato dio inicio el 7 julio 2023. los demas terminos y condiciones no modificados continuan en vigor.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">COBERTURA</th> <th style="width: 15%;">NUMERO DE LA POLIZA</th> <th style="width: 15%;">VIGENCIA DESDE</th> <th style="width: 15%;">VIGENCIA HASTA</th> <th style="width: 20%;">VALOR ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento del contrato</td> <td>595-47-994000000748</td> <td>7-jul-23</td> <td>7-ene-25</td> <td>\$ 612.119.535.80</td> </tr> <tr> <td>Pago de salarios y prestaciones sociales e</td> <td>595-47-994000000748</td> <td>7-jul-23</td> <td>7-ene-27</td> <td>\$ 612.119.535.80</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y calidad de la obra</td> <td>595-47-994000000748</td> <td>7-jul-23</td> <td>7-ene-25</td> <td>\$ 612.119.535.80</td> </tr> </tbody> </table>	COBERTURA	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	Cumplimiento del contrato	595-47-994000000748	7-jul-23	7-ene-25	\$ 612.119.535.80	Pago de salarios y prestaciones sociales e	595-47-994000000748	7-jul-23	7-ene-27	\$ 612.119.535.80	Estabilidad y calidad de la obra	595-47-994000000748	7-jul-23	7-ene-25	\$ 612.119.535.80	
COBERTURA	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO																	
Cumplimiento del contrato	595-47-994000000748	7-jul-23	7-ene-25	\$ 612.119.535.80																	
Pago de salarios y prestaciones sociales e	595-47-994000000748	7-jul-23	7-ene-27	\$ 612.119.535.80																	
Estabilidad y calidad de la obra	595-47-994000000748	7-jul-23	7-ene-25	\$ 612.119.535.80																	

[Anexo N°1 Pólizas actualizadas Interventoría y contratista de Obra](#)



INFORME DE INERVENTORÍA

6. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La unidad deportiva del Municipio de Dabeiba se encuentra ubicado entre los barrio: Víctor Cárdenas y Barrio Obrero que componen el casco urbano del Municipio en cuestión.

MAPA DE LOCALIZACION UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE DABEIBA



INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
(Fuente: Google maps)




INFORME DE INERVENTORÍA

6.1 COORDENADAS

Latitud: 7.00014

Longitud: -76.26265

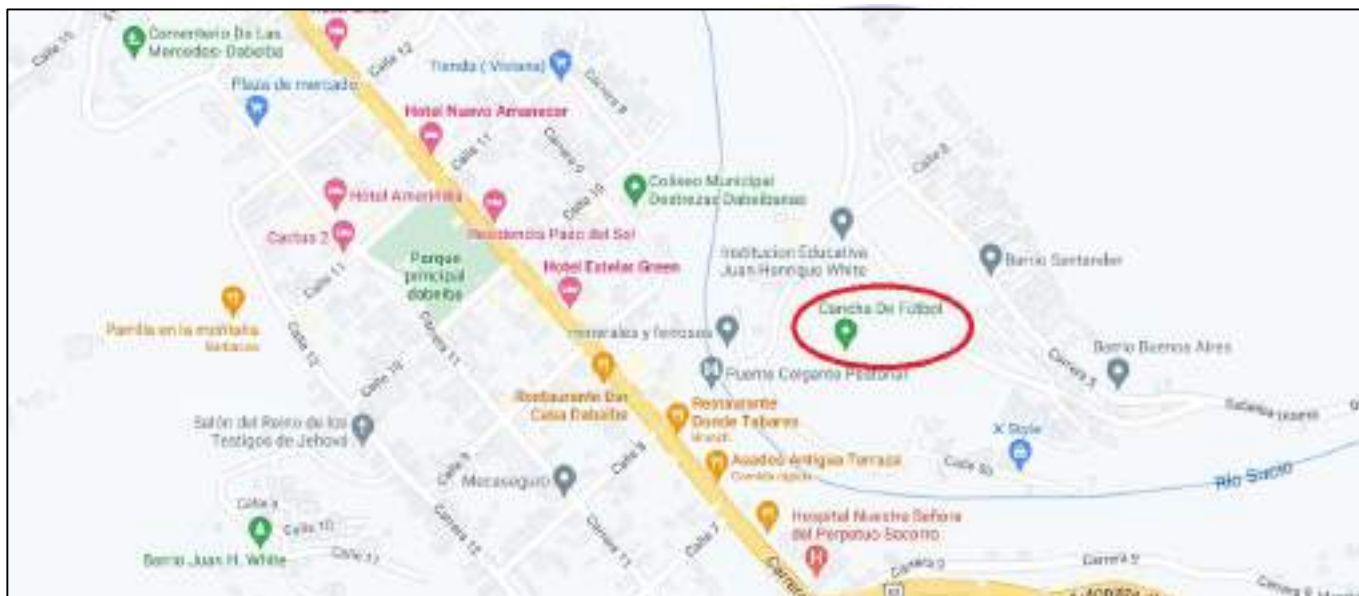

(Fuente: Google maps)

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



7. INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El convenio interadministrativo N° CV-019 de 2023 y cuyo objeto contractual es el de “ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA”, sigue en su avance contractual bajo la supervisión de la interventoría designada, por la Administración Municipal, mediante controles administrativo, técnico, ambiental, financiero, contable y jurídico a dicho convenio que arrojan como resultado para el presente periodo un progreso que esta permitiendo el cumplimiento del objeto del mismo y alcanzando parcialmente las metas trazadas en la programación de obra por parte del subcontratista del asociado.

Lo anterior se hace bajo una rigurosa vigilancia de las actividades contractuales, las mayores y menores cantidades de estas actividades y el análisis y aprobación de posibles obras necesarias no contempladas y obras extras al presupuesto relacionado. De igual manera, se realiza seguimiento constante a los procesos administrativos y jurídicos de los documentos aportados para la legalización del convenio, como son la actualización de pólizas a los tiempos y modificaciones del convenio original, acreditar el personal en campo para la ejecución de las actividades, la respectiva alta en la seguridad social de este personal y la revisión de planes y procedimientos de los componentes de seguridad y salud en el trabajo, componente social, componente ambiental y componente estructural del proyecto en general.

En este periodo de ejecución, la interventoría continuó realizando las inspecciones que ameritaron a los procesos constructivos basados en las especificaciones descritas en cada ítem intervenido mediante los recorridos en obra diarios por parte del personal de interventoría que garanticen que los elementos en construcción están debidamente ubicados e instalados con exactitud y utilizando los materiales adecuados de acuerdo a la calidad de los mismos y según las necesidades propias de cada actividad.

Durante este periodo no se ejecutaron comités de obra con el conveniente y la Administración Municipal, pero se han realizado visitas entre las partes para la registro del contratante y conocimiento del avance eficaz de las obras en ejecución.

En el avance del periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2023 y el 6 de octubre de 2023, se realizaron observaciones al contratista de obra tales.



- **11 de septiembre de 2023**, se le recuerda al contratista de obra la importancia del uso de los elementos de protección personal.
- **13 de septiembre de 2023**, se le recomienda al contratista de obra mejorar las condiciones en los procedimientos de vaciados de concreto en las graderías, para evitar incidentes laborales con los colaboradores.
- **26 de septiembre de 2023**, se le recomienda al contratista de no dejar los vaciados iniciados en los pedestales, ya que por norma se recomienda dejar los cortes de 45° o 90°. Se debe evitar hacer cortes en los nudos, ya que en estos se debe conservar que el concreto sea monolítico.
- **27 de septiembre de 2023**, se le solicita al contratista de obra nuevamente la instalación de la valla informativa del convenio de obra.
- Se le recuerda nuevamente a la residente SST del contratista el uso correspondiente de los elementos de protección personal.
- **28 de septiembre de 2023**, ingresa a obra minicargador a la obra sin documentación, al igual que el operador del mismo no cuenta con seguridad social.
- Se le recuerda al contratista de obra que para el ingreso de materiales se debe cumplir con los lineamientos implementados en el PMT del convenio.
- **Se deja constancia por parte de la interventoría que cualquier incidente o eventualidad será solo y únicamente responsabilidad del contratista de obra.**
- **29 de septiembre de 2023**, ingresan a obra vehículos de placa JYW 850, OLA 293, SBK 120 sin la documentación requerida por parte de la residente SST de la interventoría. Nuevamente se deja constancia en bitácora que si llegase a suceder algún incidente será responsabilidad del contratista de obra.
- **30 de septiembre de 2023**, se realiza prueba de asentamiento al concreto preparado en obra para verificar que se esté cumpliendo con la dosificación del diseño de mezclas presentado por el contratista de obra.
- **3 de octubre de 2023**, se convoca a reunión virtual con la socio-ambiental del contratista de obra, profesional social de la alcaldía municipal y residente social de la interventoría, con el fin de ejecutar actividades que se realizaron en el mes de octubre hora 4:30pm.
- **4 de octubre de 2023**, se le solicita a la residente SST del contratista de obra hacer seguimiento al uso de los EPP de los colaboradores, en especial los que están realizando la imprimación de la base granular ya que esta deteriora bastante los EPP.

[Anexo N°2 Copia de bitácora](#)



7.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS:

Se adelantaron las siguientes actividades durante el presente período:

CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA

CAPITULO 1: ACERO ESTRUCTURAL

Ítem 1.1: Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo de 4200 Kg /Cm2 (60.000 Psi).



Se realiza corte, figuración e instalación de acero de estructural.

CAPITULO 3: HORMIGONES

Ítem 2.3 Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de fundación de 30*30, 21 MPA.





CAPITULO 3: CUBIERTA

Ítem 3.1 Suministro, transporte y colocación de estructura metálica de cubierta, cerchas, columnas, templeros.





CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE

CAPITULO 1: PRELIMINARES

Ítem 1.1: Localización, trazado y replanteo.



CAPITULO 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Ítem 6.4: Excavaciones en material heterogéneo, incluyendo bolas de roca de diámetros inferiores a 1m, 0-2m, cualquier grado de humedad.





INFORME DE INVENTORÍA



Se realiza excavación manual.

Ítem 6.9: Renivelación de triturado existente según coordenadas topográficas.



		
INFORME DE INVENTORÍA		



Se realiza nivelación de triturado existente.

Ítem 6.13: Riego de imprimación sobre la base granular compactada, utilizando una emulsión asfáltica de rompimiento lento, con una dosificación a 2Kg/M2 de ligante residual o sea aproximadamente 1.6 Kg7M2 de emulsión asfáltica, con una concentración del orden del 60%.





Se realiza imprimación sobre base granular.

8. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Las obras ejecutadas durante el 7 de septiembre de 2023 al 6 de octubre de 2023, generaron cuatro informes, semanales (Ver Anexos), que contiene lo desarrollado en cada una de los cuatros semanas transcurridas, en el cual, van relacionados las condiciones contractuales del contrato, el personal en obra, pagos a contratista e interventoría, actividades ejecutadas durante la semana, comentarios y observaciones generales y registro fotográfico.

[Anexo N°3 Informe semanal presentado por el contratista de obra.](#)



INFORME DE INERVENTORÍA

9. INFORME DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADO CON ACUMULADAS

Con base en la programación de obra propuesta por el Contratista, Se realiza el seguimiento y control de los tiempos de ejecución del contrato y el avance físico del proyecto, obteniendo:

Informe semanal último N° 14
 Fecha de corte domingo 8 de octubre del 2023
 Porcentaje programado: 40,14%
 Equivalente en dinero: \$ 1.222.741.040

Porcentaje medido en obra: 53,89%
 Equivalente en dinero: \$ 1.641.403.167

Porcentaje de ejecución es del 13,74% por encima del programado. Ver gráfico anexo.





**AVANCE FISICO PORCENTUAL DE OBRA VS PROYECCION ACUMULADA
CONVENIO DE OBRA CIVIL**

PLAZO CONTRACTUAL EN SEMANAS	% PROYECTADO DE AVANCE ACUMULADO DE OBRA SEMANAL	% EJECUTADO DE AVANCE ACUMULADO DE OBRA SEMANAL	% EJECUTADO DE AVANCE ACUMULADO DE TIEMPO
SEMANA 1	0,15%	0,00%	4,17%
SEMANA 2	0,17%	0,19%	8,33%
SEMANA 3	0,32%	0,30%	12,50%
SEMANA 4	0,46%	0,39%	16,67%
SEMANA 5	0,64%	0,39%	20,83%
SEMANA 6	1,14%	1,32%	25,00%
SEMANA 7	1,79%	1,76%	29,17%
SEMANA 8	4,59%	4,46%	33,33%
SEMANA 9	7,92%	8,72%	37,50%
SEMANA 10	12,50%	10,40%	41,67%
SEMANA 11	16,33%	11,80%	45,83%
SEMANA 12	20,17%	15,00%	50,00%
SEMANA 13	24,29%	48,15%	54,17%
SEMANA 14	40,14%	53,89%	58,33%

VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO
\$ 1.222.741.040	\$ 1.641.403.167

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME DE INVENTORÍA

10. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO EN OBRA

Según lo estipulado en la cláusula Quinta del convenio de obra civil celebrado entre el Municipio de Dabeiba y Asomudacar, establece que: **FORMA DE DESEMBOLSO:** “el valor del presente convenio se desembolsará de la siguiente manera:

PAGO ANTICIPADO:

el convenio tendrá un pago anticipado del 40% del valor de este, el cual se desembolsará una vez se: 1- allegue y apruebe la póliza de cumplimiento. 2- Presente la factura o documento equivalente. 3- Certificación del supervisor o interventor del convenio. 4- Constancia o certificación de estar al día en aportes parafiscales y de seguridad social a que haya lugar. (...)”

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
Pago anticipado del convenio	\$ 1.218.391.480	40%

NOTA: Se está a la espera de la presentación de acta de avance No. 1 de obra para realizar el respectivo descuento del pago anticipado, por parte del conveniente de obra.

Para el presente informe y según lo mostrado en el AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADO CON ACUMULADAS, el conveniente alcanza el 53,89% de ejecución real, lo que facilitaría realizar el respectivo descuento de dicho pago.

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



11. INFORMACIÓN FINANCIERA

11.1 EL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO DE OBRA:


Con relación a la fecha de corte del presente informe, la interventoría ha llevado a cabo el seguimiento de las actividades ejecutadas diariamente, con el fin de determinar el rendimiento y el avance diario presentado en la obra.

Los valores actuales vigentes del estado de cuenta del contrato se resumen a continuación:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO ACTA	VALOR FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO
Valor del contrato	\$ 3.045.978.701						
Anticipo	\$ -						
OtroSi N°1	\$ -						
Valor total del contrato	\$ 3.045.978.701						
Pago anticipado		\$ 1.218.391.480		\$ 1.218.391.480	\$ 1.218.391.480	40,00%	\$ 1.827.587.220
Acta No. 1 (pendiente)		\$ 1.620.115.772	\$ 1.218.391.480	\$ 401.724.292	\$ 401.724.292	13,19%	\$ 1.425.862.929
TOTALES	\$ 3.045.978.701	\$ 1.620.115.772	\$ 1.218.391.480	\$ 1.620.115.772	\$ 1.620.115.772	53,19%	\$ 1.425.862.929



INFORME DE INERVENTORÍA

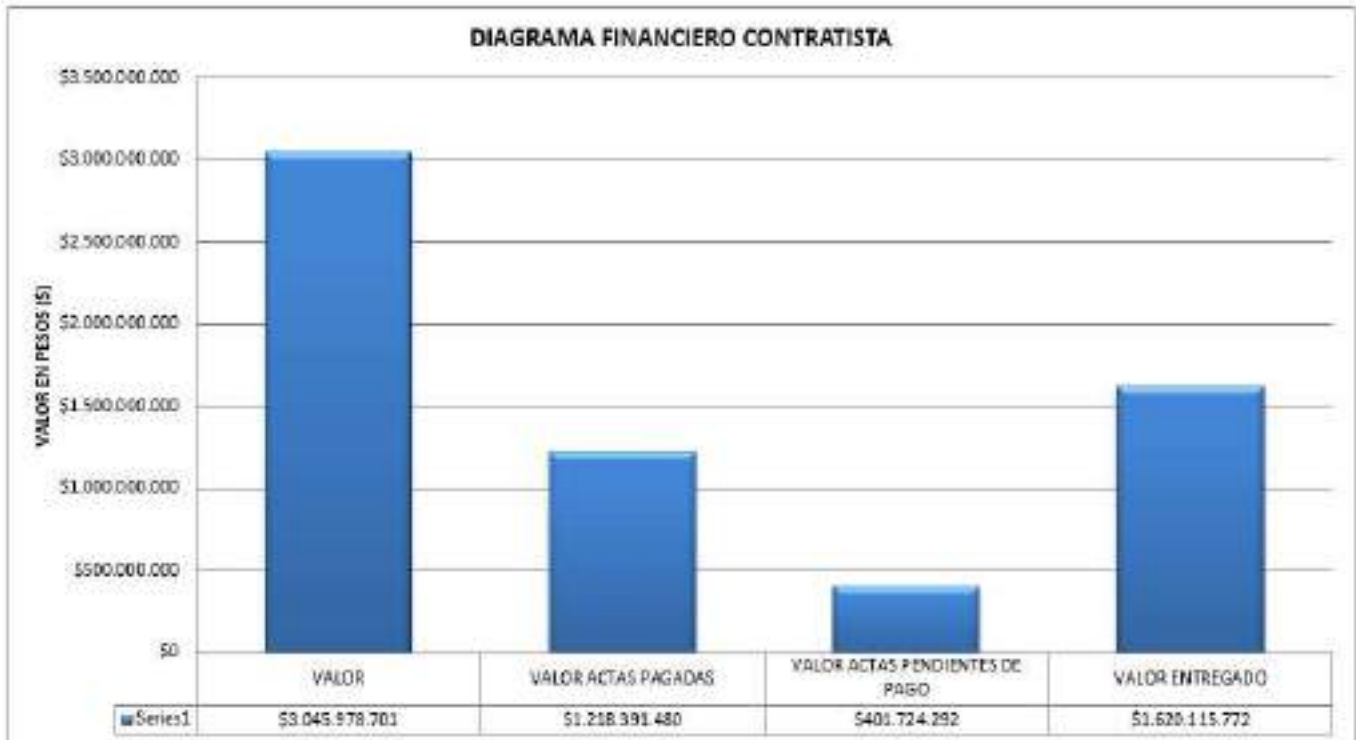

A la fecha de cierre del presente informe, no se presentaron actas de avance de obra por parte del conveniente de obra civil.

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



11.2 EL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO DE INTERVENTORÍA:

Con relación a la fecha del presente informe, la interventoría ha llevado a cabo el seguimiento de las labores a realizar del seguimiento y control tanto administrativo como financiero y técnico al contrato de interventoría, donde se ha realizado la inversión de los recursos asignados para tal fin.


Los valores actuales vigentes del estado de cuenta del contrato se resumen a continuación:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO ACTA	VALOR FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO
Valor del contrato	\$ 234.901.600						
Anticipo	\$ -						
Valor total del contrato	\$ 234.901.600						
Acta No. 1 (pendiente)		\$ 907.424	\$ -	\$ 907.424	\$ 907.424	0,39%	\$ 233.994.176
Acta No. 2 (pendiente)		\$ 19.579.846	\$ -	\$ 19.579.846	\$ 19.579.846	8,34%	\$ 214.414.329
Acta No. 3 (pendiente)		\$ 106.095.436	\$ -	\$ 106.095.436	\$ 106.095.436	45,17%	\$ 108.318.893
TOTALES	\$ 234.901.600	\$ 126.582.707	\$ -	\$ 126.582.707	\$ 126.582.707	53,89%	\$ 108.318.893





INFORME DE INERVENTORÍA

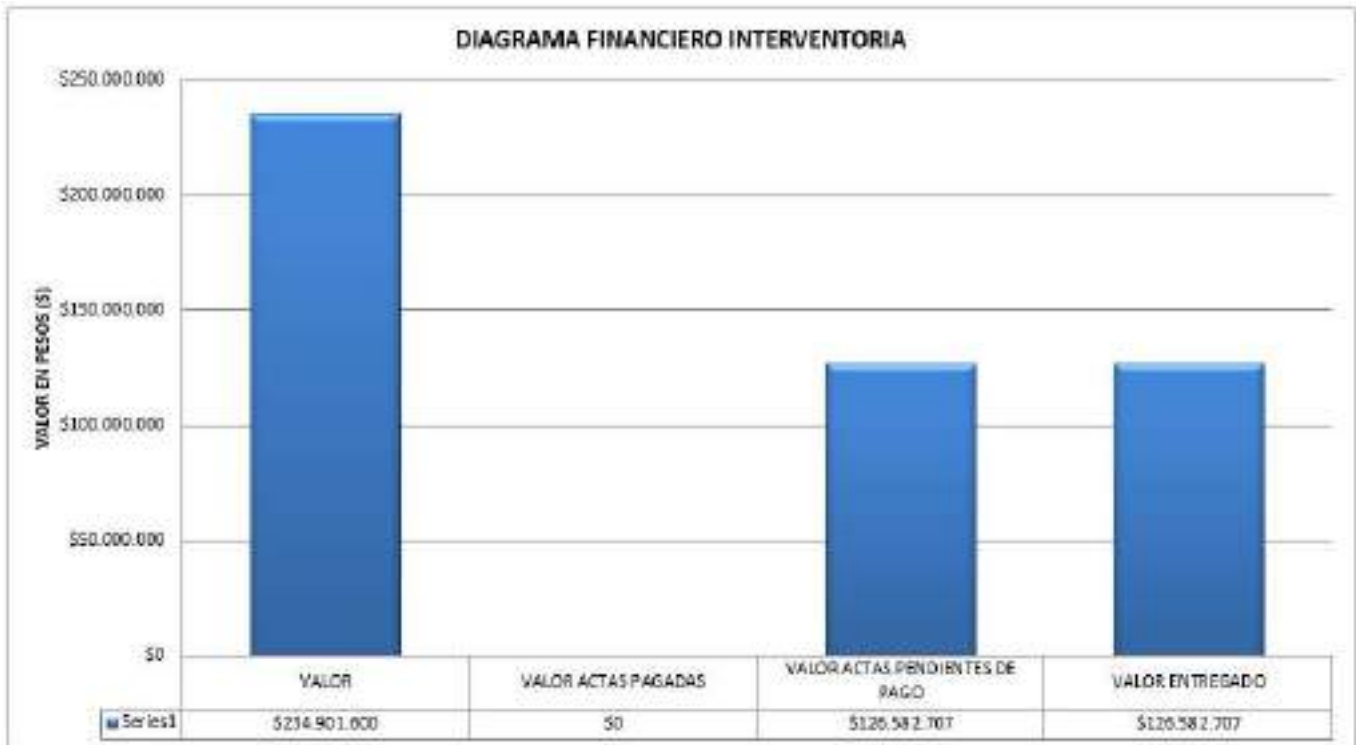


A la fecha de cierre del presente informe, no se presentaron actas de avance de obra por parte del conveniente de interventoría.

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME DE INERVENTORÍA

AVANCE FISICO PORCENTUAL DE OBRA VS PROYECCION ACUMULADA CONVENIO DE INTERVENTORIA

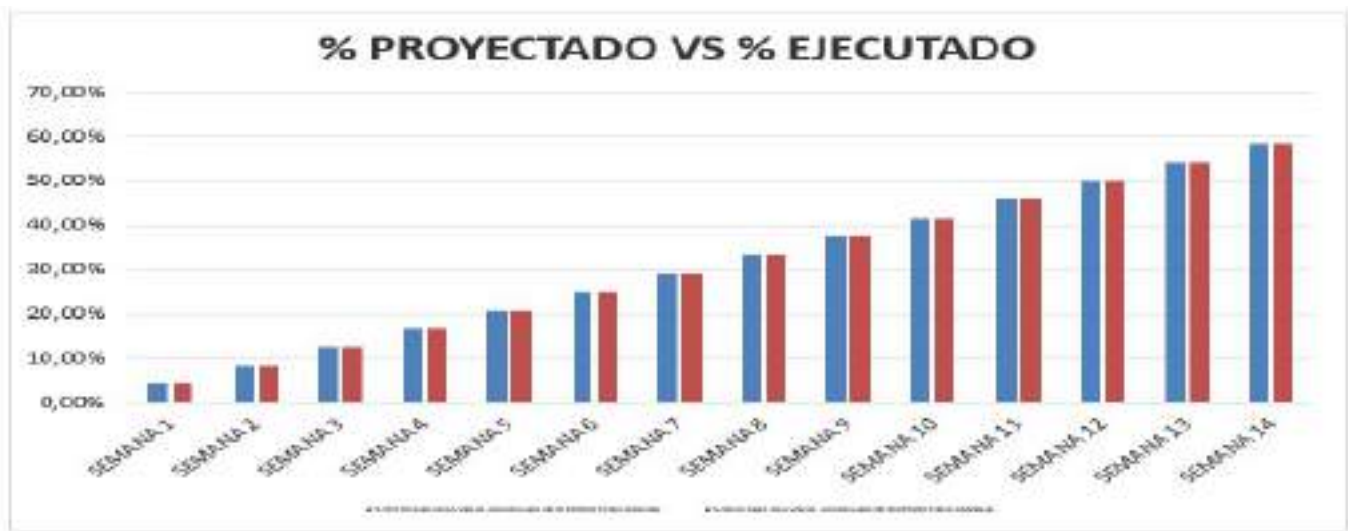

PLAZO CONTRACTUAL EN SEMANAS	% PROYECTADO DE AVANCE ACUMULADO DE INTERVENTORIA SEMANAL	% EJECUTADO DE AVANCE ACUMULADO DE INTERVENTORIA SEMANAL	% EJECUTADO DE AVANCE ACUMULADO DE TIEMPO
SEMANA 1	4,17%	4,17%	4,17%
SEMANA 2	8,33%	8,33%	8,33%
SEMANA 3	12,50%	12,50%	12,50%
SEMANA 4	16,67%	16,67%	16,67%
SEMANA 5	20,83%	20,83%	20,83%
SEMANA 6	25,00%	25,00%	25,00%
SEMANA 7	29,17%	29,17%	29,17%
SEMANA 8	33,33%	33,33%	33,33%
SEMANA 9	37,50%	37,50%	37,50%
SEMANA 10	41,67%	41,67%	41,67%
SEMANA 11	45,83%	45,83%	45,83%
SEMANA 12	50,00%	50,00%	50,00%
SEMANA 13	54,17%	54,17%	54,17%
SEMANA 14	58,33%	58,33%	58,33%

VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO
\$ 137.025.933	\$ 137.025.933



INFORME DE INERVENTORÍA

12. COMPONENTES ADMINISTRATIVOS.

En el periodo reportado se evidencian los siguientes eventos:

- El periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2023 al 6 de octubre de 2023, se cerró con un personal administrativo equivalente a 7 empleos. Compuesto por:

DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
PROFESIONAL SST	1
AUXILIAR DE OBRA	1
MAESTRO DE OBRA	1
RESIDENTE SOCIO-AMBIENTAL	1
RESIDENTE SST	1

- El personal de interventoría cerró con siete unidades:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
AUXILIAR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE SST	1
RESIDENTE SOCIAL	1
RESIDENTE ESTRUCTURAL	1
RESIDENTE AMBIENTAL	1

Se comprobó que todo el personal que intervino en el proyecto estuvo vinculado al sistema de seguridad social.

[Anexo N°4 control de personal en obra del constructor y de Interventoría.](#)



13. NOVEDADES DEL EQUIPO PROFESIONAL

Para el presente informe de interventoría se conserva la relación inicial del personal de los equipos y profesionales del contratista y de interventoría.

- A continuación, se menciona el grupo de profesionales actuales del constructor:

CARGO	NOMBRE
Director de obra	LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN
Residente de obra	YOVANY AUGUSTO ZAPATA ZABALA
Auxiliar de obra	LEANDRO SERNA RICARDO
Profesional SST	EVELYN CRISTANCHO SÁNCHEZ
Residente SST	DORA MARIA MARIN QUIROZ
Residente socio-ambiental	ANGELA
Maestro de obra	WILDER ANTONIO USUGA

- Se relaciona el grupo de profesionales actuales de la interventoría:

CARGO	NOMBRE
Director de interventoría	JOSÉ FERNANDO ÁLZATE
Residente de Interventoría	MAURICIO OYOLA MONTES
Tecnóloga Obras Civiles	SILVANA MONTOYA
Residente SST	ANYI ALEJANDRA LÓPEZ
Residente Social	MÓNICA QUIROS
Residente Ambiental	JUAN SEPÚLVEDA
Residente Estructural	JUAN SEBASTIÁN MONSALVE

[Anexo N°4 control de personal en obra del constructor y de Interventoría.](#)

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME DE INERVENTORÍA

14. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE OBRA

El periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2023 al 6 de octubre de 2023, se cerró con un personal operativo equivalente a 34 empleos. Compuesto por:

CONSOLIDADO PERSONAL			
ÁREA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
ADMINISTRATIVO CONSTRUCTOR	3	3	6
ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA	4	3	7
MAESTRO DE OBRA	1		1
OFICIALES OBRA NEGRA	4		4
SOLDADORES	2		2
AYUDANTES	14		14
			34

En el proyecto de la construcción de obras para la terminación y puesta en funcionamiento de los componentes de la unidad deportiva del Municipio de Dabeiba; se tienen las siguientes novedades en su personal:

NOVEDADES	
INGRESOS	4
RETIROS	2

[Anexo N°4 control de personal en obra del constructor y de Interventoría.](#)



INFORME DE INTERVENTORÍA

15. CONTROL DIARIO DE INTERVENTORIA CON NOMBRE, CÉDULA Y NOVEDADES

En la siguiente tabla se resumen las novedades que se presentaron en el mes, la información completa reposa en el adjunto que se citará más adelante.

CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
71682952	José Fernando Álzate	Director de interventoría	7 julio 23	N/A
1069505802	Mauricio Oyola Montes	Residente de interventoría	7 julio 23	N/A
1066573710	Silvana Montoya Areiza	Aux. de interventoría	7 julio 23	N/A
1028034664	Anyi Alejandra López	Residente SST	7 julio 23	N/A
1128278613	Juan Sebastián Monsalve	Residente Estructural	7 julio 23	N/A
1036649373	Mónica Quiroz	Residente Social	1 agos 23	N/A
1067857697	Juan Sepúlveda	Residente Ambiental	7 julio 23	N/A

16. REGISTRÓ DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

En el periodo reportado se evidencian los siguientes elementos y que corresponden a la maquinaria y equipos en obra:

- El periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2023 al 6 de octubre de 2023, se cerró con:

Motosierra	1
Tronzadora	1
Pulidora	1
Radial	1
Concretadora	1
Cono slum	1
Cilindros toma de muestras	4
Compresor de aire	1
Cortadora de concreto	1



Vibro de concreto	1
Soldador	1
Compactador tipo rana	1
Compactador tipo canguro	1
Planta eléctrica	1

[Anexo N°5 Cuadro de maquinaria y equipo](#)

17. CONTROL DIARIO DE LOS EQUIPOS DE INTERVENTORÍA.

En el transcurso del mes se ha realizado revisión y el mantenimiento a los equipos de oficina, es decir los computadores, las impresoras y demás elementos fueron supervisados técnicamente y dejados a punto.

Permanece, todo el mobiliario (mesas, sillas, armarios, estanterías y archivadores). Se calibraron nuevamente las herramientas menores para La toma de mediciones y registros fotográficos se llevaron cabo con equipo en buen estado,

Permanente reposición y un debido control, el resto de material de oficina, como el papel, la tinta o el tóner que se usa para imprimir o hacer fotocopias, los bolígrafos, los rotuladores o marcadores, los archivadores A-Z, los cuadernos, o blocs, las notas adhesivas y un largo etcétera,

El siguiente equipo y accesorios, fue el encargado de un adecuado desempeño por parte de la Interventoría.

DESCRIPCION	CANTIDAD
Computador Portátil	4
Impresora, escáner	1
Celulares	4



18. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORÍA

En el periodo reportado se han ejecutado las siguientes actividades:

- Controles legales
- Controles técnicos
- Control financiero
- Control ambiental
- Control de seguridad y salud en el trabajo en la obra
- Revisión de planos.
- Revisión de la programación semanal de Obra programada Vs ejecutada
- Convocar y liderar dos comités de obra
- Emisión de correspondencias
- Registro diario de lluvias.
- Registro diario del personal en obra.
- Registro diario de equipo.
- Registros diarios de todo lo acontecido en cada jornada laboral

19. FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.

- Conocer el contrato de obra civil y anexos que se celebre entre el Municipio de Dabeiba y el contratista ASOMUDACAR, así mismo deberá conocer todos los documentos que lo integren como términos de condiciones, presupuesto, especificaciones técnicas entre otros.
- Realizar la interventoría integral sobre las obras de :TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA .Organizar y poner a disposición del proyecto todo el recurso humano y técnico requerido, ofrecido y apropiado para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del interventor el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y reconocimientos del personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como la elaboración de los subcontratos



necesarios, dejando expresa constancia de que el Municipio de Dabeiba no asume ninguna relación ni vínculo de tipo laboral o prestacional con el personal del interventor.

- Tener conocimiento completo y detallado del Pliego de Condiciones de la nombrada Licitación Pública (si existiere), sus adendas y aclaraciones, de la propuesta presentada por el proponente adjudicatario de la misma y de cualquier otro documento que haga parte del contrato que se suscriba. Para tal efecto la interventoría deberá revisar previamente a la iniciación de las obras los planos de la obra, tanto técnicos, con el fin de constatar la total coordinación entre ellos, para su debida aplicación en la ejecución de la obra.
- Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista el programa de trabajo para la ejecución de las obras.
- Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de la obra, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo de los contratos.
- Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme al pliego de condiciones y a la propuesta técnica - económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato que resulte de la citada licitación.
- Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes. Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos corresponden.
- Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente corrección.
- Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del proyecto estén debida y completamente definidas. En el evento de no presentarse igualdad entre las especificaciones particulares establecidas en las cantidades de obra y las fijadas en las especificaciones generales de construcción establecidas por la administración, primarán aquellas que figuren en los respectivos planos. De presentarse dudas sobre este particular, deberá formularse consulta por escrito a la supervisión del contrato por parte del Municipio, para efectos de clarificación escrita por parte de ésta.
- Señalar el sitio de colocación y recibir al inicio de las obras (en el caso de estar convenido contractualmente) la valla que identifique el contrato y la obra, de acuerdo con el diseño que haya establecido el Municipio a través de la supervisión del contrato.
- Suministrar al contratista, todos los planos, detalles y especificaciones técnicas necesarias, que deba utilizar en la ejecución del contrato.



- Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños por parte del contratista de obra, incluyendo la supervisión a las diligencias que ejecute el contratista ante la electrificadora local (si el contrato lo contempla) y el ente certificador del RETIE.
- Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos realizados y compararlos con los previstos en el cronograma contractual como justificación para la autorización de los pagos establecidos.
- Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de lo contratado y en defensa de los intereses de la Entidad representada en el funcionario que el Ordenador del Gasto designe.
- Presentar de acuerdo con lo que se convenga con el funcionario que el Ordenador del Gasto designe, los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la interventoría, etc. En forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos.
- Comunicar previamente al Supervisor en forma inmediata todas las determinaciones sobre posibles cambios, que se tengan que hacer en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones y órdenes dirigidas al contratista. El Supervisor que el Ordenador del Gasto determine, podrá rechazar o modificar las determinaciones que crea conveniente.
- Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
- Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato como funciones de carácter técnico.
- Coordinar de común acuerdo con la Entidad, los cambios necesarios en los planos y especificaciones de las obras y suministros.
- Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones del Pliego de Condiciones de la licitación mencionada.
- Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos dentro de los plazos aportados con la supervisión del funcionario que el Ordenador del Gasto determine. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre la aplicación de las sanciones.
- Realizar las funciones específicas determinadas en el contrato de interventoría así:
 - Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de los trabajos.



- Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista los informes y las cuentas que el contratista presente a la Entidad.
- Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, datos, estudios e informes y otros documentos en poder de la Entidad, que sean necesarios para los trabajos del contratista.
- Ordenar al contratista el cumplimiento de las labores que estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el desarrollo del objeto.
- Presentar informe final por escrito.
- Y todas aquellas que sean pactadas dentro del contrato.
- Conceptuar dentro de los cinco (5) días siguientes a la iniciación de la obra, sobre la documentación presentada por el contratista: a) Plan de inversión del anticipo, (si existiere) b) Programa de insumos y personal, c) Programa de utilización de maquinaria y equipos, d) Programa de trabajo e inversión, e) Diagrama de ruta crítica para la construcción y f) Programa de Seguridad Industrial.
- Suscribir conjuntamente con el Contratista y el Supervisor del contrato de interventoría, el acta de Iniciación del contrato, dentro del término que haya sido establecido en el mismo.
- Exigir y recibir, para efectos de revisión y control, dentro del plazo estipulado en el contrato, una programación gráfica de los trabajos y un flujo mensual de caja, los cuales deberán ser presentados por el Contratista dentro del mismo término. Copias de estos documentos serán enviadas por la Interventoría a la supervisión del contrato.
- Verificar que el contratista desarrolle la labor con el residente y demás personal del mismo, indicados en su oferta. Para el cambio de estos profesionales, el contratista deberá contar con el visto bueno de la interventoría y del Municipio.
- Abrir y llevar conjuntamente con el Contratista, una memoria diaria de la obra en un tomo denominado “Bitácora o Libro de Obra”, en donde se harán constar las acciones realizadas diariamente en ella, así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones que de parte de alguno de los participantes de la obra se hagan constar. Este libro formará parte integral de los documentos del contrato. Aquí también podrán constar conceptos técnicos de consultores externos a la obra, y deberá ser entregado por la Interventoría, al finalizar el contrato. Este libro debe ser firmados por personal representante de la interventoría, del contratista y eventualmente si se requiere por parte del representante del Municipio.
- Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos periódicamente y citar a estos al Contratista y al Supervisor del contrato de interventoría.



- Verificar la ubicación de los campamentos y de los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la construcción.
- Verificar los cerramientos y el trámite de los permisos correspondientes por parte del contratista, antes del inicio de la obra.
- Efectuar dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados, las cuales se deberán hacer constar en formatos diseñados para el efecto, discriminando fechas, especificación del ítem medido, su ubicación en la obra (identificando ejes de construcción), unidad y cantidad de medida. Con base en estas medidas deberá efectuar los cortes mensuales de obra, haciéndolos constar en el formato respectivo, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de la Obra.
- Remitir al supervisor, en forma mensual, copias de los formatos de medidas y de los cortes de obra; así como un informe detallado de la obra ejecutada, del personal y materiales en ella, junto con una reseña fotográfica que deberá entregar el interventor, para efectos de llevar un control de la obra en esa oficina.
- Elaborar, con base en los cortes mensuales de obra, las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales suscribirá conjuntamente con el Contratista. El valor de estas actas no podrá ser inferior al porcentaje estipulado en contrato y las copias de estas actas deberán ser remitidas a la supervisión del contrato.
- Exigir para la ejecución de la obra, materiales, mano de obra y elementos de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos, cantidades de obra y pliegos de condiciones de la nombrada Licitación, que hayan servido de base para la adjudicación del contrato.
- Ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que sean requeridos para establecer exactamente la buena calidad de los materiales y mezclas de concretos a emplear y con base en los resultados de los mismos, proceder a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos. Para los ensayos de los concretos se deberá tener en cuenta lo establecido en el Código Colombiano de Construcciones Sismo- resistentes NSR-10. Para ensayos de otros materiales se deberán usar las condiciones estipuladas en códigos específicos. Copias de los resultados de todas y cada una de estas pruebas o ensayos serán remitidos al supervisor del contrato, discriminando la ubicación, el orden y la fecha en los cuales se ejecutaron. Los controles de concretos se deberán consignar en los formatos correspondientes, diseñados conjuntamente entre el contratista y la interventoría.
- Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes NSR-10, del RETIE, del RAS y las



normas técnicas que cobijan la calidad y funcionamiento de los demás bienes y servicios que son objeto del contrato al que se hará interventoría.

- Exigir el total cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones de construcción para todos los ítems de la obra, así como las que aparezcan en los planos constructivos.
- Exigir buena calidad de obra para todos y cada uno de los ítems de construcción, considerando que obra mal ejecutada no podrá ser recibida en ninguna de las actas del contrato.
- Aprobar o improbar la iniciación o terminación de los ítems contratados, teniendo en cuenta además la programación establecida para los trabajos.
- Ordenar la remoción y el reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto un plazo determinado mediante comunicación escrita.
- Verificar que el Contratista cuente en la obra con el equipo y la maquinaria necesarios, los cuales deberán estar en perfectas condiciones de servicio, exigiéndolos si faltaren o si se hallaren en mal estado que sean reparados o cambiados en el menor tiempo posible para permitir una correcta ejecución de la obra.
- Verificar que el Contratista tenga previsto en la obra todos los medios y los recursos para mantener la seguridad dentro de ella y que permitan mantener y favorecer, durante todo el tiempo de la ejecución de la obra, la integridad personal de quienes laboran o permanecen en ella.
- Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra, pudiendo modificarla cuando por razón técnica o dada la naturaleza de la obra, esto se haga necesario, pero sin modificación al plazo inicial o adicionalmente pactado en el contrato. Cualquier modificación que sea realizada deberá ser remitida a la Supervisión del contrato, adjuntando la respectiva reprogramación de la obra y el flujo de caja correspondiente a esta.
- Resolver las consultas que presente el Contratista y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la marcha de la obra se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas en la obra de acuerdo con los planos constructivos y las especificaciones de construcción, deberán ser remitidas para la consulta y decisión, mediante oficio al supervisor del contrato, con la anticipación suficiente a fin de no entorpecer la obra.
- Remitir al supervisor del contrato, para el trámite de aprobación ante el ordenador del gasto, y con la anticipación suficiente, los estudios correspondientes, en caso de presentarse durante la marcha de la construcción, mayores cantidades de obra, obras complementarias, adicionales o suprimidas, contemplando, si hubiere lugar a ello, el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de las tres



primeramente citadas. Estos estudios corresponden a modificaciones al valor o al plazo de los contratos.

- Suscribir, en el evento de requerirse obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el Contratista y de forma previa a que se eleve la solicitud respectiva ante el ordenador del gasto, las Actas de Precios no pactados, para los ítems cuyos valores no aparezcan en el presupuesto inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos como parte integral de los estudios que presente para la aprobación del ordenador del gasto, por intermedio de la supervisión del contrato.
- Recibido el Contrato Adicional o la orden escrita del Ordenador del Gasto, el interventor podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. Para estas obras se deberá seguir exactamente el mismo procedimiento descrito para las obras inicialmente contratadas, es decir se hará el control de calidad de los materiales, mano de obra y de los elementos que se vayan a utilizar en su construcción y serán medidas y recibidas, previa elaboración de los diarios de medidas y cortes mensuales, en Actas de Recibo. Estas Actas de Recibo de obras contratadas adicionalmente, serán enumeradas en forma independiente a las actas de Recibo Parcial de obra del Contrato Inicial o Principal, llevando además un orden consecutivo para cada uno de los tipos descritos de obras (mayor cantidad de obra, obra complementaria o adicional). Copia de todos los formatos de Diario de Medidas, Cortes Mensuales de Obra, Actas de Recibo, Pruebas y Ensayos de Laboratorio, etc., deberán ser remitidas al supervisor del contrato.
- Elaborar durante la marcha del contrato, el cuadro de liquidación de obra, discriminando los ítems y las cantidades de obra recibidas en cada una de las actas del contrato. Copias de estos formatos deberán ser remitidas por la Interventoría al supervisor del contrato, una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra.
- Estudiar, en caso de solicitud de prórroga del plazo del contrato, la posibilidad de concesión de la misma, con o sin aplicación de la sanción establecida, y remitir el estudio respectivo para la revisión del supervisor, con una anticipación mínima de diez (10) días calendario antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido. Esta prórroga se entenderá efectuada una vez el ordenador del gasto suscriba la minuta correspondiente.
- Suscribir, en caso de ser necesario, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, el acta de Suspensión Temporal del contrato, que deberá ser avalada con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
- Suscribir, una vez superadas las condiciones que generaron la suspensión del contrato, el Acta de Reiniciación respectiva, conjuntamente con el Contratista y el



supervisor del contrato de interventoría, dejando constancia del tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento final del contrato.

- Verificar que el contratista modifique la garantía única constituida para amparar el contrato en caso de suspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo.
- Constatar, una vez recibida la comunicación del Contratista sobre la fecha de entrega final de la obra, el estado de la misma y ordenar el arreglo o reconstrucción de toda la obra o montaje que encuentre deficiente o defectuoso. Si llegare a existir duda sobre resistencia de algún elemento estructural, constatada contra los resultados de las pruebas y los ensayos de laboratorio realizados, podrá ordenar la correspondiente prueba, la cual estará a cargo del contratista. Copia de la comunicación citada deberá remitirla al supervisor del contrato de Interventoría, así como de las pruebas realizadas si tuviere lugar, junto con los respectivos resultados.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el Contratista y el supervisor del contrato de interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra. En esta Acta se hará constar el estado en que se recibe la obra contratada, el valor final del contrato incluyendo los reajustes o revisiones de precios y los datos que exija el Estatuto contractual vigente.
- Exigir al Contratista la modificación del amparo de estabilidad de obra a la fecha de recibo a satisfacción de la misma.
- Elaborar, una vez sea recibida la obra, un Acta de Preliquidación Final del Contrato, basada en un cuadro general de liquidación de obra en donde aparezcan todas las cantidades de obra recibidas y remitirlos a la supervisión del contrato de interventoría. . En esta acta se deberán discriminar todos los valores del contrato, por actas incluyendo las de reajustes o revisiones de precios.
- Elaborar, con base en el acta de preliquidación aprobada y aceptada, el acta de liquidación del contrato, suscrita por el contratista, el Interventor y el ordenador del gasto.
- Recomendar la adopción de medidas legales en caso de incumplimiento del contratista, previo agotamiento del debido proceso frente al mismo.
- Conceptuar sobre la viabilidad técnica y económica de las adiciones o modificaciones al contrato, solicitadas por el contratista o requeridas por la entidad.
- Conceptuar sobre la viabilidad técnica y económica de las solicitudes de reajuste o revisión de precios del contrato.
- Conceptuar sobre la viabilidad técnica y económica de las solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
- Aprobar las facturas o sus similares, que sean emitidas por el contratista, para que la entidad proceda al pago correspondiente.



INFORME DE INERVENTORÍA

- Apoyar técnica y económicamente a la entidad en la proyección de los actos administrativos que deban expedirse en ejecución del contrato.
- Verificar que el contratista de obra, mantenga el equipo de trabajo propuesto. Durante toda la ejecución del contrato de obra.

20. CUADRO DE LLUVIAS

Durante el periodo se presentaron lluvias durante 1 día en la madrugada, 1 día en la mañana sin afectación directa a las actividades de obra en curso. (VER ANEXO)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CV 029 -2023 ALINAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA		INFORME MENSUAL N° 3 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 6 DE OCTUBRE DE 2023																												
CUADRO DE REPORTE DE ESTADO DEL TIEMPO																														
JORNADA	SEPTIEMBRE											OCTUBRE																		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
MADRUGADA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MAÑANA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TARDE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> N NUBLADO LL LLUVIAS S SOL </div> <div style="margin-top: 5px;"> DIAS FESTIVOS </div>																														
ELABORADO POR: SILVANA MONTOYA ARIZA AUX. DE INTERVENTORIA SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S																														



21. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

21.1 CORRESPONDENCIA GENERAL ENVIADA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada en este periodo:

FECHA	ENVIADA	ASUNTO
16 sept 23	INTERCANFUTDAB-AMB-001-2023	Solicitud de Informe Ambiental y Anexos.
18 sept 23	INTERCANFUTDAB-AMB-002-2023	Observaciones Informe Ambiental Periodo 7 de agosto - 7 de septiembre de 2023
19 sept 23	INTERCANFUTDAB-AMB-003-2023	Respuesta Oficio Ambiental DB-SO-AMB_19_09_2023_5
30 sept 23	INTERCANFUTDAB-004-2023	Requerimientos de seguridad y salud en el trabajo, documentos de ingreso de vehículos a la obra.
2 oct 23	INTERCANFUTDAB-TEC-005-2023	Presunto incumplimiento de requerimientos varios de obra, perteneciente al convenio de la referencia.
3 oct 23	INTERCANFUTDAB-TEC-006-2023	Requerimientos de documentación de soporte técnica y administrativas pendientes de sustentación, correspondientes al convenio de la referencia.
6 oct 23	INTERCANFUTDAB-TEC-008-2023	Remisión de concepto técnico sobre viga de fundación para estructura metálica de la cubierta en placa polideportiva, correspondientes al convenio de la referencia.

[Anexo N°6 correspondencia generada](#)

21.2 CORRESPONDENCIA GENERAL RECIBIDA

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida en este periodo:

FECHA	RECIBIDA	ASUNTO
3 oct 23	SERGIO DOMINGUEZ Asesor estructural contratista	Respuesta a observaciones.

[Anexo N°7 correspondencia recibida](#)



INFORME DE INERVENTORÍA

23.CONCLUSIONES

Siendo este informe el tercero del plazo total del convenio que comprende la construcción de obras para la terminación y puesta en funcionamiento de las graderías, cancha de futbol, cubierta metálica placa polideportiva, cancha sintética de futbol y pista de trote y demás obras complementarias de la unidad deportiva del municipio de Dabeiba, Antioquia; la interventoría realizó el respectivo acompañamiento a los procesos ejecutados por el conveniente de obra desde los aspectos técnicos, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental, se presentan las siguientes conclusiones.

Técnicamente, el convenio de obra se viene ejecutando a buen ritmo por parte del subcontratista delegado por ASOMUDACAR, aclarando que el avance porcentual obtenido para el presente informe deriva principalmente del inicio de las actividades de suministro de la grama sintética y su posterior instalación, prevista para la segunda semana del mes de octubre de 2023. A esta actividad puntual, se suman las actividades en actual ejecución, entre las que se destacan la instalación de los aceros de refuerzo y vaciado de concretos de las estructuras de cimentación para la posterior construcción de la cubierta de la placa polideportiva, seguido de los trabajos de soldadura para dicha estructura metálica de la cubierta mencionada. Así mismo, y como se había expresado en el inicio del presente párrafo, se ejecutan y terminan las actividades de nivelación de la capa de triturado en el que se empezara a colocar los rollos de la grama sintética de la cancha de futbol.

Las actividades ejecutadas y mencionadas anteriormente, se ejecutan a cabalidad de la descripción de los ítems del presupuesto bajo la vigilancia y control de la interventoría, en campo, acatando las especificaciones de los planos del proyecto. Sin embargo, se esta a a espera del pronunciamiento de la Administración Municipal con respecto a las memorias de cálculo estructural y estudios de suelos para poder determinar si las inconsistencias halladas (descritas en los informes anteriores), cumplen con la normativa aplicada para dicho diseño y de esta manera avalar o no los argumentos del contratista y pago respectivo de dicho ítem.

Con los avances descritos, las actividades ya ejecutadas y otras con el suministro oportuno de materiales, se observa, al comparar con la programación de obra que, el convenio presenta un porcentaje de ejecución del 13,74% por encima de lo programado. Siendo la fecha de corte el 8 de octubre de 2023 (semana 14), el avance acumulado esperado es del 40,14%, equivalente en dinero a \$1.222.741.040 contra un 53,89% de progreso medido en obra y equivalente en dinero a \$ 1.641.403.167. Dentro de este avance, se han tenido en



cuenta, las obras de mayores y/o menores cantidades a ejecutarse y las obras extras que han surgido producto de mejoras a los procesos constructivos y obras que no pudieron ser prevista en la etapa de diseño por la incertidumbre que había al momento de la planificación y que solo eran evaluables al momento de ejecutar actividades específicas del objeto contractual. Por consiguiente, se mantiene el equilibrio del convenio de obra a fin de terminar con el presupuesto establecido el respectivo del convenio.

Observando ya los componentes administrativos y legales; se tiene una modificación del convenio de obra, específicamente el Otrosí no. 1 modificadorio que hace referencia a la forma de desembolso de los recursos del convenio interadministrativo de asociación / obra n° cv-019 de 2023, en su clausula quinta, ratificando un pago anticipado del 40% y el porcentaje restante, pagado mediante actas de avance de obra, dejando un 10% para la liquidación del mismo. Dicho Otrosí, está debidamente legalizado ante el ente conveniente contratante, al igual que el convenio de interventoría que se mantiene sin modificaciones a la fecha de este informe. Las pólizas no sufren modificación y se mantienen las actuales pólizas ya aprobadas mediante acto administrativo pertinente.

Con respecto al pago derivado de las modificaciones al convenio inicial y ya descritos anteriormente, se está a la espera de que el contratista presente la resolución del acta de avance realizada en este periodo de ejecución, de acuerdo a las indicaciones dadas por la interventoría. El monto de esta acta se estima por encima del 50% del valor del convenio y de este se deberá realizar el descuento del pago anticipado realizado al inicio del presente convenio de obra.

Se continua a la espera de algunos documentos solicitados al subcontratista de acuerdo a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, documentos ambientales faltantes y ajustes al componente social.

De acuerdo a lo anteriormente descrito en esta conclusión, se puede afirmar que el avance es óptimo, según la programación de obra, pero se deberá tener principal cuidado en el avance de la instalación de la grama sintética, pues esta representa un avance significativo en el proyecto y demanda una ejecución eficaz y bajo los parámetros de diseño dados para su recepción a satisfacción por parte de la Administración Municipal. Es de esperar que, el subcontratista mantenga los recursos mínimos para el avance ideal, acatando siempre las recomendaciones de la interventoría y que son debidamente consignadas en la bitácora de obra y las correspondencias a que den lugar durante los procesos constructivos.



INFORME DE INERVENTORÍA

24. INFORME EJECUTIVO DE ESPECIALISTAS

24.1 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se realiza un seguimiento continuo de la ejecución de los planes y programas ambientales realizados en obra.

[Anexo N°8 Informe de Gestión Ambiental](#)

24.2 INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realiza un seguimiento continuo de la ejecución de las actividades enmarcadas en la normatividad vigente en referencia al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en El Trabajo y Seguridad Social.

[Anexo N°9 Informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo](#)

24.3 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Se realiza un seguimiento continuo de la ejecución de las actividades enmarcadas en la normatividad vigente en referencia al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en El Trabajo y Seguridad Social.

[Anexo N°10 Informe de Gestión Social.](#)

24.4 INFORME DE ESPECIALIDAD ESTRUCTURAL

Se realiza un seguimiento continuo de la ejecución de las actividades enmarcadas en la normatividad vigente en referencia al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en El Trabajo y Seguridad Social.

[Anexo N°11 Informe de Especialidad Estructural.](#)



25 LISTADO DE ANEXOS

- [Anexo N°1 Pólizas actualizadas Interventoría y contratista de Obra](#)
- [Anexo N°2 Copia de bitácora](#)
- [Anexo N°3 Copia del informe mensual presentado por el contratista de obra](#)
- [Anexo N°4 Control de personal en obra del constructor y de Interventoría](#)
- [Anexo N°5 Cuadro de maquinaria y equipo](#)
- [Anexo N°6 correspondencia enviada](#)
- [Anexo N°7 correspondencia enviada](#)
- [Anexo N°8 Anexo Informe de Gestión Ambiental](#)
- [Anexo N°9 Informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo](#)
- [Anexo N°10 Informe de Gestión Social](#)
- [Anexo N°11 Informe de Especialidad Estructural](#)



ARQ. JOSÉ FERNANDO ÁLZATE

Director de interventoría

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



ANEXO N°1 PÓLIZAS ACTUALIZADAS INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.





INFORME DE INERVENTORÍA

PÓLIZAS ACTUALIZADAS INTERVENTORÍA

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición RIONEORO, 07 DE JULIO DE 2023	Póliza 3482447-5	Documento 15158492
Intermediario GLORIA ESTELLA GONZALEZ PALACIO	Código 13611	Oficina 4036
		Referencia de Pago 01215158492

TOMADOR

NT 8021088486	Razón Social y/o Nombres y Apellidos MPIOs ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES MASER
Dirección CL. 46 32A 14	Ciudad MEDELLIN
	Teléfono 2041105

GARANTIZADO

NT 8021088486	Nombres y Apellidos MPIOs ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES MASER
------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NT 8029800945	Nombres y Apellidos MUNICIPIO DE DABEIBA
------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	28-JUN-2023	28-DIC-2023	48.125.712,00	74.515,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-JUN-2023	28-JUN-2024	48.125.712,00	193.030,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28-JUN-2023	28-DIC-2024	48.125.712,00	509.912,00
VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)
Desde: 28-JUN-2023	Hasta: 28-DIC-2024	Días: 1279	Desde: 28-JUN-2023	Hasta: 28-DIC-2024
			\$795.458	\$151.137
				TOTAL A PAGAR
				\$946.595

VALOR A PAGAR EN LETRAS
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$144.377.136	Prima Anual \$529.383	Total Valor Asegurado \$144.377.136,00
-------------------------------	---	--------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/95 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 008961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACION	MONEDA	COASEGURO	NUMERO POLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPANIA LIDER
012	NDX	4036	CUN602	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANIA	CATEGORIA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA
13611	GLORIA ESTELLA GONZALEZ PALACIO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NATURAL	100,00	795.458

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se aplica	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Rango al cual accede	Identificación interna de la plataforma
CÓDIGO CLAUSULA DE	11/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/04/2017	13 - 18	NT-P	3	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
NRO. DE CONTRATO CV 020 DE 2023.
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA

Número de Póliza

3682447

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

NIT

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

6001088486

Número de Documento

8909800945

[Ver Anexos \(1\)](#)

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición RIONEGRO, 12 DE JULIO DE 2023	Póliza 3482447-E	Documento 15168704
Intermediaria GLORIA ESTELLA GONZALEZ PALACIO	Código 13611	Oficina 4038
		Referencia de Pago 01215168704

TOMADOR

NIT 8001088486	Reazón Social y/o Nombres y Apellidos MPIO5 ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES MASER
Dirección CL. 4A 52A 14	Ciudad MEDELLIN
	Teléfono 2941155

GARANTIZADO

NIT 8001088486	Nombres y Apellidos MPIO5 ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES MASER
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 890980945	Nombres y Apellidos MUNICIPIO DE DABEIBA
------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	07-JUL-2023	06-ENE-2024	48.125.712,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-JUL-2023	07-JUL-2024	48.125.712,00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07-JUL-2023	06-ENE-2027	48.125.712,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
07-JUL-2023	06-ENE-2027	1233	07-JUL-2023	31-DIC-2024	\$0	\$0	\$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$0	Prima Anual \$529.283	Total Valor Asegurado \$144.377.136,00
--	-----------------------------------	--------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2519/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

161 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LÍDER
012	NDK	4008	78902	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPañIA	CATEGORÍA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA
13611	GLORIA ESTELLA GONZALEZ PALACIO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NATURAL	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza
CÓDIGO CLAVISULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	P-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
NRO. DE CONTRATO CV 020 DE 2023.
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES:

RIONEGRO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CÓDIGO: 2455475501

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-1
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
[GARANTÍA ÚNICA]



Ciudad y Fecha de Expedición RIONEGRO, 12 DE JULIO DE 2023	Póliza 3682447-5	Documento 15168704
Intermediaria GLORIA ESTELLA GONZALEZ PALACIO	Código 13611	Oficina 4038
		Referencia de Pago 01215168704

TOMADOR

NIT 8001088466	Razón Social y/o Nombres y Apellidos MPIO5 ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES MASER	
Dirección CL. 46 52A 14	Ciudad MEDELLIN	Teléfono 2041155

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2023, SE MODIFICA LA VIGENCIA DELA
POLIZA

MEDELLIN - RIONEGRO - RIONEGRO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:

RIONEGRO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 2455475501

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 940.903.493-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 2

Datos de Póliza

Número de Póliza

3682447

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

8001088486

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

8309800945

Ver Anexos (2)



INFORME DE INERVENTORÍA

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA.



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950022466

PÓLIZA No: 595-47-99400000748 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**
DIA MES AÑO: **05 07 2023** DIA MES AÑO: **05 07 2023**
FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE** IDENTIFICACIÓN: **NIT 901.415.647-5**
DIRECCIÓN: **CARRERA 50 #56 - 42** CIUDAD: **NECOCLI, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **3176165442**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: **MUNICIPIO DE DABEIBA** IDENTIFICACIÓN: **NIT 890.980.094-5**
BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE DABEIBA** IDENTIFICACIÓN: **NIT 890.980.094-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	CUMPLIMIENTO	28/06/2023	28/12/2024	622,119,535.80
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/06/2023	28/12/2026	622,119,535.80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	VER NOTA ACLARATORIA		622,119,535.80
	PAGO ANTICIPADO	28/06/2023	28/12/2024	1,244,239,071.60

BENEFICIARIOS
NIT 890980094 - MUNICIPIO DE DABEIBA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION Nro. CV-019-2023, DE FECHA 28/06/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO O FORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *3,110,597,679.00	VALOR PRIMA: \$ *****40,505,947	CARGOS EXPEDICIÓN: \$ *****11,000.00	IVA: \$ *****7,698,220	TOTAL A PAGAR: \$ *****48,215,167
---	---	--	----------------------------------	---

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	SPART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	SPART	VALOR ASEGURADO
DURANGO E. Y CIA. LTDA	3437	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULARES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1881 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción **SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES**. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción **SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO**.

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**
(#16)7701961009019(8020)00009900007600896002246

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
DIRECCIÓN CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Semano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (001) 456 7174
Fax: (001) 456 7174 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensorasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahorra Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor llame en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2019 DICERO - REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8881, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EMISORA: SEAS URABA SEGUROS

CCOL AGENCIA: 595 RAMO: 17 No. PÓLIZA: 994000000748 AÑO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE

IDENTIFICACIÓN: NT 901.415.647-5

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DABEIBA

IDENTIFICACIÓN: NT 890.980.094-5

SENERCIARIO: MUNICIPIO DE DABEIBA

IDENTIFICACIÓN: NT 890.980.094-5

TEXTO ITEM 1

CONDICIONADO GENERAL: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-19-0001
NOTA TÉCNICA: 13/09/2017-1502-NT-P-05-P020817006018000

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
5950022482

PÓLIZA No: 595 -74 - 994000000146 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** CDD. AGE: 595 RAMO: 74 PAF:
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS
05 07 2023 **28 06 2023 23:59** **28 12 2023 23:59** **183** **05 07 2023**
 FECHA DE EMISIÓN VIGENCIA DE LA PÓLIZA VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA ALAS DIAS FECHA DE IMPRESIÓN
 MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

TPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION** VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA
28 06 2023 23:59 **28 12 2023 23:59** **183**
 VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.415.647-5**
 DIRECCIÓN: **CARRERA 50 #56 - 42** CIUDAD: **NEOCOCLI, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **3176165442**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.415.647-5**
 DIRECCIÓN: **CARRERA 50 #56 - 42** CIUDAD: **NEOCOCLI, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **3176165442**
 BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CA. NIT : 901415647**
 ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA** CIUDAD: **MEDELLÍN**
 DIRECCIÓN: **VIA URBANA No. 0-0**
 ACTIVIDAD: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
 TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA: **AV.-0**
 DESCRIPCIÓN AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLÍMITE
 CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES \$ 464,000,000.00 464,000,000.00
 DEDUCIBLES: **15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**
 BENEFICIARIOS
 NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**
 OBSERVACIONES

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No. CV-019-2023, DE FECHA 28/04/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AJUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DASEIBA, ANTIOQUIA.

OBSERVACIONES:

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****464,000,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****1,163,178	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****221,004	TOTAL A PAGAR: \$ *****1,384,182
---	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE DURANGOS E. Y CIA. LTDA	CLAVE 3437	%PART 100.00	VALOR ASEGURADO

LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR [415]7791861000019[8020]00000000007900095002244 FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-46 Piso 12 Bogotá YICRUZ 0

CBD125780FDDFETA57 CLIENTE Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (901) 458 7174
 Fax: (901) 458 7174 * Celular: 312 342 8229 * Correo electrónico: defensorasolidaria@gmail.com
 Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradora-solidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2690 ENL993 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 9801 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VILLANO SUPERVISOR GENERAL FINANCIERO DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS

000.AGENCIA: 395

TAMPO: 74

NO POLIZA: 994000000146

ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE

IDENTIFICACION: MT 901.415.647-5

ASEGURADO: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE

IDENTIFICACION: MT 901.415.647-5

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACION: MT 001-8

TEXTO ITEM 1

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- LOS TERCEROS AFECTADOS

- MUNICIPIO DE DABEIBA NIT. 890.980.094-5

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- MUNICIPIO DE DABEIBA NIT. 890.980.094-5

- ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE - ASOMUDACAR con NIT 901.415.647-5

* SE ACLARA QUE LA PÓLIZA EN ASUNTO ES CORRELATIVA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 994000000146.

CONDICIONADO GENERAL: 20/10/2021-1502-P-06-FATRI-CL-SUSP-04-DRO1

NOTA TÉCNICA: 30/10/2021-1502-WT-P-06-F201021MPP6P6001

**LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000146	ANEXO: 0	TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	PRIMA: 3
TOMADOR: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE		IDENTIFICADOR: 901.415.647-5	

ASEGURADOS							
ITEM	ASEGURADO	C.C. & NT	UBICACION DEL PRECIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	ASOCIACION DE MUNICIPIOS URA	901415647-5	VIA URBANA No. 0-0	MEDELLIN	664,000,000.00	1,163,178	1,384,182
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						1,163,178	1,384,182

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: **994000000748** Número de anexo: **0**

Agencia: **SEAS URABA SEGUROS** Ramo: **CUMP. ENT. ESTATALES**


Asegurado / Beneficiario: **MUNICIPIO DE DABEIBA**

Tomador / Garantizado: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE**

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 28 de junio de 2023	sábado, 28 de diciembre de 2024	\$622,119,535.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 28 de junio de 2023	lunes, 28 de diciembre de 2026	\$622,119,535.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	jueves, 28 de diciembre de 2023	jueves, 28 de diciembre de 2024	\$622,119,535.80
PAGO ANTICIPADO	miércoles, 28 de junio de 2023	sábado, 28 de diciembre de 2024	\$1,244,239,071.60

[Nueva Consulta](#)
[Visualizar PDF](#)



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICIUSP09V4

NÚMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
5950022466

POLIZA No: 595-47-994000000748 ANEXO: 0

AGENCIA SUREDOORA: SEAS URABA SEGIROS

COB AERTECA: 595 NAMA: 47

TPO DE MOVIMIENT: EXPEDICIONE

TPO DE OPERACION: SELECCION

DA: 05 MES: 07 AÑO: 2023 DA: 05 MES: 07 AÑO: 2023
FECHA DE EMISION: FECHA DE IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CABINE IDENTIFICACION NI: 901.415.647-5

DIRECCION: CARRERA 50 #56 - 42

SIGLAS: SECOCOLI, ANTIOQUIA TELEFONO: 3176156462

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DAREIBA

IDENTIFICACION NI: 890.980.094-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DAREIBA

IDENTIFICACION NI: 890.980.094-5

AMPAROS

CIRO DE NEGOCIO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPARO:

CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
PAGO ANTICIPADO

BENEFICIARIOS
NIT 890980094 - MUNICIPIO DE DAREIBA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

***OBJETO DE LA GARANTIA**

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION NRO. CV-019-2023, DE FECHA 28/06/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON APOYAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y FIESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL Y ADESNES, CUBIERTA METALICA GRADERAS DE FUTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SUBTERRANEA DE FUTBOL Y FIESTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DAREIBA, ANTIOQUIA.


*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE FIEBRO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	DEBITOS EMISION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ 3,110,597,679.00	\$ *****60,505,947	\$ *****11,000.00	*****7,698,220	\$ *****48,215,167
NOMBRE INTERSEGUARO:	CLAVE:	SPART:	SPART:	VALOR ASEGURADO:
COBARRIOS S. S CIA. LTDA	3437	100.00		

SE MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUEÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración: 1024 x 768
Derechos: Calle 105 No. 54-55, Puros by 12, P.O.M. - Colombia
Servicio al Cliente: Todos los Días de Lunes a Viernes



DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: 994000000146 **Número de anexo:** 0

Agencia: SEAS URABA SEGUROS **Ramo:** CUMP. ENT. ESTATALES

Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE TURBO

Tomador / Garantizado: ESTRADA RAMIREZ LUISA FERNANDA

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	Junes, 13 de febrero de 2023	sábado, 13 de abril de 2024	\$3.140.000,00

[Nueva Consulta](#) [Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegadores: Internet Explorer 9 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración: 1024 x 768
 Dirección: Calle 100 No. 54-45, Piso 8 y 12, SAN CARLOS, Bogotá D.C.
 Correo de Tecnología: Copyright@TribunalesColombianos.com

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950022466

PÓLIZA No: 595-47-99400000748 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**
DA MES AÑO DA MES AÑO
11 07 2023 11 07 2023
FECHA DE EXPIRACIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE** IDENTIFICACION: **MT 901.415.647-5**
DIRECCION: **CARRERA 50 #56 - 42** CIUDAD: **NECOCLI, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **3176165442**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: **MUNICIPIO DE DABEIBA** IDENTIFICACION: **NIT 890.980.094-5**
BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE DABEIBA** IDENTIFICACION: **NIT 890.980.094-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CONTRATO CUMPLIMIENTO	07/07/2023	07/01/2025	622,119,535.80
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	07/07/2023	07/01/2027	622,119,535.80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA	ACLARATORIA	622,119,535.80
	PAGO ANTICIPADO	07/07/2023	07/01/2025	1,244,239,071.60

BENEFICIARIOS
NIT 890980094 - MUNICIPIO DE DABEIBA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION Nro. CV-019-2023, DE FECHA 26/06/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL Y ANDEMES, CUBIERTA METALICA GRADAS DE FUTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ 3,110,397,679.00	VALOR PRIMA: \$ *****	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****
--	--------------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------------

NOMBRE INTERSEGURO	CLAVE	SPART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	SPART	VALOR ASEGURADO
DURANGO S. Y CIA. LTDA.	3437	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1801 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**
(415)77018100301980293060030000756099502246

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Pso 12 Bogotá CLIENTE
CBO125780F00FF7A5A

Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2600 DIC 03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8001 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS

COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000000748 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE

IDENTIFICACIÓN: NT 901.415.647-5

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DABEIRA

IDENTIFICACIÓN: NT 890.980.094-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DABEIRA

IDENTIFICACIÓN: NT 890.980.094-5

TEXTO ITEM 1

CONDICIONADO GENERAL: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-03-DOCI
NOTA TÉCNICA: 15/08/2017-1502-NT-P-05-POZ0817005018000

OBSERVACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL CONTRATO DIO INICIO EL 07 DE JULIO DE 2018.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950022482

PÓLIZA No: 595 -74 - 994000000146 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS			COD. AGE: 595	RAMO: 74	PAP:																																
<table border="1"> <tr><td>11</td><td>07</td><td>2023</td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>	11	07	2023	DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	<table border="1"> <tr><td>28</td><td>12</td><td>2023</td><td>23:59</td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>HORAS</td></tr> </table>	28	12	2023	23:59	DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA DESDE A LAS	<table border="1"> <tr><td>07</td><td>01</td><td>2024</td><td>23:59</td><td>10</td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>HORAS</td><td>DIAS</td></tr> </table>	07	01	2024	23:59	10	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	VIGENCIA HASTA A LAS	<table border="1"> <tr><td>11</td><td>07</td><td>2023</td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>	11	07	2023	DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN
11	07	2023																																			
DIA	MES	AÑO																																			
28	12	2023	23:59																																		
DIA	MES	AÑO	HORAS																																		
07	01	2024	23:59	10																																	
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS																																	
11	07	2023																																			
DIA	MES	AÑO																																			
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE A LAS		VIGENCIA HASTA A LAS		TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION																														
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL																																					

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	VIGENCIA DEL ANEXO	<table border="1"> <tr><td>28</td><td>12</td><td>2023</td><td>23:59</td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>HORAS</td></tr> </table>	28	12	2023	23:59	DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA DESDE A LAS	<table border="1"> <tr><td>07</td><td>01</td><td>2024</td><td>23:59</td><td>10</td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>HORAS</td><td>DIAS</td></tr> </table>	07	01	2024	23:59	10	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	VIGENCIA HASTA A LAS
28	12	2023	23:59																				
DIA	MES	AÑO	HORAS																				
07	01	2024	23:59	10																			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS																			

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE	IDENTIFICACIÓN: NIT	901.415.647-5
DIRECCIÓN: CARRERA 50 #56 - 42	Ciudad: NECOCLI, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 3176165442

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE	IDENTIFICACIÓN: NIT	901.415.647-5
DIRECCIÓN: CARRERA 50 #56 - 42	Ciudad: NECOCLI, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 3176165442
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT	001-8

DATOS DEL RESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CA NIT : 901415647

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA** CIUDAD: **MEDELLÍN**

DIRECCION: **VIA URBANA No. 0-0**

ACTIVIDAD: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA: **AV.-0**

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 464,000,000.00	464,000,000.00	

DEDUCIBLES: **15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

BENEFICIARIOS
NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**

OBSERVACIONES

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No. CV-019-2023, DE FECHA 28/06/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA.

OBSERVACIONES:

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****464,000,000.00	VALOR PRIMA \$ *****0	GASTOS EXPEDICION \$*****0.00	IVA \$ *****0	TOTAL A PAGAR \$ *****0
--	---------------------------------	---	-------------------------	-----------------------------------

INTERMEDIARIO

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
DURANGO S. Y CIA. LTDA	3437	100.00			

LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENIDADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma]
FIRMA ASEGURADOR




(415)7791861000193020000300000007003596002248

[Firma]
FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 150 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CB0125780F00FF7A57

CLIENTE



DEMORENO 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174

Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 8226 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procesamiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2055 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS

COD. AGENCIA: 595 RAMO: T4 N° POLIZA: 994000000146 AERD: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE

IDENTIFICACIÓN: NT 901.415.647-5

ASEGURADO: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE

IDENTIFICACIÓN: NT 901.415.647-5

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NT 001-8

TEXTO ITEM 1

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- LOS TERCEROS AFECTADOS ✓

- MUNICIPIO DE BARBESA NIT. 890.380.094-5 ✓

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- MUNICIPIO DE BARBESA NIT. 890.380.094-5 ✓

- ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE - ASOMUDACAR con NIT 901.415.647-5 ✓

* SE ACLARA QUE LA PÓLIZA EN ASUNTO ES CORRELATIVA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 994000000146 ✓

CONDICIONADO GENERAL: 20/10/2021-1502-S-06-PATRI-CL-SUSP-04-CROCI

NOTA TÉCNICA: 20/10/2021-1502-MT-P-06-P201021HPP69601

OBSERVACION

MEDIANTE EL PRESENTE ASENSO Y DE ACUERDO AL ACTA SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL CONTRATO DIO EMICIO EL 31 DE JULIO DE 2023 ✓

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINAN EN VIGOR.

CLIENTE

**LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

DATOS DE LA PÓLIZA

Nº. POLIZA: 994000000146	ANEXO: 1	TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	PÁGINA: 3
TOMADOR: ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE		IDENTIFICACION: 901.415.647-5	

ASEGURADOS							
ITEM	ASEGURADO	C.C. & NIT	UBICACION DEL PREGIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	ASOCIACION DE MUNICIPIOS URA	901415647-5	VIA URBANA No. 0-0	MEDELLIN	464,000,000.00	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0

Consultar Póliza

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: **994000000748** Número de anexo: **1**

Agencia: **SEAS URABA SEGUROS** Ramo: **CUMP. ENT. ESTATALES**

Asegurado / Beneficiario: **MUNICIPIO DE DABEIBA**

Tomador / Garantizado: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE**

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PAGO ANTICIPADO	viernes, 7 de julio de 2023	martes, 7 de enero de 2025	\$1.244.239.071.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	domingo, 7 de enero de 2024	domingo, 7 de enero de 2029	\$622.119.535.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 7 de julio de 2023	jueves, 7 de enero de 2027	\$622.119.535.80
CUMPLIMIENTO	viernes, 7 de julio de 2023	martes, 7 de enero de 2025	\$622.119.535.80

[Nueva Consulta](#)

[Visualizar PDF](#)



Número de póliza:	994000000146	Número de anexos:	1
Agencia:	SEAS URABA SEGUROS	Ramo:	RESP CIVIL EXT PATRI
Asegurado / Beneficiario:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE		
Tomador / Garantizado:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN CARIBE		

Detalle anuarios asegurados:

Anuario / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	lunes, 28 de diciembre de 2023	domingo, 7 de enero de 2024	5464.000.000.00

[Nueva Consulta](#)

[Visualizar PDF](#)



→ Personal de contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar sst, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 ayudantes de obra, 3 soldadores

→ Personal de Interventoria: 1 Residente Civil, 1 Auxiliar Civil, Residente sst, 1 Residente Social

→ Clima: 7:00 am - 17:00 pm - Soleado

→ Equipo: H. menor, Pulidora, tronzadora, Equipo Soldador radial

Contratista

Silvana M^e
Interventoria

6 de Septiembre: 1. Excavación para construcción de cajas, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3. Armazon de conastillas para vigas, 4. Encofre de gradeneria, 5. Lleno de pilotes y compactación

→ Personal del contratista: 1 Residente Civil, 1 Auxiliar Civil, 1 Auxiliar sst, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 ayudantes de obra, 4 soldadores

→ Personal de interventoria: 1 Residente Civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente sst, 1 Residente Social

→ Clima: 7:00 am - 17:00 pm - soleado

→ Equipo: H. menor, Pulidora, tronzadora, Equipo Soldador radial

Contratista

Silvana M^e
Interventoria

7 de Septiembre: 1. Excavacion para construcción de cajas, 2 Corte y armado de estructura metálica, 3. Encofre de gradeneria, 4. Lleno de pilotes y compactación.

→ Personal de contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar sst, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 ayudantes de obra, 4 soldadores

→ Personal de interventoria: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente sst, 1 Residente social

- Clima: 7:00 am - 17:00 pm. Soleado
- Equipo: H. menor, pulidora, Tranzadora, Equipo Soldador radial

Contratista

Silvana M^o
Interventoria

8 de Septiembre: 1 excavación para construcción de cajas, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3. Encofre de gradería, 4. Lleno de pilotes y compactación.

- Personal del contratista: 1 Residente civil, Auxiliar civil, 1 Auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 8 ayudantes, 4 Soldadores

- Personal de Interventoria: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente SST, 1 Residente Social.

- Clima: 7:00 am - 17:00 pm - soleado

- Equipo: H menor, Pulidora, tranzadora, Equipo Soldador radial.

Contratista

Silvana M^o
Interventoria

9 de Septiembre: 1 excavación para construcción de cajas, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3. Nivelación de triturado.

- Personal de contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 ayudantes, 4 Soldadores.

- Personal de interventoria: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente SST, 1 Residente Social.

- Clima: 7:00 am - 13:00 pm.

- Equipo: H. menor, Pulidora, tranzadora, Equipo Radial.

Contratista

Silvana M^o
Interventoria

Domingo 10 de Septiembre no se programaron actividades

11 de Septiembre: excavación para construcción de cajas, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3. Nivelación de triturado, 4. Amarre de vigas.

- Personal de contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1. Aux

11ar sst, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 ayudantes de obra, 4 soldadores.

- Personal de interventoría: 1 Residente civil, Auxiliar civil, 1 Residente sst, 1 Residente social
 - Clima: 7:00 am - 17:00 pm - Soleado
 - Equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, Equipo Soldador radial
 - Se le recuerda al contratista la importancia del uso de EPP del todo Personal
- Contratista Silvana M^e Interventora, ~~Amij~~ SST Interventora

12 de Septiembre: Excavación para construcción de cajas, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3 Nivelación de fitorado.

- Personal de contratista: Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar sst, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 8 ayudantes de obra, 4 soldadores
- Personal de Interventoría: 1 Residente civil, Auxiliar civil, 1 Residente sst, 1 Residente social.
- Clima: 7:00 am - 17:00 pm - Soleado
- Equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, Equipo Soldador radial.

Contratista Silvana M^e Interventora

13 de Septiembre: Se le solicita al contratista, mejorar los procedimientos para la actividad de vaciado en la gradería, para evitar incidentes con los trabajadores

- ~~Amij~~ SST Interventora.
- Excavación para construcción de cajas, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3 Nivelación de fitorado, 4. Amorre de vigas, 5. Encofre de gradería
 - Personal del contratista: 1 Residente civil, 2 Auxiliar civil, 3 Auxiliar sst, 1 Maestro de obra, 3 oficiales, 10 ayudantes de obra, 4 Soldadores
 - Personal de interventoría: 1 Residente civil, Auxiliar civil, 1 Residente sst, 1 Residente social
 - Clima: 7:00 am - 17:00 pm soleado
 - Equipo: H menor, pulidora, tronzadora, Equipo Soldador radial

11 de Septiembre: Silvana M^o
 Interventoría Contratista.

- 14 de Septiembre: 1. Excavación para construcción de filtros, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3. Nivelación de triturado, 4. figuración de hierro, 5. Compactación en zapatas
- Personal del contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 ayudantes de obra, 4 Soldadores, 1 socioambiental.
 - Personal de interventoría: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente SST, 1 Residente social.
 - clima: 7:00 am - 17:00 pm Soleado
 - Equipo: H. menor, polidora, tronzadora, Equipo soldador radial

Silvana M^o

Contratista Interventoría

- 15 de Septiembre: 1. Excavación para construcción de filtros, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3. Nivelación de triturado; 4. llenos y compactación en Zapatas
- Personal de contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 ayudantes, 4 soldadores, 1 socioambiental
 - Personal Interventoría: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente SST, 1 Residente social.
 - clima: 7:00 am - 17:00 pm Soleado.
 - Equipo: H. menor, polidora, tronzadora, Equipo soldador radial.

Silvana M^o

Contratista Interventoría

- 16 de Septiembre: 1. llenos de filtros, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3. nivelación de triturado, 4. Amarre de vigas

- Personal del contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 ayudantes de obra, 4 soldadores
- Personal de interventoria: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente SST, 1 Residente social
- clima: 7:00 - 13:00 pm - Soleado
- Equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, Equipo soldador, - radial.

Silvana M^o

Contratista

Interventoria

- Domingo 17 de septiembre no se programaron actividades.
- 18 de septiembre: 1. Lleno de filtros, 2 Corte y armado de estructura metálica, 3 nivelación de fiturado, 4 Amarre de vigas
- Personal de contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 11 ayudantes de obra, 4 soldadores
- Personal Interventoria: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente SST, Residente Social
- clima: 7:00 am - 17:00 pm soleado
- Equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, Equipo soldador radial

Silvana M^o

Contratista

Interventoria

- 19 de septiembre: 1. Lleno de filtros, 2. Corte y armado de estructura metálica. 3 nivelación de fiturado, 4. Amarre de vigas, 5. Corte y armado de formaleta
- Personal del contratista: 1 Residente civil, 2 Auxiliar civil, 1 Auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 11 ayudantes de obra, 4 soldadores
- Personal de Interventoria: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente SST, 1 Residente Social,
- clima: 7:00 am - 17:00 pm - soleado
- Equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, Equipo soldador r.

Silvana M^o

Contratista

Interventoria

- 20 de Septiembre: 1 lleno de filtros, 2. Corte y armado de estructura metálica, 3 Nivelación, de fitorado, 4 vacuado de cajas de inspección, 5 Encofre de gradieria
- Personal del contratista: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 11 ayudantes de obra, 4 soldadores
 - Personal de interventoría: 1 Residente civil, 1 Auxiliar civil, 1 Residente SST, 1 Residente social
 - clima: 7:00 am - 17:00 pm soleado
 - Equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, Equipo soldador radial

Contratista

Silvana M^o
Interventoría

- 21 de Septiembre: 1 Nivelación de fitorado, 2 vacuado de cajas de inspección, 3 Amarré de vigas, 4 Corte de tubería galvanizada para arreglo de cerramiento perimetral.
- P. Contratista: 1. Residente civil. 2. Auxiliar civil, 1 Aux. SST, 1. m. de obra, 2 oficiales, 10 ayudantes de obra, 4 soldadores
 - P. Interventoría: 1 Residente civil, Auxiliar civil, 1 Residente SST, 1 Residente social.
 - clima: 7:00 am - 17:00 pm soleado.
 - Equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, equipo soldador r.

Contratista

Silvana M^o
Interventoría

- 22 de Septiembre: Nivelación de fitorado, 2 encofrado para vacuado de viga fundación. 3. Arreglo de cerramiento perimetral.
- P. Contratista: 1 Residente civil, 1 Aux civil, 1 Aux. SST, maestro de obra, 3 oficiales, 10 ayudante, 4 Soldadores
 - P. Interventoría: R. civil, Aux. civil, Residente SST, R. social.
 - clima: 7:00 - 17:00 pm soleado.
 - Equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, equipo soldador r.

Contratista

silvana N°
Interventoría

23 de Septiembre: 1. Nivelación de triturado, 2 desencofrado de viga fundación, 3. Arreglo de cerramiento perimetral, 4. Lleno de filtros

→ P. Contratista: 1 R. Civil, 1 Aux. Civil, 1 Aux. SST, 1 maestro obra, 2 Oficiales, 10 ayudantes de obra, 3 soldadores

→ P. Interventoría: R. Civil, 1 Aux. Civil, 1 R. SST, R. Social.

→ Clima: 7:00 am - 17:00 pm Soleado

→ Equipo: H. menor, pulidora, tronadora, Equipo soldador radial.

Contratista

silvana N°
Interventoría

24 - Septiembre (Domingo) no se programaron actividades.

25 - Septiembre: 1. Nivelación de triturado, 2 Encofrado de viga fundación, 3. Instalación de tubería para filtros, 4. Corte y armado de estructura metálica

→ P. Contratista: 1 R. Civil, 1 Aux. SST, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 11 ayudantes de obra, 3 soldadores

→ P. Interventoría: R. Civil, 1 Aux. Civil, 1 R. SST, 1 Social

→ Clima: 7:00 am - 17:00 pm - Soleado

→ Equipo: H. menor - pulidora, tranzadora, Equipo soldador radial.

Contratista

silvana N°
Interventoría

26 Septiembre 2023 Martes

Actividades: 1- se realiza nivelación de triturado
2- encofrado de viga fundación para posterior vaciado. 3- lleno y compactación en zona de filtros. 4- vaciado de viga fundación.

- Personal contratista: 1 residente obra, 1 aux obra, 1 residente SST, 1 maestro obra, 2 oficiales, 11 ayudantes 1 residente socio-ambiental.

→ Personal interventoria: 1 residente, 1 residente SST, 1 residente social, 1 aux inter.

Clima: 7:00am - 17:00pm soleado

Equipo: H. menor, canguro compactador, pulidora, martillo demoler.

observaciones: 1- se le solicita al contratista de obra no dejar los vaciados iniciados en los pedestales, ya que se recomienda dejar los cortes de 45° o 90°.

- se debe evitar hacer los cortes en los nudos, ya que en estos se deben conservar que el concreto sea monolítico.

contratista

Silvana M^o
Interventoria

Miércoles 27 septiembre 2023

Actividades: 1- se continúa con la nivelación de triturado
2- se retira formaleta de viga de fundación vaciada el día anterior. 3- se realiza vaciado de cajas de inspección

→ Personal contratista: 1 residente obra, 1 residente SST, 1 aux obra, 1 maestro obra, 1 residente SST, 2 oficiales, 11 ayudantes 1 tec socio-ambiental.

→ P. Interventoria: 1 residente, 1 aux int, 1 residente social, 1 residente ambiental.

Clima: 7:00am - 17:00pm soleado

Equipo: H. menor, canguro compactador, pulidora 4".

observaciones: 1- se le solicita al contratista nuevamente la instalación de la valla informativa del contrato

Observaciones: Se le reitera nuevamente a la residente SST el uso correspondiente de los EPP de todo el personal perteneciente al proyecto.

SST Interventoria

Silvana M^o

Interventoria

Jueves 28 Septiembre 2023

Actividades: 1- se continúa con la nivelación de terreno. 2- se continúa con la construcción y vaciado de cajas de inspección 3- se realiza encafrado de viga de cimentación placa polideportiva para posterior vaciado.

personal contratista: 1 director obra, 1 residente obra, 1 obrero, 1 residente sst, maestro obra, 2 oficiales, 11 ayudantes
tecnología socio-ambiental

personal interventoria: 1 director, 1 residente, 1 aux, 1 p. social, 1 p. sst, 1 p. ambiental, 1 p. estructural, 1 o

clima: 7:00am - 17:00pm soleado

equipo: H. menor, pulidora, concretadora

observaciones: Ingreso minicargador a la obra sin documentación y operador sin seguridad social. y para el ingreso de materiales no se está realizando el debido control vial, lo cual se le recuerda al contratista que cualquier incidente o eventualidad será asumido y solo responsabilidad del mismo.

-se realiza comité de obra # 2. SSI-Interventoria.

Contratista Interventoria
Silvana M^o.

Viernes 29 Septiembre 2023

Actividades: 1- se continúa con la nivelación de terreno en cancha. 2- se continúa con encafrado de viga de fundación en placa polideportiva para posterior vaciado. 3- se continúa con la construcción de cajas de inspección. 4- vaciada viga fundación

personal contratista: 1 director obra, 1 residente obra, 1 obrero, 1 residente sst, 1 maestro obra, 2 oficiales, 11 ayudantes

personal interventoria: 1 residente, 1 Director, 1 p. sst, 1 p. social, 1 ambiental, 1 estructural, 1 aux int.

clima: 7:00am - 17:00pm soleado

equipo: H. menor, pulidora, concretadora, vibroconcreto

observaciones: Para este día ingresaron un camion de placa JYW850, una volquete de placa OLA 293 y una volquete SBR 120 de los wabs, el contratista no entregó los documentos requeridos por la interventoria y responde hacerse responsable de cualquier ocurrencia dentro de la obra en caso de ocurrir por medio o actividad con estos vehículos o de sus mismos operadoses. ~~Ampl~~
SST Interventoria.

-se le recomienda al contratista de obra compactar el triturado de la cancha según especificaciones.

contratista Silvana M^o
interventoria

Sábado, 30 septiembre 2023

Actividades: 1- se continúa con la nivelación de triturado
2- se continúa con vaciado de viga de fundación.

→ Personal contratista: 1 residente obra, 1 aux obra, 1 residente SST, 1 maestro obra, 2 oficiales, 11 ayudantes.

→ Personal interventoria: 1 residente, 1 aux int, 1 social, 1 D. SST, 1 ambiental.

Clima: 7:00am - 13:00pm soleado

Equipo: H. menor, pulidora, concretoobra, vibra concreto como slum, camisas muestros.

observaciones: se realiza prueba de asentamiento de los concretos preparados en obra para verificación de la dosificación según diseño de mezcla.

contratista Silvana M^o
interventoria

1 octubre 2023 Domingo no se realizaron actividades.

Lunes 2 octubre 2023

Actividades: 1- se continúa con la nivelación de triturado
2- se realiza retiro de formaleta de viga de fundación vaciada el día anterior. 3- construcción de tapas para

cajas de inspección. 4- Se da inicio con la imprimación sobre base granular.

→ personal contratista: 1 residente obra, 1 aux obra, 1 sst, 1 maestro, 2 oficiales, 12 ayudantes

→ personal interventoria: 1 residente, 1 aux int, 1 sst, 1 social

clima: 7:00am - 17:00pm soleado

equipo: H. menor, pulidora, tronzadora.

contratista

Silvana M^o
Interventoria

9/11 Martes 3 octubre 2023

→ Actividades: 1- se continúa con la nivelación de triturado. 2- se continúa con la imprimación de base granular. 3- se realiza encofrado de grade para posterior vaciado.

→ personal contratista: 1 residente obra, 1 aux obra, 1 sst, 1 maestro obra, 2 oficiales, 12 ayudantes

→ personal interventoria: 1 residente, 1 aux, 1 social, 1 sst

clima: 7:00 - 14:00pm soleado 15:00pm - 17:00pm Nublado

equipo: H. menor, pulidora, tronzadora

→ observaciones: 1- se le recuerda al contratista de obra

cumplir con las especificaciones técnicas según el convenio, se le recuerda que el triturado que se está

nivelando debe ser compactado para evitar ondulaciones a la hora de instalar la grama sintética.

2- Se convocó a reunión virtual con la socio-ambiental de contratista, la Trabajadora Social de la alcaldía y la residente

Social de Interventoria, con el objetivo de ejecutar las actividades que se realizaron el mes de octubre, hora: 4:30 pm,

Manuel

contratista.

Silvana M^o
Interventoria

Miércoles 4 octubre 2023

Actividades: 1- se continúa con encofrado de gradaderas. 2- se continúa con la nivelación de triturado.

3- se continúa con la imprimación de base granular.

→ personal contratista: 1 director, 1 residente obra, 1 aux, 1 residente SST, 1 maestro, 2 oficiales, 12 ayudantes.

→ personal interventoria: 1 residente, 1 aux int, 1 social, 1 ambiental, 1 estructural, 1 residente SST.

clima: 7:00am - 8:30am lluvias 8:30am - 17:00pm nublado

equipo: H. menor, pulidora, tronzadora.

observaciones: Se le solicita a la residente SST del contratista hacer seguimiento de los EPP de los trabajadores, en especial a las actividades de imprimación sobre base granular ya que esta actividad deteriora muy constante los EPP, los cuales deben ser cambiados y aptos para dicha actividad.

SST Interventoria.

contratista Silvana H^o
interventoria

Jueves 5 octubre 2023

Actividades: 1- se continúa con la nivelación manual de triturado. 2- se continúa con el encofrado de gradaderas para posterior vaciado de la misma.

→ personal contratista: 1 residente obra, 1 aux obra, 1 residente SST, 1 maestro, 2 oficiales, 12 ayudantes

→ personal interventoria: 1 residente, 1 aux, 1 social, 1 ambiental, 1 SST.

clima: 7:00am - 17:00pm soleado

equipo: H. menor, pulidora, tronzadora, radial.

contratista Silvana M^o
interventoria

Viernes 6 octubre 2023

Actividades: 1- se continúa con la nivelación de triturado. 2- se continúa con el encofrado

de gradearias para posterior vaciado.

→ personal contratista: 1 residente obra, 1 aux obra, 1 sst
1 maestra, 2 oficiales, 12 ayudantes

→ personal interventoria: 1 residente, 1 aux, 1 sst, 1 social, 1
ambiental, 1 estructural.

Clima: 7:00am - 17:00pm soleado

Equipo: H. menor, polidora, tronzadora, radial.

Silvana M^o

contratista

Interventoria



INFORME DE INERVENTORÍA

ANEXO N°3 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.



SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	domingo, 10 de septiembre de 2023	CONSECUTIVO	10
------------------------	-----------------------------------	-------------	----

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ASOCIADO	CV 019-2023
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	Escenario Deportivo
ESTADO DE DESARROLLO	En ejecución
MUNICIPIO	Dabeiba Antioquia
DIRECCION	
BARRIOS DE INFLUENCIA	Victor Cardena

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE- ASOMUDACAR	FIRMA INTERVENTORÍA:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RÍO NEGRO NARE "MASER"
N° DE CONTRATO	CV 019-2023	N° DE CONTRATO	CV 020-2023
OBJETO DEL CONTRATISTA	ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANT.	OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA	FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA".
FECHA DE INICIO DE LA OBRA	viernes, 7 de julio de 2023	FECHA DE INICIO DE LA INTERVENTORÍA	viernes, 7 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024
OTROSÍ No. 1	N/A	OTROSÍ No. 1	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A	PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024

VALOR DEL CONTRATO	DE OBRA	Costo Inicial	\$	3.110.597.679,00	DE INTERVENTORÍA	Inicial	\$	240.628.560,00
		ADICIÓN OTROSÍ N° 1		N/A		ADICIÓN OTROSÍ N° 1		N/A
		TOTAL (Costo directo + AU)	\$	3.110.597.679,00		TOTAL	\$	240.628.560,00



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

GENERACIÓN DE EMPLEO

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA				PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				OBSERVACIONES	
Personal Interventoría:		Profesionales contratista:		Personal de obra contratista		SUBCONTRATISTA: Mármoles y Baldosas			
Director de Interventoría	1	Director de Obra	1	Maestro		Maestro	0		
Residente de Interventoría	1	Residente de Obra	1	Oficiales	2	Oficiales	0		
Auxiliar Residente de Interventoría	1	Auxiliar Residente de Obra	1	Ayudantes	9	Ayudantes	0		
Tecnólogo en Salud laboral	1	Tecnólogo en Salud laboral	1	Topógrafo		Ayudantes	0		
Residente social	1	Profesionales seguridad y salud en el trabajo	1	Soldadores					
Residente ambiental	1	Maestro de obra	1						
Asesores	1			Servicios generales		Ayudantes	0		
Total empleos administrativos en obra:			13	Total empleos operativos en obra:		11	Total empleos subcontratos:	0	Total empleos activos en obra: 24

PAGOS CONTRATISTA DE OBRA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
TOTAL	\$	\$	\$	0,00%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 3.110.597.679
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 3.110.597.679
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	8,72%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACTUAL	10,40%

PAGOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
TOTAL	\$	\$	\$	0,00%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 240.628.560
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 240.628.560
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%

PORCENTAJE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	12,50%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACTUAL	10,40%
PORCENTAJE DE ATRASO	-2,10%
DIAS DE ATRASO	-1,89



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA

ITEMS	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
PRESUPUESTO CONTRACTUAL			
5	6.4	Excavaciones en material heterogeneo, incluyendo bolas de roca de diametros inferiores a 1m, 0-2m, cualquier grado de humedad	se realiza excavacion para pilotes
1	3.1	Suministro transporte e instalación de concreto para losa horizontal de asiento E=0,10	se realiza encofrado de graderias
6	OE3	Lleno con material de prestamo	se realiza lleno y compactacion de zapatas
6	OE8	STC de Tuberia Santaria PVC 6"	se realiza excavacion para la instalacion de tuberia de 6"
6	OE9	STC de caja de inspeccion en concreto de 60x60, profundidad variable. Incluye tapa en concreto	se realiza excavacion para la contruccion de caja de inspeccion
6	OE2	Suministro, transporte y colocacion de concreto para pilotes D 0,45 21 MPA	se realiza vaciado de concreto para pilotes
3	3.1	Suministro, transporte y colocación de estructura metalica de cubierta, cerchas, columnas templeiros	se realiza corte y figuracion de estructura metalica

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

PENDIENTES INTERINSTITUCIONALES



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



se realiza vaciado de pilotes



se realiza encofrado de graderia



se realiza corte y figuracion de estructura metalica



se realiza excavacion para la instalacion de tuberia de 6"



se realiza lleno y compatacion de zapatas



se realiza excavacion para la contruccion de caja de inspeccion



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	domingo, 17 de septiembre de 2023	CONSECUTIVO	11
------------------------	-----------------------------------	-------------	----

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ASOCIADO	CV 019-2023
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	Escenario Deportivo
ESTADO DE DESARROLLO	En ejecución
MUNICIPIO	Dabeiba Antioquia
DIRECCION	
BARRIOS DE INFLUENCIA	Victor Cardena

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE- ASOMUDACAR	FIRMA INTERVENTORÍA:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RÍO NEGRO NARE "MASER"
N° DE CONTRATO	CV 019-2023	N° DE CONTRATO	CV 020-2023
OBJETO DEL CONTRATISTA	ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANT.	OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA	FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA".
FECHA DE INICIO DE LA OBRA	viernes, 7 de julio de 2023	FECHA DE INICIO DE LA INTERVENTORÍA	viernes, 7 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024
OTROSÍ No. 1	N/A	OTROSÍ No. 1	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A	PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024

VALOR DEL CONTRATO	DE OBRA	Costo Inicial	\$ 3.110.597.679,00	DE INTERVENTORÍA	Inicial	\$ 240.628.560,00
		ADICIÓN OTROSÍ N° 1	N/A		ADICIÓN OTROSÍ N° 1	N/A
		TOTAL (Costo directo + AU)	\$ 3.110.597.679,00		TOTAL	\$ 240.628.560,00



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

GENERACIÓN DE EMPLEO

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA				PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				OBSERVACIONES		
Personal Interventoría:		Profesionales contratista:		Personal de obra contratista		SUBCONTRATISTA: Mármoles y Baldosas				
Director de Interventoría	1	Director de Obra	1	Maestro		Maestro	0			
Residente de Interventoría	1	Residente de Obra	1	Oficiales	3	Oficiales	0			
Auxiliar Residente de Interventoría	1	Auxiliar Residente de Obra	1	Ayudantes	10	Ayudantes	0			
Tecnólogo en Salud laboral	1	Tecnólogo en Salud laboral	1	Topógrafo		Ayudantes	0			
Residente social	1	Profesionales seguridad y salud en el trabajo	1	Soldadores	3					
Residente ambiental	1	Maestro de obra	1							
Asesores	1			Servicios generales		Ayudantes	0			
Total empleos administrativos en obra:			13	Total empleos operativos en obra:		16	Total empleos subcontratos:	0	Total empleos activos en obra:	29

PAGOS CONTRATISTA DE OBRA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
TOTAL	\$	\$	\$	0,00%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 3.110.597.679
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 3.110.597.679
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	10,40%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACTUAL	11,80%

PAGOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
TOTAL	\$	\$	\$	0,00%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 240.628.560
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 240.628.560
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%

PORCENTAJE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	16,33%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACTUAL	11,80%
PORCENTAJE DE ATRASO	-4,53%
DIAS DE ATRASO	-4,08



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA

ITEMS	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
PRESUPUESTO CONTRACTUAL			
1	3.1	Suministro transporte e instalación de concreto para losa horizontal de asiento E=0,10	se realiza vaciado de graderias
6	OE3	Lleno con material de prestamo	se realiza lleno y compactacion de zapatas
6	OE8	STC de Tubería Santaria PVC 6"	se realiza instalacion de tuberia de 6"
6	OE9	STC de caja de inspeccion en concreto de 60x60, profundidad variable. Incluye tapa en concreto	se realiza excavacion para la contruccion de caja de inspeccion
3	3.1	Suministro, transporte y colocación de estructura metalica de cubierta, cerchas, columnas templeros	se realiza corte y figuracion de estructura metalica

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Empty space for general comments and observations.

PENDIENTES INTERINSTITUCIONALES

Empty space for inter-institutional pending items.



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



se realiza instalacion de tuberia de 6"



se realiza vaciado de graderias



se realiza corte y figuracion de estructura metalica



se realiza lleno y compactacion de zapatas



se realiza corte y figuracion de acero





PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	domingo, 24 de septiembre de 2023	CONSECUTIVO	12
------------------------	-----------------------------------	-------------	----

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ASOCIADO	CV 019-2023
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	Escenario Deportivo
ESTADO DE DESARROLLO	En ejecución
MUNICIPIO	Dabeiba Antioquia
DIRECCION	
BARRIOS DE INFLUENCIA	Victor Cardena

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE- ASOMUDACAR	FIRMA INTERVENTORÍA:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RÍO NEGRO NARE "MASER"
N° DE CONTRATO	CV 019-2023	N° DE CONTRATO	CV 020-2023
OBJETO DEL CONTRATISTA	ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANT.	OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA	FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA".
FECHA DE INICIO DE LA OBRA	viernes, 7 de julio de 2023	FECHA DE INICIO DE LA INTERVENTORÍA	viernes, 7 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024
OTROSÍ No. 1	N/A	OTROSÍ No. 1	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A	PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024

VALOR DEL CONTRATO	DE OBRA	Costo Inicial	\$ 3.110.597.679,00	DE INTERVENTORÍA	Inicial	\$ 240.628.560,00
		ADICIÓN OTROSÍ N° 1	N/A		ADICIÓN OTROSÍ N° 1	N/A
		TOTAL (Costo directo + AU)	\$ 3.110.597.679,00		TOTAL	\$ 240.628.560,00



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

GENERACIÓN DE EMPLEO

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA				PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				OBSERVACIONES		
Personal Interventoría:		Profesionales contratista:		Personal de obra contratista		SUBCONTRATISTA: Mármoles y Baldosas				
Director de Interventoría	1	Director de Obra	1	Maestro		Maestro	0			
Residente de Interventoría	1	Residente de Obra	1	Oficiales	3	Oficiales	0			
Auxiliar Residente de Interventoría	1	Auxiliar Residente de Obra	1	Ayudantes	11	Ayudantes	0			
Tecnólogo en Salud laboral	1	Tecnólogo en Salud laboral	1	Topógrafo		Ayudantes	0			
Residente social	1	Profesionales seguridad y salud en el trabajo	1	Soldadores	3					
Residente ambiental	1	Maestro de obra	1							
Asesores	1			Servicios generales		Ayudantes	0			
Total empleos administrativos en obra:			13	Total empleos operativos en obra:		17	Total empleos subcontratos:	0	Total empleos activos en obra:	30

PAGOS CONTRATISTA DE OBRA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
TOTAL	\$	\$	\$	0,00%

PAGOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
	\$	\$	\$	0,00%
TOTAL	\$	\$	\$	0,00%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 3.110.597.679
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 3.110.597.679
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	11,80%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACTUAL	15,00%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 240.628.560
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 240.628.560
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	20,17%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACTUAL	15,00%
PORCENTAJE DE ATRASO	-5,17%
DIAS DE ATRASO	-4,65



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA

ITEMS	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
PRESUPUESTO CONTRACTUAL			
3	2,3	Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de fundación de 45*45, 21 MPA	se realiza vaciado de viga de fundacion
6	OE4	Suministro e instalacion de cerramiento de malla eslabonada similar a la existente	se realiza cerramiento de malla eslabonada
6	OE8	STC de Tuberia Santaria PVC 6"	se realiza instalacion de tuberia de 6"
6	OE9	STC de caja de inspeccion en concreto de 60x60, profundidad variable. Incluye tapa en concreto	se realiza vaciado para caja de inspeccion
5	6,9	Renivelación de triturado existente según coordenadas topográficas	se realiza renivelacion de triturado
3	3.1	Suministro, transporte y colocación de estructura metalica de cubierta, cerchas, columnas templeros	se realiza corte y figuracion de estructura metalica

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

PENDIENTES INTERINSTITUCIONALES



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



se realiza vaciado de viga de fundacion



se realiza cerramiento de malla eslabonada



se realiza instalacion de tuberia de 6"



se realiza vaciado para caja de inspeccion



se realiza renivelacion de triturada





PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	domingo, 1 de octubre de 2023	CONSECUTIVO	13
------------------------	-------------------------------	-------------	----

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ASOCIADO	CV 019-2023
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	Escenario Deportivo
ESTADO DE DESARROLLO	En ejecución
MUNICIPIO	Dabeiba Antioquia
DIRECCION	
BARRIOS DE INFLUENCIA	Victor Cardena

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE- ASOMUDACAR	FIRMA INTERVENTORÍA:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RÍO NEGRO NARE "MASER"
---------------------------	---	----------------------	---

N° DE CONTRATO	CV 019-2023	N° DE CONTRATO	CV 020-2023
----------------	-------------	----------------	-------------

OBJETO DEL CONTRATISTA	ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANT.	OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA	FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.
------------------------	---	----------------------------------	--

FECHA DE INICIO DE LA OBRA	viernes, 7 de julio de 2023	FECHA DE INICIO DE LA INTERVENTORÍA	viernes, 7 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024
OTROSÍ No. 1	N/A	OTROSÍ No. 1	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A	PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024

VALOR DEL CONTRATO	DE OBRA	Costo Inicial	\$ 3.110.597.679,00	DE INTERVENTORÍA	Inicial	\$ 240.628.560,00
	ADICIÓN OTROSI N° 1		N/A	ADICIÓN OTROSI N° 1		N/A
	TOTAL (Costo directo + AU)		\$ 3.110.597.679,00	TOTAL		\$ 240.628.560,00



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

GENERACIÓN DE EMPLEO

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA				PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				OBSERVACIONES	
Personal Interventoría:		Profesionales contratista:		Personal de obra contratista		SUBCONTRATISTA: Mármoles y Baldosas			
Director de Interventoría	1	Director de Obra	1	Maestro		Maestro	0		
Residente de Interventoría	1	Residente de Obra	1	Oficiales	2	Oficiales	0		
Auxiliar Residente de Interventoría	1	Auxiliar Residente de Obra	1	Ayudantes	11	Ayudantes	0		
Tecnólogo en Salud laboral	1	Tecnólogo en Salud laboral	1	Topógrafo		Ayudantes	0		
Residente social	1	Profesionales seguridad y salud en el trabajo	1	Soldadores					
Residente ambiental	1	Maestro de obra	1						
Asesores	1			Servicios generales		Ayudantes	0		
Total empleos administrativos en obra:			13	Total empleos operativos en obra:	13	Total empleos subcontratos:	0	Total empleos activos en obra:	26

PAGOS CONTRATISTA DE OBRA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
TOTAL	\$	- \$	- \$	0,00%

PAGOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
TOTAL	\$	- \$	- \$	0,00%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 3.110.597.679
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 3.110.597.679
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	15,00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACTUAL	48,15%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 240.628.560
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 240.628.560
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	24,29%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACTUAL	48,15%
PORCENTAJE DE ATRASO	23,86%
DIAS DE ATRASO	21,47



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA

ITEMS	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
PRESUPUESTO CONTRACTUAL			
3	2,3	Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de fundación de 45*45, 21 MPA	se realiza vaciado de viga de fundacion
6	OE9	STC de caja de inspeccion en concreto de 60x60, profundidad variable. Incluye tapa en concreto	se realiza vaciado para caja de inspeccion
5	6,9	Renivelación de triturado existente según coordenadas topográficas	se realiza renivelacion de triturado

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

PENDIENTES INTERINSTITUCIONALES



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



se realiza vaciado de viga de fundacion



se realiza vaciado para caja de inspeccion



se realiza nivelacion de triturado



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	domingo, 8 de octubre de 2023	CONSECUTIVO	14
------------------------	-------------------------------	-------------	----

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ASOCIADO	CV 019-2023
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	Escenario Deportivo
ESTADO DE DESARROLLO	En ejecución
MUNICIPIO	Dabeiba Antioquia
DIRECCION	
BARRIOS DE INFLUENCIA	Victor Cardena

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE- ASOMUDACAR	FIRMA INTERVENTORÍA:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RÍO NEGRO NARE "MASER"
---------------------------	---	----------------------	---

N° DE CONTRATO	CV 019-2023	N° DE CONTRATO	CV 020-2023
----------------	-------------	----------------	-------------

OBJETO DEL CONTRATISTA	ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANT.	OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA	FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA".
------------------------	---	----------------------------------	---

FECHA DE INICIO DE LA OBRA	viernes, 7 de julio de 2023	FECHA DE INICIO DE LA INTERVENTORÍA	viernes, 7 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 3 de enero de 2024
OTROSÍ No. 1	N/A	OTROSÍ No. 1	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A	PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	N/A
FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A	FECHA DE REINICIÓ N° 2	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	miércoles, 3 de enero de 2024

VALOR DEL CONTRATO	DE OBRA	Costo Inicial	\$ 3.110.597.679,00	DE INTERVENTORÍA	Inicial	\$ 240.628.560,00
	ADICIÓN OTROSÍ N° 1		N/A	ADICIÓN OTROSÍ N° 1		N/A
	TOTAL (Costo directo + AU)		\$ 3.110.597.679,00	TOTAL		\$ 240.628.560,00



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

GENERACIÓN DE EMPLEO

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA				PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				OBSERVACIONES	
Personal Interventoría:		Profesionales contratista:		Personal de obra contratista		SUBCONTRATISTA: Mármoles y Baldosas			
Director de Interventoría	1	Director de Obra	1	Maestro		Maestro	0		
Residente de Interventoría	1	Residente de Obra	1	Oficiales	3	Oficiales	0		
Auxiliar Residente de Interventoría	1	Auxiliar Residente de Obra	1	Ayudantes	11	Ayudantes	0		
Tecnólogo en Salud laboral	1	Tecnólogo en Salud laboral	1	Topógrafo		Ayudantes	0		
Residente social	1	Profesionales seguridad y salud en el trabajo	1	Soldadores					
Residente ambiental	1	Maestro de obra	1						
Asesores	1			Servicios generales		Ayudantes	0		
Total empleos administrativos en obra:			13	Total empleos operativos en obra:	14	Total empleos subcontratos:	0	Total empleos activos en obra:	27

PAGOS CONTRATISTA DE OBRA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
TOTAL	\$	- \$	- \$	0,00%

PAGOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ANTICIPO	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	% AVANCE FINANCIERO
ACTA #				
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
	\$	- \$	- \$	0,00%
TOTAL	\$	- \$	- \$	0,00%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 3.110.597.679
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 3.110.597.679
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	48,15%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACTUAL	53,89%

FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL	\$ 240.628.560
FALTA POR PAGAR DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	\$ 240.628.560
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE PAGADO DEL VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTES DE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL	0,00%
PORCENTAJE ACTAS PAGADAS + ACTAS PENDIENTESDE PAGO CON VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	0,00%
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	40,14%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACTUAL	53,89%
PORCENTAJE DE ATRASO	13,75%
DIAS DE ATRASO	12,38



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA

ITEMS	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
PRESUPUESTO CONTRACTUAL			
1	3,2	Suministro transporte e instalación de concreto para losa horizontal de asiento E=0,10	se realiza vaciado de graderia
5	6,13	Riego de imprimación sobre la base granular compactada, utilizando una emulsión asfáltica de rompimiento lento, con una dosificación a 2Kg/M2 de ligante residual o sea aproximadamente 1.6 Kg7M2 de emulsión asfáltica, con una concentración del orden del 60%.	se realiza riego de imprimacion
5	6,9	Renivelación de triturado existente según coordenadas topográficas	se realiza renivelacion de triturado
6	OE9	STC de caja de inspeccion en concreto de 60x60, profundidad variable. Incluye tapa en concreto	se realiza vaciado para caja de inspeccion

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

PENDIENTES INTERINSTITUCIONALES



PROYECTO: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

FICHA SEMANAL AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



se realiza vaciado de graderia





se realiza riego de imprimacion



se realiza nivelacion de triturado



se realiza vaciado para caja de inspeccion





**ANEXO N°4 CONTROL DE PERSONAL EN OBRA DEL
CONSTRUCTOR Y DE INTERVENTORÍA.**





CONTROL DE PERSONAL

VERSIÓN 00

Página ___ de ___

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA

INTERVENTORIA

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA

ASOMUDACAR

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA

PERIODO EVALUADO	DESDE	FECHA ACTA DE INICIO		FECHA DE CORTE: IN MENSUAL	
		7 SEPT 2023	HASTA	6 OCT 2023	

PERSONAL	CEDULA	CARGO	SEPTIEMBRE												OCTUBRE												TOTAL DIAS LABORADOS	% DISPONIBILIDAD							
			J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V										
JOSE FERNANDO ALZATE	71.682.952	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	1													1	1	1							12	50%								
MAURICIO OYOLA	1.069.505.802	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
JUAN SEBASTIAN MONSALVE	1.128.278.613	INGENIERO ESTRUCTURAL INTERVENTORIA						1	1	1								1	1							5	21%								
SILVANA MONTOYA AREIZA	1.066.573.710	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
ALEJANDRA LOPEZ DURANGO	1.028.034.664	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
MONICA QUIROZ	1.036.649.373	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
JUAN SEPULVEDA	1.067.857.697	RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA						1	1	1									1	1						5	21%								
LEONARDO CORREA ROLDAN	15.326.333	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	1	1					1	1	1				1	1	1									12	50%								
YOVANI ZAPATA ZABALA	15.328.893	RESIDENTE DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
LEANDRO SERNA RICARDO	1.152.705.696	AUXILIAR DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
EVELIN CRISTANCHO SANCHEZ	1.108.120.972	RESIDENTE SST CONTRATISTA							1	1								1	1	1						5	21%								
DORA MARIA MARIN QUIROZ	43.416.906	AUXILIAR SST CONTRATISTA	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
WILDER ANTONIO USUGA	71.330.961	MAESTRO DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
ANGELA MARIA ZAPATA GUZMAN	32.243.413	SOCIOAMBIENTAL CONTRATISTA	1	1	1										1	1	1	1								12	50%								
																										0	0%								
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO																																			
PERSONAL NO CALIFICADO	CEDULA	CARGO																																	
GERARDO ANTONIO GRACIANO	8.417.299	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1										13	54%								
JUAN CAMILO USUGA	1.017.134.441	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				27	113%								
OTALVARO TORREZ GRACIANO	8.413.217	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1															10	42%								
JOSE HERNAN DURANGO PINO	1.027.941.661	OFICIAL												1	1	1	1	1	1	1	1	1				15	63%								
TOTAL MAESTRO Y OFICIALES																																			
AYUDANTES	CEDULA	CARGO																																	
WILSON GUZMAN HERNANDEZ	1.216.727.200	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				26	108%								
JUAN CARLOS MAZO	1.039.287.153	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				26	108%								
YEINER SALAS GRACIANO	1.039.287.229	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				26	108%								
WILDEMAN LOPEZ URIBE	8.419.172	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				25	104%								
DENYER DE JESUS MUÑOZ	1.101.610.265	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				26	108%								
LUIS ALBERTO DAVID GIRALDO	1.039.286.337	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				26	108%								
YOAN ANDRES CARMONA MUÑOZ	1.040.800.700	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				26	108%								
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ BEDOYA	71.085.032	SOLDADOR	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1				1	1					15	63%								
FERNEY CAMILO URREGO URREGO	239.289.276	SOLDADOR	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1						17	71%								
JOHN SEBASTIAN OQUENDO AGUIRRE	1.000.536.587	AYUDANTE DE SOLDADURA	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				17	71%								
EDISON VARGAS PINO	1.038.289.121	AYUDANTE DE SOLDADURA	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				17	71%								
WALTER FELIPE URREGO	8.075.833	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				26	108%								
SERGIO OLIVER MUÑOZ TUBERQUIA	1.000.869.311	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1			22	92%								
CRUZ ANGEL MORALES CARTAGENA	8.415.806	AYUDANTE							1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				23	96%								
CARLOS FELIPE LOPEZ MONSALVE	1.001.620.428	AYUDANTE												1	1	1	1	1	1	1	1	1				18	75%								
OSCAR HERNAN TUBERQUIA POSSO	1.039.288.899	AYUDANTE																					1	1	1	4	17%								
TOTAL AYUDANTES			13	13	12	0	14	14	14	14	14	13	11	0	15	14	12	11	14	11	0	14	15	8	7	7	9	0	7	7	9	9	9		
TOTAL DE PERSONAS LABORANDO			13	13	12	0	14	14	14	14	13	11	0	15	14	12	11	14	11	0	14	15	8	7	7	9	0	7	7	9	9	9			

SILVANA MONTOYA AREIZA

AUXILIAR DE INTERVENTORIA



ANEXO N°5 CUADRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.





CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA CV -N. ° 020-2023

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA



INFORME MENSUAL N° 3

DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 6 DE OCTUBRE DE 2023

CONTROL DE EQUIPO EN OBRA

EQUIPO	CANT.	SEPTIEMBRE															OCTUBRE														
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
HERRAMIENTA MENOR		A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	
TRONZADORA	1	A	I	I		A	A	I	A	A	A		I	A	A	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
PULIDORA	1	A	A	A		A	A	A	A	I	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		A	A	A	A	A	
RADIAL	1	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	
CONCRETADORA ELECTRICA	1	A	I	I		I	I	A	I	A	I		I	I	A	A	A	I		I	A	A	A	A		A	A	A	I	I	
VIBRO PARA CONCRETO	1	A	I	I		I	I	A	I	I	I		I	I	I	I	A	I		I	A	I	I	A	A		A	I	I	I	I
CAMISAS TOMA DE MUESTRAS CONCRETO	1	A	I	I		I	I	A	I	A	I		I	I	I	A	I	I		I	I	A	A	I	I		A	I	I	A	I
CONO ASENTAMIENTO	1	A	I	I		I	I	A	I	A	I		I	I	I	A	I	I		I	I	A	A	I	I		A	I	I	A	I
SOLDADOR	1	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	
COMPACTADOR TIPO CANGURO	1	A	A	I		I	I	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	A	I	I	I	I		I	I	I	I	I
TALADRO PERCUTOR	1	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	I		I	I	I	I	I
TALADRO DEMOLEDOR	1	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	A	I	I	I	I		I	I	I	I	I

CONVENCIONES: A = ACTIVO R = EN REPARACIÓN I = INACTIVO

DIAS FESTIVOS

ELABORADO POR:
SILVANA MONTOYA AREIZA
 AUX DE INTERVENTORIA
SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



ANEXO N°6 CORRESPONDENCIA ENVIADA.





CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Medellín, 16 de septiembre de 20223

INTERCANFUTDAB-AMB-001-2023

Señores

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-ASOMUDACAR
LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA
Rep. Legal.

REFERENCIA: ANUAR EFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

ASUNTO: *Solicitud de Informe Ambiental y Anexos.*

Cordial saludo

La suscrita Interventoría a cargo de **Sinergia interventoría y construcciones SAS** de la ejecución contractual de la referencia, en atención al desarrollo de las obligaciones contractuales y atendiendo los lineamientos del Profesional Ambiental, se dirige a ustedes para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos obligatorios que ustedes como ejecutores del proyecto han adquirido voluntariamente.

Les comparto las directrices para el informe Inicial PMA y posteriores desarrollos mensuales de dicho componente, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado el Profesional ambiental de esta Interventoría, le solicita formalmente a su Homologo del Contratista cumplir como mínimo con los siguientes puntos dados como sugerencia para la Implementación y Desarrollo de los Informes Mensuales.

- Portada.
- Tabla de contenido.
- Introducción.
- Objetivo general y específicos.
- Localización del proyecto.
- Descripción detallada y argumentada de las actividades ejecutadas en el mes.
- Aspectos socioambientales.
- Cronograma de actividades generales y por mes de ejecución (tabla de Excel).
- Avance del P.M.A-acta de ejecución.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

- Gestión de residuos sólidos.
- Programa orden y aseo (jornadas semanales y cronograma mensual y/o semanal).
- Conclusiones y recomendaciones.
- Acciones de mejora.
- Anexos fotográficos.
- Anexos certificación cantera.
- Anexo permiso de escombro.
- Anexo permisos ambientales para la tala de árboles.
- Anexos de otros documentos.

Cabe recalcar qué, los puntos mencionados en su mayoría serían para el desarrollo de los Informes Mensuales de Ejecución del Componente Ambiental, siempre y cuando se tenga aprobado el Informe Inicial del PMA.

Dicho esto, se reitera el cumplimiento de la entrega puntual de los informes en la fecha establecida para el día 27 de cada mes, evitando así, se impartan sanciones a la **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE (ASOMUDACAR)**, por incumplimiento a los lineamientos de la interventoría. Lo anterior es comentado en consecuencia al primer incumplimiento de la solicitud de ejecución y la entrega no entrega a la fecha de este Oficio de ningún documento asociado a las actividades Ambientales.

Agradeciendo su atención.

JUAN A. SEPULVEDA OCHOA.
Residente Ambiental.
Sinergia interventoría y construcciones SAS.



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Medellín, 18 de Septiembre de 20223

INTERCANFUTDAB-AMB-002-2023

Señores

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-ASOMUDACAR

LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA

Rep. Legal.

REFERENCIA: ANUAR EFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

ASUNTO: Observaciones Informe Ambiental Periodo 7 de Agosto – 7 de Septiembre de 2023.

Cordial saludo

La suscrita Interventoría a cargo de **Sinergia interventoría y construcciones SAS** de la ejecución contractual de la referencia, en atención al desarrollo de las obligaciones contractuales y atendiendo los lineamientos del Profesional Ambiental, se dirige a ustedes para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos obligatorios que ustedes como ejecutores del proyecto han adquirido voluntariamente.

Al realizar la revisión por parte del Profesional Ambiental informa al Contratista las observaciones del Informe Socioambiental (Componente Ambiental) entregado como documento necesario en el cumplimiento de los compromisos contractuales para la Ejecución de Actividades del Proyecto mencionado en la Referencia.

Las siguientes son las observaciones.

- Portada. (Cumple)
- Tabla de contenido. (Se Observan en la Tabla de Contenido de las evidencias Fotográficas un (¡**Error de Marcador no definido!**). **Corregir.**
- Introducción. (Se evidencia errores de redacción). **Corregir.**
- Objetivo general y específicos. (No se evidencia el contenido de este Título). **Corregir.**
- Localización del proyecto. (Se evidencia la Ilustración 1, sin embargo es necesario describir mejor la localización del Proyecto.) **Corregir.**

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

- Programas de Implementación y Seguimiento Ambiental. **Corregir.**
- Se Evidencian las Descripciones de 2 Programas, sin embargo, no se pueden verificar su contenido ya que, no se cuenta a la Fecha de este oficio, con el Plan de Manejo ambiental Inicial, en donde se deben estar identificados en su totalidad los Programas necesarios para la optima ejecución de este componente.
 - **Conformación del Grupo de Gestión Ambiental.** En lo evidenciado se observa un cuadro en donde se describe el Grupo de Profesionales que hacen Parte de la Gestión Ambiental de la Obra, dicho cuadro debe tener adicionalmente a lo consignado, la identificación (No. de Cedula y No. de Tarjeta Profesional).
 - **Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.** (Suprimir la Palabra **Concienciación**), adicional a esto se debe realizar como mínimo dos (2) Capacitaciones por Periodo presentado, sabiendo esto es necesario anexar registro de dichas capacitaciones con listado del personal presente con la información de cada uno y firma de asistencia, tener en cuenta que las personas ahí enunciadas deben ser trabajadores de la obra y aparecer en el listado de la seguridad social mensual.
 - **Permiso de Ocupación de Cauce.** (N/A)
 - **Permiso de Aprovechamiento Forestal.** (N/A).
 - **Escombrera o ZODME.** Se debe Anexar el Certificado de la Escombrera autorizada por el Municipio para la Disposición Final de los Escombros ó en su Defecto Retiro de Material de Excavaciones, en caso que el Municipio NO cuente con una Escombrera o Botadero Certificado, favor solicitar al Área pertinente del Municipio generar un certificado de aprobación de la donación de dichos Materiales.
 - **Canteras y Fuentes de Materiales.** Se evidencia en los Anexos la Documentación de Licencia y Permisos de la Cantera ahí mencionada, sin embargo se observa en qué, en la Constancia del Registro Único de Comercializadores Mineros-RUCOM, tiene una fecha de expedición del Mes Enero de 2023 y el Certificado RUCOM tiene fecha de expedición del Mes de Junio de 2022, con un periodo de Vigencia del 2 de Junio de 2022 al 31 de Julio de 2023 (a la fecha de entrega de este Informe se encuentra sin vigencia), es de anotar que estos Dos Certificados hacen parte de un Registro, se recomienda revisar la veracidad de estos registros.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

- **Manejo Integral de Materiales de Construcción.** Se evidencia cuadro de Descripción del Material Utilizado en Obra, sin embargo, en este cuadro se debe describir la cantidad de material que fue utilizado de Cantera y Cual fue reutilizado de las Excavaciones. También se menciona una Protección del material de refuerzo con plástico, pero no se observa evidencia fotográfica de esta protección. Por otra parte, se enuncia una generación de acopios para los geotextiles, lo cual tampoco se observa evidencia fotográfica.
 - **Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD y zonas de depósito - ZODME.** Favor Anexar los documentos de licencias y permisos del Relleno Sanitario ahí enunciado.
 - **Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos.** Se recomienda Anexar Certificado por parte de las EMPRESAS PÚBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P, en donde se identifique si ellos también pueden realizaran la disposición final de los Residuos Especiales o Peligrosos, en caso de no ser así, es necesario tener en cuenta, si en la obra se generan esta clase de residuos realizar los tramites pertinentes con una empresa certificada para esta clase de Transporte.
 - **Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.** Se recomienda anexar evidencia Fotográfica de los Baños en Obra ahí mencionados.
 - **Manejo de Instalaciones Temporales.** Se recomienda Anexar evidencias fotográficas de cada componente ahí mencionado, ya qué, solo se observan Dos (2) imágenes las cuales no concuerdan con lo consignado en los puntos mencionados.
-
- **Cronograma de Actividades Generales y por mes de Ejecución (tabla de Excel).** No se evidencia información acorde a este punto, se recomienda realizar dicho cronograma.
 - **Avance del P.M.A-Acta de Ejecución.** No se evidencia información acorde a este punto, se recomienda entregar el desglose del componente ambiental consignado en el presupuesto oficial, para así, tener claridad de cual es el avance del PMA mensual.
 - **Programa orden y aseo (jornadas semanales y cronograma mensual y/o semanal).** Es necesario realizar este tipo de actividades para el óptimo manejo de los residuos sólidos, no solo es implementar un Punto Ecológico, se recomienda anexar evidencias fotográficas de dichas jornadas.
 - **Conclusiones y recomendaciones.** Se recomienda realizar para cada

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

- informe mensual este punto.
- **Acciones de mejora.** Se recomienda realizar para cada informe mensual este punto.
 - **Anexos fotográficos.** Se evidencian varias imágenes de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, sin embargo, es de aclarar que en un periodo de un mes se generan varias actividades puntuales por lo cual se recomienda anexar más evidencias fotográficas.

Dicho esto, el área ambiental de esta Interventoría hace referencia que a la fecha de este oficio solo se ha hecho entrega del Informe con Periodo (7 de Agosto - 7 de Septiembre de 2023), quedando pendiente la entrega del Plan de Manejo Ambiental Inicial y el Informe mensual del Periodo correspondiente al 7 de Julio – 6 de Agosto de 2023.

Para concluir el Profesional Ambiental, NO aprueba este Informe hasta no realizar a cabalidad las observaciones anteriormente mencionadas.

Agradeciendo su atención.

JUAN A. SEPULVEDA OCHOA.
Residente Ambiental.
Sinergia interventoría y construcciones SAS.



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Medellín, 19 de septiembre de 2023

INTERCANFUTDAB-AMB-003-2023

Señores

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-ASOMUDACAR

LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA

Rep. Legal.

REFERENCIA: ANUAR EFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

ASUNTO: Respuesta Oficio Ambiental DB-SO-AMB_19_09_2023_5

Cordial saludo

La suscrita Interventoría a cargo de **Sinergia interventoría y construcciones SAS** de la ejecución contractual de la referencia, en atención al desarrollo de las obligaciones contractuales y atendiendo los lineamientos del Profesional Ambiental, se dirige a ustedes para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos obligatorios que ustedes como ejecutores del proyecto han adquirido voluntariamente.

Dando respuesta al Oficio enunciado en la Referencia, nos permitimos aclarar varios puntos.

1. Se observa un cuadro describiendo la inversión Ambiental realizada hasta el momento en obra para el Periodo 7 de Agosto – 7 de Septiembre de 2023, sin embargo se debe aclarar cantidades de cada Descripción o Actividad y las Unidades específicas del Avance, el cual estarían cobrando. De igual forma es necesario que este cuadro de Inversión, sea descrito como un acta de avance de obra (Excel) con sus memorias de cantidades y evidencia fotográfica, para así, adjuntar al acta de avance el cual estarían solicitando cobrar.
2. Se evidencia anexo al Oficio de respuesta enviado por el Área Socioambiental del Contratista, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA. DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE DISEÑO EXISTENTES, REALIZANDO DE NUEVO ESTUDIOS Y REFORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE DABEIBA, teniendo en cuenta

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

esto se debe ajustar este Plan acorde al proyecto en ejecución, toda vez que, dicho documento está formulado para un diagnóstico y evaluación de diseños, mas no, para un proyecto que se encuentra en ejecución.

3. Se debe tener muy pendiente qué, por mucho que el documento del Plan Inicial esta bajo los lineamientos del ente evaluador de los diseños (Gobernación de Antioquia), es necesario ajustar toda la información consignada ahí, al proyecto en ejecución, sabiendo que, este documento es el manual con el cual se regirán los componentes y seguimientos ambientales para el alcance del Proyecto, por ende estos ajustes tendrán actualizaciones puntuales de componentes que no se verificaran en obra por motivos de la naturalidad y/o alcance final del proyecto.

Se recomienda tomar estos puntos aclaratorios como base para un proceso Ambiental optimo del Proyecto. De igual forma al realizar estas actualizaciones, Anexar un certificado por parte del Profesional Ambiental del contratista, donde hace entrega del Documento toda vez que, se realizó una revisión Preliminar y da aprobación del Plan de Manejo Ambiental Inicial entregado por parte del ente contratante y bajo el cual se regirán el seguimiento y control de dicho Plan.

No obstante, se reiteran las observaciones enviadas en el oficio **INTERCANFUTDAB-AMB-002-2023**, para así dar un concepto de aprobación del Plan de Manejo Ambiental Inicial y posterior aceptación sin observaciones de los Informes Mensuales.

Para concluir el Área Ambiental de esta Interventoría espera que se tomen de la mejor manera todas las recomendaciones y observaciones realizadas, toda vez que, estas son dirigidas con el animo de trabajar de la mano, mas no, de ser un obstáculo en la Ejecución del Proyecto.

Agradeciendo su atención.

JUAN A. SEPULVEDA OCHOA.
Residente Ambiental.
Sinergia interventoría y construcciones SAS.



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001 Fecha:
10/11/2016

Dabeiba, 30 de septiembre de 2023

INTERCANFUTDAB-004-2023

Señores

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-ASOMUDACAR

LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA

Rep. Legal.

REFERENCIA: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA, GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

ASUNTO: Requerimientos de seguridad y salud en el trabajo, documentos de ingreso de vehículos a la obra.

Cordial saludo,

Se le recuerda al contratista que para el cargue y descargue de materiales e ingresos de maquinaria amarilla se debe entregar con anticipación los documentos de vehículos, maquinaria y seguridad social de los conductores y operadores, ya que el día 28 de septiembre ingresaron a obra, un camión blanco con rojo de paca JYW 850 de Envigado y un mini cargador HYUNDAI modelo HSL 850-7 de color amarillo para el descargue de la grama sintética, así mismo el día 29 de septiembre del presente año ingresaron para el descargue materiales, una volqueta verde con placa OLA 293 de Frontino, y volqueta de placa SBK 120 color blanco, los cuales no contaban con la documentación requerida.

A. Documentación para vehículo:

- SOAT
- Técnico mecánica
- Matricula de propiedad
- Póliza extra contra actual

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001 Fecha:
10/11/2016

B. Documentación del personal:

- Seguridad social (Cedula, EPS, ARL, AFP)
- Licencia de conducción

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001 Fecha:
10/11/2016

Se adiciona que, aunque el contrato cuenta con una póliza, no se puede pasar por alto los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a las afiliaciones y la seguridad del trabajador (**CLAUSULA 9.2-ASOCIACION 2.22,2.23,2.24,} * [2.28)**). Si se pasa por alto las instrucciones de Interventoría, la interventoría no se hace responsable de cualquier evento, incidente o accidente de trabajo, de ser así será única y exclusivamente responsabilidad del contratista.

Cordialmente,

ANYI ALEJANDRA LÓPEZ DURANGO
Residente SST.
Sinergia interventoría y construcciones SAS



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Medellín, 2 de octubre de 2023

INTERCANFUTDAB-TEC-005-2023

Señores

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-ASOMUDACAR
LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA**

Rep. Legal.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No. CV-019-2023 “ANUAR EZFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.”

ASUNTO: Presunto incumplimiento de requerimientos varios de obra, perteneciente al convenio de la referencia.

Cordial saludo,

Por medio de la presente correspondencia, se le comunica al conveniente del presunto incumplimiento en la entrega de varios requerimientos que se han venido haciendo al subcontratista de obra delegado por su asociación para la ejecución de las actividades descritas en el convenio de la referencia.

A continuación, se relacionan dichos pendientes:

1. En el correo electrónico del pasado 26 de agosto de 2023, por parte de la residente SST de interventoría Tnlga. Alejandra López se solicitaron las correcciones de los IBC a las planillas de seguridad social pagadas en los meses de agosto y septiembre de 2023.

A la fecha del presente comunicado, han pasado 37 días sin recibir ni respuesta ni las correcciones respectivas a dicho requerimiento.

Es de aclarar que el asociado, firmo la aceptación del convenio de la referencia en donde se expresa en la clausula 8 COMPORMISOS DE LAS PARTES, numeral 8.2 DE LA ASOCIACION, inciso 2.23, que cita: “Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 80 de 1993 -adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 -, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al pago de la Seguridad Social integral, así como los propios al Servicio Nacional de aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBFy las cajas de compensación familiar de todo eel personal vinculado directamente a la ejecución del convenio, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución del convenio.”

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Por lo tanto, se queda a la espera del ajuste y entrega de las planillas mencionadas en un **plazo perentorio de 5 días hábiles** a partir de la fecha de entrega del presente comunicado.

2. En la correspondencia **INTERCANFUTDAB-AMB-002-2023** del pasado 18 de septiembre de 2023, por parte del residente ambiental Ing. Juan Sepúlveda se realizaron observaciones varias al informe ambiental No. 2 presentado por el subcontratista de obra y se recalcó la entrega del informe ambiental no. 1 del periodo comprendido entre el 7 de Julio de 2023 al 6 de Agosto de 2023. De igual manera se solicito el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

A la fecha del presente comunicado, han pasado 14 días sin recibir ni respuesta ni las correcciones respectivas a dicho requerimiento.

Se le recuerda al asociado que en el convenio de la referencia en donde se expresa en la cláusula 8 COMPORMISOS DE LAS PARTES, numeral 8.2 DE LA ASOCIACION, inciso 2.1, que cita: "Ejecutar el convenio de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos elaborada para tal efecto, la cual hace parte integral de este convenio", inciso 2.22 que cita: "adoptar las medidas ambientales , sanitarias, forestales , ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro, a las cosas o al medio ambiente, y garantiza que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y proveedores.

Por lo tanto, se queda a la espera del ajuste del informe No. 2, entrega del informe No. 1 y PMA mencionados en un **plazo perentorio de 5 días hábiles** a partir de la fecha de entrega del presente comunicado.

Agradeciendo su atención.

Sandra Milena Franco Vanegas
Representante Legal
SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Medellín, 3 de octubre de 2023

INTERCANFUTDAB-TEC-006-2023

Señores

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-ASOMUDACAR
LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA**

Rep. Legal.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN NO. CV-019-2023 “ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.”

ASUNTO: *Requerimientos de documentación de soporte técnica y administrativa pendientes de sustentación, correspondientes al convenio de la referencia.*

Cordial saludo,

De acuerdo al seguimiento y control de tipo técnico y administrativo al convenio de la referencia, se hace necesario la entrega, por parte del asociado, de la documentación pertinente y descrita en la minuta del convenio y del otrosí No. 1 de la referencia, para ello tenemos:

1. Presentar la justificación de costos presupuestales correspondientes al PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO). Se debe presentar la inversión a realizar con el 2% destinado para el rubro presupuestal PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) que describe en la cláusula segunda del convenio interadministrativo y que equivale al 2% del presupuesto de obra, para el control y seguimiento de la interventoría.
2. Justificar el valor pagado del PGIO (2%) acta de avance de obra No. 1. Se debe presentar la justificación de los gastos en el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) que se calcularon en el acta de avance de obra No. 1 y que deben ser debidamente soportados y aprobados por la interventoría y municipio.
3. Entrega en medio magnético del PAPSO, PMT Y PMA. Se debe entregar a la interventoría copia del PAPSO, PMT Y PMA presentados en la propuesta de obra. Se aclara que el PMT debe ser aprobado por el Municipio de Dabeiba mediante acto administrativo correspondiente.
4. Recibo a satisfacción de la facturación de las actas de avance de obra. Se debe enviar a la interventoría, la factura de cada acta de avance de obra para su recibo a satisfacción y así poder verificar que los valores allí consignados, este acorde al acta presentada, esto según lo indica la cláusula primera del otrosí No. 1 al convenio interadministrativo.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

5. Presentar documento de soporte de subcontratación o administración delegada. Se debe enviar a la interventoría, copia del subcontrato o minuta de la administración delegada, que demuestra vínculo entre la asociación y el ejecutor del contrato de obra, esto según lo indica la cláusula duodécima del convenio interadministrativo.

Se queda a la espera de la entrega oportuna y a la mayor brevedad posible de los requerimientos enunciados.

Agradeciendo su atención.



Sandra Milena Franco Vanegas
Representante Legal
SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Medellín, 6 de octubre de 2023

INTERCANFUTDAB-TEC-008-2023

Ingeniero
RAFAEL EDUARDO MORENO GOMEZ
Supervisor - Secretaria de Infraestructura
MUNICIPIO DE DABEIBA
E.S.M

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN NO. CV-019-2023 “ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.”

ASUNTO: Remisión de concepto técnico sobre viga de fundación para estructura metálica de la cubierta en placa polideportiva, correspondientes al convenio de la referencia.

Cordial saludo,

En la ejecución del seguimiento y control técnico de la interventoría a las obras que se viene ejecutando en el marco del convenio de la referencia, se realiza la trazabilidad a las observaciones a los diseños iniciales y su implementación en campo, teniendo que:

1. El pasado 24 de agosto de 2023, vía correo electrónico, se recibe por parte del Ing. Leonardo Correo, director de obra del contratista los detalles estructurales corregidos de gradería de acuerdo a lo encontrado en el sitio, y de viga de fundación con corrección en el tipo de varilla de refuerzo. Dicho correo electrónico y anexos fueron enviados al especialista estructural de interventoría para su respectivo aval.
2. El día 8 de septiembre de 2023, se envió correo electrónico al contratista de obra por parte del especialista estructural de la interventoría con las observaciones a los detalles presentados.
3. Seguidamente, el día 9 de septiembre de 2023, se recibe por parte del Ing. Leonardo Correo, director de obra del contratista, solicitud de aclaración a la correspondencia enviada por el especialista estructural de interventoría, con una serie de objeciones a las indicaciones y conclusiones dadas en dicho oficio.
4. Posteriormente el mismo día 9 de septiembre de 2023, se envió correo electrónico al contratista de obra por parte del especialista estructural de la interventoría con acatando algunas de las observaciones presentadas por el contratista mediante oficio anexo a dicho correo.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

5. En las semanas siguientes, el contratista procede a la terminación de la construcción de los elementos estructurales objeto de los comunicados anteriormente mencionados.
6. El día 3 de octubre de 2023, y durante la revisión de cantidades ejecutadas a la fecha indicada, la interventoría informa verbalmente al contratista que la viga de fundación no cumple con las observaciones detalladas en los oficios en cuanto al acero de refuerzo indicado. Acto seguido, vía correo electrónico, se recibe por parte del Ing. Leonardo Correo, director de obra del contratista, objeciones a las indicaciones ya impartidas por el especialista estructural de interventoría en cuanto al chequeo del acero de refuerzo de este elemento estructural en un tono desafiante y aseverando que las indicaciones dadas por escrito de la interventoría eran equivocadas.
7. En tono conciliador y con el animo de subsanar los episodios relatados en el presente documento, se solicitó de manera verbal al contratista emitir un comunicado que sustente la presunta equivocación en el concepto técnico emitido por la interventoría con respecto al tema en cuestión. Es por ello que el día 4 de octubre de 2023, se recibe por parte del Ing. Leonardo Correo, director de obra del contratista correspondencia del asesor estructural del contratista, Ing. Sergio Domínguez, argumentando la manera en que fue concebido el diseño de la viga y su presunto cumplimiento con la norma (NSR-10). De inmediato, fue nuevamente trasladado las comunicaciones escritas recibidas por la interventoría para verificación del componente estructural.
8. El día 6 de octubre de 2023, el especialista estructural de interventoría, emite nuevo comunicado evaluando los argumentos del asesor estructural del contratista, el cual se anexa a la presente correspondencia con las conclusiones necesarias para solucionar este inconveniente de diseño de dicha viga de fundación.

Ante los hechos mencionados y descritos de manera fiel a la realidad, la interventoría acude a la administración municipal con la siguiente solicitud:

- Para determinar la aceptación del acero de refuerzo argumentado, figurado, y colocado en obra por el contratista versus las observaciones al mismo por parte de la interventoría, se requiere evaluar el elemento estructural cuestionado con base en su incidencia en el sistema estructural de resistencia sísmica de la estructura. Y para ello se le **requiere a la Secretaria de Infraestructura las memorias de cálculo estructurales del sistema** con el fin de avalar la respuesta dada por el asesor del contratista o en su defecto no recibir a satisfacción la viga de fundación y el no pago de la misma en las actas de avance de obra respectivas por parte de la interventoría.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

De esta manera, la interventoría podrá definir de una vez por todas los pasos a seguir con la aceptación de dicha actividad de obra y que hace parte inherente del convenio de la referencia. Por el momento, el elemento estructural queda pendiente de ser recibido y aprobado por la interventoría y se ve con preocupación las obras sucesoras y que se puedan ver afectadas por la aplicación correcta de la norma en su diseño o la omisión de las recomendaciones de interventoría para tal fin.

Se queda a la espera de la entrega oportuna y a la mayor brevedad posible de los requerimientos enunciados.

Agradeciendo su atención

Sandra Milena Franco Vanegas
Representante Legal
SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Copia: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-
ASOMUDACAR**
LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA
Rep. Legal.

Anexo: correspondencia INGEPRISMA, especialista estructural de interventoría

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735

Dabeiba, octubre de 2023

Oficio: Respuesta a los ingenieros Leonardo Correa Roldan y Sergio Domínguez.

Proyecto: Unidad deportiva de Dabeiba

Cordial saludo apreciados ingenieros contratistas y demás miembros del equipo de interventoría.

El presente oficio tiene como fin dar respuesta al equipo contratista del proyecto de Dabeiba sobre el refuerzo considerado en las vigas de cimentación.

En el primer correo enviado por el ingeniero Leonardo Correa Roldan, se evidencian 2 errores conceptuales, el primero es que calcula el refuerzo a flexión con el área bruta en vez de considerar el área efectiva ($b \cdot d$). El segundo error, es que asocia el A_s con la suma del refuerzo de la parte superior e inferior de la viga, cuando evidentemente A_s se debe analizar separadamente para la fibra a compresión y la fibra a tracción.

Concluimos entonces que la respuesta dada por el ingeniero Leonardo Correa Roldan no tiene validez por su desconocimiento sobre estos conceptos básicos de diseño de elementos a flexión.

En relación al documento enviado por el Ingeniero Sergio Domínguez, identificamos que el cálculo del refuerzo a flexión es correcto. El ingeniero determina una cuantía requerida de **0.00109**. Adicionalmente, el ingeniero hace referencia al capítulo C10.5.3 en el que claramente dice que el refuerzo mínimo requerido por la ecuación C.10-3 no es estrictamente necesario cuando el refuerzo suministrado es por lo menos 1/3 mayor que el requerido por análisis.

Esto significa que el refuerzo suministrado debe ser por lo menos igual o mayor a $1.333 \cdot 0.00109 = 0.00145$, entonces:

$$A_s = 0.00145 \cdot 45\text{cm} \cdot 37.5\text{cm} = 2.45\text{cm}^2$$

El acero suministrado de 3 barras de $1/2"$ = **3.81cm²** es mayor que este valor.

NOTA: Lo anterior únicamente es válido si las vigas que estamos analizando no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. En caso de hacer parte del sistema de resistencia sísmica, la viga se debe diseñar con los requisitos de C.21 y la cuantía

mínima no podrá ser menor que 0.0033 para este caso, siendo así el acero suministrado sería insuficiente. Cabe anotar que las vigas de cimentación hacen parte o no del sistema de resistencia sísmico, dependiendo de la forma en que se realizó el análisis estructural.

En varias ocasiones hemos solicitado comedidamente que se nos suministre la memoria de cálculo, para verificar la hipótesis de diseño y la forma en que fue modelada la estructura. Aceptaremos la respuesta dada por el ingeniero Sergio Domínguez únicamente cuando se nos suministre la memoria de cálculo y podamos verificar que efectivamente la hipótesis considerada por el ingeniero es o no correcta.


Atentamente,

Handwritten signature of Deiler Palacios Cortés in black ink.

Deiler Palacios Cortés

Ingeniero Civil

Mat. 011037-0631620 ANT

Handwritten signature of Juan Sebastián Monsalve Giraldo in black ink.

Juan Sebastián Monsalve Giraldo

Ingeniero Civil | M.Sc. | D.Sc.

Mat. 05202233052 ANT



INFORME DE INERVENTORÍA

ANEXO N°7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.



SERGIO A. DOMÍNGUEZ S.

INGENIERO CIVIL

ESTRUCTURAS DE CONCRETO y DE ACERO

MAT: 05202-161250 ANT

Medellín, octubre 3 de 2023

Señores


PLANEACIÓN M/PAL DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA A OBSERVACIONES

Para el diseño de las vigas de fundación la NSR10 me da otra alternativa, ya que estas vigas solo son vigas de enlace y NO reciben carga vertical (según planos).

Para esto se hizo un modelo matemático de un tramo y se calcula el acero por su propio peso (a flexión). Se desprecia el suelo.

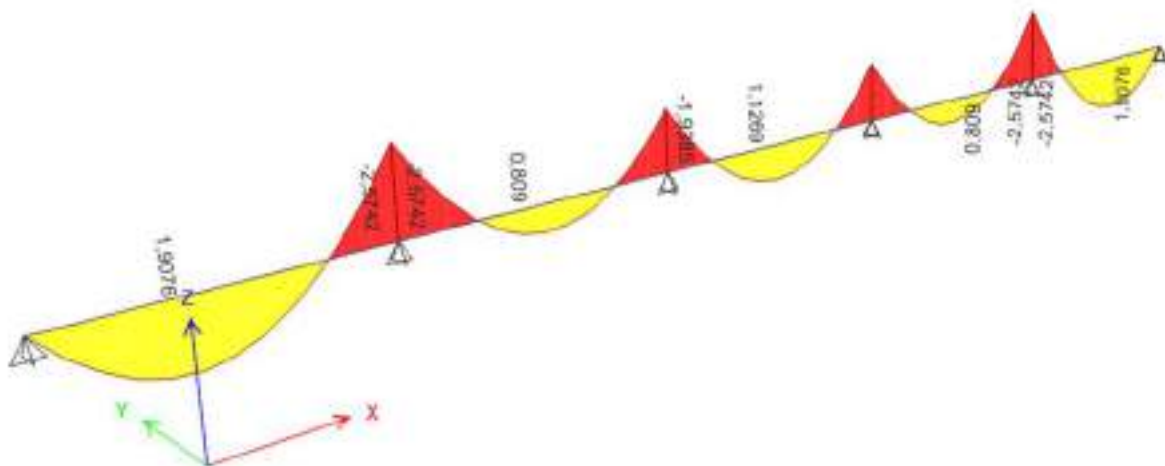

EL modelo en ETABS 2016, se asignó una viga de 45x45 con un concreto de 21 Mpa.

El momento máximo de diseño es de **2.57** ton-m

DISEÑO

H=45cm

B=45cm

r=7.5cm

d=37.50cm

DISEÑO DE REFUERZO EN VIGAS


CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICA DE LA VIGA

Ancho b (cm)=	45
Altura h (cm)=	45

d' (cm)=	7,5
r (cm)=	7,5

PROPIEDADES DE LA VIGA

Momento Ultimo (Tn.m)=	2,57
Resistencia del concreto a los 28 días f'c (kg/cm ²)=	210
Fluencia del acero fy (kg/cm ²)=	4200
Tipo de Zona=	No Sismica ▼
Factor de reducción (ø)=	0,9



RESULTADOS INICIALES

peralte efectivo d (cm)=	37,5
β_1 =	0,85
pb=	0,021675
As (cm ²)=	1,83656645
p=	0,001088336
pmax=	0,01625625
pmin=	0,003333333
As max. (cm ²)=	27,43242188
As min. (cm ²)=	5,625

EL ACERO FLUYE (FALLA DUCTIL)

Utilice Acero Mínimo

ENTONCES: As (cm²)= 1,83656645 <== RESULTADO

Se utilizaron $3\phi 1/2. = 3 \cdot 1.27 \text{cm}^2 = 3.81 \text{cm}^2 > 1.84 \text{cm}^2$ (Ok)

Acero mínimo = $pbd = 0.00333 \cdot 45 \text{cm} \cdot 37.5 \text{cm} = 5.62 \text{cm}^2$

Pero la norma nos da la siguiente opción.

CRI0.5.3 — El refuerzo mínimo requerido por la ecuación (C.10-3) debe proporcionarse dondequiera que se necesite refuerzo, excepto cuando dicho refuerzo sea 1/3 mayor que el requerido por el análisis. Esta excepción proporciona suficiente refuerzo adicional en elementos grandes en los cuales la cantidad requerida por C.10.5.1 ó C.10.5.2 sería excesiva.

$$5.62\text{cm}^2 / 3 = 1.87\text{cm}^2 > 1.84\text{cm}^2 \text{ (Se cumple).}$$

Por tanto, se pueden colocar las 3 ϕ 1/2...



SERGIO ANDRÉS DOMINGUEZ SEHUANES
INGENIERO CIVIL
MAT N° 05202-161250 ANT.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
05202161250ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 27/11/2008
SERGIO ANDRES
DOMINGUEZ SEHUANES
C.C. 71317631
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Andres Dominguez Sehanes', written over a horizontal line.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SERGIO ANDRES DOMINGUEZ SEHUANES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 71317631, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-161250 desde el 27 de Noviembre de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1149.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Mayo del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



INFORME DE INERVENTORÍA

ANEXO N°8 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL





INFORME AMBIENTAL

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA
CV -N. ° 020-2023**

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

PERIODO 7 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2023.



10 DE OCTUBRE DE 2023



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	4
2.1 GENERAL	4
2.2 Específicos:	4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
5. INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	7
5.1 Actividades de obra desarrolladas:	8
5.2 Documentación parque automotor en obra.	10
6. INVERSION AVANCE AMBIENTAL	11
7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	12
7.1 CORRESPONDENCIA GENERAL RECIBIDA Y ENVIADA	12
8. CONCLUSIONES	12





1. INTRODUCCIÓN

La unidad deportiva del municipio de Dabeiba, es un ente deportivo el cual le aporta a la comunidad Dabeibana, un espacio de educación y recreación. Por ello la Administración Municipal, se interesó en realizar las adecuaciones necesarias para que este escenario siga siendo un referente de la región.

Para lograr esta meta, El municipio de Dabeiba, realizó la contratación de ASOMUDACAR como contratista, mediante la modalidad de contratación **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. N. ° 019-2023** y cuyo objeto contractual es la **“ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.** “Así mismo y velando siempre por los intereses de sus habitantes, se tiene una interventoría contratada a MASER, quien realizará las labores de supervisión en diferentes ámbitos que permitan la ejecución efectiva y eficaz del objeto del contrato.

Se busca contar con una infraestructura física segura, confiable y modernizada con el propósito de facilitar el desempeño de sus servidores y así tener funcionalidad y uso de un servicio institucional acorde de sus necesidades.

Haciendo referencia a las actividades ambientales a ejecutar en el proyecto, es necesario llevar a cabo un seguimiento del cumplimiento del plan de manejo ambiental, el cual fue elaborado inicialmente para así realizar los programas de control.



2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Sustentar ante la Administración municipal de Dabeiba, el estado de ejecución de las actividades ambientales programadas y ejecutadas por el contratista de obra, durante el periodo del informe, con los controles realizados por el área ambiental de la interventoría para el buen y correcto desarrollo de dichas actividades, cumpliendo con los requerimientos Ambientales.

2.2 Específicos:

- Verificar el cumplimiento a los requerimientos establecidos en el contrato.
- Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el contratista.
- Realizar seguimiento y control a los componentes y programas enunciados en el Plan de Manejo Ambiental.
- Elaborar los informes mensuales.

INFORME DE ACTIVIDADES	No. 1		
PERIODO	Del 7 de septiembre de 2023 al 6 de octubre de 2023		
FECHA DE ELABORACIÓN	Día	Mes	Año
	10	10	2023



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto “ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.”

El propósito de dar terminación a la unidad deportiva es que toda la población del municipio cuente con un mejor ambiente deportivo.

Se busca contar con una infraestructura física segura, confiable y modernizada con el propósito de facilitar el desempeño de sus servidores y así tener funcionalidad y uso de un servicio deportivo acorde de sus necesidades.

Para el componente Ambiental se solicitó presentar el Plan de Manejo Ambiental para la verificación y seguimiento de las actividades Ambientales que serían ejecutadas en el Proyecto.

Dicho Plan debería tener Componentes y Programas para Seguimiento, Control y Mitigación de los Impactos Ambientales que podrían ser generados por las actividades de construcción realizadas en obra para cumplir con el Alcance Final del Proyecto.

Se tiene unos rubros asignados para:

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA, PMA, PMT..... \$48.140.488

Rubro el cual hasta la fecha de este Informe no ha sido desglosado, teniendo en cuenta que se encuentra generalizado como un solo ITEM o Actividad a Ejecutar.



4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Se encuentra localizado en el Municipio de Dabeiba, Antioquia, el cual se encuentra ubicado al noroccidente de la subregión Occidente. Limita al norte con los municipios de Ituango y Mutatá; al oriente con los municipios de Peque y Urumita; al sur con el municipio de Frontino; y al occidente con el municipio de Murindó y el departamento del Chocó.

Superficie del municipio de Dabeiba	190.500 hectáreas 1.905,00 km ² (735,52 sq mi)
Altitud del municipio de Dabeiba	753 metros de altitud
Coordenadas geográficas	Latitud: 7° 0' 0" Norte Longitud: 76° 15' 0" Oeste



(Fuente: Imagen Internet)



5. INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

En este periodo se ejecutó el control administrativo, técnico, ambiental, financiero, contable y jurídico de acuerdo con las funciones establecidas para la interventoría externa; se revisó la proyección de los alcances del contrato y lo necesario para cumplir a cabalidad el objeto del mismo, teniendo en cuenta la evaluación de las actividades contractuales, actividades contractuales adicionales, obras necesarias no contempladas y obras extras al presupuesto relacionado.

Así mismo se realizó revisión de la documentación aportada para el contrato como vigencia del mismo, pólizas establecidas, personal de obra debidamente acreditado, afiliaciones y pago de seguridad social al personal de obra correspondiente, revisión de planes y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo y programación de obra.

En campo estuvo la interventoría atenta a revisar que cada actividad ejecutada estuviera de acuerdo con la descripción de los ítems presupuestados y sus especificaciones, con todos sus elementos ubicados con exactitud, instalados adecuadamente, con los materiales requeridos para cada actividad y sus respectivos certificados de calidad y, por último, controlar su adecuada ejecución en obra.

Durante este periodo no se ejecutaron comités de obra.

En el avance del periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2023 y el 6 de octubre de 2023, se realizaron observaciones al contratista de obra tales como, al fecha de elaboración de este documento no se ha realizado la entrega del informe ambiental por parte del contratista, correspondiente al periodo indicado anteriormente.



INFORME AMBIENTAL

5.1 Actividades de obra desarrolladas:

Se adelantaron las siguientes actividades durante el presente período:

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

PRORAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.

Este proyecto no requiere aprovechamiento de individuos arbóreos.

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.

No aplica para el periodo

Proyecto 3. Protección de fauna.

No aplica para el periodo

Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.

No aplica para el periodo

PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

Campamentos: Instalación de los campamentos, para ello realiza lo siguiente:

- Materiales en obra ordenados y protegidos.



INFORME AMBIENTAL



Materiales de obra por demolición sin protección.



Materiales de obra por demolición sin protección.



Materiales de obra por demolición sin protección.



Materiales de obra por demolición sin protección.

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

- Mantenimiento Punto ecológico con señalización.



INFORME AMBIENTAL

No se observaron evidencias de estos mantenimientos y/o jornadas de recolección, teniendo en cuenta que en visita realizada por el ingeniero ambiental del contratista no hubo jornada y por parte del contratista, no se envían dichas evidencias.

5.2 Documentación parque automotor en obra.

Documentos maquinaria en obra

Licencia conductor maquinaria de obra

SINERGIA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



6. INVERSION AVANCE AMBIENTAL

El contratista no realizó la entrega del desglose de las actividades ejecutas en el periodo comprendido en este documento.

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME AMBIENTAL

7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

7.1 CORRESPONDENCIA GENERAL RECIBIDA Y ENVIADA

Para este periodo no hay correspondencia.

8. CONCLUSIONES

Se han realizado acercamiento al homologo Ambiental del Contratista, dándole conocimiento de la no entrega en los tiempo solicitados de los informes mensuales, para así, cumplir con los componentes contractuales del Área Ambiental.

Para los próximos informes se tendrá en cuenta a cabalidad lo consignado en el Plan de Manejo Ambiental Inicial.


JUAN SEPULVEDA OCHOA
Residente Ambiental
C.C 1.067.857.607

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



ANEXO N°9 INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





INFORME MENSUAL SST

**INFORME N°03 MENSUAL SST
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA-AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS OCMponentes: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA”**



INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 hasta el 06 DE OCTUBRE DE 2023

**INTERVENTOR:
MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RÍO NEGRO
NARE
MASER**

**SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 020-2023**

**CONTRATISTA:
ASOMUDACAR
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CV-019-2023**

MUNICIPIO DE DABEIBA-BARRIO OBRERO



INFORME MENSUAL SST

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
JUSTIFICACIÓN.....	3
MARCO LEGAL.....	4
Objetivo general.....	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	6
Alcance del informe.....	6
1.2. sistema de seguridad social.....	8
1.3. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	10
1.4. FORMACIÓN	11
1.4.1. INDUCCIÓN GENERAL	11
1.4.2. CAPACITACIONES SST.....	12
1.4.3. CHARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS	12
1.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	13
1.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD	14
1.7. TAREAS DE ALTO RIESGO	15
1.8. PLAN DE EMERGENCIAS	15
1.9. Control vial.....	16
1.10. ORDEN Y ASEO	17
1.11. PUNTO ECOLOGICO.....	17
1.12. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.....	18
1.13. Rotulado y etiquetado.....	19
2. Caracterización de ausentismo	19
2.1 . ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.....	19
2.2. causas de origen no laboral.....	20
listado de anexos.....	21



INTRODUCCIÓN

Nosotros **SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**, en cabeza de MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RÍO NEGRO NARE”, realiza la supervisión y seguimiento al **CONVENIO: “ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA-AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS OCMponentes: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA”** con la cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la dirección y de todos los trabajadores con los principios de seguridad y salud en el trabajo y conservación del medio ambiente, cumpliendo así con el plan de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente elaborado para la obra.

JUSTIFICACIÓN

Se busca que el contratista mediante la aplicación de conceptos teóricos sobre salud y seguridad en el trabajo, la prevención de riesgos laborales, conservar la salud en el entorno laboral, las condiciones y factores de riesgo en situaciones internas (el cumplimiento de la normatividad, la actitud por mantener prevención de riesgos y la concientización por parte de la organización – trabajadores) y del entorno (capacitación en prevención de riesgos laborales) que afectan a las empresas.

Lo anterior permitirá verificar diferentes conceptos fundamentales de la salud y seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales, dentro de la realidad que hoy presenta la empresa.

Su resultado permitirá encontrar alternativas de solución acorde con las necesidades de la empresa y ajustadas a la normatividad legal vigente, la seguridad ocupacional y prevención de riesgos laborales.



MARCO LEGAL

1. Ley 1562/2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dicta otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
2. Ley 1355 de 14 de oct 2009 Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención.
3. Ley 9/1979 por la cual se dictan medidas sanitarias.
4. Decreto 1072/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
5. Decreto 1295/1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
6. Decreto 2090/2003 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.
7. Resolución 4272/2021 por la cual se establecen los requisitos mínimos para el desarrollo de trabajo en alturas.
8. Resolución 0312 de 2019 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del SG-SST para empleadores y contratantes.
9. Resolución 652/2012 Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en Entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
10. Resolución 2013/1986 Por la cual se reglamenta la organización funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
11. Resolución 2400/1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
12. Resolución 2346/2007 “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”
13. Resolución 1401/2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
14. Circular 072 de 2020, Autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST.
15. Resolución 0223 Orientar en las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19, para adaptar en los diferentes sectores diferentes al sector salud con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades.



OBJETIVO GENERAL

Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores administrativos y operativos al CONVENIO: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA-AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS OCOMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA”** y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para este proyecto se tuvieron en cuenta objetivos específicos, estos relacionados con las exigencias del proyecto como:

- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.
- Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo laboral mediante la revisión periódica.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen al proyecto.
- Implementar planes, procedimientos, guías de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de los AT y EL.
- Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
- Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores.
- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.



INFORME MENSUAL SST

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



ALCANCE DEL INFORME





INFORME MENSUAL SST

INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SST

NOVEDADES CONTRATRISTA	
INGRESOS	4
RETIROS	2

1.1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO

En el periodo comprendido del 07 de septiembre de 2023 al 06 de octubre del 2023. el cual estuvo a cargo del contratista ASOMUDACAR se realizaron las siguientes actividades constructivas, las cuales tuvieron acompañamiento permanente por parte del personal SST de la interventoría y del contratista:

Las cuales son:

- Excavación para construcción de cajas de inspección
- Corte y armado de estructura metálica
- Corte y armado de formaleta
- Encofrado de gradería
- Lleno de pilotes y compactación
- Nivelación de triturado
- Amarrado de vigas
- Fundición de graderías
- Figuración de hierro
- Instalación de tubería 6"
- Lleno y compactación de filtros
- Fundición de cajas de inspección
- Corte de tubería galvanizada e instalación en cerramiento perimetral
- Encofrado para viga fundación
- Vaciado de viga fundación
- Desencofrado de viga fundación
- Imprimación sobre base granular



INFORME MENSUAL SST

REGISTRO FOTOGRAFICO



1.2. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la Ley 100 de 1993, que es el marco general legal de la seguridad social. Tal como la define en la siguiente frase:



“La seguridad social integrada es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, los empleados vinculados al proyecto deben contar con afiliaciones a la seguridad social, EPS, AFP, ARL y pago integrado de la seguridad social, a través de la planilla electrónica. En este orden el personal que labora, por parte de la interventoría cumple con los requisitos exigidos.

La interventoría validó la información entregada de manera electrónica y física, y procedió con la elaboración del listado de personal en obra, a fin de contar con la base de datos actualizada y efectuar el seguimiento respectivo. De acuerdo con la información anterior, el contratista entregó los aportes al Sistema de Seguridad Social en los que se le hizo la observación por el no cumplimiento de algunos IBC, a lo que se comprometió ponerse al orden del día desde el periodo informe #2 con dicho incumplimiento y a la fecha del presente informe no se han obtenidos respuestas de su respectivo cumplimiento. A continuación, se anexa tabla de novedades.

PLANILLA JULIO						
NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE-CONVENIO	PAGO DE SS	DIAS	NOVEDADES
LEONARDO CORREA ROLDAN	15.326.333	Director de obra	\$ 7.500.000	\$ 3.200.000	30	NO CUMPLE
SANTIAGO CUARTAS GONZALES	1.128.401.933	Auxiliar SST	\$ 2.800.000	\$ 1.020.000	17	NO CUMPLE

SINERGIAS
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

PLANILLA AGOSTO						
NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE-CONVENIO	PAGO DE SS	DIAS	NOVEDADES
LEONARDO CORREA ROLDAN	15.326.333	Director de obra	\$ 7.500.000	\$ 3.200.000	30	NO CUMPLE
YOVANI ZAPATA ZABALA	15.328.893	Ingeniero residente	\$ 5.500.000	\$ 5.500.001	30	CUMPLE
EVELIN CRISTANCHO SANCHEZ	1.108.120.972	Profesional SST	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	30	CUMPLE
WILDER ANTONIO USUGA	71.330.961	Maestro encargado	\$ 3.000.000	\$ 3.500.000	30	CUMPLE
DORA MARIA MARIN QUIROZ	43.416.906	técnico o tecnólogo SST	\$ 2.800.000	\$ 1.995.000	21	CUMPLE

Ver Anexo N°1: Seguridad social

1.3. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

A fin de detectar patologías previas que puedan acelerar la aparición y desarrollo de enfermedades de origen común y/o laboral, y cumpliendo con lo dictaminado en la Resolución 2346 del 11 de julio de 2007 “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”. El personal antes de su ingreso debe contar con la realización de la evaluación médica ocupacional. Para el periodo del presente informe, el contratista ASOMUDACAR, presentó 4 ingresos de personal, los cuales presentaron el respectivo examen de ingreso ocupacional.

INGRESOS		
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
CRUZ ANGEL MORALES CARTAGENA	8.415.806	Ayudante de obra
CARLOS FELIPE LOPEZ MONSALVE	1.001.620.428	Ayudante de obra
JOSE HERNAN DURANGO PINO	1.027.941.661	Oficial
OSCAR HERNAN TUBERQUIA POSSO	1.039.288.899	Ayudante de obra

Ver Anexo N° 2: Exámenes médicos ocupacional

1.4. FORMACIÓN

Durante el periodo del presente informe se llevaron a cabo las siguientes actividades por el contratista en pro de fomentar la seguridad y salud de los trabajadores:

1.4.1. INDUCCIÓN GENERAL

El **Decreto 1072** de 2015 obliga a las empresas a implementar dentro de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST), la realización de inducción y reinducción a los trabajadores en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo (Art. 2.2.4.6.11).

Para el periodo del presente informe, el contratista ASOMUDACAR, presentó 4 ingresos de personal a los cuales se les realizó su respectiva inducción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ver Anexo N° 3: Registro de inducción SST

1.4.2. CAPACITACIONES SST

Para el periodo del presente informe, el contratista ASOMUDACAR, presentó las siguientes capacitaciones al personal para que puedan desempeñar sus labores con autocuidado y responsabilidad, con base a los reglamentos contenidos en el SG-SST.

Nombre de la capacitación	Fecha de realización	Quien realiza la capacitación	Duración
Brigada de emergencias	11/09/2023	Dora Maria Marín - Aux SST	1 hora
Punto de encuentro	16/09/2023	Dora Maria Marín - Aux SST	1 hora

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ver Anexo N° 4: Registro de charlas

1.4.3. CHARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS

Para el periodo del presente informe el contratista ASOMUDACAR, presenta temas en pro de prevención de incidentes, accidentes y enfermedad laboral, adoptando también la cultura por realizar las pausas activas al inicio de la jornada laboral.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ver Anexo N° 4: Registro de charlas


1.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Dependiendo de la actividad constructiva desarrollada, se asignan los elementos de protección personal. Para el periodo evaluado, se suministraron básicamente los siguientes:

- ✓ Casco de seguridad
- ✓ Calzado con puntera de seguridad
- ✓ Guantes tipo vaqueta
- ✓ Guantes de nitrilo
- ✓ Protección auditiva
- ✓ Protección visual
- ✓ Camisa manga larga
- ✓ Careta

En cuanto a la asignación y reposición de los elementos de protección personal, es efectiva en cantidad y calidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

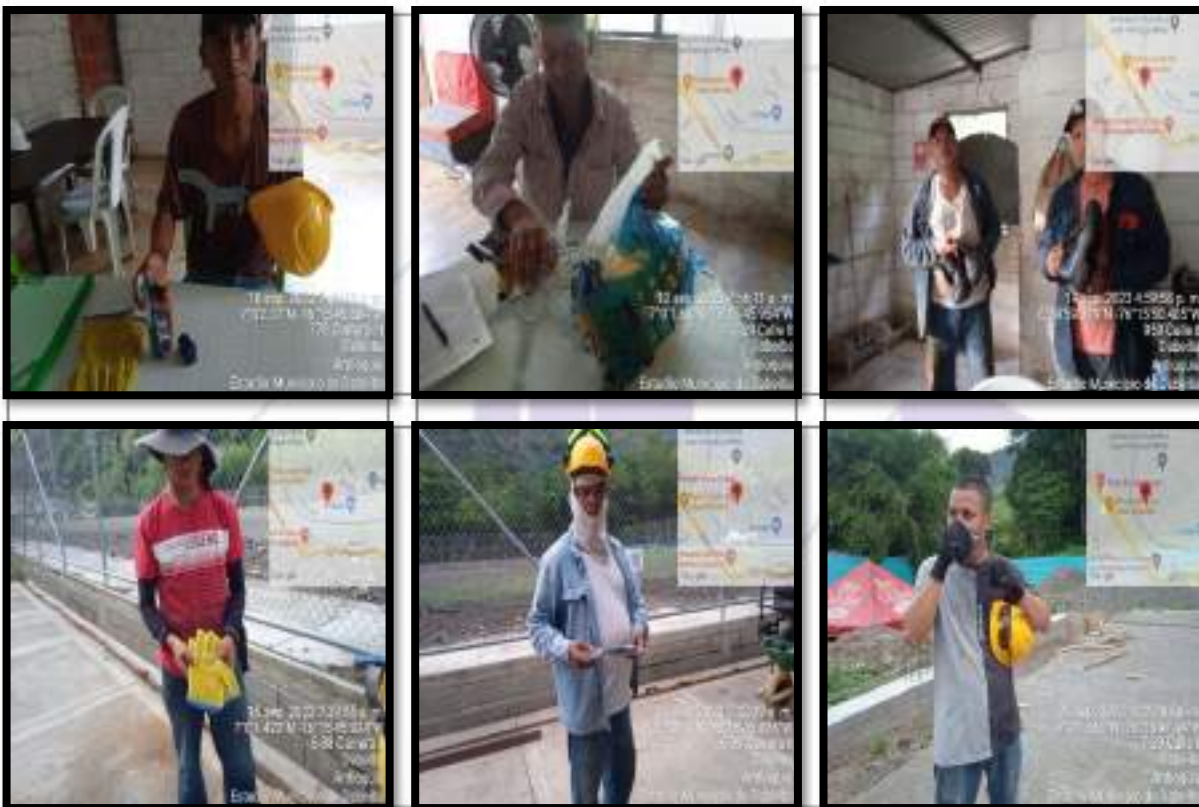

Ver Anexo N° 5: Registro entrega de elementos de protección personal

1.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Para el periodo comprendido en el presente informe a cargo del contratista ASOMUDACAR, se realizó recorridos a los diferentes espacios del frente de obra validando lo siguiente (Decreto 1072. Art 2.2.4.6.15):

- Personal autorizado vs personal en campo
- Disponibilidad y uso adecuado de los elementos de protección personal
- Verificación de la señalización y demarcación de las zonas de trabajo
- Inspecciones de herramientas
- Inspección locativa
- Inspección de utensilios de primeros auxilios

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ver Anexo N°6: Inspecciones de seguridad

1.7. TAREAS DE ALTO RIESGO

En el periodo comprendido del 07 de septiembre del 2023 al 06 de octubre de 2023 a cargo del contratista ASOMUDACAR, se realizaron actividades de trabajo en caliente para la elaboración de estructura metálica de la cubierta de la placa polideportiva e instalación de tubería metálica en cerramiento perimetral.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ver Anexo N°7: Permisos para tareas de alto riesgo

1.8. PLAN DE EMERGENCIAS

El **Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25**, indica que cada empresa *“debe implementar y mantener las disposiciones necesarias, en materias de prevención,*

preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.”

El contratista ASOMUDACAR cumple con la norma anteriormente mencionada para una respuesta más rápida y eficiente en caso de una emergencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ver Anexo N°8: Plan de emergencias

1.9. CONTROL VIAL

El contratista ASOMUDAR capacitó a 2 colaboradores pertenecientes al proyecto para realizar la actividad de control vial para el cargue y descargue de materiales, el cual hasta la presente fecha se realiza con una paleta de pare y siga.

NOTA: Hasta la fecha del presente informe el contratista no ha hecho entrega del respectivo PMT a la interventoría, así mismo presenta incumplimiento con la entrega anticipada de la documentación requerida de los vehículos y operadores que ingresan a la obra para una ágil atención ante una posible eventualidad, lo cual se le ha solicitado en reiteradas ocasiones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1.10. ORDEN Y ASEO

Se diseñó e implementó en el proyecto, el programa de orden y aseo por parte del contratista ASOMUDACAR durante el periodo evaluado, en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realiza orden y aseo en bodegas, oficina y frente de obra.
- Se hace recolección de residuos sólidos en obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1.11. PUNTO ECOLOGICO

El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución No. 2184 de 2019 que unifica también los colores que deberán tener las canecas de basura. Para el periodo evaluado en el presente informe la empresa contratista ASOMUDACAR, cumple con lo mencionado anteriormente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1.12. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Se realizó recorrido a las diferentes zonas de trabajo durante el periodo comprendido, inspeccionando el estado y visibilidad de las señales instaladas, al igual que su utilidad frente a la prevención del riesgo.

Durante el periodo comprendido se emplearon señalización adhesiva (obras civiles) en puntos visibles para los empleados y visitantes, Se implementa señalizaciones preventivas, informativas, de emergencias y se restringe el paso en zonas peligrosas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1.13. ROTULADO Y ETIQUETADO

El decreto 1496 de 2018 en su ART 7. “La etiqueta de los productos químicos deberá contener los elementos definidos en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Los productos deben estar etiquetados incluso si están destinados para uso exclusivo en lugares de trabajo”.

De acuerdo con lo expresado anteriormente el contratista ASOMUDACAR en el periodo contemplado, cumple con la norma establecida en los procesos de rotulado y etiquetado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO

2.1. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

La Ley 1562 de 2012 define accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por



cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servidos temporales que se encuentren en misión”.

Por su parte, la Resolución 1401 de 2007, plantea la siguiente definición: “Incidente de trabajo es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos”.

En el periodo evaluado del 07 de septiembre del 2023 al 06 de octubre de 2023 para el contratista ASOMUDACAR, no se presentó ningún caso de accidentes ni incidente de trabajo.

2.2. CAUSAS DE ORIGEN NO LABORAL

Se realiza seguimiento a los eventos de origen no laboral: enfermedad general, licencia de maternidad y/o paternidad y accidente de tránsito.

Los demás sucesos que generan ausencias de los puestos de trabajo estarán a cargo del contratista de acuerdo a sus directrices.

En el periodo comprendido del 07 de septiembre 2023 al 06 de octubre de 2023 para el contratista ASOMUDACAR se presentó 1 caso de ausentismo por causa no laboral.

	SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST-033
	ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL AUSENTISMO LABORAL POR CAUSA MÉDICA 2023	FECHA	3/03/2023
		VERSION	1















MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA TRABAJADOR	OBRA	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (A.T., E.L., E.G.)	PERIODO DE INCAPACIDAD		DÍAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA	TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD	DÍAS ASEGURADOS AT	DÍAS ASEGURADOS E	DÍAS ASEGURADOS EI	CÓDIGO DIAGNOSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CONDICIÓN DE SALUD	OBSERVACIONES
							INICIAL	FINAL									
SEPTIEMBRE	SERGIO OLIVERMUÑOZ TUBERQUIA	1.000.867.311	ESTADIO DABIEBA	AYUDANTE	A	E.G.	20/09/2023	22/09/2023	3	0	3	0	0	0	RSX	MALESTAR Y FATIGA	

Ver Anexo N°9: Ausentismo por enfermedad común

Elaborado por:

**Anyi Alejandra López D.
C.C. 1.028.034.664
Residente SST-Interventoría**

LISTADO DE ANEXOS

-  Anexo N° 1: Seguridad social
-  Anexo N° 2: Exámenes médicos ocupacional
-  Anexo N° 3: Registro de Inducción
-  Anexo N° 4: Registro de capacitación y charlas de seguridad
-  Anexo N°5: Registro de entrega de elementos de protección personal
-  Anexo N° 6: Inspecciones de seguridad
-  Anexo N° 7: Permisos para tareas de alto riesgo
-  Anexo N° 8: Plan de emergencias
-  Anexo N° 9: Ausentismo por enfermedad común
-  Anexo N° 10: Hoja de vida de los equipos
-  Anexo N° 11: Base de Datos
-  Anexo N° 12: Plan de trabajo anual
-  Anexo N° 13: Egresos de personal
-  Anexo N° 14: Oficios SST

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S



INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 1

Seguridad social

Interventoría

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-12, 09:35:06 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

65632662

Periodo Cotización:

agosto de 2023

Periodo Servicio:

septiembre de 2023

PAGADO 12/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS		
Documento	NI901026111	Dirección	CL 49E #83 A - 196 INTERIOR 1104
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6045914585
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FRANCO VANEGAS SANDRA MILENA	Identificación	CC 43635791
Total Afiliados	10	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMC	VAC	APP	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias RAR	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000633885	SALOME BANOY FRANCO	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1028034664	ANYI ALEJANDRA LOPEZ DURANGO	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.800.000	\$ 72.000	6,960	\$ 1.800.000	\$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300
CC 1036951149	ESTEFANIA CORREA SEPULVEDA	01	00		X																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.700.000	\$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.700.000	\$ 68.000	6,960	\$ 1.700.000	\$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.700.000	\$ 68.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 526.400
CC 1039049996	DANIELA QUINTERO LOPEZ	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.700.000	\$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.700.000	\$ 68.000	6,960	\$ 1.700.000	\$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.700.000	\$ 68.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 526.400
CC 1066518091	ANA MARIA PRASCA GUTIERREZ	01	00		X																	0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	6,960	\$ 1.380.000	\$ 96.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 427.300
CC 1066573710	SILVANA MONTOYA AREIZA	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.100.000	\$ 336.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.100.000	\$ 84.000	6,960	\$ 2.100.000	\$ 146.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.100.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.200
CC 1069505802	MAURICIO OYOLA MONTES	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(MIN002) ADRES MIN002	\$ 3.200.000	\$ 128.000	6,960	\$ 3.200.000	\$ 222.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.200.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 990.800
CC 43819836	NIDIA PETRONA PARODY RUA	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.600.000	\$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.600.000	\$ 104.000	6,960	\$ 2.600.000	\$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.600.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 805.000
CC 71211012	ALEXIS AGUILAR BUSTAMANTE	01	00		X	X																0	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.066.667	\$ 490.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.066.667	\$ 122.700	6,960	\$ 3.066.667	\$ 213.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.066.667	\$ 122.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 949.600
CC 71682952	JOSE FERNANDO ALZATE MOLINA	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 5.600.000	\$ 952.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 5.600.000	\$ 224.000	6,960	\$ 5.600.000	\$ 389.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 5.600.000	\$ 224.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.789.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 24.306.667	\$ 24.306.667	\$ 24.306.667	\$ 24.306.667	\$ 3.945.100	\$ 972.300	\$ 1.692.300	\$ 972.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.582.000	\$ 58.700	\$ 7.640.700



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-12, 09:28:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT	NI 901026111
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65632662
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	155364330
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 7.640.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	\$ 2.024.000	\$ 15.700
N800229739	230201	PROTECCION	4	\$ 1.014.400	\$ 7.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 906.700	\$ 7.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 72.000	\$ 600
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 185.600	\$ 1.500
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 362.700	\$ 2.800
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 224.000	\$ 1.800
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 128.000	\$ 1.000
N890903790	14-11	ARL SURA	10	\$ 1.692.300	\$ 13.000
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	10	\$ 972.300	\$ 7.500

SubTotales: \$ 7.582.000 \$ 58.700
Total a Pagar: \$ 7.640.700



PAGADO 12/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS		
Documento	NI901026111	Dirección	CL 49E #83 A - 196 INTERIOR 1104
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6045914585
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FRANCO VANEGAS SANDRA MILENA	Identificación	CC 43635791
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMC	AMP	AC	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017150777	CINDY JOANA MORALES MONSALVE	59	00																	0	0	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.800
CC 1036649373	MONICA GISELA QUIROS CORTES	59	00	R																0	0	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	6,960	\$ 2.100.000	\$ 146.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 5.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.000	\$ 2.800	\$ 357.800

Medellín, 12 de septiembre de 2023

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de SuAporte.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

Documento de Identidad: NI 901026111

Usuario: FRANKLIN DUQUE

Teléfono: 6045914585

Número de Planilla: 65632478

Fecha de Recepción: 12 de septiembre de 2023

Periodo de Cotización: 2023-08

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-11 - ARL SURA

Número de empleados: 2

Valor: \$357.800

Total Pagado: \$357.800

Cualquier inquietud adicional, comuníquese con nuestras Líneas de Servicio al Cliente: Barranquilla: 385 24 44, Bogotá: 742 44 88, Bucaramanga: 697 87 27, Cali: 485 94 44, Cartagena: 693 77 27, Pereira: 340 13 27, Manizales: 892 80 27, Medellín: 604 27 27, desde otras ciudades: 018000 51 99 77, servicioalcliente@enlace.com.co

Cordialmente,
SERVICIO AL CLIENTE

PAGADO 22/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA GISELA QUIROS CORTES		
Documento	CC1036649373	Dirección	CR 11 #7 - 82
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5731135
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	DABEIBA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMC	AMP	ACP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036649373	MONICA GISELA QUIROS CORTES	03	00	X																0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.100.000	\$ 336.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.100.000	\$ 262.500	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 336.000	\$ 262.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.500	\$ 2.700	\$ 601.200

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-22, 12:45:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	MONICA GISELA QUIROS CORTES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1036649373
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65643983
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	175740626
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 601.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 336.000	\$ 1.500
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 262.500	\$ 1.200

SubTotales: \$ 598.500 \$ 2.700
Total a Pagar: \$ 601.200



Comprobante

de pago en línea



ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

Nro. de recibo: 65643983

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 1036649373

Fecha y hora de la transacción: Viernes 22 de Septiembre de 2023 12:46:02 PM

Nro. de comprobante: 0000080913

Valor pagado: \$ 601,200.00

Producto: *****8197

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO - Administración Financiera de Colombia

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249583	0	INGEPRISMA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 29 A 50-159	BELLO-ANTIOQUIA	4520874	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149873099	9456136859	E	2023/09/20	2023/09/08	BANCOLOMBIA	0	\$3,413,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)					\$3,905,334	\$625,000			\$3,905,334	\$156,400			\$3,905,334	\$156,400			\$3,905,334	\$272,100		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)					\$3,905,334	\$625,000			\$3,905,334	\$156,400			\$3,905,334	\$156,400			\$3,905,334	\$272,100		\$0	\$0		
Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)					\$3,905,334	\$625,000			\$3,905,334	\$156,400			\$3,905,334	\$156,400			\$3,905,334	\$272,100		\$0	\$0		
1	CC 1144197254	BEDOYA MONTOYA JUAN MANUEL	231001	4	\$154,667	\$24,800	EPS010	4	\$154,667	\$6,200	CCF03	4	\$154,667	\$6,200	14-11	4	\$154,667	\$10,800	4	\$0	\$0		
2	CC 1040377126	GOMEZ SANTAMARIA ELIFAZ	230201	1	\$38,667	\$6,200	ESSC24	1	\$38,667	\$1,600	CCF03	1	\$38,667	\$1,600	14-11	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0		
3	CC 1039449461	GONZALEZ RIOS DIEGO FERNANDO	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0		
4	CC 1027963711	MARTINEZ CHARRASQUIEL PITER ALEXANDER	25-14	18	\$696,000	\$111,400	EPS037	18	\$696,000	\$27,900	CCF03	18	\$696,000	\$27,900	14-11	18	\$696,000	\$48,500	18	\$0	\$0		
5	CC 1028011331	PETRO OSORIO EUGENIO DE JESUS	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0		
6	CC 1238338920	RODRIGUEZ BERRIO JOSE ALEJANDRO	230301	18	\$696,000	\$111,400	EPS037	18	\$696,000	\$27,900	CCF03	18	\$696,000	\$27,900	14-11	18	\$696,000	\$48,500	18	\$0	\$0		
EMPLEADO					\$7,114,667	\$1,138,400			\$7,114,667	\$284,600			\$7,114,667	\$284,600			\$7,114,667	\$495,600		\$0	\$0		
Sucursal: RIESGO 5 (7 Afiliados)					\$7,114,667	\$1,138,400			\$7,114,667	\$284,600			\$7,114,667	\$284,600			\$7,114,667	\$495,600		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)					\$7,114,667	\$1,138,400			\$7,114,667	\$284,600			\$7,114,667	\$284,600			\$7,114,667	\$495,600		\$0	\$0		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)					\$7,114,667	\$1,138,400			\$7,114,667	\$284,600			\$7,114,667	\$284,600			\$7,114,667	\$495,600		\$0	\$0		
7	CC 71491680	BEDOYA JIMENEZ ALVARO ANTONIO	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0		
8	CC 1128278613	MONSALVE GIRALDO JUAN SEBASTIAN	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0		
9	CC 1028041045	OTALVARO ESCOBAR VICTOR ANDRES	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0		
10	CC 1001672404	PALACIOS CORTES DEILER	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0		
11	CC 1152226529	PARAMO GIRALDO VALENTINA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0		
12	CC 1128416091	PINEDA RUIZ DAVID ESTEBAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0		
13	CC 71490446	ROMAN QUINTERO GILDARDO ANTONIO	25-14	4	\$154,667	\$24,800	EPS010	4	\$154,667	\$6,200	CCF03	4	\$154,667	\$6,200	14-11	4	\$154,667	\$10,800	4	\$0	\$0		
Total	Afiliados(13)				\$11,020,001	\$1,763,400			\$11,020,001	\$441,000			\$11,020,001	\$441,000			\$11,020,001	\$767,700		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249583	0	INGEPRISMA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 29 A 50-159	BELLO-ANTIOQUIA	4520874	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149873099	9456136859	E	2023/09/20	2023/09/08	BANCOLOMBIA	0	\$3,413,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$1,763,400	\$0	\$0	\$1,763,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$24,800	\$0	\$0	\$24,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$321,800	\$0	\$0	\$321,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$297,000	\$0	\$0	\$297,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,119,800	\$0	\$0	\$1,119,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$767,700	\$0	\$0	\$767,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$767,700	\$0	\$0	\$767,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$441,000	\$0	\$0	\$441,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	13	\$441,000	\$0	\$0	\$441,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$441,000	\$0	\$0	\$441,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$244,400	\$0	\$0	\$244,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$148,600	\$0	\$0	\$148,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				13	\$3,413,100	\$0	\$0	\$3,413,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	FUNDACION AMBIENTE INTERNACIONAL		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900105020
Ciudad/Municipio	MONTERIA	Departamento	CORDOBA
Dirección	CL 62B 6 31 ED. PLAZA DE LA	Teléfono	7825146
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7893703162	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	agosto / 2023	Periodo Cotización Salud	septiembre / 2023
Días de Mora		Fecha Pago	2023/09/13
Número Autorización	158369350		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JUAN ALBERTO	Apellidos	SEPULVEDA OCHOA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1067857697
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	\$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.160.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 185.600
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 185.600

SALUD		Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Días	30	IBC	\$ 1.160.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 46.400
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 46.400

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.160.000
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 6.100

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	\$ 1.160.000	\$ 46.400

TOTAL PAGADO:	\$ 284.500
----------------------	-------------------



INFORME MENSUAL SST



Seguridad social Contratista

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8.415.806**

MORALES CARTAGENA

APELLIDOS

CRUZ ANGEL

NOMBRES

Angel Morales Cruz
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-1967**

DABEIBA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

A+
G S N H

M
SEXO

29-AGO-1986 DABEIBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Angel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



A-0110900-00134365-M-0008415806-20081207 0007582785A 1 9924409946

Medellín, 11 de September de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ICCONO S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVOS PPAL ANTIOQUIA				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C8415806	MORALES CARTEGENA CRUZ ANGEL	12/09/2023		12154719	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
 Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/09/2023 18:49:24 .
 Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
 Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.60.34.83, 192.230.104.10, 172.16.42.57



NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 12/09/2023, el empleador INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES identificado con NIT número 900541997 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6165480	12/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	8415806	CRUZANGEL MORALES CARTAGENA	1160000	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2023-09-12

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CRUZ ANGEL MORALES CARTAGENA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **8415806**, se encuentra afiliado/a desde **01/10/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 12 de septiembre de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



comfama

Radicado: 372780

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Cruz Angel Morales Cartagena con cédula de ciudadanía 8415806, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de ICCONO S.A.S desde 12 de septiembre de 2023.

No tiene grupo familiar registrado.

Se expide esta constancia el día 3 de octubre de 2023 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.001.620.428**
LOPEZ MONSALVE

APELLIDOS
CARLOS FELIPE

NOMBRES

Carlos Felipe

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-ENE-2000**

DABEIBA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

11-ABR-2018 DABEIBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-0110900-01144398-M-1001620428-20200706

0071128409A 1

9912523354

Medellín, 15 de September de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ICCONO S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVOS PPAL ANTIOQUIA				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1001620428	LOPEZ MONSALVE CARLOS FELIPE	16/09/2023		13718Y18	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
 Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 15/09/2023 18:09:55 .
 Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
 Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.60.34.83, 192.230.104.10, 172.16.42.57

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	Número de Ident.	Nombres	Apellidos	Fecha de Afiliación	Departamento	Ciudad	Dirección	Teléfono	Regimen	Estado
CC	1001620428	CARLOS FELIPE	LOPEZ MONSALVE	2022-08-01	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	B LA ARENERA		C	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	Razon Social	Estado	Rango Cotizante	Fecha Vinculacion
900541997	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ICONO SAS	N	A	16/09/2023

La anterior certificación se expide y firma, a los 20 días del mes de Septiembre de 2023, a solicitud del interesado y es válida hasta los 20 días del mes de Octubre de 2023

Cordialmente,


CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **LOPEZ MONSALVE CARLOS FELIPE** identificado(a) con CC número **1.001.620.428** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 28 de abril de 2019 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de septiembre de 2023.

Cordialmente,


Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2023091517570



comfama

Radicado: 372786

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Carlos Felipe Lopez Monsalve con cédula de ciudadanía 1001620428, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de ICCONO S.A.S desde 16 de septiembre de 2023.

No tiene grupo familiar registrado.

Se expide esta constancia el día 3 de octubre de 2023 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.027.94

DURANGO PINO

APELLIDOS

JOSE HERNAN

NOMBRES

José Durango

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

15-MAY-1986

CAREPA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

18-MAY-2004 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0103500-00980825-M-1027941661-20180221

0059585488A 1

9903454424

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Medellín, 20 de September de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ICCONO S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVOS PPAL ANTIOQUIA				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1027941661	DURANGO PINO JOSE HERNAN	21/09/2023		24812491	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
 Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/09/2023 17:46:19 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.60.34.83, 192.230.104.10, 172.16.42.57

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	Número de Ident.	Nombres	Apellidos	Fecha de Afiliación	Departamento	Ciudad	Dirección	Teléfono	Regimen	Estado
CC	1027941661	JOSE HERNAN	DURANGO PINO	2018-08-02	ANTIOQUIA	DABEIBA	CASA JOSE DURANGO - BARRIO_S4 - ANTADO		C	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	Razon Social	Estado	Rango Cotizante	Fecha Vinculacion
900541997	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ICONO SAS	N	A	21/09/2023

La anterior certificación se expide y firma, a los 3 días del mes de Octubre de 2023, a solicitud del interesado y es válida hasta los 3 días del mes de Noviembre de 2023

Cordialmente,


CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE HERNAN DURANGO PINO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1027941661**, se encuentra afiliado/a desde **13/02/2009** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 20 de septiembre de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



comfama

Radicado: 372788

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Jose Hernan Durango Pino con cédula de ciudadanía 1027941661, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de ICCONO S.A.S desde 21 de septiembre de 2023.

No tiene grupo familiar registrado.

Se expide esta constancia el día 3 de octubre de 2023 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.039.288.899

TUBERQUIA POSSO

APELLIDOS

OSCAR HERNAN

NOMBRES

Oscar Hernan Tuberquia

FIRMA



EPS - coosalud.

tel 320 7503964



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1994

DABEIBA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

25-JUN-2012 DABEIBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0110900-00399859-M-1039288899-20120514

0031150024A*1

39540424

Medellín, 02 de October de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ICCONO S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVOS PPAL ANTIOQUIA			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1039288899	TUBERQUIA POSSO OSCAR HERNAN	03/10/2023		w2505822	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
 Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/10/2023 14:39:17 .
 Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
 Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.60.34.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57



NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 03/10/2023, el empleador INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES identificado con NIT número 900541997 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6238624	03/10/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1039288899	OSCARHERNAN TUBERQUIA POSSO	1160000	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2023-10-03

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Octubre del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

OSCAR HERNAN TUBERQUIA POSSO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.039.288.899**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 3 de Octubre del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



comfama

Radicado: 373389

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Oscar Hernan Tuberquia Posso con cédula de ciudadanía 1039288899, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de ICCONO S.A.S desde 03 de octubre de 2023.

No tiene grupo familiar registrado.

Se expide esta constancia el día 4 de octubre de 2023 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-22, 04:57:38 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

64567805

Periodo Cotización:

agosto de 2023

Periodo Servicio:

agosto de 2023

PAGADO 10/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN		
Documento	CC15326333	Dirección	CR 87D #45 - 40 CALLE 1 NRO 11 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5074806
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGL	UMI	MAC	AMP	ACP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 15326333	LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.200.000	\$ 400.000	6,960	\$ 3.200.000	\$ 222.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.134.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 0	\$ 512.000	\$ 400.000	\$ 222.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.134.800	\$ 0	\$ 1.134.800





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-12, 06:29:22 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

65547296

Periodo Cotización: agosto de 2023

Periodo Servicio: septiembre de 2023

PAGADO 12/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ICCONO				
Documento	NI900541997		Dirección	CR 87D #45 - 40 INT 401	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5074806	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	CORREA ROLDAN LEONARDO FAVIO		Identificación	CC 15326333	
Total Afiliados	52		ARP	ARL SURA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	IGR	UIC	VAC	VAP	ICP	IRP	Días PER	Días EPS	Días RAR	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000536587	JOHN SEBASTIAN AGUIRRE OQUENDO	01	00	X																	0	13	13	13	(230301) PORVENIR	\$ 502.667	\$ 80.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 502.667	\$ 20.200	6,960	\$ 502.667	\$ 35.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 502.667	\$ 20.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.900
CC 1000757340	JUAN PABLO OCAÑO OROZCO	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1000869311	SERGIO OLIVER MUÑOZ TUBERQUIA	01	00	X																	0	1	1	1	(230201) PROTECCION	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	6,960	\$ 38.667	\$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 38.667	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.100
CC 1001610265	DEINER DE JESUS MUÑOZ USUGA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1002147650	OMAR ALEXIS CORREA ESCOBAR	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1002206480	VICTOR MANUEL ARANGO HOLGUIN	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1007522500	JESUS DAVID GARCIA ZAPATA	01	00	X																	0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 116.000	\$ 18.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 116.000	\$ 4.700	6,960	\$ 116.000	\$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 116.000	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.100
CC 1017134441	JUAN CAMILO USUGA PULGARIN	01	00	X																	0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 618.667	\$ 99.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 618.667	\$ 24.800	6,960	\$ 618.667	\$ 43.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 618.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.700
CC 1023702285	SANTIAGO ANTONIO CARDONA CRUZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1023702295	NEIDER DARIO CARDONA QUIROS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1023702362	MANUELA QUIROZ GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1038098826	FRDYS DAVID MARTINEZ CLETO	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600
CC 1039285335	LUIS MARTIN DAVID CARDONA	01	00	X	X																0	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 386.667	\$ 61.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 386.667	\$ 15.500	6,960	\$ 386.667	\$ 27.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 386.667	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.900
CC 1039286337	LUIS ALBERTO DAVID GIRALDO	01	00	X																	0	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.044.000	\$ 167.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.044.000	\$ 41.800	6,960	\$ 1.044.000	\$ 72.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.044.000	\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323.400
CC 1039287153	JUAN CARLOS MAZO AMAYA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1039287395	CARLOS ALFONSO RAMIREZ RODRIGUEZ	01	00	X																	0	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.044.000	\$ 167.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.044.000	\$ 41.800	6,960	\$ 1.044.000	\$ 72.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.044.000	\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323.400
CC 1039288689	LUIS FELIPE SIERRA TABARES	01	00	X																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1039289121	EDISON VARGAS PINO	01	00	X																	0	13	13	13	(230301) PORVENIR	\$ 502.667	\$ 80.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 502.667	\$ 20.200	6,960	\$ 502.667	\$ 35.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 502.667	\$ 20.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.900
CC 1039289229	YEINER LEANDRO SALAS GRACIANO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Rows list individual contributors with their respective contribution details.



III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 59.593.339	\$ 60.792.006	\$ 60.792.006	\$ 60.792.006	\$ 9.591.100	\$ 2.432.900	\$ 3.952.800	\$ 2.271.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.248.300	\$ 0	\$ 18.248.300

PAGADO 27/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	C Y B CONSTRUCTORES SAS	Nombre Sucursal	ISVIMED	Código Sucursal	06
Documento	NI900012866	Dirección	CL 32E #63 A - 80		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4114268		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BUSTAMANTE MUÑOZ RICARDO LEON	Identificación	CC 3391567		
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMC	AMP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1108120972	EVELIN CRISTANCHO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600
CC 43262083	MARIA YORLEYDY ARTEAGA CANO	01	00	X																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 1.120.000	\$ 280.000	\$ 487.200	\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.167.200	\$ 28.700	\$ 2.195.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1152705696	NÚMERO PLANILLA:	4517864610	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	LEANDRO SERNA RICARDO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	APTADO	TELÉFONO:	8280000	DÍAS DE MORA:	4	AÑO:	2023
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995944500
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 307.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 0	\$ 307.200	\$ 1.400	\$ 308.600	
SUBTOTALES:										\$ 307.200	\$ 1.400	\$ 308.600	

TOTAL APORTES A SALUD														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 0	\$ 1.100	\$ 0	\$ 240.000	\$ 1.100	\$ 0
SUBTOTALES:										\$ 240.000	\$ 1.100	\$ 0	\$ 241.100	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 134.300		
SUBTOTALES:										\$ 133.700	\$ 600	\$ 0	\$ 134.300	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1152705696	SERNA RICARDO LEANDRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.920.000				NO																	230301-PORVENIR	30	1.920.000	\$ 307.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 307.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	1.920.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 240.000	14-11 - ARL SURA	30	1.920.000	\$ 115270569	133.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL **\$ 684.000**



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-27, 09:13:12 AM

Tipo Planilla:

A: PLANILLA COTIZANTES CON NOVEDAD DE INGRESO

Número Planilla:

65904137

Periodo Cotización:

agosto de 2023

Periodo Servicio:

septiembre de 2023

PAGADO 27/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ICCONO			
Documento	NI900541997	Dirección	CR 87D #45 - 40 INT 401	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5074806	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	CORREA ROLDAN LEONARDO FAVIO		Identificación	CC 15326333
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	USP	COR	SIN	UM	MAC	AMP	AC	IRP	Días FER	Días EPS	Días ANE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43416906	DORA MARIA MARIN QUIROZ	01	00	X														0	21	21	21	(230301) PORVENIR	\$ 1.995.000	\$ 319.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.995.000	\$ 79.800	6,960	\$ 1.995.000	\$ 138.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.995.000	\$ 79.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 617.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.995.000	\$ 1.995.000	\$ 1.995.000	\$ 1.995.000	\$ 319.200	\$ 79.800	\$ 138.900	\$ 79.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 617.700	\$ 0	\$ 617.700



Fecha creación: 2023-11-07, 03:18:55 p. m.

Tipo Planilla: Y

Número Planilla: 65546746

Periodo Cotización: 202308

Periodo Servicio: 202308

PAGADA 2023-09-21 18:55:04.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 21/09/2023, la empresa ICCONO, con documento de identificación NI900541997, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ZAPATA GUZMAN ANGELA MARIA, con CC 32243413, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA



INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 2

Exámenes médicos ocupacionales

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro medico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA	C.C.
SEPTIEMBRE/26/2023	1,001,620,428

EXAMEN MEDICO DE INGRESO DE S O CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS PERSONALES			
NOMBRE COMPLETO		FECHA DE NACIMIENTO	
CARLOS FELIPE LOPEZ MONSALVE		ENERO/12/2000	O +
CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
DABEIBA	COOSALUD	23 AÑOS	3122431711
EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
ICCONO	OSTEOMUSCULAR	AYUDANTE	DABEIBA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APTO PARA TRABAJO EN ALTURA	<input type="checkbox"/>	Apto para trabajo en espacios confinados	<input type="checkbox"/>
		Apto para trabajo de manipulacion alimentos	<input type="checkbox"/>

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN				
Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente
Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Quimico	
Prevalente	Prevalente	Prevalente		

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGÍA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19,

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría	Glicemia	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visiometría	Perfil Hepático	Rx Columna Dinámica
Espirometría	Test de Fobias	RX Columna Lumbosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Psicométrico
Perfil Lipídico	Rx Tórax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 6839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Carlos Felipe Lopez Monsalve

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 8396

Aldana O

Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro médico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

3117367321

celular:

FECHA

SEPTIEMBRE/12/2023

CC

8.415.806

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL DE INGRESO

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

CRUZ ANGEL MORALES CARTAGENA

FECHA DE NACIMIENTO

20/12/1967

1. SEXO

As

CIUDAD

DABEIBA

EPS

NUEVA EPS

EDAD

55

MOVIL

3183822631

EMPRESA

ICCONO

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

AYUDANTE

MUNICIPIO

DABEIBA

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

Apto para trabajo en alturas

Apto para trabajo en excavaciones

Apto para trabajo en espacios confinados

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenómenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánica

Químico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGÍA APARENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES. SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometria	Glicemia Basal	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visiometria	Perfil Hepático	Rx Columna Dinamica
Espirometria	Test de Fobias	RX Columna Lumbosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Sensopsicomético
Perfil Lipídico	Rx Torax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Cruz Angel Morales Cartagena
Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico de Salud Ocupacional
L.S.O. 81432

Aldana O
Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro medico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA	C.C.
JULIO/26/2023	1,108,120,972

EXAMEN MEDICO DE INGRESO DE S O CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS PERSONALES			
NOMBRE COMPLETO		FECHA DE NACIMIENTO	
EVELIN CRISTANCHO SANCHEZ		ENERO/19/1990	O +
CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
DABEIBA	SURA	33 AÑOS	3124745120
EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
ICCONO SAS	OSTEOMUSCULAR	SISO	DABEIBA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	
APTO PARA TRABAJO EN ALTURA		Apto para trabajo en espacios confinados	Apto para trabajo de manipulacion alimentos

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN				
Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente
Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico	
Prevalente	Prevalente	Prevalente		

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN DE MAMA 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19, 7, CITOLOGIA ANUAL

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría	Glicemia	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visiometria	Perfil Hepático	Rx Columna Dinámica
Espirometría	Test de Fobias	RX Columna Lumbosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Psicometrico
Perfil Lipídico	Rx Tórax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro medico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA

SEPTIEMBRE/26/2023

C.C.

1,027,941,661

EXAMEN MEDICO DE INGRESO DE S O CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

JOSE HERNAN DURANGO PINO

FECHA DE NACIMIENTO

MAYO/15/1986

O +

CIUDAD

DABEIBA

EPS

COOSALUD

EDAD

37 AÑOS

MOVIL

3206702661

EMPRESA

ICCONO

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

OFICIAL

MUNICIPIO

DABEIBA

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

Apto para trabajo en espacios confinados

Apto para trabajo de manipulacion alimentos

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Fisico

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

Prevalente

Prevalente

Quimico

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría	Glicemia	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visiometría	Perfil Hepático	Rx Columna Dinámica
Espirometría	Test de Fobias	RX Columna Lumbosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Psicométrico
Perfil Lipídico	Rx Tórax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Jose Hernan Durango Pino
Firma del Paciente

Luis G. Aldana Oter
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 91252

Aldana O
Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro medico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA	C.C.
JULIO/06/2023	15,326,333

EXAMEN MEDICO DE INGRESO DE S O CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS PERSONALES			
NOMBRE COMPLETO		FECHA DE NACIMIENTO	
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN		OCT/10/1971	O +
CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
DABEIBA	SURA	51 AÑOS	3206746304
EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
LEONARDO CORREA	OSTEOMUSCULAR	DIRECTOR DE OBRA	DABEIBA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	
APTO PARA TRABAJO EN ALTURA		Apto para trabajo en espacios confinados	Apto para trabajo de manipulacion alimentos

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN				
Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente
Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico	
Prevalente	Prevalente	Prevalente		

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19,

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría	Glicemia	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visiometria	Perfil Hepático	Rx Columna Dinámica
Espirometría	Test de Fobias	RX Columna Lumbosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Psicometrico
Perfil Lipídico	Rx Tórax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Firma Médico Especialista en SO

**LUIS GABRIEL ALDANA OTERO**

Médico especialista en salud ocupacional

Registro medico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

Salud Ocupacional

FECHA	C.C.
OCTUBRE/04/2023	1,039,288,899

EXAMEN MEDICO DE INGRESO DE S O CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR**DATOS PERSONALES**

NOMBRE COMPLETO		FECHA DE NACIMIENTO	
OSCAR HERNAN TUBERQUIA POSSO		MAYO/28/1994	O +
CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
DABEIBA	COOSALUD	29 AÑOS	3207503964
EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
ICCONO SAS	OSTEOMUSCULAR	AYUDANTE	DABEIBA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APTO PARA TRABAJO EN ALTURA	<input type="checkbox"/>	Apto para trabajo en espacios confinados	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apto para trabajo de manipulacion alimentos	<input type="checkbox"/>

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente
Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Quimico	
Prevalente	Prevalente	Prevalente		

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APARENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO, PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19,

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometria	Glicemia	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visiometria	Perfil Hepático	Rx Columna Dinámica
Espirometria	Test de Fobias	RX Columna Lumbosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Psicométrico
Perfil Lipídico	Rx Tórax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clinica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Oscar H. Tuberquia P.
Firma del Paciente

Luis G. Aldana Oter
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Aldana O
Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
JULIO/06/2023	15,328,893

EXAMEN MEDICO DE INGRESO DE S O CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS PERSONALES			
NOMBRE COMPLETO		FECHA DE NACIMIENTO	
YOVANI AUGUSTO ZAPATA ZABALA		JULIO/23/1976	A +
CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
DABEIBA	NUEVA	47 AÑOS	3157752105
EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
ICONO SAS	OSTEOMUSCULAR	RESIDENTE DE OBRA	DABEIBA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	
APTO PARA TRABAJO EN ALTURA		Apto para trabajo en espacios confinados	Apto para trabajo de manipulacion alimentos

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN				
Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente
Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico	
Prevalente	Prevalente	Prevalente		

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19,

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría	Glicemia	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visiometria	Perfil Hepático	Rx Columna Dinámica
Espirometría	Test de Fobias	RX Columna Lumbosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Psicometrico
Perfil Lipídico	Rx Tórax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Firma Médico Especialista en SO



INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 3 Registro de Inducción



	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN		FECHA:	05-03-2023
			VERSIÓN:	001

TIPO DE ACTIVIDAD									
INDUCCIÓN	X	FORMACIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		OTRA. ¿Cuál?	
Empresa	ICCONO S.A.S					Interna	X	Externa	
DIRIGIDO A	Empleados		Conductor		Servicios Generales		Contratistas	X	

Fecha programada: 18-09-2023	Fecha real: 18-09-2023	Duración: 1 Hora
Nombre capacitador: <i>Juan Oscar Huan Quivra</i>	Empresa responsable (Si aplica)	
Solicitada por: <i>Juan Oscar Huan Quivra</i>	Cargo: <i>Asesor SST</i>	
Objetivo: Dar a conocer los aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo, y los riesgos a los que se encuentra expuesto durante el desarrollo de sus actividades.		

TEMA(S)	ACTIVIDADES / METODOLOGÍA
Política SST	Mediante charla se dan a conocer aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo, se dan recomendaciones para evitar accidentes laborales, no correr, usar adecuadamente los elementos de protección personal según la actividad a realizar, procurar el autocuidado en todo momento usar botas de seguridad, guantes, lentes, se recomienda tomar buena postura en el momento de realizar manipulaciones de cargas, para evitar lesiones lumbares, en caso tal utilizar ayudas mecánicas, y/o el apoyo de otro compañero de trabajo, y realizar pausas activas periódicamente.
Política No alcohol	
Objetivos SST	
Reglamento de Higiene y S I	
Roles y responsabilidades frente al SG-SST	
Plan de emergencia (funciones de los brigadistas)	
Funciones del Copasst	
Comité de convivencia laboral	
Procedimiento en casos de A T o incidentes	
Riesgos del puesto de trabajo	
Uso adecuado de EPP	
Protocolo que aplica.	
AUTOCUIDADO PERSONAL	
Prevención de accidente y autocuidado	
Accidente e incidente	

Elaboró: Evelin Cristiancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-SST-026

INDUCCIÓN - FORMACIÓN

FECHA: 05-03-2023


VERSIÓN: 001

NOMBRE DE ASISTENTES (en caso de requerir registro de asistencia favor emplearlo)	CARGO	FIRMA
<i>Carlos Felipe Lopez Montano</i>	<i>Asistente</i>	<i>Carlos</i>

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (¿cómo se verifica el objetivo?)

Observación	Evaluación	<input checked="" type="checkbox"/> Práctica	Registros	Revisión y seguimiento	Auditoría	Informe
Otro. ¿Cuál?	Fecha de verificación de eficacia		Responsable de verificación			
	<i>18-09-2023</i>		José Zapata			

Elaboró: Evelin Crisfiancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Rolján	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023



	INDUCCIÓN - FORMACIÓN	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001


Observaciones y resultados obtenidos:

Mediante los resultados de la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia el logro de los objetivos de la inducción de seguridad y salud en el trabajo

¿Cumplió el objetivo?	Si X	n o	Tipo de acción a seguir:	Nº
-----------------------	---------	--------	--------------------------	----

Fecha de verificación de la eficacia:	Firma del responsable:
18-09-2023	

Elaboró: Evelin Crislancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

**EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO INDUCCIÓN ICONO
S.A.S**

Fecha: 18-04-2023

Nombre completo: Carlos Felipe Correa Monasterio

1. ¿Describa con sus palabras lo que entiende de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Compromiso, Responsabilidad

2. ¿En que se basa la Seguridad y Salud en el Trabajo?

- a. Realizar actividades para mejorar el clima laboral
- b. Ponerse los elementos de protección personal
- c. Realizar actividades encaminadas a preservar la seguridad y salud de los trabajadores en su ambiente laboral
- d. Ninguna las anteriores

3. Escriba debajo de cada imagen, si es un ACTO o CONDICIÓN insegura

<p>Correr por las escaleras</p> 			
Acto	Condición	acto	Acto

Elaboró: Evelin Crisnacho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

4. Marque con una x los peligros a los que estará expuesto en su labor

Físicos Biológicos Biomecánicos

Psicosocial

5. ¿Para qué se utilizan los elementos de protección personal?

para nuestra comodidad

6. ¿Qué hace el Vigía de SST

- a. Es la persona que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

7. ¿Qué es la Brigada de emergencia?

- a. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

2

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

8. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral?

- a. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

9. ¿Cuáles son los 3 factores a tener en cuenta en el manejo de sustancias químicas?

- a. Rotulación, regueros, tipo de sustancias
- b. Tipo de sustancia, elementos de protección personal, toxicidad
- c. Nombre de la sustancia, Rombo de seguridad, hoja de seguridad
- d. Ninguna de las anteriores.


10. ¿Qué hacer en caso de un accidente laboral?

- a. Se queda callado y no reporta
- b. Pide una cita prioritaria en un EPS
- c. Informa al jefe inmediato y se reporta a la ARL SURA.

11. Mencione aspectos e impactos ambientales que pueden generar en su actividad.

Contaminación Sustancias Químicas

Elaboró: Evelin Crislancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001


TIPO DE ACTIVIDAD								
INDUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	FORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	REINDUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN	<input type="checkbox"/>	OTRA. ¿Cuál?
Empresa	ICCONO S.A.S					Interna	<input checked="" type="checkbox"/>	Externa
DIRIGIDO A	Empleados	<input type="checkbox"/>	Conductor	<input type="checkbox"/>	Servicios Generales	<input type="checkbox"/>	Contratistas	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha programada:	Fecha real:	Duración: 1 Hora
12-09-2023	12-09-2023	
Nombre capacitador:	Empresa responsable (Si aplica)	
<i>Diego Felipe Ojeda Acevedo</i>		
Solicitada por:	Cargo:	
<i>Diego Felipe Ojeda Acevedo</i>	Aux SST	
Objetivo: Dar a conocer los aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo, y los riesgos a los que se encuentra expuesto durante el desarrollo de sus actividades.		

TEMA(S)	ACTIVIDADES / METODOLOGÍA
Política SST	Mediante charla se dan a conocer aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo, se dan recomendaciones para evitar accidentes laborales, no correr, usar adecuadamente los elementos de protección personal según la actividad a realizar, procurar el autocuidado en todo momento usar botas de seguridad, guantes, lentes, se recomienda tomar buena postura en el momento de realizar manipulaciones de cargas, para evitar lesiones lumbares, en caso tal utilizar ayudas mecánicas, y/o el apoyo de otro compañero de trabajo, y realizar pausas activas periódicamente.
Política No alcohol	
Objetivos SST	
Reglamento de Higiene y S I	
Roles y responsabilidades frente al SG-SST	
Plan de emergencia (funciones de los brigadistas)	
Funciones del Copasst	
Comité de convivencia laboral	
Procedimiento en casos de A T o incidentes	
Riesgos del puesto de trabajo	
Uso adecuado de EPP	
Protocolo que aplica.	
AUTOCUIDADO PERSONAL	
Prevención de accidente y autocuidado	
Accidente e incidente	

1


Elaboró: Evelin Cristiancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023


	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

NOMBRE DE ASISTENTES (en caso de requerir registro de asistencia favor emplearlo)	CARGO	FIRMA
Angelmé	auxiliar	[Firma]

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (¿cómo se verifica el objetivo?)							
Observación	Evaluación	<input checked="" type="checkbox"/> Práctica	Registros	Revisión y seguimiento	Auditoría	Informe	
Otro. ¿Cuál?			Fecha de verificación de eficacia		Responsable de verificación		
			12-09-2023		José Zapata		

Elaboró: Evelin Crislancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

Observaciones y resultados obtenidos: Mediante los resultados de la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia el logro de los objetivos de la inducción de seguridad y salud en el trabajo			
¿Cumplió el objetivo?	el	Sí X	no o
Tipo de acción a seguir:			N°
Fecha de verificación de la eficacia:		Firma del responsable:	
12-09-2023			

3

Elaboró: Evelyn Cristiancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

**EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO INDUCCIÓN ICONO
S.A.S**

Fecha:

Nombre completo: *cuq angel mara de cardenas*

1. ¿Describa con sus palabras lo que entiende de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo?

con promiso


2. ¿En que se basa la Seguridad y Salud en el Trabajo?

- a. Realizar actividades para mejorar el clima laboral
- b. Ponerse los elementos de protección personal
- c. Realizar actividades encaminadas a preservar la seguridad y salud de los trabajadores en su ambiente laboral
- d. Ninguna las anteriores

3. Escriba debajo de cada imagen, si es un ACTO o CONDICIÓN insegura

<p>Correr por las escaleras</p>			
<i>Acto</i>	<i>condición</i>	<i>Acto</i>	<i>condición</i>

Elaboró: Evelin Crstancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

4. Marque con una x los peligros a los que estará expuesto en su labor

Físicos Biológicos Biomecánicos

Psicosocial

5. ¿Para qué se utilizan los elementos de protección personal?

para mi cuidado



6. ¿Qué hace el Vigía de SST

- a) Es la persona que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

7. ¿Qué es la Brigada de emergencia?

- a. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b) Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

2

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

8. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral?

- a. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

9. ¿Cuáles son los 3 factores a tener en cuenta en el manejo de sustancias químicas?



- a. Rotulación, regueros, tipo de sustancias
- b. Tipo de sustancia, elementos de protección personal, toxicidad
- c. Nombre de la sustancia, Rombo de seguridad, hoja de seguridad
- d. Ninguna de las anteriores.

10. ¿Qué hacer en caso de un accidente laboral?

- a. Se queda callado y no reporta
- b. Pide una cita prioritaria en un EPS
- c. Informa al jefe inmediato y se reporta a la ARL SURA.

11. Mencione aspectos e impactos ambientales que pueden generar en su actividad.

Contaminación

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN		FECHA:	05-03-2023
			VERSIÓN:	001

TIPO DE ACTIVIDAD						
INDUCCIÓN	X	FORMACIÓN		REINDUCCIÓN	CAPACITACIÓN	OTRA. ¿Cuál?
Empresa	ICCONO S.A.S				Interna	X Externa
DIRIGIDO A	Empleados		Conductor	Servicios Generales		Contratistas X

Fecha programada:	22-09-2023	Fecha real:	22-09-2023	Duración:	1 Hora
Nombre capacitador:	Don Juan Juan Quina		Empresa responsable (Si aplica)		
Solicitada por:	Don Juan Juan Quina		Cargo: AVT SST		
Objetivo: Dar a conocer los aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo, y los riesgos a los que se encuentra expuesto durante el desarrollo de sus actividades.					

TEMA(S)	ACTIVIDADES / METODOLOGÍA
Política SST	Mediante charla se dan a conocer aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo, se dan recomendaciones para evitar accidentes laborales, no correr, usar adecuadamente los elementos de protección personal según la actividad a realizar, procurar el autocuidado en todo momento usar botas de seguridad, guantes, lentes, se recomienda tomar buena postura en el momento de realizar manipulaciones de cargas, para evitar lesiones lumbares, en caso tal utilizar ayudas mecánicas, y/o el apoyo de otro compañero de trabajo, y realizar pausas activas periódicamente.
Política No alcohol	
Objetivos SST	
Reglamento de Higiene y S I	
Roles y responsabilidades frente al SG-SST	
Plan de emergencia (funciones de los brigadistas)	
Funciones del Copasst	
Comité de convivencia laboral	
Procedimiento en casos de A T o incidentes	
Riesgos del puesto de trabajo	
Uso adecuado de EPP	
Protocolo que aplica: AUTOCUIDADO PERSONAL	
Prevención de accidente y autocuidado	
Accidente e incidente	

1

Elaboró: Evelin Crislancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-SST-026

FECHA: 05-03-2023


INDUCCIÓN - FORMACIÓN

VERSIÓN: 001

NOMBRE DE ASISTENTES (en caso de requerir registro de asistencia favor emplearlo)	CARGO	FIRMA
José Hernán Sánchez Pina	ST	José H. S. P.

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (¿cómo se verifica el objetivo?)							
Observación	Evaluación	X Práctica	Registros	Revisión y seguimiento	Auditoría	Informe	
Otro. ¿Cuál?			Fecha de verificación de eficacia		Responsable de verificación		
			22-09-2023		José Zapata		


Elaboró: Evelyn Cristancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001


Observaciones y resultados obtenidos:
 Mediante los resultados de la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia el logro de los objetivos de la inducción de seguridad y salud en el trabajo

¿Cumplió el objetivo?	Si	n	Tipo de acción a seguir:	Nº
	X	o		

Fecha de verificación de la eficacia: 22-09-2023

Firma del responsable: 

Elaboró: Evelin Crislancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO INDUCCIÓN ICCONO S.A.S

Fecha: 22-09-2023

Nombre completo: José Hernán Durango Pino

1. ¿Describa con sus palabras lo que entiende de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo?



Compromiso


2. ¿En que se basa la Seguridad y Salud en el Trabajo?

- a. Realizar actividades para mejorar el clima laboral
- b. Ponerse los elementos de protección personal
- c. Realizar actividades encaminadas a preservar la seguridad y salud de los trabajadores en su ambiente laboral
- d. Ninguna las anteriores

3. Escriba debajo de cada imagen, si es un ACTO o CONDICIÓN insegura

<p>Correr por las escaleras</p> 			
Acto	condición	acto	condición

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

4. Marque con una x los peligros a los que estará expuesto en su labor

Físicos Biológicos Biomecánicos

Psicosocial

5. ¿Para qué se utilizan los elementos de protección personal?

*para nuestro cuidado personal
y evitar lesiones*



6. ¿Qué hace el Vigía de SST


- a. Es la persona que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

7. ¿Qué es la Brigada de emergencia?

- a. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

2

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

8. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral?

- a. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

9. ¿Cuáles son los 3 factores a tener en cuenta en el manejo de sustancias químicas?

- a. Rotulación, regueros, tipo de sustancias
- b. Tipo de sustancia, elementos de protección personal, toxicidad
- c. Nombre de la sustancia, Rombo de seguridad, hoja de seguridad
- d. Ninguna de las anteriores.

10. ¿Qué hacer en caso de un accidente laboral?

- a. Se queda callado y no reporta
- b. Pide una cita prioritaria en un EPS
- c. Informa al jefe inmediato y se reporta a la ARL SURA.

11. Mencione aspectos e impactos ambientales que pueden generar en su actividad.

contaminación Sustancias químicas, ruidos
contaminación

3

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

TIPO DE ACTIVIDAD										
INDUCCIÓN	X	FORMACIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		OTRA. ¿Cuál?		
Empresa	ICCONO S.A.S						Interna	X	Externa	
DIRIGIDO A	Empleados		Conductor		Servicios Generales		Contratistas		X	

Fecha programada:	Fecha real:	Duración: 1 Hora
03-10-2023	03-10-2023	
Nombre capacitador:	Empresa responsable (Si aplica)	
Don María María Rivera		
Solicitada por:	Cargo:	
Don María María Rivera	Aut. SST	
Objetivo: Dar a conocer los aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo, y los riesgos a los que se encuentra expuesto durante el desarrollo de sus actividades.		

TEMA(S)	ACTIVIDADES / METODOLOGÍA
Política SST	Mediante charla se dan a conocer aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo, se dan recomendaciones para evitar accidentes laborales, no correr, usar adecuadamente los elementos de protección personal según la actividad a realizar, procurar el autocuidado en todo momento usar botas de seguridad, guantes, lentes, se recomienda tomar buena postura en el momento de realizar manipulaciones de cargas, para evitar lesiones lumbares, en caso tal utilizar ayudas mecánicas, y/o el apoyo de otro compañero de trabajo, y realizar pausas activas periódicamente.
Política No alcohol	
Objetivos SST	
Reglamento de Higiene y S I	
Roles y responsabilidades frente al SG-SST	
Plan de emergencia (funciones de los brigadistas)	
Funciones del Copasst	
Comité de convivencia laboral	
Procedimiento en casos de A T o incidentes	
Riesgos del puesto de trabajo	
Uso adecuado de EPP	
Protocolo que aplica.	
AUTOCUIDADO PERSONAL	
Prevención de accidente y autocuidado	
Accidente e incidente	

1


Elaboró: Evelin Crislancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

NOMBRE DE ASISTENTES (en caso de requerir registro de asistencia favor emplearlo)	CARGO	FIRMA
Oscar Herman Urbina Flores	Ayudante	Oscar H. Urbina F.


MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (¿cómo se verifica el objetivo?)							
Observación	Evaluación	<input checked="" type="checkbox"/> Práctica	Registros	Revisión y seguimiento	Auditoria	Informe	
Otro. ¿Cuál?			Fecha de verificación de eficacia	Responsable de verificación			
			03-10-2023	José Zapata			

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-026
	INDUCCIÓN - FORMACIÓN	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

Observaciones y resultados obtenidos:

Mediante los resultados de la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia el logro de los objetivos de la inducción de seguridad y salud en el trabajo

¿Cumplió el objetivo?	el	Si	n	Tipo de acción a seguir:	N°
		X	o		
Fecha de verificación de la eficacia:				Firma del responsable:	
03-10-2023					

Elaboró: Evelyn Cristóbal Sánchez	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Boscon	Código: FT-SST-026
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

**EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO INDUCCIÓN ICONO
S.A.S**

Fecha: 3/03/2023

Nombre completo: Oscar Hernan Tuberguera Posso

1. ¿Describe con sus palabras lo que entiende de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Compromiso responsabilidad y obligación


2. ¿En que se basa la Seguridad y Salud en el Trabajo?

- a. Realizar actividades para mejorar el clima laboral
- b. Ponerse los elementos de protección personal
- c. Realizar actividades encaminadas a preservar la seguridad y salud de los trabajadores en su ambiente laboral
- d. Ninguna las anteriores

3. Escriba debajo de cada imagen, si es un ACTO o CONDICIÓN insegura

<p>Correr por las escaleras</p>			
Acto	Condición	Acto	Condición

<p>Elaboró: Evelin Crisnacho Sánchez</p>	<p>Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roitán</p>	<p>Código: FT-SST-028</p>
		<p>Fecha de modificación: 05-03-2023</p>

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

4. Marque con una x los peligros a los que estará expuesto en su labor

Físicos Biológicos Biomecánicos

Psicosocial

5. ¿Para qué se utilizan los elementos de protección personal?

Para mi propia seguridad

6. ¿Qué hace el Vigía de SST


- a) Es la persona que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

7. ¿Qué es la Brigada de emergencia?

- a. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b) Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

2

Elaboró: Evelin Cristiancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-028
		Fecha de modificación: 05-03-2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-028
	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS	FECHA:	05-03-2023
		VERSIÓN:	001

8. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral?

- a. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- b. Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias.
- c. Identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

9. ¿Cuáles son los 3 factores a tener en cuenta en el manejo de sustancias químicas?

- a. Rotulación, regueros, tipo de sustancias
- b. Tipo de sustancia, elementos de protección personal, toxicidad
- c. Nombre de la sustancia, Rombo de seguridad, hoja de seguridad
- d. Ninguna de las anteriores.

10. ¿Qué hacer en caso de un accidente laboral?

- a. Se queda callado y no reporta
- b. Pide una cita prioritaria en un EPS
- c. Informa al jefe inmediato y se reporta a la ARL SURA.

11. Mencione aspectos e impactos ambientales que pueden generar en su actividad.

Contaminación con desechos químicos

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-028 Fecha de modificación: 05-03-2023
---	--	--



INFORME MENSUAL SST

Anexo N° 4
Registro de capacitación y
charlas de seguridad





CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO:

EXPOSITOR: *Don Home Open Reunión*

FECHA: *11-09-2023* DURACIÓN: *1 hora.*

OBJETO DEL TEMA

Socializar con los trabajadores acerca de que es una brigada de emergencia y su conformación

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<i>Leider, Leandro</i>	<i>Ayu</i>	<i>Leider</i>
<i>Stavro</i>	<i>Oficial</i>	<i>Stavro</i>
<i>Wilson</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Wilson</i>
<i>Suan</i>	<i>Oficial</i>	<i>Suan</i>
<i>DWAYNE</i>	<i>Ayudante</i>	<i>DWAYNE</i>
<i>Juan Carlos</i>	<i>Ayu</i>	<i>Juan Carlos</i>
<i>Wilson</i>	<i>Ayu</i>	<i>Wilson, H.</i>
<i>Yuan</i>	<i>Ayu</i>	<i>Yuan</i>
<i>WALTER FELIX</i>	<i>Ayu</i>	<i>WALTER</i>
<i>Sebastián</i>	<i>Soldador</i>	<i>Sebastián</i>
<i>Edison</i>	<i>Soldador</i>	<i>Edison</i>
<i>Don David</i>	<i>Oficial</i>	<i>Don David</i>
<i>Gerardo</i>	<i>Oficial</i>	<i>Gerardo</i>
<i>Francisco</i>	<i>Soldador</i>	<i>Francisco</i>
<i>Fanny</i>	<i>Soldador</i>	<i>Fanny</i>
<i>Juan</i>	<i>Supervisor M.O.</i>	<i>Juan</i>

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

Que es una brigada de emergencia como su conformación



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST-042

FECHA 26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN 1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estudio Subselva

EXPOSITOR: Dava Oficin Oficin de...

FECHA: 16-09-2023 DURACIÓN: 1 hora

OBJETO DEL TEMA

Brindar información a los trabajadores acerca de ubicación de punto de encuentro y rutas de evacuación en el caso de emergencia.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Walter Felipe	Ayudante	[Firma]
Juan Carlos Mayo	Ayudante	[Firma]
David...	Ayudante	[Firma]
Angel...	Ayudante	[Firma]
Telefonistas	Oficial	[Firma]
Juan Carlos usuga	Oficial	[Firma]
Cesar...	Oficial	[Firma]
Yeiner Leonardo	Ayudante	[Firma]
Yohan Carmona	Ayudante	[Firma]
WALTER FELIPE		[Firma]
Wilson...	Ayudante	[Firma]
Sebastian Adriano	Ayudante	[Firma]
Fernando...	Soldado	[Firma]
Edson Vargas Pina	Soldado	[Firma]
Luz Yurany Roldán	Supervisor M.O.	[Firma]
Sergio...	Auxiliar	[Firma]
Fernando...	Soldado	[Firma]

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

- Punto de encuentro
- Rutas de evacuación

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST-042
	Control de Asistencia	FECHA	26/02/2023
		VERSIÓN	1

CLASIFICACION

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: *Estadio, Deberse.*

EXPOSITOR: *Don Juan Juan Perez*

FECHA: *07-09-2023* DURACION:

OBJETO DEL TEMA

Socialización con los trabajadores sobre el riesgo químico sobre polvos orgánicos e inorgánicos

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<i>Wildemar Diaz</i>	<i>ayudante</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Yanci Leoncio</i>	<i>Ayu</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Yuan Lavmona</i>	<i>Ayudante</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Leon Camilo</i>	<i>Oficial</i>	<i>[Signature]</i>
<i>DANIEL MUÑOZ U. GUARDO</i>	<i>Ayudante Oficial</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Juan Carlos Maza</i>	<i>Ayu</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Wilson</i>	<i>Auxili</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Olivero Torres</i>	<i>Oficial</i>	<i>[Signature]</i>
<i>WALTER FELIPE RIEGO</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Luis Alberto Davila</i>	<i>Oficial</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Sebastián Rivera</i>	<i>Ayu</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Sebastian Adame</i>	<i>ayudante soldador</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Edson Vargas Pino</i>	<i>Soldador</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Fernan Camacho Arango</i>	<i>soldador</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Francisco Jimenez</i>	<i>Soldador</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Lot Yurany RIVERA</i>	<i>Supervisor M.O.</i>	<i>[Signature]</i>

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

Socialización ATS.

Riesgo Químico por polvos orgánicos e inorgánicos

[Diagonal lines indicating crossed-out content]



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST-042

FECHA 26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN 1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estadía de Puerto

EXPOSITOR: Juan Carlos Ruiz

FECHA: 08-09-2023 DURACION:

OBJETO DEL TEMA

Realizar con los trabajadores las pruebas de Seguridad sobre el consumo de tabaco dentro de las instalaciones

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yean Leandro	Ayu	Yean Leandro
Walter Felipe Varez	Oficial	Walter Felipe Varez
Yean Carmona	Ayudante	Yean L.
Cervantes	Oficial	Cervantes
Yean Carmona	Oficial	Cervantes
Juan Carlos Ruiz	Ayu	Juan Carlos Ruiz
Wilson	Ayuda.	Wilson H.
Luis Alberto David	Oficial	Luis Alberto David
Yean Carmona	Ayudante	Yean Carmona
Fernando Coimbra Varez	Soldador	Fernando Coimbra Varez
Sergio Rivera	Tex.	Sergio Rivera
Felisa Vargas Pino	Soldador	Felisa Vargas Pino
Francisco Javier Jimenez	Soldador	Francisco Javier Jimenez
Roberto A. Yurumy Rúa Rueda	ayudante soldador	Roberto A. Yurumy Rúa Rueda
Luz Yurumy Rúa Rueda	Supervisor M.O.	Luz Yurumy Rúa Rueda

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

Realizar sobre las especies para el consumo del tabaco



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-98T-042

FECHA 26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN 1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estadio Papeete

EXPOSITOR: Dou Mau Mau Amos

FECHA: 09-09-2023 DURACIÓN: 5 min

OBJETO DEL TEMA

Generalizar con los colaboradores sobre traumas de lesiones blandas y como se debe de manejar al momento de tenerlos

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeiner Leandro	Ayu	Yeiner
Darvick Muñoz	Ayudante	Darvick
Juan Carlos Vega	Oficial	Juan Carlos
Juan Carlos Maza	Ayu	Juan Carlos
Wilson	Ayu	Wilson
Ataluma Torres	Oficial	Ataluma Torres
Yohan Carmona	Ayudante	Yohan C.
Walter Felipe Burrego	ayudante	WALTER FELIPE
Wilder Lopez	Ayudante	Wilder Lopez
Santiago	Ayu	Santiago
Gerardo	Oficial	Gerardo
Juan Alberto David	Ayu	Juan Alberto
Edison Vargas Pino	Soldador	Edison Vargas
Francisco Jimenez	Soldador	Francisco Jimenez
Francis Edmir Vega	Soldador	Francis Edmir
Sebastian Aquino	ayudante Soldador	Sebas A.

TEMAS TRATADOS (incluye compromisos adquiridos)

Luz Yenny Ruiz Supervisor D.O. Yenny Ruiz

TEMAS
Tramando lesiones blandas y manejo



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST-042

FECHA 20/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN 1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estudio de riesgos (Ant)

EXPOSITOR: Y de Quié Pasa Quié

FECHA: 10-02-2023 DURACIÓN: 5 min.

OBJETO DEL TEMA

Socializar con los colaboradores acerca de la importancia de mantener ciertos sitios de trabajo en muy buenas condiciones de orden y aseo

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeiner Leandro	Ayu	Yeiner Santos
Juan Carlos Maza	Ayu	Juan Carlos Maza
Wilson J.	Ayu	Wilson J.
Olakana Torres	Oficial	Olakana Torres
Juan Camilo Vargas	Oficial	Juan Camilo Vargas
Diego Muñoz U	Ayudante	Diego Muñoz U
Yoon Jaramana	Ayudante	Yoon Jaramana
Luis Alberto David	Oficial	Luis Alberto David
WALTER FELIPE BARRERA	Oficial	WALTER FELIPE BARRERA
Gerardo	Oficial	Gerardo
Sebastián Restrepo	Ayu	Sebastián Restrepo
Christian Adams	ayudante Soldador	Christian Adams
Felipe Vargas Pineda	Soldador	Felipe Vargas Pineda
Francisco Jimenez	Soldador	Francisco Jimenez
Wilder Lopez	Ayudante	Wilder Lopez
Luz Yurany Ruiz	Supervisor M.O.	Luz Yurany Ruiz

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

orden y aseo
entre otros



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO

FT-SST-042

FECHA

26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN

1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CIERRA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estado Dapunta

EXPOSITOR: Juan Felipe Pineda

FECHA: 12-09-2023 DURACIÓN: 5 min

OBJETO DEL TEMA

Simular con los colaboradores la capacitación de mantener siempre nuestro sitio de trabajo

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yainer Leandro	Ayu	
Yohan Carmona	Ayudante	Yohan C.
Juan Camilo Ureaga	Oficial	
Wilson I...	Auxili	Wilson I...
Wilder...	Ayudante	
Daniel Muñoz	Ayudante	Daniel
Carverdo	Oficial	Carverdo
Juan Carlos Maza	Ayu	
Señor Olivero	AUX	Señor
José Alberto David	AUX	José David
WALTER ELI PURRERO	Ayu	WALTER
Edson Vargas Pino	Soldador	
Roberto A.	Ayudante	Roberto A.
Juan Pineda	Supervisor M.O	Juan Pineda
LEANDRO SERNA	RES OBRA	
Franco Camilo Ureaga	Soldador	Camilo Ureaga
Sebastian Aguirre	Ayudante	Sebastian

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

Orden y aseo en sitio de trabajo



	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST-042
	Control de Asistencia	FECHA	26/02/2023
		VERSIÓN	1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: *Estudio de peligros cont*

EXPOSITOR: *David Pineda*

FECHA: *15-09-2023* DURACIÓN: *70 min*

OBJETO DEL TEMA

Sensibilizar a los trabajadores acerca de como controlar el estrés y como manejarlo con mejor manejo y sus consecuencias

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<i>Yeiner Leonardo</i>	<i>Oficial</i>	<i>Yeiner</i>
<i>Juan Carlos Haza</i>	<i>AYU</i>	<i>JCH</i>
<i>Wilson H.</i>	<i>AYU</i>	<i>Wilson H.</i>
<i>Suan Tania usaga</i>	<i>Oficial</i>	<i>Suan</i>
<i>Celso</i>	<i>Oficial</i>	<i>Celso</i>
<i>Orly Angelina</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Orly</i>
<i>Dalymar Suarez U.</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Dalymar</i>
<i>Otalvaro Torres</i>	<i>Oficial</i>	<i>Otalvaro Torres</i>
<i>Luis Alberto David</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Luis David</i>
<i>Sebastian</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Sebastian</i>
<i>WALTER FELIUREGO</i>		<i>WALTER</i>
<i>Yoon Carmona</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Yoon</i>
<i>Felisa Vargas</i>	<i>Soldado</i>	<i>Felisa</i>
<i>Sebastian</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Sebastian</i>

TEMAS TRATADOS (incluye compromisos adquiridos)

Manejo y control del estrés.

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST-042
	Control de Asistencia	FECHA	26/02/2023
		VERSIÓN	1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: *Estudio de orden*

EXPOSITOR: *Manojo de la Salud*

FECHA: *18-02-2023* DURACIÓN: *3 hrs*

OBJETO DEL TEMA

Sensibilizar en las consecuencias de la importancia del orden y cómo con las herramientas que se ofrecen

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<i>Yeiner Leandro</i>	<i>AyU</i>	<i>Yeiner</i>
<i>Juan Carlos Maza</i>	<i>AyU</i>	<i>Juan Carlos</i>
<i>Wilson</i>	<i>AyU</i>	<i>Wilson</i>
<i>Olivero Torres</i>	<i>Oficial</i>	<i>Olivero Torres</i>
<i>Andrés</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Andrés</i>
<i>Juan Larmona</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Juan C.</i>
<i>Daniel</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Daniel</i>
<i>Sonia</i>	<i>Oficial</i>	<i>Sonia</i>
<i>Sebastián</i>	<i>Aux</i>	<i>Sebastián</i>
<i>Luis Alberto David</i>	<i>Aux</i>	<i>Luis David</i>
<i>Walter</i>	<i>Ayudante</i>	<i>Walter</i>
<i>Berardo</i>	<i>Oficial</i>	<i>Berardo</i>
<i>Carlos</i>	<i>Aux</i>	<i>Carlos</i>
<i>WALTER FELIPE</i>	<i>Soldado</i>	<i>WALTER FELIPE</i>
<i>Sebastián</i>	<i>Soldado</i>	<i>Sebastián</i>
<i>Wilson</i>	<i>Soldado</i>	<i>Wilson</i>

TEMAS TRATADOS (incluye compromisos adquiridos)

orden y cómo

ubicación de herramientas necesarias



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST-042
FECHA 26/02/2023
VERSIÓN 1

Control de Asistencia

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estadio Dabubu

EXPOSITOR: Don Maria Haba

FECHA: 19-09-2023

DURACIÓN:

OBJETO DEL TEMA

Diferencia tipos de materiales y Sustancias para la prevención de accidentes en su campo

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeiner leandro	Ayu	Yeiner
Wilson Jari	Ayudante	Wilson
Juan Carlos Maza	Ayu	JCM
Angelina	ayudante	Angelina
Yohan Carmona	Ayudante	Yohan
Suan Camila usuga	Oficial	Camila
Sergio Ojeda	Aux	Sergio
Wilson	Ayu	Wilson
WALTER PELIERURRO		WALTERFE
Gerardo	Oficial	Gerardo
Carlos Beltrán	Soldador	Carlos
Edison Vargas	Soldador	Edison
Sebastián	Ayudante Soldador	Sebastián
Diego	Ayudante	Diego
Janet Camilo Ingo	Soldador	Camilo Ingo
José Yenny	Supervisor M.O.	Yenny
Dus Alberto David	Dirx	Dus David

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

Manejo seguro de materiales y Sustancias químicas



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST-042

FECHA 26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN 1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estadio Quibuln

EXPOSITOR: [Signature]

FECHA: 20-09-2023 DURACIÓN:

OBJETO DEL TEMA

Socializar con los trabajadores las importancias de Reducir, Reutilizar y Reciclar

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeiner Leandro	Ayu	Yeiner Leandro
Juan Carlos	Ayu	[Signature]
Daniela Muñoz	ayudante	[Signature]
Wildeman Lopez	AYUDANTE	[Signature]
sema olivero	Ayu	[Signature]
Andrés Torres	Ayu	[Signature]
Juan Carlos	Oficial	[Signature]
Andrés Angel	ayudante	[Signature]
Gerardo	Oficial	[Signature]
WALTER FELIPE REGO		WALTER FELIPE
Wilson	Ayu	Wilson
yoan carmona	Ayu	yoan
Juan Alberto	Ayu	Juan David
Sebastián Aguirre	Ayu soldador	Sebas. A.
Genel Camilo Urrego	soldador	Camilo Urrego

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

La importancia de reciclar en el día a día de trabajo y nuestro entorno



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST-442

FECHA 26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN

1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estudios de Salud

EXPOSITOR: [Signature]

FECHA: 21-09-2023 DURACIÓN: 7 min

OBJETO DEL TEMA

Especializar con las trabajadoras la importancia del cumplimiento de disposiciones legales aplicables que inciden sobre el bienestar de las trabajadoras.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeiner Leandro	Ayudante	[Signature]
Wilderman Rojas	Ayudante	[Signature]
Gerardo	Oficial	[Signature]
Yovan Carmona	Ayudante	[Signature]
WALTER FELIPE	ayudante	[Signature]
Juan Carlos Haza	Ayudante	[Signature]
Wilson	Ayudante	[Signature]
Severino Camilo Urrego	Oficial	[Signature]
Carlos Felipe Lopez Morales	Ayudante	[Signature]
Felison Vargas Pino	Soldador	[Signature]
Juan Alberto Ospina	Ayudante	[Signature]
Sebastián Felipe	ayudante soldador	[Signature]
Walter Felipe	Ayudante	[Signature]
Juan Yvanys Ruiz	Supervisor M.O.	[Signature]
Felipe Camilo Urrego	SOLDADOR	[Signature]

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

Complemento a disposiciones legales aplicables en materia SST.

[Large diagonal scribbles covering the remaining text area]



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO

PT-891-042

FECHA

28/02/2023

Control de Asistencia

VERSION

1

CLASIFICACION

CAPACITACION CHARLA REUNION ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Seguridad de trabajo

EXPOSITOR: Vlado Karamanovic

FECHA: 22-04-2023 DURACION: 5hr

OBJETO DEL TEMA

Recordar en las colaboraciones acerca del acoso laboral y consecuencias

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Leiberman Igor	Operario	[Firma]
200 Angelina	ayudante	[Firma]
Susan Tamara LBustos	Oficial	[Firma]
Gerardo	Oficial	Gerardo
Yovan Karamanovic	Ayudante	Yovan K.
Yeiner Leonor	Ayu	Yeiner
Tan Carlos	Ayu	[Firma]
Luis Felix Lopez M	Ofi	Luis
WALTER FELIPE BARRERA		WALTER FELIPE
Danyel Gonzalez	Ayudante	Danyel
Edson Vargas Pino	Soldador	[Firma]
Sebastián Adriano	Ayudante Soldador	Sebastián A.
Luis Alberto Bernal	Ofi	Luis David
José Manuel Sánchez	Ofi	José H. D. P.

TEMAS TRATADOS (Incluya compromisos adquiridos)

• Que es acoso laboral

[Large scribbled-out area]



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO

FT-SST-042

FECHA

26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN

1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estudio de Trabajo

EXPOSITOR: Juan Pablo Ruiz

FECHA: 26-09-2023 DURACIÓN: 5mi

OBJETO DEL TEMA


Sancionar con los colaboradores la importancia del uso adecuado de EPP para cada actividad a realizar

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Josua Camilo Vasquez	Oficial	Josua
Carlos Felipe Lopez	ayudante	Carlos
Wilson	Ayu	Wilson I.
Juan Carlos	Ayu	Juan
Seba Marcel	Ayu	Seba
DANIEL MUÑOZ	ayudante	DANIEL
enry Angel me	ayudante	enry
WILSON LOPEZ	ayudante	WILSON
Juan Carlos	Oficial	Juan C. D. P.
Joan Carmona	Ayudante	Joan I.
Juan Gilberto David	del	Juan David
Yeiner Leandro	Ayu	Yeiner
WALTER PELAEZ		WALTER
Juan H. D. P.	Oficial	Juan H. D. P.
Josybrany Roldan	Supervisor M.O.	Josybrany Roldan

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

- Uso adecuado de las EPP para cada actividad





SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO

FT-SST-042

FECHA

29/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN

1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION

CHARLA

REUNIÓN

ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO:

Estadía Debeche

EXPOSITOR:

Don Juan Juan Quiroga

FECHA:

27-09-2023

DURACIÓN: 5min

OBJETO DEL TEMA

Dar a conocer a los trabajadores medidas preventivas para proteger y cuidar las manos

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Sergio Iniguez

AUX

YOAN CARMONA

AUX

YOAN C.

DENYK MORALES U.

Ayudante

DENYK

Arcan Zamora USUGA

ROSA VERA MORALES P.

ob.

ROSA V. P.

WILSON LARA

APROBANTE

WALTER FELIPE RABELO

AUX

WALTER FE

CARLOS FELIX LARA M.

audiente

carlos

JUAN GARCIA

AUX

KEINER LEONARDO SALAS

AUX

LUIS ALBERTO DAVID

AUX

Luis David

JOSE ANTONIO

ayudante

JOSÉ YIMMY RUIZ

SUPERVISOR M-O

YIMMY RUIZ

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

- cuidados y proteccion de manos y como prevenir accidentes



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST-042

FECHA 26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN 1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estadio República

EXPOSITOR: Don Oficio Oficio

FECHA: 28-04-2023 DURACIÓN: 5 min

OBJETO DEL TEMA

Informar a los colaboradores de que la Seguridad es responsabilidad de todos si queremos cumplir el compromiso de cero accidentes laborales.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeiner Leandro	Ayu	Yeiner
Sergio H. Díaz	Ayu	Sergio
Daniel Muñoz C.	Ayudante	Daniel
Ricardo Castillo	Oficial	Ricardo
Yuan Armando	Ayudante	Yuan C.
W. Wilson H.	Ayu	Wilson H.
José H. D. P.	CIF	José H. D. P.
Carlos Esteban López	Ayu	Carlos
Primo Angel M. P.	Ayudante	Primo
Juan Carlos	Ayu	Juan
José Alberto David	CIF	José David
WALTER FELIPE		WALTER FELIPE

TEMAS TRATADOS (Incluye compromisos adquiridos)

La Seguridad es responsabilidad de todos



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO

FT-SST-042

FECHA

20/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN

1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION

CHARLA

REUNIÓN

ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO:

Estado de Trabajo

EXPOSITOR:

Quintanilla y Cia

FECHA:

29-04-2023

DURACIÓN:

OBJETO DEL TEMA

Socializar con los colaboradores las recomendaciones para evitar accidentes por caída de los objetos en manipulaciones

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeiner Leonardo	Ayu	Yeiner
Angel	ayudante	Angel
Juan Carlos	oficial	Juan Carlos
Jose H. Duran	of	Jose H. D.P.
Severo	AUX	Severo
Wilson	Ayu	Wilson
William	ayudante	William
Juan Carlos	Ayu	Juan Carlos
Carlos Felix Lopez M.	ay	Carlos
Yuan Leonardo	Ayudante	Yuan L.
DANIEL MUÑOZ U.	Ayudante	DANIEL
WALTER FELI EUBREGO		WALTER FE
Juan Alberto David	ayu	Juan David

TEMAS TRATADOS (incluye compromisos adquiridos)

presencia de caídas de objetos en manipulaciones



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST-042

FECHA 26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN

1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estadio Deubertson

EXPOSITOR: Don Juan Juan Juan

FECHA: 30-04-2023 DURACIÓN: 5 min

OBJETO DEL TEMA

Sensibilizar en los colaboradores acerca de que es el estrés laboral y trabajo bajo presión.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeiner Leonardo	Ayu	Yeiner
Wilderman Lopez	Operarios	Wilderman
Orlando Angulo	ayudante	Orlando
Juan Carlos	Ayu	Juan Carlos
Eda V. De la Cruz	Of	Eda V. De la Cruz
Luis Felipe Lopez	ayudante	Luis Felipe
Wilson H	Ayu	Wilson H
Deliver Medina	ayudante	Deliver
WALTER FELIPE FERRER		WALTER FELIPE
Sergio Muñoz	AUX	Sergio
Yohan Larmona	Ayudante	Yohan Larmona
José Yurany Roca	Supervisor O.D.	Yurany Roca

TEMAS TRATADOS (incluye compromisos adquiridos)

Que es el estrés laboral y que es el trabajo bajo presión



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO

FT-SST-042

FECHA

26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN

1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION

CHARLA

REUNIÓN

ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO:

Estadío Guebarra

EXPOSITOR:

Daniela María Torres

FECHA:

03-10-2023

DURACIÓN:

5 min

OBJETO DEL TEMA

Socialización con los colaboradores de las empresas de la manipulación adecuada de sustancias químicas

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan Carlos	Ayu	[Signature]
Wilson	Ayu	Wilson H
Wilder	Ayudante	[Signature]
OSCAR H. REBERGUISA	OF	OSCAR H. D.P.
Carlos Felipe Lopez M.	Aludante	Carlos
WALTER FELIPE	Ayudante	WALTER FELIPE
Danyel Muñoz U.	Ayudante	Danyel
Yuan Carmona	Ayudante	Yuan C.
Dani Alberto David	OF	Dani David
Yeiner Leandro	Ayu	Yeiner
Juan Carlos	Oficial	[Signature]
STANIA	ALX	[Signature]
OSCAR ANGELO	ayudante	[Signature]
OSCAR HERNAN REBERGUISA	Ayudante	OSCAR H. REBERGUISA P.
Jos Yurany Yv Rodu	Supervisado M.O.	Yurany Rodu

TEMAS TRATADOS (incluye compromisos adquiridos)

Manipulación de Sustancias químicas



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-95T-042

FECHA 26/02/2023

Control de Asistencia

VERSIÓN 1

CLASIFICACIÓN

CAPACITACION CHARLA REUNIÓN ACTIVIDAD

PROYECTO/PROCESO: Estudio Alcoholismo

EXPOSITOR: Juan Carlos Pineda

FECHA: 06-10-2023 DURACIÓN:

OBJETO DEL TEMA

enfrentar al trabajador acerca de las importancias de tener una mejor calidad de vida con el uso correcto de alcohol

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan Carlos	AyU	Juan C.
José Robinson	Asistente	José R. Robinson
Wilson	AyU	Wilson H.
Geiner Leandro	AyU	Geiner
WALTER FELIPE BARRERA	ayudante	WALTER
Carlos Félix López	ayudante	Carlos
José H. D. Pineda	of	José H. D. P.
SEBASTIÁN	ACX	SEBASTIÁN
Juan Camilo Usuga	Oficial	Juan C.
Daniel Rodríguez	Asistente	Daniel
Wilson	Asistente	Wilson
Luis Alberto	As	Luis Daniel
Yoon Larrosa	Ayudante	Yoon C.
Edy Anguila	ayudante	Edy
Jesús Prunty Kuu Kodur	Supervisor M.O.	Jesús Prunty

TEMAS TRATADOS (incluye compromisos adquiridos)

- Estilo de vida saludable no consumo de alcohol

SEPTIEMBRE SGSST CHARLAS PAUSAS Y CAPACITACIONES SEP-OCT 2023



LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1	2	3
	Inducción Especifica SST			Pausas activas		
				CUMPLIO		
4	5	6	7	8	9	10
Inducción Especifica SST		Reporte de actos y condiciones inseguras	Socializacion de ATS .Que es riesgo quimico por polvos organicos e inorganicos	Socializar sobre los espacios , para el consumo de tabaquimos	Trauma de tejidos blandos y manejo.	Orden y aseo y que es el autocuidado
CUMPLIO		cumplio	CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO
11	12	13	14	15	16	17
Capacitación: Que es una briigada de emergencia y como se conforma	Orden y aseo en sitio de trabajo	Pausas activas:		Manejo y control del estrés	Capacitacion : Ques el punto de encuentro y rutas de evacuación	
CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO		CUMPLIO	CUMPLIO	
18	19	20	21	22	23	24
Inducción Especifica SST : Charla : orden y aseo , ubicación de herramientas manuales	Manejo seguro de materiales y sustancias quimicas	La importancia de reciclar en el àrea de trabajoy nuestro entorno	Cumplimiento a disposiciones legales aplicables en materia SST	Acoso laboral: Inducción por ingreso de personal		
CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO		
25	26	27	28	29	30	1
Inducción Especifica SST :	Uso adecuado de los EPP ,por actividad	Cuidado y proteccion de manos y como prevenir accidentes	La seguridad es responsabilidad de todos	Prevención de caidas de objetos por manipulación	Que es estrés laboral y que es trabajo bajo presión	
	CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO	CUMPLIO	
2	3	4	5	6	7	8
Inducción Especifica SST	Manipulación de sustancias quimicas - Inducción Especifica SST por personal que ingresa			Estilos de vida saludables , no consumo de alcohol		
	CUMPLIO			CUMPLIO		

NOTA: Las inducciones debe presentarse la lista de asistencia de la inducción y anexar cada evaluacion de la misma, de las charlas de seguridad se presenta las asistencias escaneadas. Las capacitaciones presentar en pdf escaneado la asistencia y anexar las evaluaciones hechas al personal crear un documento en excel con registro fotografico de las actividades sst de obra.



INFORME MENSUAL SST



Anexo N°5

Registro de entrega de elementos de protección personal

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: FE887-472

FECHA: 01/03/2023

VERSION: 001

NOMBRE DEL FILIA/GRUPO	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS											FIRMA	OBSERVACIONES		
				GUANTES DE NITRILAS	BOOTS DE PUNTA	MASCARILLA OCULAR	PROTECCIÓN AUDITIVA (TYPE COVER)	PROTECCIÓN AUDITIVA (TYPE INSERTION)	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE PUNTA	MOCHILA DE CARGAS	MOCHILA	GUANTES DE LANA	GUANTES DE GAMBES			YARAS MEDIO	REPTORES
Luis Alberto Rendón	10272613	Aj	10-08-23	/		/											Luis David	
Luis Alberto Rendón	10272602	Aj	17-08-23									/					Luis David	botas Seguridad com. 23.
Luis Alberto Rendón	10272610	Aj	24-08-23									/					Luis David	
Luis Alberto Rendón	10272611	Aj	25-08-23									/					Luis David	
Luis Alberto Rendón	10272633	Aj	04-09-23					/									Luis David	
Luis Alberto Rendón	10272637	Aj	13-09-23									/					Luis David	
Luis Alberto Rendón	10272657	Aj	21-09-23									/					Luis David	



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: PT-SS-472


FECHA: 07/03/2023


VERSION: 001

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DEL COLABORADOR	EMPRESA	CARGO	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS											FIRMA	OBSERVACIONES		
				CASCOS CON BARRERAS	MOCHILAS PLATA	MOCHILAS VERDES	PROTECCIÓN AUDITIVA (PND OTRA)	PROTECCIÓN AUDITIVA (PND OTRA)	CORRETE PUNTA	BOZOS CON FLEXIBILIDAD	DESAFILI DE SEGURIDAD	BOZOS	PROTECCIÓN DE MANOS (GLOVES)	GUANTES DE CARMEN			TAPAS BOCAS	OTROS
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	10-08-20														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	13-08-20														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	18-08-23														JOHAN C.	camisa
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	21-08-20														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	24-08-23														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	21-08-20														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	01-09-23														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	02-09-23														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	04-09-23														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	13-09-2024														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	15-09-20														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	18-09-20														JOHAN C.	
JOHAN ANDRES C.	LOWE STORES	CAJ	25-09-20														JOHAN C.	

APPEND

		SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											CODIGO:	PT-457-472				
		ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL											FECHA:	23/03/2023				
													VERSION:	001				
NOMBRE DEL COLABORADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS											FIRMA	OBSERVACIONES		
				GUANTES DE NITRILICO	MOCHILA PLANA	MOCHILAS HERMETICAS	PROTECCION AUDITIVA (TAPAS DE OREJAS)	PROTECCION ALIMENTARIA (TAPA DE BOCAL)	GUANTES DE LATEX	BATA DE PROTECCION	PROTECTOR DE CARABALLA	PROTECTOR	PROTECTOR DE VENTANA	PROTECTOR DE CARABALLA			PROTECTOR	PROTECTOR
Juan Camilo	1017134220	OPERA	15-08-2021	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Camilo Zapata	
Juan Camilo	1017134220	OPERA	16-08-2021														Camilo	
Juan Camilo	1017134220	OPERA	17-08-2021														Camilo	
Juan Camilo	1017134220	OPERA	01-09-23		✓												Camilo	causas
Juan Camilo	1017134220	OPERA	05-09-23														Camilo	
Juan Camilo	1017134220	OPERA	12-09-23														Camilo	
Juan Camilo	1017134220	OPERA	18-09-2023														Camilo	
Juan Camilo	1017134220	OPERA	21-09-2023														Camilo	
Juan Camilo	1017134220	OPERA	27-09-2023		✓												Camilo	

	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											CODIGO	FT-657-072			
	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL											FECHA	07/08/2023			
												VERSION	001			
EMPRESA O COLABORADOR	IDENTIFICACION	CATEGORIA	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS											FIRMA	OBSERVACIONES
				GUANTES CON MANEJO DE...	MOCHILA CLIMA	MOCHILA TERCERA	PROTECCIÓN PARA LOS OJOS	PROTECCIÓN AUDITIVA (TAPONES)	LUBRIFICANTES	RETOZO CON FORTIN	PROTECCIÓN DE MANOS	PROTECCIÓN DE...	PROTECCIÓN DE...	PROTECCIÓN DE...		
Wilson H	121622200	Auxiliar	11-02-23	1	1				1			1	1	1	Wilson H	gafas
Wilson H	121622200	Aux	11-02-23									7	7	7	Wilson H	
Wilson H	121622200	Aux	06-09-23									1			Wilson H	gafas
Wilson H	121622200	Aux	09-09-23									7			Wilson H	gafas
Wilson F	121622200	Aux	30-09-23												Wilson H	gafas



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: ST-SSP-012

FECHA: 05/07/2023

VERSION: 001

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

IDENTIFICACION DEL EMPLEADO	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE ENTREGA	SEÑALAMIENTO	PROTECCIÓN OÍDIA	PROTECCIÓN FACIAL	PROTECCIÓN PARA LOS OJOS	PROTECCIÓN PARA LAS MANOS	PROTECCIÓN PARA LOS PIEDES	PROTECCIÓN PARA EL CUELLO	PROTECCIÓN PARA LA CABEZA	PROTECCIÓN PARA EL CARPA	PROTECCIÓN PARA EL CODO	PROTECCIÓN PARA EL CARGO	FIRMA	REMARKS
✓	Sergio Luis Torres	Operario	31-07-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sando	Compu 20g
✓	Sergio Luis Torres	Operario	13-07-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sando	Compu 20g
✓	Sergio Luis Torres	Operario	18-09-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sando	Compu 20g
✓	Sergio Luis Torres	Operario	28-09-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sando	Compu 20g



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: PT-001-012

FECHA: 07/03/2023

VERSION: 001

NOMBRE DEL COLABORADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CAPSOM										OBSERVACIONES		
				LABORATORIO BIOMÉTRICO	SEÑALADOR	SEÑALADOR	PROTECCIÓN AUDITIVA (P. BATERIA)	PROTECCIÓN AUDITIVA (P. BATERIA)	SEÑALADOR	SEÑALADOR	SEÑALADOR	SEÑALADOR	SEÑALADOR		SEÑALADOR	
Danyer	100616263	Ay	20-07-23		1							1	1		Danyer	
Danyer	100616263	Ay	12-09-23										7		Danyer	
Danyer	100616263	Ay	14-08-23		7		7	7				7	7		Danyer	
Danyer	100616263	Ay	12-08-23										7		Danyer	
Danyer	100616263	Ay	29-08-23									7			Danyer	
Danyer	100616263	Ay	06-09-23									7			Danyer	
Danyer	100616263	Ay	28-07-23				7								Danyer	
Danyer	100616263	Ay	07-07-23									7			Danyer	
Danyer	100616263	Ay	18-07-23									7	7		Danyer	
Danyer	100616263	Ay	20-07-23										7		Danyer	
Danyer	100616263	Ay	26-07-23		7		7						7		Danyer	



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

COORD: FT-887472
FECHA: 07/06/2023
VERSION: 001

EMPRESARIO COLABORADOR	EMPRESARIO	LUGAR	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MARCA										FIRMA	OBSERVACIONES	
				GUANTES MANOS DE LÁTEX	GUANTES DE LANA	GUANTES DE PIEL	PROTECCIÓN AUDITIVA TAPÓN	PROTECCIÓN AUDITIVA CASCOS	PROTECCIÓN FACIAL	PROTECCIÓN OJOS	PROTECCIÓN CABELLO	PROTECCIÓN CUELLO	PROTECCIÓN DE CARGA			PROTECCIÓN DE CAÍDA
Juan Carlos Ma	107978 AS	Ay	26-07-23		1							1	1		Juan Carlos	
Juan Carlos Ma	100920 AS	Ay	11-08-20			7						7			Juan Carlos	
Juan Carlos Ma	071202 AS	Ay	17-08-23							7					Juan Carlos	COMUNIC.
Juan Carlos Ma	163920 AS	Ay	12-09-20			7								7	Juan Carlos	
Juan Carlos	103420 AS	Ay	26-07-23												Juan Carlos	



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO:	PS-EST-078
FECHA:	27/03/2023
VERSION:	001

NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS														FIRMA	OBSERVACIONES
				GUANTE CON BAMBUCOS	GUANTE DE LANA	GUANTE DE CUERO	PROTECTOR AUDIAL TIPO CORDON	PROTECTOR AUDIAL TIPO INCAJON	GUANTE DE GOMA	GUANTE DE PIEL	DESAHUCAR	DESAHUCAR	DESAHUCAR	DESAHUCAR	DESAHUCAR	DESAHUCAR	DESAHUCAR		
Carlos Felipe Lopez	2711011500000000000	Asistente	18-09-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>				Carlos	
Carlos Felipe Lopez	2711011500000000000	Asistente	25-09-2022											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Carlos	
Carlos Felipe Lopez	2711011500000000000	Asistente	03-10-2022		<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Carlos	



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: FT-EST-012

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA: 07/03/2023


VERSION: 001

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

NOMBRE DEL COLABORADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS												OBSERVACIONES			
				ESPELTO	GUANTES	GORRO	OCULARES	PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	PROTECCIÓN PARA CAÍDAS	PROTECCIÓN PARA MOVILIDAD	PROTECCIÓN PARA VIBRACION	PROTECCIÓN PARA RAYOS UV	PROTECCIÓN PARA RUIDO	PROTECCIÓN PARA ELECTRICIDAD				
Yeiner Salas	1.039-289-201	AYUDANTE	27-07-23	✓	1									1	1			Yeiner	
Yeiner Salas	1.039-289-201	AYUDANTE	11-06-23											7	7	7		Yeiner	
Yeiner	1.039-289-201	AYUDANTE	13-09-2023											7		7		Yeiner	
Yeiner	1.039-289-201	AYUDANTE	02-10-2023											7				Yeiner	

APROBADO

	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												<small>CODIGO:</small> PT-017-412			
	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL												<small>FECHA:</small> 23/08/23			
													<small>VERSION:</small> 01			
<small>ENCARGADO DEL REGISTRO</small>	<small>IDENTIFICACION</small>	<small>CURP</small>	<small>FECHA DE ENTREGA</small>	<small>ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS</small>										<small>FECHA</small>		
				<small>ESPELLOS DE SEGURIDAD</small>	<small>MOCHILAS</small>	<small>VESTIMENTAS</small>	<small>PROTECCIÓN AUDITIVA</small>	<small>PROTECCIÓN VISUAL</small>	<small>PROTECCIÓN RESPIRATORIA</small>	<small>PROTECCIÓN MANOS</small>	<small>PROTECCIÓN PIES</small>	<small>PROTECCIÓN CARPA</small>	<small>PROTECCIÓN OJOS</small>		<small>PROTECCIÓN OÍDOS</small>	
<i>Donatiana...</i>	42401670	SST	17-08-23 ✓													<i>coconca. 2</i> <i>zupita</i>
<i>Donatiana...</i>	42401670	SST	23-08-23													

		SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												CODIGO	PS-001-012		
		ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL												FECHA:	05/03/2023		
														VERSION:	001		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																	
NOMBRE DEL COLABORADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE ENTREGA	PROTECCIÓN CASCOS	PROTECCIÓN OJOS	PROTECCIÓN AUDÍFONA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	PROTECCIÓN MANOS	PROTECCIÓN PIES	PROTECCIÓN CINTURA	PROTECCIÓN OTRAS PARTES DEL CUERPO	PROTECCIÓN ALTO VOLTAJE	PROTECCIÓN ANTICORTAMIENTOS	PROTECCIÓN ANTICADIDAS	OTROS	FIRMA	REMARKS
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	11-08-23		✓	✓	✓						✓	✓	✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	15-08-23												✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	15-08-23	✓	✓	✓									✓	<i>[Signature]</i>	capa on de capu
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	16-08-23		✓										✓	<i>[Signature]</i>	responsable de trabajo
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	17-08-23				✓		✓						✓	<i>[Signature]</i>	protector plasticos
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	23-08-23						✓						✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	25-08-23												✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	28-08-23												✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	29-08-23												✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	06-09-23						✓						✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	11-09-23			✓	✓								✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	26-09-23												✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	30-09-23		✓										✓	<i>[Signature]</i>	
Walter Lopez	P.419.299	Ay.	01-10-2023												✓	<i>[Signature]</i>	



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: 17857478

FECHA: 07/09/2021

VERSION: 001

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS													OTRAS OBSERVACIONES	
				CASCO	GUANTES	BOQUILLA	PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN Ocular	PROTECCIÓN FACIAL	PROTECCIÓN PARA LOS PIES	PROTECCIÓN PARA LAS MANOS	PROTECCIÓN PARA EL CUELLO	PROTECCIÓN PARA EL CARPA	PROTECCIÓN PARA EL OÍDO	PROTECCIÓN PARA EL CODO	PROTECCIÓN PARA EL TORSO		PROTECCIÓN PARA EL BRAZO
WALTER FELIX	8-075-803	Ay	31-08-21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WALTER FELIX Camiseta
WALTER FELIX	8-075-803	Ay	01-09-21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WALTER FELIX Zapatos
Walter peluy	8-075-803	Ay	18-09-21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WALTER FELIX



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: FF.887-012

FECHA: 05/03/2023

VERSION: 001

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DEL COLABORADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS										OBSERVACIONES			
				GORRO CON BARRA ELASTICA	GUANTES DE LATEX	GUANTES DE PUEBLO	PROTECCION FACIAL (TAPA O BARRERA)	PROTECCION OJOS (GAFAS)	PROTECCION AUDIOS (TAPONES)	PROTECCION RESPIRATORIA (MASCARILLA)	PROTECCION PARA CAIDAS (CASCO)	PROTECCION PARA CONTAMINACION	PROTECCION PARA CONTACTO CON OBJETOS DUREZA		PROTECCION PARA CONTACTO CON LIQUIDOS	PROTECCION PARA CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS	PROTECCION PARA CONTACTO CON SUSTANCIAS BIOLÓGICAS
HERRERA JESUS O	67478008	AUX	26-07-23	1	1				1				1	1			<i>[Signature]</i>
HERRERA JESUS O	67478008	AUX	15-08-23		7	7							7	7			<i>[Signature]</i>



INFORME MENSUAL SST

Anexo N° 6
Inspecciones de seguridad





SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-557-362

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

FECHA: 21/08/2023

VERSIÓN: 1

Área / Proceso: *Remedialación Estudios* Ciudad: *Durazno (Ant)*
 Fecha: *04-09-2023* 11:00 AM 04 de Septiembre de 2023 Lugar: *Estudio de suelo*
 Hora: *7:00 AM - 5:00 PM* Otro o Proyecto: *Remedialación patología estéril*
 Descripción de la tarea a realizar: *exigencia piloto, vacado pilotes, breches y construcciones de capen, traslado de grutas con agua voladora, excavación para reposición de patras, compactación de zapatas*

Herramientas y maquinaria a utilizar			Para esta tarea se requiere permiso de:	
Cestaria <input type="checkbox"/>	Meceta <input type="checkbox"/>	Equipo de soldadura <input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en caliente <input type="checkbox"/>	
Cinzel <input type="checkbox"/>	Pala <input checked="" type="checkbox"/>	Compresor <input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en altura <input type="checkbox"/>	
Destornillador <input type="checkbox"/>	Pico de punta <input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de calzado <input type="checkbox"/>	Energías peligrosas <input type="checkbox"/>	
Alcate <input checked="" type="checkbox"/>	Alojadora <input type="checkbox"/>	Inversor soldador <input type="checkbox"/>	Espacio Confinado <input checked="" type="checkbox"/>	
Sierra manual <input checked="" type="checkbox"/>	Taladro <input type="checkbox"/>	Otros: Extensión eléctrica <input checked="" type="checkbox"/>	Otro, cuM? <input type="checkbox"/>	
Longo de filos <input checked="" type="checkbox"/>	Sierra Circular <input checked="" type="checkbox"/>			
tillo <input type="checkbox"/>	Pulidora <input checked="" type="checkbox"/>			
Puncón <input checked="" type="checkbox"/>	Esmeril <input type="checkbox"/>			

Función detallada de la tarea	Peligros potenciales y AS-acciones	Consecuencias	Controles Requeridos
Acompañar y/o dirigir la charla pre-operacional	Riesgo locativo. Caída al mismo nivel, caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Golpes, heridas, laceraciones, contusiones, machucos.	Uso de Elementos de protección personal adecuados. Capacitaciones Difusión de Análisis de trabajo seguro Calentamiento y Charla Preoperacional. Orden y aseo. Señalización y demarcación.
Autorizar la movilización del personal al sitio de trabajo.	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre estramientos. Riesgo locativo. Caída al mismo nivel. Caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Problemas musculares, lumbagos Descompensación física Golpes, heridas y contusiones. Fracturas, contusiones.	Capacitación auto cuidado en el trabajo. Uso de filtro Solar capacitación y entrenamiento Señalización y demarcación. Orden y aseo. Implementar sistemas de almacenamiento. Uso de dotación y EPP suministrados por la empresa.
Verificar elementos de Protección Personal y alistamiento de áreas de trabajo	Riesgo locativo. Caídas o nivel Riesgo químico. Material Particulado Riesgo físico. Radiación no ionizantes Riesgo físico. Alta Temperatura (calor) Riesgo Biológico. Picaduras.	Caidas al mismo nivel Golpes, heridas y contusiones Cortes y laceraciones Afecciones pulmonares Quemaduras cutáneas por UV, Enrojecimiento de la piel Mordeduras y picaduras de animales peligrosos	Inspecciones Planeadas Capacitaciones Charla preoperacional. Suministro y Uso de Elementos de protección personal adecuados (Botas de seguridad, overol, guantes de baqueta, gafas de seguridad, protector respiratorio, casco, impermeable tipo fontanero,
Verificar el estado de Herramientas y equipos	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre estramientos. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol) Riesgo locativo. Caída de	Problemas musculares, lumbagos Golpe de calor desmayo Descompensación física Golpes, heridas y contusiones.	Inspección planeadas de herramientas de trabajo Uso de bloqueador solar Suministro de agua potable Capacitación auto cuidado en el trabajo. Señalización y demarcación. Implementación de sistemas de almacenamiento Orden y aseo en los frentes de trabajo Instalación de iluminación artificial (luminarias).

<p>OPERACIÓN BAJO NUEVAS CONDICIONES:</p> <p>RIESGOS PERIFERICOS</p>	<p>Supervisión de mantenimientos.</p>	<p>Caida de altura; golpes traumas, luxaciones</p>	<p>Uso correcto de Elementos de protección personal (Overol, guantes, botas, gafas de seguridad, Casco de seguridad, protector auditivo) Protección anticaida; Uso de arnés, escalera Capacitaciones Supervisión técnica y HSE Señalización y demarcación. Implementación de sistemas de almacenamiento Orden y aseo en los frentes de trabajo Instalación de iluminación artificial (luminarias). Mantenimientos preventivos y/o correctivos de maquinarias y equipos. Mantenimientos preventivos y/o correctivos de luminarias.</p>
<p>RIESGOS PERIFERICOS</p>	<p>DE VIENTO. Caída de altura Caída de Objetos Caída de Carga Proyección de material particulado a altas velocidades Proyección de basura y elementos combustibles</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Polmonitis, muerte Problemas pulmonares (neumocistosis) Inyección de material particulado en ojos Golpes con y contra la carga o sus implementos Contusiones mayores Golpes costales o heridas. Caída de tubo u objetos.</p>	<p>Charla diaria Preoperacional Calentamiento, ejercicios de relajación y estiramiento o Calistenia Uso Elementos de protección personal (overol, guantes, botas, gafas de seguridad, Casco) Uso de Bloqueador Solar Humectaciones periódicas Difusión del análisis de trabajo seguro. SUSPENSIÓN de ACTIVIDADES si la condición persiste</p>
<p>RIESGOS PERIFERICOS</p>	<p>DE LLUVIA, Tormentas eléctricas. Piso húmedo y resbaloso Caída de altura Caída a nivel inundación.</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Polmonitis, y muerte Problemas pulmonares (neumocistosis) Contusiones mayores Resaca, gripa, pulmonía, Bronquitis, Aries</p>	<p>Difusión del análisis de trabajo seguro. Uso de dotación de invierno (poncho, gabandita, overol de dos picos en caucho) Mayor inspección técnica de OIRA EVACUACION si amenaza la lluvia y suspensión de la actividad.</p>
<p>PELIGROS Y RIESGOS PARA ACTIVIDADES DE FACILIDADES DE OBRA (reflejo y nivelación de terreno manualmente, medir, cortar, figurar, amarrar del hierro, fundir)</p>	<p>Físico : exposición a radiación solar (rayos UV.)</p>	<p>deshidratación, estrés térmico, cefalea, lesiones en piel, insolación, cáncer de piel, conjuntivitis, inflamación de la cornea, infecciones, cataratas y cambios retinales. Golpeado por, golpeado contra, Heridas, lumbagos, espasmos, esguince, luxación, traumatismos, cuerpo extraño en ojo,</p>	<p>Utilizar los demás EPP (casco de seguridad, gafas, guantes, guantes de vaqueta, botas puntera de acero)</p>
<p>Condiciones inseguridad : superficie de trabajo irregular y deslucantes con diferencia de nivel ,condiciones de orden y aseo</p>	<p>guzaciones , lesiones en manos, golpes, Fracturas,</p>	<p>realizar inspección visual de superficies de trabajo.</p>	
<p>condiciones de seguridad : (Accidentes de tránsito, por desplazamiento hacia las áreas de trabajo y movimiento de maquinaria</p>	<p>daños materiales, lesionados , muerte.</p>	<p>Ubicar rutas seguras y gases personales tanto para desarrollar el trabajo como para evacuación. No transite por bordes de taludes , bordes de cajas, de excavaciones. se debe tener completo orden y aseo del lugar de trabajo. uso de elementos de protección personal.</p>	
<p>biomecánico uso de herramientas manuales . (mango de sierra tubo de torsión para dar figura</p>	<p>cortes menores por uso de herramientas , golpes, Contusiones</p>	<p>Dar cumplimiento al PESV y al PMT, Usar cintos de seguridad ,Realizar preoperacional de los vehículos ,Respetar las señalizaciones en la vía Uso de guantes y demás EPP.</p>	

		<p>caída al mismo nivel si al momento de hacer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la varilla esta se pela o se revienta</p> <p>lumbagos y espamos al ejercer fuerza sobre el tubo de torsión para figurar la varilla</p> <p>No usar medios de distracción cuando se está laborando</p>
<p>Biomecánico (Postura prolongada) mantenida, forzada, anti gravitacionales, sobre esfuerzos, movimiento repetitivo.</p>	<p>Heridas, lumbagos, espaldas, afecciones al sistema osteomuscular, y circulatorio, pérdida de capacidad, desórdenes por trauma acumulativo.</p>	<p>Personal competente y certificado en alturas, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas, tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo, coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, remitirse al procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea, garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>BIOMECÁNICO : transporte de carga, manipulador manual de carga (llevar el hierro figurado asta el sitio de amarrar)</p>	<p>lumbago y espamos al cargar el hierro, heridas con los bordes del hierro ya figurado, lesiones atercerros por carga de las varillas largas</p>	<p>Personal competente y certificado en alturas, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas, tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo, coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, remitirse al procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea, garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>Biomecánico: movimiento repetitivo (amarrar de hierro)</p>	<p>Heridas al manipular alambre de amarrar, golpes traumáticos por caídas en las superficies de hierro entretregidos, aporrear a un compañero que este cerca de el trabajador</p>	<p>No correr por encima de esta superficie, de acuerdo a su talla bien ajustado, el operario usara su calzado de acuerdo a su talla bien ajustado, asegurese de escoger la herramienta para la tarea.</p>



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-SSY-182

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

FECHA: 21/08/2023

VERSIÓN:

Área / Proceso: Estadio Delacaba (Am) Ciudad: Delacaba
 Fecha: 11.09.2023 17:09 hrs. año: 2023 Lugar: Estadio Delacaba (Am)
 Hora: 7:am a 5pm. Obra o Proyecto: Remodelación y adecuación Estadio
 Descripción de la tarea a realizar: excavación de brechas y construcción de cajas de zapatas, corte y armado de estructuras de concreto.
Uso de gradas con viga y reparaciones de filtros, compactación

Equipo y herramientas a utilizar

Para este trabajo se requiere permiso de:

Cortafito	<input type="checkbox"/>	Meceta	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en caliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Cinzel	<input checked="" type="checkbox"/>	Pala	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en altura	<input type="checkbox"/>
Destornillador	<input checked="" type="checkbox"/>	Pico de punta	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de oxicorte	<input type="checkbox"/>	Energías peligrosas	<input type="checkbox"/>
Alicate	<input checked="" type="checkbox"/>	Alojadora	<input type="checkbox"/>	Inversor soldador	<input type="checkbox"/>	Espacio Confinado	<input type="checkbox"/>
Sierra manual	<input checked="" type="checkbox"/>	Taladro	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros: Extensión eléctrica	<input type="checkbox"/>	Otro, cuál?:	<input type="checkbox"/>
Trapo de faves	<input type="checkbox"/>	Sierra Circular	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cable	<input checked="" type="checkbox"/>	Pulidores	<input checked="" type="checkbox"/>				
Punzón	<input checked="" type="checkbox"/>	Esmeril	<input checked="" type="checkbox"/>				

Puntos de evaluación de la tarea

Riesgos potenciales y Accidentes

Consecuencias

Controles Requeridos

Acompañar y/o dirigir la charla pre-operacional	Riesgo locativo. Caída al mismo nivel, caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Golpes, heridas, laceraciones, contusiones, machucos.	Uso de Elementos de protección personal adecuados. Capacitaciones Difusión de Análisis de trabajo seguro Calistenia y Charla Preoperacional. Orden y aseo. Señalización y demarcación.
Autorizar la movilización del personal al sitio de trabajo.	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre estratamientos. Riesgo locativo. Caída al mismo nivel. Caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Problemas musculares, lumbagos Descompensación física Golpes, heridas y contusiones, fracturas, contusiones,	Capacitación auto cuidado en el trabajo. Uso de Filtro Solar capacitación y entrenamiento Señalización y demarcados. Orden y aseo. Implementar sistemas de almacenamiento. Uso de dotación y EPP suministrados por la empresa.
Verificar elementos de Protección Personal y alistamiento de áreas de trabajo	Riesgo locativo. Caídas a nivel Riesgo químico. Material Particulado Riesgo físico. Radiación no ionizantes Riesgo físico. Alta Temperatura (calor) Riesgo Biológico. Picaduras.	Caídas al mismo nivel Golpes, heridas y contusiones Cortes y laceraciones Afecciones pulmonares Quemaduras cutáneas por UV, Enrojecimiento de la piel Mordeduras y picaduras de animales peligrosos	Inspecciones Planeadas Capacitaciones Charla preoperacional. Suministro y Uso de Elementos de protección personal adecuados (Botas de seguridad, overol, guantes de baqueta, gafas de seguridad, protector respiratorio, casco, impermeable tipo fontanero,
Verificar el estado de Herramientas y equipos	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre estratamientos. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol) Riesgo locativo. Caída de	Problemas musculares, lumbagos Golpe de calor desmayo Descompensación física Golpes, heridas y contusiones.	Inspección planeadas de herramientas de trabajo Uso de bloqueador solar Suministro de agua potable Capacitación auto cuidado en el trabajo. Señalización y demarcación. Implementación de sistemas de almacenamiento Orden y aseo en los frentes de trabajo Instalación de iluminación artificial (luminarias).

<p>OPERACIÓN BAJO NUEVAS CONDICIONES:</p> <p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>Supervisión de mantenimientos.</p>	<p>Caida de altura; golpes/traumas, luxaciones</p>	<p>Uso correcto de Elementos de protección personal (Overol, guantes, botas, Gafas de seguridad, Casco de seguridad), protector auditivo. Protección anticaida; Uso de arnes, escalas. Capacitaciones Supervisión técnica y HSE Señalizaciones y demarcacion. Implementacion de sistemas de almacenamiento Orden y aseo en los frentes de trabajo Instalacion de luminacion artificial (luminarias). Mantenimientos preventivos y/o correctivos de maquinarias y equipos. Mantenimientos preventivos y/o correctivos de luminarias.</p>
<p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>DE VIENTO. Caida de altura Caida de Objetos Caida de Carga Proyeccion de material particulado a altas velocidades Proyeccion de heces y elementos contundentes</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Politraumatismo, muerte Problemas pulmonares (neumocistosis) Inserción de material particulado en ojos Golpes con y contra la carga o sus implementos Contusiones mayores Vieques costales o heridas. Caida de tubo u objetos.</p>	<p>Charla diaria Preoperacional Calentamiento, ejercicios de relajación y estiramiento a Calentamiento Uso Elementos de protección personal (overol, guantes, botas, gafas de seguridad, Casco) Uso de Rayosol Solar Inspecciones periódicas Difusión del análisis de trabajo seguro. SUSPENSIÓN de ACTIVIDADES si la condición persiste</p>
<p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>DE LUBRICA. Herramientas eléctricas. Flas lubricante y herbafoso Caida de altura Caida a nivel Inundación.</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Politraumatismo, y muerte Problemas pulmonares (neumocistosis) Contusiones mayores Resfriado, gripes, polmonía, bronquitis, Aoms</p>	<p>Difusión del análisis de trabajo seguro. Uso de dotación de lluvia (poncho, gabardina, overol de dos piezas en caucho) Mayor inspección técnica de Obra SUSPENSIÓN si avanza la lluvia y suspensión de la actividad.</p>
<p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>Fisico : exposición a radiación solar (rayos UV)</p>	<p>deshidratación, estrés térmico, cefaleas, lesiones en piel, insolación, cáncer de piel, conjuntivitis, inflamación de la cornea, infecciones, catatais y cambios rituales. Causado por, golpeado contra, Heridas, lumbagos, espasmos, equivoce, torcedo, traumatismo, cuerpo extraño en ojo,</p>	<p>Utilizar los demás EPP(casco de seguridad,gafas, guantes,guantes de vaqueta, botas puntera de acero)</p>
<p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>Condiciones de inseguridad : superficie de trabajo irregular y deslizante con diferencia de nivel ,condiciones de orden y aseo</p>	<p>entorpecimientos , lesiones en manos, golpes. Fracturas,</p>	<p>realizar inspección visual de superficies de trabajo. Utilizar rutas seguras y pasos peatonales tanto para desarrollar el trabajo como para evacuación. No transite por bordes de taludes , bordes de cunetas de excavaciones. se debe tener completo orden y aseo del lugar de trabajo. uso de elementos de protección personal.</p>
<p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>condiciones de seguridad : (Accidentes de tránsito, por desplazamiento hacia las áreas de trabajo y movimiento de maquinaria</p>	<p>daños materiales, lesionados , muerte.</p>	<p>dar cumplimiento al PESH y al PNT. Usar cintos de seguridad ,Realizar preoperacional de los vehiculos ,Respetar las señalizaciones en la vía</p>
<p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>biomecánico uso de herramientas manuales . (mango de tierra tubo de torsión para dar figura</p>	<p>cortes rezacas por uso de herramientas, golpes, Contusiones</p>	<p>Uso de guantes y demás EPP.</p>

		<p>caída al mismo nivel al momento de hacer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la varilla esta se pela o se reviesta</p> <p>hombros u espaldas al ejercer fuerza sobre el tubo de torsión para figurar la varilla</p> <p>No usar medios de elevación cuando se está laborando</p>
<p>Biomecanico (Postura prolongada) mantenida, forzada, así gravitacionales, sobre esfuerzo, movimiento repetitivo,</p>	<p>Hernias, lumbagos, migrañas, afecciones al sistema osteomuscular, y circulatorio, pérdida de capacidad, desórdenes por trauma acumulativo.</p>	<p>Personal competente y certificado en alturas, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas, tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo, coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, remitirse al procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea, garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>BIOMECANICO : transporte de carga, manipulación manual de carga (levar el hierro figurado asta el sitio de amarrar)</p>	<p>lumbago y espaldas al cargar el hierro ,heridas con los bordes del hierro ya figurado , lesiones atenuadas por cargas de las varillas largas</p>	<p>Personal competente y certificado en alturas, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas , tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo ,coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, remitirse al procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea , garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>Biomecanico: movimiento repetitivo (amarrar de hierro)</p>	<p>heridas al manipular sambre de amarrar, esguinces traumas por caídas en las superficies de hierro entretegidos ,apoyar a un compañero que este encima de el trabajador</p>	<p>no correr por encima de esta superficie, de acuerdo a tu talla bien ajustado, el operario usara su calzado de acuerdo a su talla bien ajustado ,asegurarse de escoger la herramienta para la tare</p>



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-SST-182

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

FECHA: 21/08/2023

VERSIÓN:

Área / Proceso: *Remodelación y adecuación* Lugar: *Depto. de Obras*Fecha: *18-09-2023* Hora: *6:45 a.m.* Proyecto: *Estadio Deportivo y adecuación estadio*Descripción de la tarea a realizar: *Relevo de filtros y corte y armado de estructuras metálicas, nivelación de terreno, anclaje de vigas pernalotes de gradiente*

Equipos y herramientas a utilizar			Para esta tarea se requiere permiso de:	
Consiñe <input type="checkbox"/>	Mazeta <input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de soldadura <input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en caliente <input checked="" type="checkbox"/>	
Cinzel <input checked="" type="checkbox"/>	Pala <input checked="" type="checkbox"/>	Compresor <input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en altura <input type="checkbox"/>	
Destornillador <input checked="" type="checkbox"/>	Pico de punta <input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de corte <input type="checkbox"/>	Energías peligrosas <input type="checkbox"/>	
Alcance <input checked="" type="checkbox"/>	Alcancadora <input type="checkbox"/>	Inversor soldador <input type="checkbox"/>	Espacio Confinado <input type="checkbox"/>	
Sierra manual <input checked="" type="checkbox"/>	Taladro <input checked="" type="checkbox"/>	Otros: Extensión eléctrica <input checked="" type="checkbox"/>	Otro, cuál: <input type="checkbox"/>	
Trigo de llaves <input checked="" type="checkbox"/>	Sierra Circular <input checked="" type="checkbox"/>			
Artículo <input checked="" type="checkbox"/>	Pulidora <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Esmeril <input type="checkbox"/>			

Factores determinantes de la tarea	Peligros inherentes y sucesivos	Consecuencias	Controles Específicos
Acompañar y/o dirigir la charla pre-operacional	Riesgo locativo. Caída al mismo nivel, caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Golpes, heridas, laceraciones, contusiones, medusiones.	Uso de Elementos de protección personal adecuados. Capacitaciones. Difusión de Análisis de trabajo seguro Calentamiento y Charla Preoperacional. Orden y aseo. Señalización y demarcación.
Autorizar la movilización del personal al sitio de trabajo.	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre estramientos. Riesgo locativo. Caída al mismo nivel. Caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Problemas musculares, lumbagos Descompensación física Golpes, heridas y contusiones. Fracturas, contusiones,	Capacitación auto cuidado en el trabajo. Uso de Filtro Solar capacitación y entrenamiento Señalización y demarcación. Orden y aseo. Implementar sistemas de almacenamiento. Uso de dotación y EPP suministrados por la empresa.
Verificar elementos de Protección Personal y alistamiento de áreas de trabajo	Riesgo locativo. Caídas a nivel Riesgo químico. Material Particulado Riesgo físico. Radiación no ionizantes Riesgo físico. Alta Temperatura (calor) Riesgo biológico. Picaduras,	Caídas al mismo nivel Golpes, heridas y contusiones Cortes y laceraciones Afecciones pulmonares Quemaduras cutáneas por UV, Enrojecimiento de la piel Mordeduras y picaduras de animales peligrosos	Inspecciones Planeadas Capacitaciones Charla preoperacional. Suministro y Uso de Elementos de protección personal adecuados (Botas de seguridad, overol, guantes de biqueta, gafas de seguridad, protector respiratorio, casco, impermeable tipo fontanero,
Verificar el estado de Herramientas y equipos	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre estramientos. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol) Riesgo locativo. Caída de	Problemas musculares, lumbagos Golpe de calor de mayno Descompensación física Golpes, heridas y contusiones.	Inspección planeada de herramientas de trabajo Uso de bloqueador solar Suministro de agua potable Capacitación auto cuidado en el trabajo. Señalización y demarcación. Implementación de sistemas de almacenamiento Orden y aseo en los frentes de trabajo Instalación de iluminación artificial (luminarias).

<p>OPERACIÓN BAJO NUEVAS CONDICIONES</p> <p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>Supervisión de mantenimientos.</p>	<p>Caida de altura, golpes traumáticos, laceraciones</p>	<p>Uso correcto de Elementos de protección personal (Jovón, guantes, botas, gafas de seguridad, Casco de seguridad, protector auditivo) Protección anti caídas; Uso de andamios, escaleras Capacitaciones Supervisión técnica y HSE Señalizaciones y demarcación Implementación de sistemas de almacenamiento Orden y aseo en los frentes de trabajo Instalación de iluminación artificial (luminarias). Mantenimientos preventivos y/o correctivos de maquinarias y equipos. Mantenimientos preventivos y/o correctivos de luminarias.</p>
<p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>DE VIENTO: Caída de altura Caída de Objetos Caída de Carga Proyección de material particulado a altas velocidades Proyección de barras y elementos contundentes</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Polmonitis crónica, muerte Problemas pulmonares (neumocoelosis) Inyección de material particulado en ojos Golpes con y contra la carga o sus implementos Contusiones mayores Golpes contusiones o heridas. Caída de tubo u objetos.</p>	<p>Charla diaria Preoperacional Calentamiento, ejercicios de relajación y estiramiento o Calentamiento Uso Elementos de protección personal (jovón, guantes, botas, gafas de seguridad, Casco) Uso de Bloqueador Solar Inyecciones periódicas Difusión del análisis de trabajo seguro. SUSPENSIÓN de ACTIVIDADES si la condición persiste</p>
	<p>DE LLUVIA, Tormentas eléctricas, Risa húmeda y resaca Caída de altura Caldo a nivel inundación.</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Polmonitis crónica, y muerte Problemas pulmonares (neumocoelosis) Contusiones mayores Resaca, gripe, polmonía, Bronquitis, Asma</p>	<p>Difusión del análisis de trabajo seguro. Uso de dotación de Inodoro (poncho, gabardina, jovón de dos piezas en caucho) Mayor Inspección técnica de Obra EXACIACION si arroja la lluvia y suspensión de la actividad.</p>
<p>RISGOS Y RIESGOS PARA ACTIVIDADES DE FACILIDADES DE OBRA (relleno y nivelación de terreno, muros, muros, aceras, cercas, Ejarar, arena del Niemo, fondo)</p>	<p>Riesgo : exposición e radiación solar (rayos UV.)</p>	<p>deshidratación, estrés térmico, vefeles, lesiones en piel, insolación, cacer de piel, coqueamiento, inflamación de la cornea, lesiones, cataratas y cambios retinales. Golpes por, golpes contra, Nervios, lumbagos, espasmos, espulso, laceración, traumáticos, cuerpo extraño en ojo.</p>	<p>Utilizar los demás EPP (casco de seguridad, gafas, guantes, guantes de vaqueta, botas puntera de acero)</p>
	<p>Condiciones de seguridad : superficie de trabajo irregular y deslucidas con diferencia de nivel ,condiciones de orden y aseo</p>	<p>ponstraciones , lesiones en manos, golpes, Fracturas.</p>	<p>realizar inspección visual de superficies de trabajo.</p> <p>Usar rutas seguras y pasos peatonales tanto para desarrollar el trabajo como para evacuación.</p> <p>No transite por bordes de taludes, bordes de cajas, de excavaciones, se debe tener completo orden y aseo del lugar de trabajo.</p> <p>uso de elementos de protección personal.</p>
	<p>condiciones de seguridad : (Accidentes de tránsito, por desplazamiento hacia las áreas de trabajo y movimiento de maquinaria</p>	<p>fallos materiales, lesionados, muerte.</p>	<p>dar cumplimiento al PSM y al PMS. Usar cintos de seguridad ,Realizar preoperacional de los vehículos ,Respetar las señalizaciones en la vía</p>
	<p>biomecánico uso de herramientas manuales . (mango de sierra tubo de torsión para dar figura</p>	<p>cortes raspones por uso de herramientas, golpes, Contusiones</p>	<p>Uso de guantes y demás EPP.</p>

		<p>caída al mismo nivel al momento de hacer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la brilla esta se pela o se revienta</p> <p>lumbagos u espemos al ejercer fuerza sobre el tubo de torsión para figurar la varilla</p> <p>No usar medios de elevación cuando se esté laborando</p>
<p>Biomecánico (Postura prologada) mantenida, forzada, anti gravitacionales, sobre esfuerzo, movimiento repetitivo,</p>	<p>Hernias, lumbagos, espaldas, afecciones al sistema osteomuscular, y circulatorio, pérdida de capacidad, desordenes por trauma acumulativo.</p>	<p>Personal competente y certificado en altura, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas, tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo, coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, rendirse al procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea, garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>BIOMECANICO (traslado de carga, manipulación manual de carga (llevar el hierro figurado este el sitio de amarre)</p>	<p>lumbago y espemos al cargar el hierro heridas con los bordes del hierro ya figurado Lesiones atencas por carga de las varillas largas</p>	<p>Personal competente y certificado en altura, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas, tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo, coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, rendirse al procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea, garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>biomecánico: movimiento repetitivo (amarre de Naranj)</p>	<p>heridas al manipular alambre de amarre, espaldas traumas por caídas en las superficies de hierro entreligidos, apomear a un compañero que este cerca de el trabajador</p>	<p>no correr por encima de esta superficie, de acuerdo a su talla bien ajustado, el operario usara su calzado de acuerdo a su talla bien ajustado, asegurese de escoger la herramienta para la tarea,</p>

30
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

	REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE OBREROS Y TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE OBREROS Y TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE OBREROS Y TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE OBREROS Y TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
--	--	--

GRUPO DE TRABAJO QUE REALIZARA LA LABOR

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Meiner Leonardo Sotelo Braciano	1039289729	Meiner
Juan Carlos MAZO	7039727153	
Wilson	727673200	Wilson
Otalvarra Torres	5413777	Otalvarra Torres
Abraham	abrahamte 844588	Abraham
Yolanda	Yolanda	Yolanda
Daniel Eduardo Luisa	150161265	Daniel
Juan Carlos	1039311111	Juan
Luis	8111799	Luis
Walter	2282369311	Walter
Luis Alberto	8419127	Luis
Luis Alberto	1639981557	Luis
Walter	103920428	Walter
WALTER FELIX URABE	8095833	WALTER
Francisco Jimenez	1000536787	Francisco
Francisco Jimenez	1046983068	Francisco Jimenez
Francisco Jimenez	11085022	Francisco
Francisco Jimenez	102794161	Francisco
ENCARGADOS		
ENCARGADO DE OBRAS	Rodrigo 43.416.900	Rodrigo
ENCARGADO MAESTRO DE OBRA	Francisco 1.046.983.068	Francisco
ENCARGADO RESPONSABLE	Francisco 1152705696	Francisco



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-SST-182

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

FECHA: 22/06/2023

VERSIÓN:

Area / Proceso: *Revisión de actividades* Ciudad: *Durban*
 Fecha: *25-04-2023* 30 mes: *04* año: *2023* Lugar: *Estadio Durban*
 Hora: *7:00 a 5 PM* Obra o Proyecto: *Estadio Durban colocación y reinstalación*
 Descripción de la tarea a realizar: *Novelación de estructura, ferrocarril de viga, europeo, marco de fierro, uso de viga, demarcación de viga*

Equipos y herramientas a utilizar:				Para esta tarea se requiere permiso de:			
Cortafieles	<input type="checkbox"/>	Mazeta	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en caliente	<input type="checkbox"/>
Cincol	<input checked="" type="checkbox"/>	Pala	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en altura	<input type="checkbox"/>
Destornillador	<input checked="" type="checkbox"/>	Pico de punta	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de corte	<input type="checkbox"/>	Energías peligrosas	<input type="checkbox"/>
Alcance	<input checked="" type="checkbox"/>	Ahoradora	<input type="checkbox"/>	Inversor soldador	<input type="checkbox"/>	Espacio Confinado	<input type="checkbox"/>
Sierra manual	<input checked="" type="checkbox"/>	Taladro	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros: Extensión eléctrica	<input type="checkbox"/>	Otro, cuál?:	<input type="checkbox"/>
Juego de llaves	<input checked="" type="checkbox"/>	Sierra Circular	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cartucho	<input checked="" type="checkbox"/>	Pulidora	<input checked="" type="checkbox"/>				
Uso	<input type="checkbox"/>	Esmeril	<input type="checkbox"/>				

Pagos detallados de la tarea	Peligros potenciales y consecuencias	Evaluaciones	Controles Requeridos
Acompañar y/o dirigir la charla pre-operacional	Riesgo locativo. Caída al mismo nivel, caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Golpes, heridas, laceraciones, contusiones, machucos.	Uso de Elementos de protección personal adecuados. Capacitaciones. Difusión de Análisis de trabajo seguro. Calentamiento y Charla Preoperacional. Orden y aseo. Señalización y demarcación.
Autorizar la movilización del personal al sitio de trabajo.	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre entramientos. Riesgo locativo. Caída al mismo nivel. Caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Problemas musculares, lumbagos. Descompensación física. Golpes, heridas y contusiones. Fracturas, contusiones.	Capacitación auto cuidado en el trabajo. Uso de Filtro Solar. capacitación y entrenamiento. Señalización y demarcación. Orden y aseo. Implementar sistemas de almacenamiento. Uso de dotación y EPP suministrados por la empresa.
Verificar elementos de Protección Personal y alistamiento de áreas de trabajo	Riesgo locativo. Caídas a nivel. Riesgo químico. Material particulado. Riesgo físico. Radiación no ionizantes. Riesgo físico. Alta Temperatura (calor). Riesgo Biológico. Picaduras.	Caidas al mismo nivel. Golpes, heridas y contusiones. Cortes y laceraciones. Afecciones pulmonares. Quemaduras cutáneas por UV, Enrojecimiento de la piel. Mordeduras y picaduras de animales peligrosos.	Inspecciones Planeadas. Capacitaciones. Charla preoperacional. Suministro y Uso de Elementos de protección personal adecuados (Botas de seguridad, overol, guantes de baqueta, gafas de seguridad, protector respiratorio, casco, impermeable tipo fontanero,
Verificar el estado de Herramientas y equipos	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre entramientos. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol). Riesgo locativo. Caída de	Problemas musculares, lumbagos. Golpe de calor desmayo. Descompensación física. Golpes, heridas y contusiones.	Inspección planeada de herramientas de trabajo. Uso de bloqueador solar. Suministro de agua potable. Capacitación auto cuidado en el trabajo. Señalización y demarcación. Implementación de sistemas de almacenamiento. Orden y aseo en los frentes de trabajo. Instalación de iluminación artificial (luminarias).

<p>OPERACIÓN BAJO NUEVAS CONDICIONES:</p> <p>RIESGOS PERIFERICOS</p>	<p>Supervisión de mantenimientos.</p>	<p>Caída de altura, golpes traumas, luxaciones</p>	<p>Uso correcto de Elementos de protección personal (Overol, guantes, botas, gafas de seguridad, Casco de seguridad, protector auditivo) Protección antiruido; Uso de arnés, escalera Capacitaciones Supervisión técnica y HSE Señalización y demarcación Implementarios de sistemas de almacenamiento Cintas y asos en los frentes de trabajo Instalación de luminarias artificial (luminarias) Mantenimientos preventivos y/o correctivos de maquinarias y equipos Mantenimientos preventivos y/o correctivos de luminarias</p>
<p>RIESGOS PERIFERICOS</p>	<p>DE VIENTO, Caída de altura Caída de Objetos Caída de Carga Proyección de material particulado a altas velocidades Proyección de basura y elementos contundentes</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Politraumatismos, muerte Problemas pulmonares (neumoconiosis) Inserción de material particulado en ojo Golpes con y contra la carga o sus implementos Contusiones mayores Golpes contusiones o heridas. Caída de tubo o objetos.</p>	<p>Charla diaria Preoperacional Calistenia, ejercicios de relajación y estiramiento o Calistenia Uso (Elementos de protección personal (overol, guantes, botas, gafas de seguridad, Casco) Uso de Bloqueador Solar Hanecciones periódicas Difusión del análisis de trabajo seguro. SUSPENSIÓN de ACTIVIDADES si la condición persiste</p>
	<p>DE LUBIA, Tormentas eléctricas, Piso húmedo y resbaloso Caída de altura Caída a nivel Inundación.</p>	<p>Luxación, Contusión, fracturas Politraumatismos, y muerte Problemas pulmonares (neumoconiosis) Contusiones mayores Resfriado, gripa, pulmonía, Bronquitis, Asma</p>	<p>Difusión del análisis de trabajo seguro. Uso de dotación de invierno (poncho, gabardina, overol de dos pisos en caucho) Mayor Inspección técnica de Obra EVACUACION si arrecia la lluvia y suspensión de la actividad.</p>
<p>PELIGROS Y RIESGOS PARA ACTIVIDADES DE FACILIDADES DE OBRA (relleno y nivelación de terreno manualmente, medir, cortar, Agotar, amarra del hierro, fundir)</p>	<p>Físico : exposición a radiación solar (rayos UV)</p>	<p>deshidratación, estrés térmicos, cefalea, lesiones en piel, insolación, cáncer de piel, ceguera, problemas de visión, inflamación de la cornea, infecciones, cataratas y cambios refractivos. Golpeado por, golpeado contra, Heridas, lumbagos, espasmos, esguince, luxación, traumatismos, riesgo extraño en ojo,</p>	<p>Utilizar los demás EPP(casco de seguridad,gafas, guantes,guantes de vaqueta, botas punta de acero)</p>
	<p>Condiciones de seguridad : superficie de trabajo irregulares y deslizo con diferencia de nivel ,condiciones de orden y aseo</p>	<p>puncaciones , lesiones en manos, golpes, Fracturas,</p>	<p>realizar inspección visual de superficies de trabajo. Ubicar rutas seguras y zonas peatonales tanto para desarrollar el trabajo como para evacuación. No transite por bordes de taludes, bordes de cajas, de excavaciones. se debe tener completa orden y aseo del lugar de trabajo. uso de elementos de protección personal.</p>
	<p>condiciones de seguridad : [Accidentes de tránsito, por desplazamiento hacia las áreas de trabajo y movimiento de maquinaria</p>	<p>deño materiales, lesionados , muerte.</p>	<p>dar cumplimiento al PESH y al PMT. Usar cintos de seguridad ,Realizar preoperacional de los vehículos ,Respetar las señalizaciones en la vía</p>
	<p>biomecánico uso de herramientas manuales . [mango de sierra tubo de toralón para dar figura</p>	<p>cortes incisos por uso de herramientas , golpes, Contusiones</p>	<p>Uso de guantes y demás EPP.</p>

		<p>caída al mismo nivel si al momento de hacer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la varilla esta se pela o se revienta</p> <p>lumbagos u espamos al ejercer fuerza sobre el tubo de torsión para figurar la varilla</p> <p>No usar medios de distracción cuando se está laborando</p>
<p>Biomecánico (Postura ,prologada) mantenida, forzada, anti gravitacionales, sobre esfuerzo, movimiento repetitivo,</p>	<p>Heridas, lumbagos, esguinces, afecciones al sistema osteomuscular, y circulatorio, pérdida de capacidad, desordenes por trauma acumulativo.</p>	<p>Personal competente y certificado en alturas, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas, tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo ,coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, remitirse al procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea, garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>BIOMECANICO : transporte de carga, manipulación manual de carga (llevar el hierro figurado asta el sitio de amarre)</p>	<p>lumbago y espamos al cargar el hierro ,heridas con los bordes del hierro ya figurado , lesiones atercernos por cargas de las varillas largas</p>	<p>Personal competente y certificado en alturas, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas , tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo ,coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, remitirse al procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea ,garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>biomecánico: movimiento repetitivo (amarre de hierro)</p>	<p>heridas al manipular alambre de amarre, esguinces traumas por caídas en las superficies de hierro estretegidos ,aponear a un compañero que este cerca de el trabajador</p>	<p>no correr por encima de esta superficie, de acuerdo a su talla bien ajustado, el operario usara su calzado de acuerdo a su talla bien ajustado ,asegurese de escoger la herramienta para la tare ,</p>

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

EXAMEN DE CALIFICACION
EXAMEN DE CALIFICACION
EXAMEN DE CALIFICACION

GRUPO DE TRABAJO QUE REALIZARA LA LABOR

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Yeiner Leandro Salas G.	709289224	Yeiner
Deivys Muñoz Ugoa	100610265	Deivys
Juan Carlos Maza	707772753	Juan
Andrés Amador C	8416806	Andrés
Wilson	727677700	Wilson
Suena Zamora Ugoa	100131141	Suena
WALTER FELIX VARELA	5075833	WALTER
Separa Huerto T.	7000569511	Separa
Carlos Felix Lopez	1007120428	Carlos
Juan Alberto Dávalos	1039986337	Juan Dávalos
Yohan Laymora	1040800500	Yohan
Sebastián Pérez	1000536587	Sebastián
José Manuel Durango R.	10279466	José
Juan Laymora	1040800500	Juan
Juan Alberto Dávalos	1039986337	Juan Dávalos
EMISOR DEL ATS		
COORDINADOR P.T.	Rodrigo Pérez - 43.416.906	FIRMA
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE OBRA	Juan Carlos Maza - 1.046.953.068	FIRMA
MANTENIMIENTO RESIDENTE	LEANDRO S - 1152305696	FIRMA

(Handwritten signatures and stamps)



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-SST-182

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

FECHA: 21/08/2023

VERSIÓN: 1

Area / Proceso: *Remodelación y adecuación* Ciudad: *Dulacobra*
 Fecha: *2-10-2021* OB mas: *10* año: *2023* Lugar: *Estadio Dulacobra*
 Hora: Obra o Proyecto: *adecuación y remodelación estadio cubela*

Descripción de la tarea a realizar: *Nivelación de trihuenda, desmontaje de un grupo de fundas encapado de gradieros, trabajo para cayo. Hiego de amolación de superficies, estructuras.*

Equipos y herramientas a utilizar			Para esta tarea se requiere permiso de:	
Cortaflores <input type="checkbox"/>	Miceta <input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de soldadura <input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en caliente <input checked="" type="checkbox"/>	
Cincol <input checked="" type="checkbox"/>	Pala <input checked="" type="checkbox"/>	Compresor <input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo en altura <input type="checkbox"/>	
Destornillador <input checked="" type="checkbox"/>	Pico de punta <input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de corte <input type="checkbox"/>	Energías peligrosas <input type="checkbox"/>	
Alicate <input checked="" type="checkbox"/>	Alojadora <input type="checkbox"/>	Inversor soldador <input type="checkbox"/>	Espacio Confinado <input type="checkbox"/>	
Sierra manual <input checked="" type="checkbox"/>	Taladro <input checked="" type="checkbox"/>	Otros: Extensión eléctrica <input type="checkbox"/>	Otro, cuM? <input type="checkbox"/>	
Hiego de fierro <input checked="" type="checkbox"/>	Sierra Circular <input checked="" type="checkbox"/>			
Ortillo <input checked="" type="checkbox"/>	Pulidora <input checked="" type="checkbox"/>			
1 <input checked="" type="checkbox"/>	Emeril <input type="checkbox"/>			

Parte detallada de la tarea	Peligros, peligrosidad y consecuencias	Consecuencias	Controles Requeridos
Acompañar y/o dirigir la charla pre-operacional	Riesgo locativo. Caída al mismo nivel, caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Golpes, heridas, laceraciones, contusiones, fracturas.	Uso de Elementos de protección personal adecuados. Capacitaciones Difusión de Análisis de trabajo seguro Calentamiento y Charla Preoperacional. Orden y aseo. Señalización y demarcación.
Autorizar la movilización del personal al sitio de trabajo.	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre estiramientos. Riesgo locativo. Caída al mismo nivel. Caída de objetos, golpes. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol).	Problemas musculares, lumbago Descompensación física Golpes, heridas y contusiones, fracturas, contusiones.	Capacitación auto cuidado en el trabajo. Uso de Filtro Solar capacitación y entrenamiento Señalización y demarcación. Orden y aseo. Implementar sistemas de almacenamiento. Uso de dotación y EPP suministrados por la empresa.
Verificar elementos de Protección Personal y alistamiento de áreas de trabajo	Riesgo locativo. Caídas a nivel Riesgo químico. Material Particulado Riesgo físico. Radiación no ionizantes Riesgo físico. Alta Temperatura (calor) Riesgo Biológico. Picaduras,	Caídas al mismo nivel Golpes, heridas y contusiones Cortes y laceraciones Afecciones pulmonares Queimaduras cutáneas por UV, Enrojecimiento de la piel Mordeduras y picaduras de animales peligrosos	Inspecciones Planeadas Capacitaciones Charla preoperacional. Suministro y Uso de Elementos de protección personal adecuados (Botas de seguridad, guantes de bota, gafas de seguridad, protector respiratorio, casco, impermeable tipo forastero,
Verificar el estado de Herramientas y equipos	Riesgo biomecánico. Carga postural dinámica sobre esfuerzos y sobre estiramientos. Riesgo físico. Exposición a radiaciones no ionizantes (Rayos de sol) Riesgo locativo. Caída de	Problemas musculares, lumbago Golpe de calor de mayo Descompensación física Golpes, heridas y contusiones.	Inspección planeada de herramientas de trabajo Uso de bloqueador solar Suministro de agua potable Capacitación auto cuidado en el trabajo. Señalización y demarcación. Implementación de sistemas de almacenamiento Orden y aseo en los frentes de trabajo Instalación de laminación artificial (limpiavidas).

<p>OPERACIÓN BAJO NUEVAS CONDICIONES:</p> <p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>Supervisión de mantenimientos.</p>	<p>Caida de altura; golpes traumas, luxaciones</p>	<p>Uso correcto de Elementos de protección personal (Overol, guantes, botas, Gafas de seguridad, Casco de seguridad, protector auditivo) Protección anticaída: Uso de arnés, escalera Capacitaciones Supervisión técnica y HSE Señalizaciones y demarcación. Implementación de sistemas de almacenamiento Orden y aseo en los frentes de trabajo Instalación de iluminación artificial (luminarias). Mantenimientos preventivos y/o correctivos de maquinarias y equipos. Mantenimientos preventivos y/o correctivos de luminarias.</p>
<p>RISGOS PERIFERICOS</p>	<p>DE VIENTO. Caida de altura Caida de Objetos Caida de Carga Proyección de material particulado a altas velocidades Proyección de basura y elementos contundentes</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Politraumatismos, muerte Problemas pulmonares (neumococales) Inserción de material particulado en ojos Golpes con y contra la carga o sus implementos Contusiones mayores Golpes oculares o heridas. Caida de tubo u objetos.</p>	<p>Charla diaria Preoperacional Calistenia, ejercicios de relajación y estiramiento o Calistenia Uso Elementos de protección personal (overol, guantes, botas, gafas de seguridad, Casco) Uso de Bloqueador Solar Humectaciones periódicas Difusión del análisis de trabajo seguro. SUSPENSIÓN de ACTIVIDADES si la condición persiste</p>
	<p>DE LLUVIA. Tormentas eléctricas. Piso húmedo y resbaloso Caida de altura Caida a nivel Inundación.</p>	<p>Luxación, Contusión, Fracturas Politraumatismos, y muerte Problemas pulmonares (neumococales) Contusiones mayores Resfriado, gripe, pulmonía, Bronquitis, Asma</p>	<p>Difusión del análisis de trabajo seguro. Uso de detección de invierno (pordós, gabardina, overol de dos piezas en caché) Mayor Inspección técnica de Obra EVACUACION si amenaza la lluvia y suspensión de la actividad.</p>
<p>PELIGROS Y RIESGOS PARA ACTIVIDADES DE FACILIDADES DE OBRA (relleno y nivelación de terreno manualmente, medir, cortar, figurar, amarrar del Hierro, fundir)</p>	<p>Físico : exposición a radiación solar (rayos UV.)</p>	<p>deshidratación, estrés térmico, cefalea, lesiones en piel, insolación, cáncer de piel, conjuntivitis, inflamación de la cornea, infecciones, cataratas y cambios retinales. Golpeado por, golpeado contra, Heridas, lumbagos, espasmos, equinoc, luxación, traumatismos, cuerpo extraño en ojo.</p>	<p>Utilizar los demás EPP (casco de seguridad, gafas, guantes, guantes de vaqueta, botas puntera de acero)</p>
	<p>Condiciones inseguridad : superficie de trabajo irregulares y desiguales con diferencia de nivel ,condiciones de orden y aseo</p>	<p>punzaciones , lesiones en manos, golpes. Fracturas,</p>	<p>realizar inspección visual de superficies de trabajo.</p>
			<p>Utilizar rutas seguras y pasos peatonales tanto para desarrollar el trabajo como para evacuación. No transite por bordes de taludes , bordes de cajas, de excavaciones. se debe tener completo orden y aseo del lugar de trabajo. uso de elementos de protección personal.</p>
	<p>condiciones de seguridad : (Accidentes de tránsito, por desplazamiento hacia las áreas de trabajo y movimiento de maquinaria</p>	<p>daños materiales, lesionados , muerte.</p>	<p>dar cumplimiento al PESV y al PMT. Usar cintos de seguridad ,Realizar preoperacional de los vehículos ,Respetar las señalizaciones en la vía</p>
	<p>bión mecánico : uso de herramientas manuales . (mango de sierra tubo de torsión para dar figura</p>	<p>cortes menores por uso de herramientas , golpes. Contusiones</p>	<p>Uso de guantes y demás EPP.</p>

		<p>caída al mismo nivel al al momento de hacer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la varilla este se sella o se resalta</p> <p>lumbagos u espaldas al ejercer fuerza sobre el tubo de torsión para figurar la varilla</p> <p>No tener riesgos de distracción cuando se está laborando</p>
<p>Biomecánica (Partes prolongada) manejada, forzada, está gravitacional, sobre esfuerzos, movimiento repetitivo,</p>	<p>Hernias, lumbagos, espaldas, aflicciones al sistema osteomuscular, y circulatorio, pérdida de capacidad, desórdenes por trauma acumulativo.</p>	<p>Personal competente y certificado en altura, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas, tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo, coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, respetar el procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea, garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>BIOMECANICO (transporte de carga, manipulacion manual de carga (lavar al hierro figurado este el sitio de acarre)</p>	<p>lumbago y espaldas al cargar el hierro ,heridas con los bordes del hierro ya figurado , lesiones atencivos por caídas de las varillas largas</p>	<p>Personal competente y certificado en altura, mantener las vías de carga despejadas y ordenadas ,tener siempre presente que un operario no debe de cargar mas de 50 kg solo ,coordinar movimientos con los operarios para el traslado de las varillas, respetar el procedimiento sobre el levantamiento de carga, usar siempre guantes apropiados para la tarea ,garantizar que el personal haga el traslado bien de la carga</p>
<p>Biomecánica: movimiento repetitivo (manera de hierro)</p>	<p>heridas al manipular alambre de amarrar, esguince traumas por caídas en las superficies de hierro entreligidos ,apretar a un compañero que está cerca de el trabajador</p>	<p>no correr por encima de esta superficie, de acuerdo a su talla bien ajustado, el operario usara su calzado de acuerdo a su talla bien ajustado , asegurese de escoger la herramienta para la tarea ,</p>

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

<p>DESCRIPCION DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>	<p>INDICACIONES DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>	<p>INDICACIONES DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>
<p>DESCRIPCION DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>	<p>INDICACIONES DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>	<p>INDICACIONES DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>
<p>DESCRIPCION DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>	<p>INDICACIONES DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>	<p>INDICACIONES DE LA OBRA (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, etc.)</p>

ORDEN DE TRABAJO QUE REALIZA LA OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Yeiner Leonardo Salas Graena	7039289229	Yeiner
YDAN Cayman	1040800700	YDAN C.
Bryan Camilo usua pulgari	1013131111	Bryan
DIEGO MORALES USUA	100160265	DIEGO
JOSE ALBERTO GONZALEZ C	9445946	JOSE
JOSE YERONIMUS GONZALEZ	1027200161	JOSE
Catalina Felicitas Lopez M.	1001610428	Catalina
WALTER FELIX VARRA G	7771377700	WALTER
Juan Carlos	8075833	JUAN
Juan Alberto Gallardo	734791153	JUAN
SERGIO MORALES	1059981957	SERGIO
DANIEL H. TUBAYAN PARRA	1000369311	DANIEL
DANIEL H. TUBAYAN PARRA	7039289229	DANIEL H. TUBAYAN P.

EMISORES

COORDINADOR DE OBRA	DANIEL H. TUBAYAN PARRA	TEL: 03.416.905	FIRMA: DANIEL H. TUBAYAN PARRA
ENCARGADO O MAESTRO DE OBRA	DANIEL H. TUBAYAN PARRA	TEL: 1.046.953.068	FIRMA: DANIEL H. TUBAYAN PARRA
INGENIERO RESIDENTE	DANIEL H. TUBAYAN PARRA	TEL: 1162785696	FIRMA: DANIEL H. TUBAYAN PARRA



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO

CÓDIGO FT-SST-093
FECHA 7/03/2023
VERSIÓN 1

Mes/Año: 09-2023 Equipo No: 7. Marca/Referencia: Hitachi G2300
Proyecto: Estadio Meléndez (ant).
Equipo Nuevo: Alquilado: Dev: propio

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
El motor se encuentra en condiciones óptimas.							si	si	si																										
Los cojinetes de neopreno (caucho) del sistema de amortiguación esta en buenas condiciones.																																			
El tubo de escape esta en buenas condiciones.																																			
Los filtros del equipo estan en buen estado.							si	si	si																										
El tanque del combustible se encuentran en buenas condiciones y con tapa.							si	si	si																										
Se han revisado las guayas y se observan en buenas condiciones							si	si	si																										
Se han verificado las condiciones de los guarda polvos							si	si	si																										
La cuerda de yoyo del equipo esta en buen estado.							si	si	si																										
Las zapatas están en buenas condiciones							si	si	si																										

Conveniones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección diaria, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

OPERADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones: Frente la amortiguación fijada.
Fecha 8-09-2023 ingreso a big reparada 13-09-2023
Se le realiza mantenimiento general Se le coloca la amortiguación
cambio del aceite, reparación de pulido.

PREOPERACIONAL EXTENSIÓN ELÉCTRICA

Mes/Año: 09-2023 Equipo No: 7 Marca/ Referencia: AM Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: _____

Proyecto: Estadio D'Ávila

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de encauchado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del macho	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de la hembra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Esta libre de quemaduras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Conexión a tierra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Clavija	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Esta libre de Empalmes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Esta indicado el nivel de tensión que maneja	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Convenciones: C: Cumple, NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:					
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

OPERADO POR:					
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



PREOPERACIONAL EXTENSIÓN ELECTRICA

Mes/Año: 10-2023 Equipo No: 4 Marca/ Referencia: N/A Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: _____

Proyecto: estudio Debeuba

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de encauchado		✓	✓	✓	✓	✓																									
Estado del macho		✓	✓	✓	✓	✓																									
Estado de la hembra		✓	✓	✓	✓	✓																									
Esta libre de quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓																									
Conexión a tierra		✓	✓	✓	✓	✓																									
Clavija		✓	✓	✓	✓	✓																									
Esta libre de Empalmes		✓	✓	✓	✓	✓																									
Esta indicado el nivel de tensión que maneja		✓	✓	✓	✓	✓																									

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

OPERADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



Tipo de documento: Formato

SST-FO 175

VERSION: 01

VIGENTE DESDE:
24/07/2023

PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

UBICACIÓN O ÁREA: *Estado Durban*

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

FECHA: *04-09-2023 al 11-09-2023*

GRUPO DE TRABAJO: *operativo*

ITEMS DE CALIFICACIÓN BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	CA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora				X			X				X			X			X			X		
2	Azadon				X			X				X			X			X			X		
3	Barra	✓				✓						✓			✓			✓			✓		
4	Cinzel	✓				✓						✓			✓			✓			✓		
5	Corta fno				X			X				X			X			X			X		
6	Cizalla				X			X				X			X			X			X		
7	Escobas, industriales, cepillos				X			X				X			X			X			X		
8	Fumigador manual	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
9	Juego de destornilladores				X			X				X			X			X			X		
10	Limas redondas				X			X				X			X			X			X		
11	Limas planas	✓			✓							X			X			X			X		
12	Llaves de copa				X			X				X			X			X			X		
13	Llaves bristol				X			X				X			X			X			X		
14	Llaves de tubo				X			X				X			X			X			X		
15	Llaves de vaso, (reochi).				X			X				X			X			X			X		
16	Llaves Expansivas				X			X				X			X			X			X		
17	Llaves fijas				X			X				X			X			X			X		
18	Marco de silicona				X			X				X			X			X			X		
19	Maseta	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
20	Martillo	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
21	Motosierra	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
22	Machete / forro	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
23	Martillo	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
24	Navaja	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
25	Pala				X			X				X			X			X			X		
26	Palin				X			X				X			X			X			X		
27	Periga				X			X				X			X			X			X		
28	Pinzas				X			X				X			X			X			X		
29	Pinzas redonda				X			X				X			X			X			X		
30	Pinzas planas				X			X				X			X			X			X		
31	Picas	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
32	Ponchadora				X			X				X			X			X			X		
33	Prensadora				X			X				X			X			X			X		
34	Rastrillo				X			X				X			X			X			X		
35	Ramachadora				X			X				X			X			X			X		
36	Segueta	✓			✓						✓			✓			✓			✓			
37	Sunchadora				X			X				X			X			X			X		
38	Templadora				X			X				X			X			X			X		
39	Tijeras para lamina				X			X				X			X			X			X		
40	Tijeras para poda				X			X				X			X			X			X		
41	Volcador móvil para residuos				X			X				X			X			X			X		
42	Volímetro				X			X				X			X			X			X		

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

* Punto crítico que inhabilita la herramienta para operar:

OBSERVACION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:

FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Profesional universitario SST y Técnico SST.



Tipo de documento: Formato

SST-FO 175

VERSION: 01

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

VIGENTE DESDE:
24/07/2023

PAGINA: 1 DE 1

UBICACIÓN O AREA: *Estadio Delzalba*

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
Gerardo AG

FECHA: *11-04-2023*

GRUPO DE TRABAJO: *Operativo*

ITEMS DE CALIFICACIÓN BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	CA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora				X			X		X		X		X			
2	Azadon				X			X		X		X		X			
3	Barra		✓			✓			✓		✓						
4	Cinzel		✓			✓			✓		✓						
5	Corta frio				X			X		X		X		X			
6	Cizalla				X			X		X		X		X			
7	Escobas, industriales, cepillos				X			X		X		X		X			
8	Fumigador manual		✓		✓			✓		✓		✓		✓			
9	Juego de destornilladores				X			X		X		X		X			
10	Limas redondas				X			X		X		X		X			
11	Limas planas		✓			✓			✓		✓						
12	Llaves de copa				X			X		X		X		X			
13	Llaves bristol				X			X		X		X		X			
14	Llaves de tubo				X			X		X		X		X			
15	Llaves de vaso, (reochi).				X			X		X		X		X			
16	Llaves Expansivas				X			X		X		X		X			
17	Llaves fijas				X			X		X		X		X			
18	Marco de silicona		✓			✓			✓		✓			✓			
19	Maseta		✓			✓			✓		✓			✓			
20	Martillo		✓			✓			✓		✓			✓			
21	Motosierra		✓			✓			✓		✓			✓			
22	Machete / forro		✓			✓			✓		✓			✓			
23	Martillo		✓			✓			✓		✓			✓			
24	Navaja		✓			✓			✓		✓			✓			
25	Pala				X			X		X		X		X			
26	Palin				X			X		X		X		X			
27	Pertiga				X			X		X		X		X			
28	Pinzas				X			X		X		X		X			
29	Pinzas redonda				X			X		X		X		X			
30	Pinzas planas				X			X		X		X		X			
31	Picas		✓			✓			✓		✓			✓			
32	Ponchadora				X			X		X		X		X			
33	Prensadora				X			X		X		X		X			
34	Rastrillo				X			X		X		X		X			
35	Remachadora				X			X		X		X		X			
36	Segueta		✓			✓			✓		✓			✓			
37	Sunchadora				X			X		X		X		X			
38	Templadora				X			X		X		X		X			
39	Tijeras para lamina				X			X		X		X		X			
40	Tijeras para poda				X			X		X		X		X			
41	Volcador móvil para residuos				X			X		X		X		X			
42	Vollmetro				X			X		X		X		X			

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

* Punto critico que inhabilita la herramienta para operar:

OBSERVACIÓN

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN.

FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Profesional universitario SST y Técnico SST.



Tipo de documento: Formato

SST-FO 175

VERSION: 01

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

VIGENTE DESDE:
24/07/2023

PAGINA; 1 DE 1

UBICACIÓN O AREA: *Estadio Debalán*

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

FECHA: *18-09-2023*GRUPO DE TRABAJO: *operativo*

ITEMS DE CALIFICACIÓN BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	CA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora				X			X			X			X			X			X			
2	Azadon				X			X			X			X			X			X			
3	Barra	✓																					
4	Cinzel	✓																					
5	Corta frio				X			X			X			X			X			X			
6	Cizalla				X			X			X			X			X			X			
7	Escobas, industriales, cepillos				X			X			X			X			X			X			
8	Fumigador manual	✓																					
9	Juego de destornilladores				X			X			X			X			X			X			
10	Limas redondas				X			X			X			X			X			X			
11	Limas planas	✓																					
12	Llaves de copa				X			X			X			X			X			X			
13	Llaves bristol				X			X			X			X			X			X			
14	Llaves de tubo				X			X			X			X			X			X			
15	Llaves de vaso, (reach).				X			X			X			X			X			X			
16	Llaves Expansivas				X			X			X			X			X			X			
17	Llaves fijas				X			X			X			X			X			X			
18	Marco de silicona	✓																					
19	Meseta	✓																					
20	Martillo	✓																					
21	Motosierra	✓																					
22	Machete / forro	✓																					
23	Martillo	✓																					
24	Navaja	✓																					
25	Pala				X			X			X			X			X			X			
26	Paln				X			X			X			X			X			X			
27	Perliga				X			X			X			X			X			X			
28	Pinzas				X			X			X			X			X			X			
29	Pinzas redonda				X			X			X			X			X			X			
30	Pinzas planas				X			X			X			X			X			X			
31	Picas	✓																					
32	Ponchadora				X			X			X			X			X			X			
33	Prensadora				X			X			X			X			X			X			
34	Rastrillo				X			X			X			X			X			X			
35	Remachadora				X			X			X			X			X			X			
36	Segueta	✓																					
37	Sunchadora				X			X			X			X			X			X			
38	Templadora				X			X			X			X			X			X			
39	Tijeras para lamina				X			X			X			X			X			X			
40	Tijeras para poda				X			X			X			X			X			X			
41	Volcador móvil para residuos				X			X			X			X			X			X			
42	Voltimetro																						

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

* Punto crítico que inhabilita la herramienta para operar:

OBSERVACIÓN

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:

FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Profesional universitario SST y Técnico SST.



Tipo de documento: Formato

SST-FO 175

VERSION: 01

VIGENTE DESDE:

24/07/2023

PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

UBICACIÓN O AREA: *Estadio Delzubi*

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

FECHA: *25-09-2023 al-01-10-2023*

GRUPO DE TRABAJO: *operativo*

ITEMS DE CALIFICACIÓN BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	CA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Altoparlante				X			X			X			X			X			X			X
2	Azadón				X			X			X			X			X			X			X
3	Barra				X			X			X			X			X			X			X
4	Cinzel				X			X			X			X			X			X			X
5	Corta frío				X			X			X			X			X			X			X
6	Cizalla				X			X			X			X			X			X			X
7	Escobas, industriales, cepillos				X			X			X			X			X			X			X
8	Fumigador manual				X			X			X			X			X			X			X
9	Juego de destornilladores				X			X			X			X			X			X			X
10	Limas redondas				X			X			X			X			X			X			X
11	Limas planas				X			X			X			X			X			X			X
12	Llaves de copa				X			X			X			X			X			X			X
13	Llaves bristol				X			X			X			X			X			X			X
14	Llaves de tubo				X			X			X			X			X			X			X
15	Llaves de vaso, (reach).				X			X			X			X			X			X			X
16	Llaves Espanslvas				X			X			X			X			X			X			X
17	Llaves fijas				X			X			X			X			X			X			X
18	Marco de silicona				X			X			X			X			X			X			X
19	Maseta				X			X			X			X			X			X			X
20	Martillo				X			X			X			X			X			X			X
21	Motosierra				X			X			X			X			X			X			X
22	Machete / forro				X			X			X			X			X			X			X
23	Martillo				X			X			X			X			X			X			X
24	Navaja				X			X			X			X			X			X			X
25	Pala				X			X			X			X			X			X			X
26	Palin				X			X			X			X			X			X			X
27	Pertiga				X			X			X			X			X			X			X
28	Pinzas				X			X			X			X			X			X			X
29	Pinzas redonda				X			X			X			X			X			X			X
30	Pinzas planas				X			X			X			X			X			X			X
31	Plicas				X			X			X			X			X			X			X
32	Ponchadora				X			X			X			X			X			X			X
33	Prensadora				X			X			X			X			X			X			X
34	Rastrillo				X			X			X			X			X			X			X
35	Remachadora				X			X			X			X			X			X			X
36	Sequeta				X			X			X			X			X			X			X
37	Sunchadora				X			X			X			X			X			X			X
38	Templadora				X			X			X			X			X			X			X
39	Tijeras para lamina				X			X			X			X			X			X			X
40	Tijeras para poda				X			X			X			X			X			X			X
41	Volcador móvil para residuos				X			X			X			X			X			X			X
42	Volímetro				X			X			X			X			X			X			X

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

* Punto crítico que inhabilita la herramienta para operar:

OBSERVACION

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN.

FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos: COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Profesional universitario SST y Técnico SST.



Tipo de documento: Formato

SST-FO 175

VERSION: 01

VIGENTE DESDE:
24/07/2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

PAGINA: 1 DE 1

UBICACIÓN O AREA: *Estadio Ruben*

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

FECHA: *02-10-2023.*

GRUPO DE TRABAJO: *Operativo*

ITEMS DE CALIFICACIÓN BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	CA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoradora				X			X			X			X			X						
2	Azadon				X			X			X			X			X						
3	Barra		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Cinzel		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Corta frio		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Cizalla				X			X			X			X			X						
7	Escobas, industriales, cepillos				X			X			X			X			X						
8	Fumigador manual				X			X			X			X			X						
9	Juego de destornilladores		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Limas redondas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	Limas planas		✓		X			X			X			X			X						
12	Llaves de copa		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13	Llaves Bristol		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14	Llaves de tubo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15	Llaves de vaso, (reach).				X			X			X			X			X						
16	Llaves Expansivas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17	Llaves fijas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	Mercio de silicona				X			X			X			X			X						
19	Maseta		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	Martillo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	Motosierra		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	Machete / forro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	Martillo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	Navaja		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	Pala		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26	Palin				X			X			X			X			X						
27	Pariga				X			X			X			X			X						
28	Pinzas				X			X			X			X			X						
29	Pinzas redonda				X			X			X			X			X						
30	Pinzas planas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31	Picas				X			X			X			X			X						
32	Ponchadora				X			X			X			X			X						
33	Prensadora				X			X			X			X			X						
34	Rastrillo				X			X			X			X			X						
35	Remachadora		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
36	Segueta				X			X			X			X			X						
37	Sunchadora		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
38	Templadora				X			X			X			X			X						
39	Tijeras para lamina				X			X			X			X			X						
40	Tijeras para poda				X			X			X			X			X						
41	Volcador móvil para residuos				X			X			X			X			X						
42	Volmetro																						

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

* Punto critico que inhabilita la herramienta para operar:

OBSERVACIÓN

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN.

FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos: COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Profesional universitario SST y Técnico SST.



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO FT-SST-057

FECHA 5/03/2023

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

VERSIÓN 1

Fecha de inspección: 07-09-2023 Hora: 7:15 am Área / Unidad operativa: Educadio Localidad: Pabuya
Inspección realizada por: [Firma] Nombre responsable unidad: Leonardo Soria
Dirección: Estadio Pabuya Teléfono: 3104442557


LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1 PELIGROS FISICOS					
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	/			
1.2	Las herramientas están en buen estado.	/	X		
1.3	Hay buena ventilación en el área.	/			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	/			
1.5	Existe controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	/			
1.6	La temperatura es confortable.	/			
2 PELIGROS LOCATIVOS					
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	/			
2.2	Escaleras en buen estado (buenas manos, antideslizantes).	/			
2.3	Pisos en buen estado.	/			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (marcos, chapas).	/			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	/	X		
2.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito, etc).	/			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	/			
2.8	En general se abastecen las sillas en buen estado?	/			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	/			
3 PELIGROS ELÉCTRICOS					
3.1	Cables eléctricos debidamente embudados.	/			
3.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	/	X		
3.3	Fusibles e interruptores en buen estado.	/	X		
3.4	Se observa cajas o bornes cortados sin sobrecarga.	/			
3.5	Cables en buen estado.	/			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos están identificados.	/		X	
3.7	Los tableros y cajas están libres de obstáculos.	/		X	
3.8	Existe señalización de peligros.	/			
4 PELIGROS DE SEGURIDAD					
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	/			
4.2	Extintores de carga vigente.	/			
4.3	Extintores libre de obstáculos.	/			
4.4	Existe señalización de extintores.	/			
4.5	Existe señalización en todos los instalaciones y en las salidas de emergencia.	/			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas.	/			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	/			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesario).	/			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	/			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?	/	X		
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	/			
5 PELIGROS BIOLÓGICOS					
5.1	El área está libre de insectos y roedores.	/	X		
6 PELIGROS BIOMECANICO					
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	/			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	/	X		
6.3	Silla en buenas condiciones, espalda, asiento, patas o base	/			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permitidos	/			
7 ORDEN Y ASEO					
7.1	El área se encuentra organizada.	/			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	/			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	/			
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	/			
8 SANEAMIENTO BASICO					
8.1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	/			
8.2	Luminarias de baños en buen estado.	/			
8.3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	/	X		
8.4	Están los inodoros limpios en buen estado.	/			

8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.		X	
9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)			
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓		
9,2	Archivo rodante en buen estado		X	
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)			
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes du trabajo y Enfermedad Laboral.			
10,4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.			

11	MEDIO AMBIENTE	BIBLIOTECAS	MEDIO ESTUDIO	SAL ESTUDIO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Filmo microondas. (Si aplica)		X		
	Hervero. (Si aplica)		X		
	Cafetera. (Si aplica)		X		
	Aire Acondicionado. (Si aplica)		X		
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)		X		
	Computador. (Si aplica)		X		
11.2 Sustancias químicas	Otro.		X		
	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.		X		
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.		X		
	Otro.		X		

OBSERVACIONES



 Firma responsable inspección



 Firma Responsable del SG-SST

FREOPERACIONAL TALADRO PERCUTOR

243085-B3

Marca Referencia: NEWALL

Equipo Nuevo:

Alquilado:

Otro: _____

Modelo: 09-2023

Equipo No: 7

Proyecto: Estadio Debuta

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
La conexión del equipo en buenas condiciones y sin rameras																						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Los orificios de ventilación se encuentran limpios y sin tapas																						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones y sin corte																						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El enchufe se encuentra en buen estado protege el contacto directo y no se ha deteriorado al polo o tierra (si lo tiene)																						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El switch de encendido y selector de posición en buenas condiciones y funcionando correctamente																						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El motor se encuentra en buen estado y no ha sido alterado para cambiar piezas o accesorios de diámetro diferente al permitido																						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección diaria, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

OPERADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



PREOPERACIONAL TRONZADORA

Mes/Año: 04-2023 Equipo No: 7 Marca/Referencia: Metabo Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: prestado
Proyecto: Estudio Caliente CS 23355

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Carcaza se encuentre en buenas condiciones.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Disco presenta fisuras o desgaste.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cuenta con tuerca de fijación del disco y está en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cuenta con guarda de seguridad.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Posee manija de sujeción.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
El interruptor de encendido y apago está en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
El cordón conductor de energía está en buenas condiciones.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
El obturador de avance continuo está en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

OPERADO POR:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Emilio Dantes	Emilio Dantes	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

Observaciones Derivadas de las inspecciones:

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL CONCRETAADORA

CÓDIGO: FT-057-047
FECHA: 07/03/2023
VERSIÓN: 1

Modelo Referencial: Powker Equipo Nuevo: Apilado: Otro: _____

Revisión: 04-2023 Equipo No: 7 Marca Referencial: Powker Modelo: XII-PCM 210

Proyecto: Estadio Durban

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
La concretadora está ubicada en una superficie plana y nivelada para evitar volcamiento.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
El equipo cuenta con la guarda de seguridad en el motor y el sistema de transmisión de fuerza.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
El freno se encuentra en buenas condiciones.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Las ruedas y soportes fijos del equipo están en buen estado.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
La tolva y los espal presentan desgastes o deterioro?		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
El equipo cuenta con un interruptor de encendido y apagado. Instalaciones eléctricas con el aislamiento en buen estado y polo o fase.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
La concretadora se limpia periódicamente?		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Se realiza mantenimiento de la máquina solamente cuando esta se encuentra apagada.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hay coordinación con el personal que maneja los cables cuando entran y salen del área de la tolva.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Se realiza un adecuado almacenamiento de los escombros o basura.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Convenios: C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y es usado en las instalaciones de México, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:		OPERADO POR:	
1	2	13	14
3	4	15	16
5	6	17	18
7	8	19	20
9	10	21	22
11	12	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



Modelo: 10-2023 Equipo No: 7 Marca/Referencia: BAKER Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: _____

Proyecto: Estadio Oshunbe Malelo x H PCM Z10

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La concretadora esta ubicada en una superficie plana y nivelada para evitar volcamiento.	/	/	/																												
El equipo cuenta con la guarda de seguridad en el motor y el sistema de frenación de fuera.	/	/	/																												
El letrón se encuentra en buenas condiciones.	/	/	/																												
Las ruedas y soportes fijos del equipo están en buen estado.	/	/	/																												
La lava y los asos presenta desgastes o deterioro?	/	/	/																												
El equipo cuenta con un interruptor de encendido y escape. Instalaciones eléctricas con el aislamiento en buen estado y polo a tierra.	/	/	/																												
La concretadora se limpia periódicamente?	/	/	/																												
Se realiza mantenimiento de la maquina solamente cuando esta se encuentra apagada.	/	/	/																												
Hay coordinación con el personal que maneja los coches cuando entran y salen del área de la lava. Se realiza un adecuado almacenamiento de las escombras o bloques.	/	/	/																												

Convenientes: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección previa, debe reparar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

OPERADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



PREOPERACIONAL PULDORA

Me/Año: 04-2023 Equipo No: 7 Marca/Referencia: DENALI Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: _____

Proyecto: Estación de Bombeo (Adecuación y remodelación)

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Carcasa se encuentra en buenas condiciones.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disco presenta fisuras o desgaste				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con fuerza de fijación del disco y esta en buen estado.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con guarda de seguridad.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posee manija de sujeción.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El interruptor de encendido y apagado esta en buen estado.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El cordón conductor de energía esta en buenas condiciones.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El obturador de avance continuo esta en buen estado.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

OPERADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO FT-SST-083

FECHA 07/03/2023

PREOPERACIONAL PULIDORA

VERSIÓN 1

Mes/Año: 10-2023 Equipo No: 1 Marca/ Referencia: DEWALT Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: _____

Proyecto: Estudio Oabuh - Adeuación + remodelación

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Carcasa se encuentra en buenas condiciones.		/	/	/	/	/																									
Disco presenta fisuras o desgaste.		/	/	/	/	/																									
Cuenta con tuerca de fijación del disco y esta en buen estado.		/	/	/	/	/																									
Cuenta con guarda de seguridad.		/	/	/	/	/																									
Posee manija de sujeción.		/	/	/	/	/																									
El interruptor de encendido y apagado esta en buen estado.		/	/	/	/	/																									
El cordón conductor de energía esta en buenas condiciones.		/	/	/	/	/																									
El obturador de avance continuo esta en buen estado.		/	/	/	/	/																									

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

OPERADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

CÓDIGO: FT-35T-486
FECHA: 07/03/2023
VERSIÓN: 1

Marca Referencia: SHILCMSIA **Equipo Nuevo:** **Alquilado:** **Otro:** _____

Modelo: 09-2023 **Equipo No.:** 7

Proyecto: Estudio de Preevaluación

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (cableado, cables, bornes)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de instalación del disco (Fig)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cuerda con accesorio adecuado (empuje, en rebabas, quita) para las accesorios	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del mango (sin fuerza, grasa, Fig)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del interruptor de emergencia (funciona adecuadamente)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de la guarda externa e interna (sin fuerza, grasa)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del disco (borde, fuerza, espacio)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de la perfil de ajuste de profundidad de corte	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del tornillo de ajuste indicador	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del cuadrante Ángulo de corte	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del indicador de corte y espacio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de la fuerza de ajuste del disco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo se alquilado y no pasa la inspección planificada, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

OPERADO POR:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

[Handwritten signature]



PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

Med/Año: 10-2023 Equipo No: 01 Marca/Referencia: STIHCMS180 Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			/	/	/	/																									
Estado de instalación del disco (F/c)			/	/	/	/																									
Cuerpo con accesorios adecuados (Anillos, sin rebabas, ajuste) para los accesorios			/	/	/	/																									
Estado del mango (sin fisuras, grietas, etc)			/	/	/	/																									
Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)			/	/	/	/																									
Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)			/	/	/	/																									
Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra			/	/	/	/																									
Estado del disco (doble, fuerza, dirección)			/	/	/	/																									
Estado de la perla de ajuste de profundidad de corte			/	/	/	/																									
Estado del tornillo de ajuste indicador			/	/	/	/																									
Estado del cuadrante ángulo de base			/	/	/	/																									
Estado del indicador de corte y zapata			/	/	/	/																									
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)			/	/	/	/																									
Estado de la fuerza de apriete del disco			/	/	/	/																									

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

OPERADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



PREOPERACIONAL DE VIBRADOR PARA CONCRETO

Mes/Año: 04-2023 Equipo No: 1 Marca/Referencia: Bosch 415315-02 Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: _____

Proyecto: Estadio Durbeta (Ant)

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
El Cable de alimentación está en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
El cabezote se encuentra en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
El motor se encuentra en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
La resta o correas se encuentran en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Las uniones de cada parte del equipo están en buen estado.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Otros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
 NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

OPERADO POR:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

PREOPERACIONAL DE VIBRADOR PARA CONCRETO

FECHA 07/03/2023
 VERSIÓN 1

Mes/Año: 10-2023 Equipo No: 07 Marca/Referencia: Universal Motor Equipo Nuevo: Alquilado: Otro: _____

Proyecto: DC 115

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓																														
El Cable de alimentación está en buen estado.	✓																														
La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.	✓																														
El cabezote se encuentra en buen estado.	✓																														
El motor se encuentra en buen estado.	✓																														
La reala o correas se encuentran en buen estado.	✓																														
Las uniones de cada parte del equipo están en buen estado.	✓																														
Otros	✓																														

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
 NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

OPERADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 7

Permisos para tareas de alto riesgo

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST1-24


FECHA 13/03/2023

LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXA AL PERMISO

FECHA 11-09-2023 al 17-09-2023 TRABAJO EN CALIENTE.

VERSIÓN 1

El área de trabajo está delimitada para impedir el paso de personal ajeno a la operación.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
El área de trabajo está libre de materiales combustibles e inflamables	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
El disco de corte es el apropiado para el material a cortar.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
El lugar cuenta con iluminación adecuada para realizar la labor.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
La máquina será utilizada lejos de atmósferas explosivas.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Se ha verificado que la tensión y frecuencia coinciden con las indicadas en su placa de características.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
El cable de suministro de energía cuenta con la clavija (se garantiza que no se realizarán conexiones del cable sin clavija al toma).	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Se cuenta con interruptor diferencial para la operación de la	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
La máquina está libre de daños estructurales evidentes.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Comprobar que el interruptor de accionamiento funciona	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Verificar que el protector del disco está en buen estado y que se encuentra correctamente fijado.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Verificar que los discos de corte o pulido están limpios y en perfecto estado.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en buen estado. Verificar que la longitud del cable eléctrico sea suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables. Mantener la empuñadura limpia y seca.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y en buen estado (por ejemplo, indicación del sentido de giro, etc.).	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Verificar visualmente el buen estado del disco.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
El disco de corte es acorde a las indicaciones del fabricante.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Verificar que el disco gira en el sentido correcto y que no hace movimientos extraños.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Trabajar sobre una superficie estable, limpia, nivelada y lo más	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Se garantiza que la operación de la máquina siempre será por debajo del nivel de los codos del operario.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Firmas:							

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CODIGO	FT-SST1-24												
	LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXA AL PERMISO							FECHA	13/03/2023												
								VERSIÓN	1												
Se cuenta con válvulas antirretroceso (arresta llamas) en ambos cilindros	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO														
Las mangueras se encuentran ubicadas en posición vertical sobre los carros o soportes	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO														
Se cuenta con extintores ubicados a 2 metros del puesto de trabajo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO														
Se cuenta con mampara de protección	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI														
Las botellas se encuentran ubicadas a una distancia entre 5 y 10 metros del lugar de trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI														
Los manómetros de ambos cilindros se encuentran funcionando y están en buen estado		NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Las válvulas de las botellas cuentan con la guarda de seguridad (caperuzas)		NA	NA	NA	NA	NA	NA														
La protección ocular es adecuada y está en buenas condiciones, con certificación para proyección de partículas y contra radiación	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI														
Se cuenta con delantal de camaza, guantes de camaza y polainas, o en su ausencia con protección corporal contra calor y chispas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO														
Se cuenta con protección respiratoria contra humos y gases	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO														
La ropa de trabajo está libre de líquidos inflamables o alguna sustancia que presente riesgo de incendio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI														
Firmas: <i>Edison Vargas Pino (NO)</i>																					
TRABAJO CON SOLDADURA																					
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Los cables eléctricos se encuentran en buenas condiciones: aislados, sin empalmes, sin obstruir el paso.	SI			SI			SI			SI			SI			SI					
El equipo cuenta con porta electrodo de mango aislado y la masa en buenas condiciones.	SI			SI			SI			SI			SI			SI					
Los electrodos están libres de oxidación.	SI			SI			SI			SI			SI			SI					
El equipo de soldadura cuenta con un sistema de puesta a tierra.	SI			SI			SI			SI			SI			SI					
El área de trabajo está libre de derrames de aceite, combustibles, zonas húmedas.	SI			SI			SI			SI			SI			SI					
La actividad se ejecuta lejos de zonas de almacenamiento de sustancias combustibles o inflamables	SI			SI			SI			SI			SI			SI					
La conexión o suministro eléctrico se realiza con manguera antihumedad	SI			SI			SI			SI			SI			SI					
Se cuenta con pantalla de protección facial contra radiaciones y proyección de partículas	SI			SI			SI			SI			SI			SI					



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CODIGO FT-SST1-24

FECHA 13/03/2023

LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXA AL PERMISO

VERSIÓN 1


ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo					
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA			
	Se tiene extintor en el área de trabajo y este cumple con las condiciones de seguridad para operar.	SI			SI			SI			SI			SI			SI							
Se han definido los elementos de protección personal adecuados para la ejecución de la labor y se encuentran en buen estado.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Se cuenta con recipientes para depositar sobrantes.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
El área de trabajo se encuentra aislada de los demás empleados con muros o mamparas.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Se han instalado avisos de restricción del paso al lugar en el que se ejecute la labor.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Se garantiza que los materiales combustibles, inflamables o explosivos no tendrán contacto con chispas o elementos calientes	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Las personas que ejecutarán la labor han recibido las instrucciones y normas de seguridad para la actividad a desarrollar.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
El personal que ejecutará la actividad conoce el procedimiento de actuación en caso de emergencia.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
La superficie de trabajo se encuentra ordenada, aseada, seca y libre material combustible.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Cuando aplique, se han diligenciado otros permisos.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Firmas: <i>Edison Vargas pino</i>																								
TRABAJOS CON SOLDADURA AUTOGENA																								
El área en la que se ejecutará la labor es ventilada, en caso contrario se cuenta con extractor de humos.																								
El accionamiento del reductor de oxígeno debiera situarse siempre en posición vertical																								
Ningunas de las botellas debiera presentar signos de golpes																								
Se cuenta con todos los permisos de trabajo aplicables a la labor.																								
Las botellas se encuentran alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las fuentes de calor y protegidas del sol.																								
Las mangueras se encuentran en buenas condiciones de uso y sólidamente conectadas a las tuercas de empalme.																								
Las mangueras están libres de fugas, especialmente las juntas, válvulas y boquillas.																								
Se cuenta con encendedor de chispa para encender el soplete																								

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										CODIGO	FT-SST1-24			
	LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXA AL PERMISO										FECHA	13/03/2023			
											VERSIÓN	1			
El área en la que se ejecutará la labor es ventilada, en caso contrario se cuenta con extractor de humos	Si			Si			Si			Si					
El sitio en el que se ejecutará la actividad se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo	Si			Si			Si			Si					
Las personas que desarrollarán la actividad conocen los procedimientos seguros de trabajo	Si			Si			Si			Si					
Los empleados que desarrollarán la actividad cuentan con todos los elementos de protección personal descritos en el permiso.	Si			Si			Si			Si					
Firmas: <i>Edson Murga Pino</i>															
PULIDORA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
El disco de corte se encuentra en buen estado, libre de ruptura, desgaste, es el apropiado acorde al tipo de material y tamaño de la pulidora.	Si			Si			Si			Si			Si		
La tuerca que ajusta el disco se encuentra en buenas condiciones y cumple su función.	Si			Si			Si			Si			Si		
Cuenta con mango de sujeción y guarda para el disco.	Si			Si			Si			Si			Si		
El suiche de encendido y apagado funciona correctamente.	Si			Si			Si			Si			Si		
Firmas: <i>Edson Murga Pino</i>															
ESMERIL	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se encuentran los discos ajustados y el eje en buen estado (libre de torceduras o desgaste).															
El esmeril cuenta con guarda de seguridad, el apoya piezas y los visores.															
La mesa de trabajo esta nivelada y garantiza la estabilidad del conjunto.															
El cable de conducción de electricidad se encuentra en buenas condiciones y cuenta con clavija.															
El sitio de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.															
Sin presencia de materiales combustibles e inflamables cercanos.															
Firmas:															
HERRAMIENTA RADIAL	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
El personal que utiliza la herramienta conoce el procedimiento seguro de trabajo conforme a las disposiciones del fabricante.															
El área en la que se realizará la operación de la máquina está en buenas condiciones de orden y aseo.															
La máquina cuenta con guarda de seguridad.															

TA: Confirmo que la zona ha sido revisada y que se han tomado todas las medidas de seguridad y autorizo la ejecución de la labor. Durante la ejecución del trabajo se quebrantan las condiciones de seguridad, el permiso perderá toda validez y los ejecutores de la labor deberán pedir uno nuevo. Será responsabilidad del trabajador notificar al empleador o a su representante cualquier circunstancia que desmejore las condiciones

	NOMBRE DEL PERSONAL AUTORIZADO	Cédula	FIRMA						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	Edison Marcos Pin	1039284121	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison	
2	Sebastián Pérez	1000536587	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	
3	Francisco Jiménez	71085022	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco	
4	Francis Camilo Urrego	1039284276	Francis	Francis					
5	Francisco Jiménez	71085022	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco			
6									
7									
NOMBRE DEL EMISOR			FIRMA						
		Cédula	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Diego	43.416.906	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego

OBSERVACIONES

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CODIGO	FT-SST1-24
	LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXA AL PERMISO							FECHA	13/03/2023
	18-09-2023. al 24-09-2023							Trabajo en caliente	VERSIÓN
El área de trabajo está delimitada para impedir el paso de personal ajeno a la operación.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
El área de trabajo está libre de materiales combustibles e inflamables	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
El disco de corte es el apropiado para el material a cortar.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
El lugar cuenta con iluminación adecuada para realizar la labor.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
La máquina será utilizada lejos de atmósferas explosivas.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Se ha verificado que la tensión y frecuencia coinciden con las indicadas en su placa de características.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
El cable de suministro de energía cuenta con la clavija (se garantiza que no se realizarán conexiones del cable sin clavija al toma).	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Se cuenta con interruptor diferencial para la operación de la máquina	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
La máquina está libre de daños estructurales evidentes.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Comprobar que el interruptor de accionamiento funciona	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Verificar que el protector del disco está en buen estado y que se encuentra correctamente fijado.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Verificar que los discos de corte o pulido están limpios y en perfecto estado.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en buen estado. Verificar que la longitud del cable eléctrico sea suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables. Mantener la empuñadura limpia y seca.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y en buen estado (por ejemplo, indicación del sentido de giro, etc.).	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Verificar visualmente el buen estado del disco.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
El disco de corte es acorde a las indicaciones del fabricante.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Verificar que el disco gira en el sentido correcto y que no hace movimientos extraños.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Trabajar sobre una superficie estable, limpia, nivelada y lo más	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Se garantiza que la operación de la máquina siempre será por debajo del nivel de los codos del operario.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Firmas:									



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST1-24

LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXA AL PERMISO

FECHA 13/03/2023

VERSIÓN 1

Se cuenta con válvulas antirretroceso (arresta llamas) en ambos cilindros	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO										
Las mangueras se encuentran ubicadas en posición vertical sobre los carros o soportes	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO										
Se cuenta con extintores ubicados a 2 metros del puesto de trabajo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO										
Se cuenta con mampara de protección	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI										
Las botellas se encuentran ubicadas a una distancia entre 5 y 10 metros del lugar de trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI										
Los manómetros de ambos cilindros se encuentran funcionando y están en buen estado	SI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
Las válvulas de las botellas cuentan con la guarda de seguridad (caperuzas)	SI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
La protección ocular es adecuada y está en buenas condiciones, con certificación para proyección de partículas y contra radiación	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI										
Se cuenta con delantal de camaza, guantes de camaza y polainas, o en su ausencia con protección corporal contra calor y chispas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO										
Se cuenta con protección respiratoria contra humos y gases	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO										
La ropa de trabajo está libre de líquidos inflamables o alguna sustancia que presente riesgo de incendio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI										
Firmas:																		
TRABAJO CON SOLDADURA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo					
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Los cables eléctricos se encuentran en buenas condiciones: aislados, sin empalmes, sin obstruir el paso.	SI			SI			SI			SI			SI			SI		
El equipo cuenta con porta electrodo de mango aislado y la masa en buenas condiciones.	SI			SI			SI			SI			SI			SI		
Los electrodos están libres de oxidación.	SI			SI			SI			SI			SI			SI		
El equipo de soldadura cuenta con un sistema de puesta a tierra.	SI			SI			SI			SI			SI			SI		
El área de trabajo está libre de derrames de aceite, combustibles, zonas húmedas.	SI			SI			SI			SI			SI			SI		
La actividad se ejecuta lejos de zonas de almacenamiento de sustancias combustibles o inflamables	SI			SI			SI			SI			SI			SI		
La conexión o suministro eléctrico se realiza con manguera antihumedad	SI			SI			SI			SI			SI			SI		
Se cuenta con pantalla de protección facial contra radiaciones y proyección de partículas	SI			SI			SI			SI			SI			SI		



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO FT-SST1-24

LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXA AL PERMISO


FECHA 13/03/2023

VERSIÓN 1

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo					
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA			
Se tiene extintor en el área de trabajo y este cumple con las condiciones de seguridad para operar.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Se han definido los elementos de protección personal adecuados para la ejecución de la labor y se encuentran en buen estado.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Se cuenta con recipientes para depositar sobrantes.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
El área de trabajo se encuentra aislada de los demás empleados con muros o mamparas.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Se han instalado avisos de restricción del paso al lugar en el que se ejecuta la labor.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Se garantiza que los materiales combustibles, inflamables o explosivos no tendrán contacto con chispas o elementos calientes	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Las personas que ejecutarán la labor han recibido las instrucciones y normas de seguridad para la actividad a desarrollar.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
El personal que ejecutará la actividad conoce el procedimiento de actuación en caso de emergencia.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
La superficie de trabajo se encuentra ordenada, aseada, seca y libre material combustible.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								
Cuando aplique, se han diligenciado otros permisos.	SI			SI			SI			SI			SI			SI								

Firmas: *Sebris A. Elson Vargas*

TRABAJOS CON SOLDADURA AUTOGENA	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo					
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA			
El área en la que se ejecutará la labor es ventilada, en caso contrario se cuenta con extractor de humos.																								
El accionamiento del reductor de oxígeno debiera situarse siempre en posición vertical																								
Ningunas de las botellas debiera presentar signos de golpes																								
Se cuenta con todos los permisos de trabajo aplicables a la labor.																								
Las botellas se encuentran alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las fuentes de calor y protegidas del sol.																								
Las mangueras se encuentran en buenas condiciones de uso y sólidamente conectadas a las tuercas de empalme.																								
Las mangueras están libres de fugas, especialmente las juntas, válvulas y boquillas.																								
Se cuenta con encendedor de chispa para encender el soplete																								

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CODIGO	FT-SST1-24									
	LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXA AL PERMISO							FECHA	13/03/2023									
								VERSIÓN	1									
El área en la que se ejecutará la labor es ventilada, en caso contrario se cuenta con extractor de humos																		
El sitio en el que se ejecutará la actividad se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo																		
Las personas que desarrollarán la actividad conocen los procedimientos seguros de trabajo																		
Los empleados que desarrollarán la actividad cuentan con todos los elementos de protección personal descritos en el permiso.																		
Firmas:																		
PULIDORA																		
El disco de corte se encuentra en buen estado, libre de ruptura, desgaste, es el apropiado acorde al tipo de material y tamaño de la pulidora.	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
La tuerca que ajusta el disco se encuentra en buenas condiciones y cumple su función.	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con mango de sujeción y guarda para el disco.	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
El suiche de encendido y apagado funciona correctamente.	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Firmas: <i>Sergio A. Echeverri Rojas y...</i>																		
ESMERIL																		
Se encuentran los discos ajustados y el eje en buen estado (libre de torceduras o desgaste).																		
El esmeril cuenta con guarda de seguridad, el apoya piezas y los visores.																		
La mesa de trabajo está nivelada y garantiza la estabilidad del conjunto.																		
El cable de conducción de electricidad se encuentra en buenas condiciones y cuenta con clavija.																		
El sitio de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.																		
Sin presencia de materiales combustibles e inflamables cercanos.																		
Firmas:																		
HERRAMIENTA RADIAL																		
El personal que utiliza la herramienta conoce el procedimiento seguro de trabajo conforme a las disposiciones del fabricante.																		
El área en la que se realizará la operación de la máquina está en buenas condiciones de orden y aseo.																		
La máquina cuenta con guarda de seguridad.																		

NOTA: Confirmando que la zona ha sido revisada y que se han tomado todas las medidas de seguridad y autorizo la ejecución de la labor. Si durante la ejecución del trabajo se quebrantan las condiciones de seguridad, el permiso perderá toda validez y los ejecutores de la labor deberán pedir uno nuevo. Será responsabilidad del trabajador notificar al empleador o a su representante cualquier circunstancia que desmejore las condiciones

NOMBRE DEL PERSONAL AUTORIZADO	Cédula	FIRMA						
		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1. Sebastián Aguirre	1000536582	Sebastián	Sebastián	Sebastián	Sebastián	Sebastián	Sebastián	Sebastián
2. Edison Vargués	1039289721	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison
3. Fermín Camilo Urego	1039289276	Camilo	Camilo	Camilo	Camilo	Camilo	Camilo	Camilo
4. [Signature]	43085022	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
5. [Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
6. [Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
7. [Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
NOMBRE DEL EMISOR	Cédula	FIRMA						
[Signature]	43.416.906	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
OBSERVACIONES								




INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 8

Plan de emergencias



	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-165
	ACTA DE CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001

Dableba 19 de 09 del 2023


ACTA DE CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA

Siendo las ~~19~~ Del día ~~19~~ del mes de ~~09~~ del 20~~23~~ se dio por finalizado el proceso de inscripción para la conformación de la Brigada de Emergencias y el Comité Operativo de Emergencias para la empresa.

De manera voluntaria se inscribieron los siguientes trabajadores;

No	Apellidos y Nombres	N° Identificación	Sección	Cargo
1	Sergio Muñoz	7000869317	Operativa	AUX
2	Socorro Córdova	1017344612	Operativa	Operativa
3	Yéiner Leonardo	1039289229	Operativa	Ayu
4	Juan Carlos	7039297153	Operativa	Ayu
5	Enzo Angulo	8415806	Operativa	Ayudante
6	Walter Ferrera	1001620428	Operativa	AUX
7	Yvan Ramirez	1040800702	Operativa	AUX
8	Wilson H	7226727200	Operativa	Ayu
9	WALTER FERRERA	8015833	Operativa	WALTER
10	Gerardo	8417299	Operativa	Gerardo
11	Duy David	1039286737	Operativa	AUX
12	Sebastien Ayala	1000536587	Operativa	Ayudante Sd.
13				
14				
15				


 COORDINADOR SST

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO	FT-SST-080
	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS		FECHA	7/03/2023
			VERSIÓN	1

Fecha de Sucesión de Ingreso	DD	MM	AAAA
------------------------------	----	----	------

1. Datos Laborales del Candidato a Brigadista

Apellidos y Nombres	Hector Quera Dora María
Área de Trabajo	Administrativo
Cargo desempeñado	SST
Antigüedad en la compañía (meses)	7 mes
Nombre del Jefe Inmediato	Leonardo Pardo Correa Paredon.
Teléfono oficina y extensión	312-2045460

2. Datos Personales del Brigadista

No. De Cédula	43416906	Edad	23	No. Celular	3122045460	GR. Sang y RH	B+
Estatura (mts)	1.54	Peso (kg)	60	Estado Civil	Casado		
Fecha de Nacimiento	DD 08 - MM 07 - AAAA 2020	Lugar de Nacimiento	Santa Fe - Pail				
Dirección de domicilio brigadista	Punto Juan H. Uribe			Teléfonos	3122045460		
En caso de emergencia avisar a	Luzeth Marcela C. Pardo			Parentesco	Hijo		
Teléfono fijo del accidente				Celular acut	3226564275		

3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro

Nombre del grupo o Brigada	Empresa	Cargo en el Grupo	Tiempo en meses
Dora María Quera	TOXEM Denta	AUX SST	21. Meses

4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados

Nombre del Curso	Tiempo de duración en horas	Institución
rescate y primeros auxilios	12 horas	Socor.

5. Acondicionamiento físico

Deporte Practicado	Intensidad semana (días)	Tiempo practica (horas)
cardio	5 días: Semanal	5 horas

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	FT-SST-080
	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS	FECHA	7/03/2023
		VERSIÓN	1

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	FT-SST-080
	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS	FECHA	7/03/2023
		VERSIÓN	1

6. Estado de Salud

¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es SI, especifique cuáles)

NO

Firma del Candidato a Brigadista

Espacio para uso exclusivo del jefe de la Brigada

8. Concepto del Jefe de la Brigada

¿Se acepta al candidato en la Brigada?

SI

No

Justificación del concepto:

Capacitaciones y Cursos

Fecha del Concepto DD 20 MM 09 AAAA 2023

GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA

OBSERVACIONES

Firma del Jefe de la Brigada



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO

FT-SST-080

HOJA DE VIDA BRIGADISTAS

FECHA

7/03/2023

VERSIÓN

1

Fecha de Solicitud de Ingreso

DD

MM

AAAA

1. Datos laborales del Candidato a Brigadista

Apellidos y Nombres

Marías Usuga, Don Jerardo Jaime

Área de Trabajo

Operativa

Cargo desempeñado

Asistente

Antigüedad en la compañía (meses)

7 años

Nombre del Jefe Inmediato

Leonardo Jacobo Correa Roldán

Teléfono oficina y extensión

312204 5960

2. Datos Personales del Brigadista

No. De Cédula

1.001.610.265

Edad

23

No. Celular

3235386519

GR. Sang y RH

O+

Estatura (mts)

1.66

Peso (Kg)

81

Estado Civil

soltero

Fecha de Nacimiento

DD

18

MM

01

AAAA

2000

Lugar de Nacimiento

Dubouche

Dirección de domicilio brigadista

Banco la Selva

Teléfonos

En caso de emergencia avisar a

Lina Marcela

Parentesco

Compañera

Teléfonos fijos del accidente

Celular acud

320794 6035

3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro

Nombre del grupo o Brigada

Empresa

Cargo en el Grupo

Tiempo en meses

4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados

Nombre del Curso

Tiempo de duración en horas

Institución

5. Acondicionamiento físico

Deporte Practicado

Intensidad semana (días)

Tiempo practica (horas)

AD

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	FT-SST-080
	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS	FECHA	7/03/2023
		VERSIÓN	1

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	FT-SST-080
	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS	FECHA	7/03/2023
		VERSIÓN	1

6. Estado de Salud

¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es SI, especifique cuáles)

NO

Denzler

Firma del Candidato a Brigadista

Espacio para uso exclusivo del jefe de la Brigada

8. Concepto del Jefe de la Brigada

¿Se acepta al candidato en la Brigada?

SI

No

Justificación del concepto:


Fecha del Concepto DD ____ MM ____ AAAA ____

GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA

OBSERVACIONES

[Handwritten Signature]

Firma del Jefe de la Brigada

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO	FT-SST-080
	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS		FECHA	7/03/2023
			VERSIÓN	1

Fecha de Solicitud de ingreso	DD	MM	AAAA
-------------------------------	----	----	------

1. Datos laborales del Candidato a Brigadista			
Apellidos y Nombres	MORA Samara Johan Andres		
Área de Trabajo	Operativo		
Cargo desempeñado	Cafu deate		
Antigüedad en la compañía (meses)	3 meses		
Nombre del jefe inmediato	Leonardo Paris Correa Roldan		
Teléfono oficina y extensión	3122045960		

ESPACIO PARA LA FOTO DEL BRIGADISTA

2. Datos Personales del Brigadista			
No. De Cédula	1.040.850.70	Edad	28
Estatura (mts)	1.65	Peso (Kg)	78
Fecha de Nacimiento	DD 30 MM 11 AAAA 1995	No. Celular	3006156016
Dirección de domicilio brigadista	Barrío Santurben	Estado Civil	unión libre
En caso de emergencia avisar a	Iveth Villa	Lugar de Nacimiento	Cajalupé
Teléfonos fijos del accidente		Teléfonos	3006156016
		Parentesco	compañero
		Celular acud	3145575560

3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro			
Nombre del grupo o Brigada	Empresa	Cargo en el Grupo	Tiempo en meses
Aux brigadista	Chec-2	suplente	12 meses

4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados		
Nombre del Curso	Tiempo de duración en horas	Institución

5. Acondicionamiento físico		
Deporte Practicado	Intensidad semana (días)	Tiempo practica (horas)
NO		

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	FT-SST-080
	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS	FECHA	7/03/2023
		VERSIÓN	1

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	FT-SST-080
	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS	FECHA	7/03/2023
		VERSIÓN	1

6. Estado de Salud

¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es Si, especifique cuáles) *NO*

Juan Andres Garcia

Firma del Candidato a Brigadista

Espacio para uso exclusivo del jefe de la Brigada

8. Concepto del Jefe de la Brigada

¿Se acepta al candidato en la Brigada?

Si

No

Justificación del concepto:


Fecha del Concepto DD ____ MM ____ AAAA ____

GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA

OBSERVACIONES

[Handwritten Signature]

Firma del Jefe de la Brigada

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-164
	CONVOCATORIA ELECCIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001

Debería ser 20 de febrero de 2023

**CONVOCATORIA
ELECCIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y EL COMITÉ OPERATIVO
DE EMERGENCIA**

El día *19* de *04* del 2023 a partir de las *7:00 am* hasta *5:00 pm* se llevará a cabo la inscripción voluntaria para elegir los Brigadistas de Emergencia.

Lo invitamos a acercarse al puesto de inscripción que se encontrará ubicado en la oficina de seguridad y salud en el trabajo

Perfil de los aspirantes

- Ser voluntarios
- Representar áreas y turnos.
- Tener permanencia dentro de la empresa
- Estar en adecuado estado físico y mental.
- Conocer la empresa y sus procesos
- Disciplina, responsabilidad y compromiso con la empresa.
- Personas dinámicas, serenas y fuertes
- Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes.
- Buena conducta como trabajador
- Buenas relaciones personales
- Disposición para trabajar en equipo
- Disposición y voluntad para trabajar en este tipo de actividad.
- Disposición para jornadas de formación y entrenamiento

Contamos con su activa participación.



REPRESENTANTE LEGAL



SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-SST-164

CONVOCATORIA
ELECCIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y EL COMITÉ
OPERATIVO DE EMERGENCIA

FECHA: 13-03-2023

VERSIÓN: 001

**REGISTRO DEL PERSONAL VOLUNTARIO PARA CONFORMAR LA
BRIGADA DE EMERGENCIA Y EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA**

No	Apellidos y Nombres	Nº Identificación	Sección	Cargo
1	Sestho Indio	1000864711	operativo	AUX
2	Gula Fdez Lora	1001630428	operativo	AUX
3	Gerard Gualto usuga	1017150111	operativo	Oficial
4	Javier Leonardo	1039209229	operativo	AUX
5	Juan Carlos	703727153	operativo	AUX
6	enry Angel m.c	8415806	operativo	ayudante
7	Juan Carmona	1040800700	operativo	Ayudante
8	Nilson A	7276727200	operativo	AUX
9	WALTER FELIPE	8075833	operativo	WALTER
10	Gerardo	8217299	operativo	Gerardo
11	Luis Alberto	107926377	operativo	AUX
12	Sebastián	1000536587	operativo	AUX soldador
13				
14				
15				

Elegidos: Don Manuel Mac Quira
Javier Leonardo como brigadista
Johan Carmona.

COORDINADOR SST



INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 9

Ausentismo por enfermedad común

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO
Nit: 890.984.670-6

INCAPACIDADES

Docto Nro: W16 11007

Fecha: Sep.20/2023

Código:

Versión:

Nombre: MUÑOZ TUBERQUIA SERGIO OLIVER

Edad: 23 Años

Sexo: MASCULINO

Telefono: 3148238463

Estrato: CONTRIBUTIVO-1

Historia: 1000869311

Id: CC 1.000.869.311

Entidad: NUEVA EPS IN CONTRIBUTIVO CAPI

Nro Aten: 78

T.Atencion: TRATAMIENTO/OBSERVACION URGENCIAS
(EVOLUCION)

Codigo Dx: P53X

Días de incapacidad: 3

Fecha Inicial: Sep.20/2023

Es una prorroga?: NO

Fecha Final: Sep.22/2023

Tipo de incapacidad: ** PRESENTA **

Observaciones: INCAPACIDAD POR TRES DIAS

Firma usuario: _____
Cedula: _____

Medico: DIAZ CAMARGO STEFFANY

Firma

Fecha Sistema: 20/09/2023
Hora: 18:18:55

Pagina: 1 de 1
Imprime: STFF

Cedula: 1.017.262.844
Registro:



INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 10

Hoja de vida de los equipos

Egresos de personal

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-154
	HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

con capacidad de 210 litros que permitira mezclar en grandes cantidades, se maneja rápido gracias a su tambor con velocidad de rotación de tambor de hasta 35 revoluciones por minuto. Cuenta además con gran resistencia y durabilidad debido a su construcción su carga máxima por mezcla hasta 180 Kg y su potencia máxima de 850 w hasta los 850 w pero 75 Kg color naranja, carga máxima por mezcla. 180 Kg / 396 lb. Velocidad (tambor) 350 RPM. - Velocidad de rotación (motor) 3.400 RPM. Clase eléctrica II

DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	concretadora Barker
Descripción:	gran resistencia y gran durabilidad
Ubicación del equipo:	Estadio Dusein
Marca:	Barker
Modelo:	KH-PCM210
Serie:	2021
Voltaje:	220 ~ 240 Voltios
Potencia:	850w / 1.14 Hp.
Fecha de puesta en funcionamiento:	21-08-2023
Información técnica adicional:	NA
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	China
Fecha de adquisición:	19-08-2023
Nombre de proveedor y Dirección:	NA
Datos de contacto E-mail, teléfono:	ventas@cemap.pe Tel. 959280118
Posee catálogo de manejo u operación:	NA
Mantenimiento indicado por el fabricante:	NA
Condiciones de operación:	Operabilidad buena condiciones Se cambio el dia 19 de agosto Nuevo

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristiancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		Fecha de modificación: 13 03 2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-154
	HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



compactador tipo conguero - es una máquina a diesel para compactación de superficies, bridas y espaldas conformadas, es una máquina de impacto vibratorio alimentado por un motor de combustión de gasolina por su peso propio aplica fuerza a la superficie del suelo en impactos consecutivos, nivelando y apisonando superficies con máquinas versátiles que ofrecen mucho trabajo y fácil mantenimiento

DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	Apisonadora
Descripción:	compactador tipo conguero para compactar superficies
Ubicación del equipo:	Estudio Debalzo (Ant)
Marca:	Honda 6x120
Modelo:	Honda 6x120
Serie:	2015
Voltaje:	211'92/102A..2012/46'0314-03(111) Euro2
Potencia:	N.A.
Fecha de puesta en funcionamiento:	FHNXS1191AA-
Información técnica adicional:	06-09-2023
	NA

DATOS DEL PROVEEDOR

Fabricante y Lugar de origen:	fabricado por Honda a ciudad orge Abasco
Fecha de adquisición:	05-09-2023
Nombre de proveedor y Dirección:	Leonardo Correa Roldán
Datos de contacto E-mail, teléfono:	ht://www.hondacenter.com.co
Posee catálogo de manejo u operación:	NO
Mantenimiento indicado por el fabricante:	NO
Condiciones de operación:	tiene deteriorado el resorte por parte de la lubricación (acutic) amortiguación flexible (esto es por el proceso de cambio)

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Crisnacho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		Fecha de modificación: 13 03 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DWE4315 - B3. - es económico y de tamaño compacto provee mayor comodidad al trabajador durante la actividad de trabajo tipo paleta, guarda en la llave, caja de engranaje, super compacta, brinda al usuario mayor capacidad en trabajos con espacios reducidos, ofrece auxilios de dos posiciones, proporciona mayor comodidad y control. potencia 700 - 2.800 rpm. 45 mm. referencia DWE 4315-733 potente motor de 2.700 W. que entrega mayor velocidad y potencia en la operación más fácil



DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	Pulidora. (Esmiladora Angular)
Descripción:	Es económica de tamaño compacto
Ubicación del equipo:	Estadio Delsol
Marca:	Denker
Modelo:	2021
Serie:	DWE4315-B3
Voltaje:	120 V - 50 Hz - 60 Hz
Potencia:	700 + 2.800 rpm
Fecha de puesta en funcionamiento:	02-08-2023
Información técnica adicional:	NA


DATOS DEL PROVEEDOR

Fabricante y Lugar de origen:	importado por Black and Denker S:A de eu
Fecha de adquisición:	26-07-2023
Nombre de proveedor y Dirección:	Homecenter
Datos de contacto E-mail, teléfono:	https://www.homecenter.com.co
Posee catálogo de manejo u operación:	NA
Mantenimiento indicado por el fabricante:	NO

Condiciones de operación: el día 14 de Agosto del 2023 se le recibo en buen estado y funcionamiento Buena con buenas equipo nuevo

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		Fecha de modificación: 13 03 2023



	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-154
	HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tronzadora Dewalt D28730-B3. cortadora de metales de 14 pulgadas con diseño ergonómico, agaradero de transporte, carbones de pacil acceso para mayor comodidad. tiene un potente motor de 2.200 w. traba de ejecución incorporada para cambio de disco pacil y rápido. cuenta robusta guía de US permite cortar ángulos y prensa que trabaja rápido y firmemente en metales al cortar todos aumentados la productividad para corte en todos los materiales ferrosos ideal para corte de perfiles y rollos. corte de tubos y cualquier trabajo en acero inoxidable.

DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	Tronzadora Dewalt
Descripción:	ideal para corte de perfiles y trabajo en acero inoxidable
Ubicación del equipo:	Estadio Quilabá
Marca:	Dewalt
Modelo:	D28730
Serie:	D28730-B3
Voltaje:	120 volt
Potencia:	2.200 w
Fecha de puesta en funcionamiento:	18-08-2023
Información técnica adicional:	NA
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	Dewalt
Fecha de adquisición:	04-05-2023
Nombre de proveedor y Dirección:	Homecenter
Datos de contacto E-mail, teléfono:	Http://www.homecenter.com.co
Posee catálogo de manejo u operación:	NA
Mantenimiento indicado por el fabricante:	NA
Condiciones de operación:	Está en buenas condiciones para la operatividad

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		Fecha de modificación: 13 03 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



El equipo permite en tiempo de ejecución prolongado de herramientas con una recuperación rápida, alimentación eléctrica, nivel de ruido 75.5 dba y regulador de presión motor universal de 120 voltios para trabajos con condiciones de bajos voltajes; tiene protección de sobre carga, tiene protección térmica automática y manija de accionamiento de 1/4 pulgadas, pistola y adaptador para soplar.


DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	compresor de aire
Descripción:	uso de herramientas industrial.
Ubicación del equipo:	Estadio del club Ant
Marca:	Dewalt
Modelo:	2002
Serie:	D2002 M.
Voltaje:	presión máxima 165 psi - 120 V
Potencia:	0.9 Hp
Fecha de puesta en funcionamiento:	18-08-2023.
Información técnica adicional:	UN

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	Estados Unidos
Fecha de adquisición:	07-2021
Nombre de proveedor y Dirección:	DEWALT
Datos de contacto E-mail, teléfono:	http://www.homedepot.com.co
Posee catálogo de manejo u operación:	NO
Mantenimiento indicado por el fabricante:	Se debe retirar el tanque del servicio: 01-2029.

Condiciones de operación: Este se encuentra en buen estado para ser operado.

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154 Fecha de modificación: 13 03 2023
---	--	--

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-154
	HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo de Soldar multi procesos y multi procesos (stick/MIG/TIG) 220 voltios, muy versátil ideal para realizar trabajos de taller tanto de mantenimiento como de producción. Voltaje: 220 volt a 240 volt. capacidad de entrada KVA 10-23 KVA circuito de voltaje abierto (volt): 78V rango corriente de salida (Amp) MIG: 30-250A / stick 20-200A ciclo de trabajo 60% para trabajo industrial. En la caja. fuente de poder mandre para plus con taceres cables en pinzas masa cable de conexión sin clavija pistola Mig 300A de 3ism. Nozzle, difusor 3 tubos de contacto

DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	Equipo de soldadura extreme welds
Descripción:	Equipo de soldar multiprocesos
Ubicación del equipo:	estadio Oshunba
Marca:	Extreme welds
Modelo:	SynGrowave. 210
Serie:	2016
Voltaje:	220 Volt - 240 (V) circuito de voltaje abierto
Potencia:	(KVA): 10-23 KVA
Fecha de puesta en funcionamiento:	18-08-2023
Información técnica adicional:	NA.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fabricante y Lugar de origen:	extreme welds Medellín
Fecha de adquisición:	04-2020
Nombre de proveedor y Dirección:	codinter.
Datos de contacto E-mail, teléfono:	3105792432
Posee catálogo de manejo u operación:	NA.
Mantenimiento indicado por el fabricante:	NA

Condiciones de operación: Buena Estado

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		Fecha de modificación: 13 03 2023



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La cortadora de concreto es una máquina que se utiliza para realizar cortes lineales y con presión en concreto prefabricado y sus usos utilizadas para hacer juntas de dilatación, reparaciones y pavimentaciones con excelente rendimiento, sus ventajas en su operación por sus bajos niveles de vibración, ella utiliza disco de punta de diamante de 18 pulgadas y realiza cortes entre 70 y 175 mm de profundidad, fácil de operar, bajos niveles de vibración excelente rendimiento de corte profundidad de corte ajustable, estructura resistente

DETALLE

CARACTERÍSTICA

Nombre del Equipo:	Cortadora de concreto Tecco power 890F
Descripción:	Se utiliza para realizar cortes en línea
Ubicación del equipo:	estadio Dabielx
Marca:	Tecco power
Modelo:	2020
Serie:	4TR2700
Voltaje:	tiene depósito de combustible (gasolina)
Potencia:	70 - 175 mm
Fecha de puesta en funcionamiento:	14-08-2023
Información técnica adicional:	NA

DATOS DEL PROVEEDOR

Fabricante y Lugar de origen:	Torra Equipa
Fecha de adquisición:	14-09-2022
Nombre de proveedor y Dirección:	Torra Equipa
Datos de contacto E-mail, teléfono:	2105-5858 - 60605253
Posee catálogo de manejo u operación:	NA
Mantenimiento indicado por el fabricante:	NA

Condiciones de operación:

Se realiza mantenimiento general
cambio de pistón, varillas con pulseras
y sellos correspondientes 14-09-2023 fecha
Sello de obra nuevamente a reparación 01-09-2023

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez

Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán

Código: FT-SST-154

Fecha de modificación:
13-03-2023




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tronzadora Metabo: para corte de metales para cortar de forma potente y rápida perfiles, tubos y barras de acero, hierro fundido, aluminio + otros metales. V.F. Motor y engranaje apoyado en rodamientos de bolas concebido para esfuerzos máximos. Inversorización de husillo para un cambio sencillo de disco dispositivo de sujeción rápida. con adaptación a acople sin recalibramiento de 15° hasta 45° alta seguridad gracias al acople protector de frenado limitador de profundidad de corte ajustable, herramienta eléctrica 110 volt revoluciones por minuto 4.100 rpm Emisión de ruido 91 dB(A)

DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	Tronzadora Metabo C523-355
Descripción:	tronzadora a núcleo de metal.
Ubicación del equipo:	Estación Dulsheim
Marca:	Metabo
Modelo:	C5-23-355
Serie:	602335000
Voltaje:	110 volt
Potencia:	142300 w c.s
Fecha de puesta en funcionamiento:	31-08-2023
Información técnica adicional:	Reinstalación hecha en Verein
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	INDUSOLCES
Fecha de adquisición:	2015
Nombre de proveedor y Dirección:	Andreas Ferry Estación.
Datos de contacto E-mail, teléfono:	3216448310
Posee catálogo de manejo u operación:	NO
Mantenimiento indicado por el fabricante:	SI
Condiciones de operación:	Se le cambió Svrche. por que se leba directo el día 18 de agosto. Esta operable Se lo realizó luego pieza el día 18.

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES


Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		Fecha de modificación: 13.03.2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-154
	HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>característica de motor de 14 amperes para obtener mas potencia y rendimiento, este equipo reduce la fatiga del trabajador mayor capacidad de corte con topz fijo de 45. Incluye para una mejor capacidad de corte que tiene suplador de polvo mantenga en la zona de corte y libre de suciedad incluye 20 decotes de cambios de cuchilla permite manipular la herramienta (caídas con controles) protege al usuario de los peligros mas comunes tiene dispositivo de freno el motor acciona el mecanismo que permite que la cinta jire si se para para corte de madera</p>	
DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	Sierra Circular
Descripción:	tiene potencia y rendimiento
Ubicación del equipo:	Estadio Debrado
Marca:	DEWALT
Modelo:	2020
Serie:	GPO-1270
Voltaje:	110 Volt
Potencia:	500 a las 1.400W.
Fecha de puesta en funcionamiento:	6-08-2023
Información técnica adicional:	NA
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	DEWALT
Fecha de adquisición:	28-07-2023
Nombre de proveedor y Dirección:	HempCenter
Datos de contacto E-mail, teléfono:	11171111111@hempcenter.com.co
Posee catálogo de manejo u operación:	NO
Mantenimiento indicado por el fabricante:	NO
Condiciones de operación:	optimas.

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		• Fecha de modificación: 13-03-2023



	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-154
	HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La raana vibró compactadora cuenta con garantía de fabricación y son los más adecuados para todo uso de las actividades elaboradas en terreno acrisado, amortiguación sobre resortes incluye sepeles para su desplazamiento capacidad de impacto 13Kn (1300 kg) 20 cm de profundidad velocidad de desplazamiento 40cm/s.

DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	Raana compactadora
Descripción:	Raana compactadora gasolina poscon compactadora
Ubicación del equipo:	Estadio Rubén Darío (AOT)
Marca:	Equimaco
Modelo:	2015
Serie:	0088
Voltaje:	Motor gasolina Diesel
Potencia:	capas de 50 cm
Fecha de puesta en funcionamiento:	28-08-2023
Información técnica adicional:	NA
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	construquipos
Fecha de adquisición:	28-08-2023
Nombre de proveedor y Dirección:	cavalada Fredy.
Datos de contacto E-mail, teléfono:	3204543622
Posee catálogo de manejo u operación:	NA
Mantenimiento indicado por el fabricante:	Mantenimiento preventivo
Condiciones de operación:	Se encuentra en mantenimiento correctivo, fuera de obra el día 31-08-2023

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		Fecha de modificación: 13-03-2023



	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-154
	HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El vibrador eléctrico sirve para los procedimientos de construcción que busca eliminar los vacíos existentes dentro de la mezcla de concreto y lograr así una mayor compactación de la misma. El vibrador de hormigón o de aguja se utiliza para compactar el hormigón de gran espesor acabado de varillar. Tiene una aguja vibratoria que se sumerge en el hormigón. Motor eléctrico 6 kg potencia 2.3 Kw/3 Hp voltaje 110 Volt frecuencia 60 Hz - Velocidad 10.000 rpm aislamiento eléctrico IP24 diámetro de cabeza 38.048 mm longitud de la manijera 4 mts

DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	vibrador eléctrico Bosch
Descripción:	vibrador eléctrico de aguja para compactar
Ubicación del equipo:	Estadio Debebeke (AN)
Marca:	Bosch
Modelo:	2012
Serie:	G1VCL2 EX
Voltaje:	110 Voltios
Potencia:	2.3 Kw / 3 Hp
Fecha de puesta en funcionamiento:	26-03-2023
Información técnica adicional:	NA
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	Arquival del Caribe S.A.S
Fecha de adquisición:	2019
Nombre de proveedor y Dirección:	Homécenter
Datos de contacto E-mail, teléfono:	http://www.homecenter.com.co
Posee catálogo de manejo u operación:	NA
Mantenimiento indicado por el fabricante:	NA
Condiciones de operación:	



SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154
		Fecha de modificación: 13 03 2023

	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-154
	HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FECHA:	13-03-2023
		VERSIÓN:	001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>Generador de eléctrica a base de gasolina potente motor y tipo de 6.5 hp, peso seco 41 Kg potencial nominal 2.2 Kw, capacidad del tanque 15 litros de combustible, cuenta con llaves para su fácil desplazamiento, Voltmetro incorporado doble voltaje. 120-240 voltios. bajo nivel de ruido, sensor luminoso de bajo nivel de aceite</p>	
DETALLE	CARACTERÍSTICA
Nombre del Equipo:	planta eléctrica, gasolina
Descripción:	generador eléctrico a base de gasolina
Ubicación del equipo:	Estadio Dabeiba
Marca:	Matobarda. power master
Modelo:	2019
Serie:	6500W
Voltaje:	120 volt - 240 volt
Potencia:	2.2 Kw
Fecha de puesta en funcionamiento:	15-08-2023
Información técnica adicional:	
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	Matobarda
Fecha de adquisición:	2020
Nombre de proveedor y Dirección:	Humante
Datos de contacto E-mail, teléfono:	HT://www.humante.com.co
Posee catálogo de manejo u operación:	no
Mantenimiento indicado por el fabricante:	preventivo
Condiciones de operación:	operable en buen estado.

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Elaboró: Evelin Cristancho Sánchez 	Revisó y Aprobó: Leonardo Correa Roldán 	Código: FT-SST-154 Fecha de modificación: 13-03-2023
---	--	--



INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 11 Base de Datos



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSTRUCCION DE OBRAS CONSERVATIVAS EN EL PISO DABEIBA - ANTIOQUIA

BASE DE DATOS PERSONAL

No.	CONSORCIO / SUBCONTRATISTA	APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE DOCUMENTO IDENTIFICACION	SEXO	ESTADO	FECHA INGRESO ABO/NN/MD	EGRESOS AAA/NN/MD	CARGO		TIPO DE VINCULACION	AREA DE INFLUENCIA DIRECTA	MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN EL PROYECTO	LUGAR O FRENTE DE TRABAJO BASE	GRADO DE ESCOLARIDAD	TIPO MANO DE OBRA	LIMITACION FISICA			SEGURIDAD SOCIAL				CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA		
								TIPO	DESCRIPCION							REQUIERE CERTIFICACION (TRABAJOS EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, CORTA, AMBA/AAA/MD)	SI/NO	(CUAL?)	EPS	ARL	FONDO DE PENSIONES AFP	CCF	APELLIDOS Y NOMBRES	PARENTESCO	NUMERO DE TELEFONO FIJO Y/O CELULAR
1	ICCONO S.A.S	LEANDRO SERNA RIGARDO	1.132.705.696	MASCULINO	ACTIVO	N/A		ADMINISTRATIVO/OPERATIVO	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	UNIVERSITARIO	MOC CALIFICADA	NO	N/A	SURA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMA	GABRIEL INARINO	MADRE	310443257
2	ICCONO S.A.S	DORA MARIA MAMIN QUIROZ	43.416.906	FEMENINO	ACTIVO	N/A		ADMINISTRATIVO/OPERATIVO	AUXILIAR EST	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	TECNOLÓGICO	MOC CALIFICADA	NO	N/A	NOVIA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMA	YURANI MARCELA MAMIN	HERA	312349490
3	ICCONO S.A.S	LIZY YURANY RUIA RODAS	1.046.953.068	FEMENINO	ACTIVO	24/07/2023		OPERATIVO	ENCARGADA DE OBRA	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	TECNOLÓGICO	MOC NO CALIFICADA	NO	N/A	SURA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMA	WILDER ANTONIO USUGA	ESPOSA	313332132
4	ICCONO S.A.S	WILDER ANTONIO USUGA SEPULVEDA	71.330.861	MASCULINO	ACTIVO	24/07/2023		OPERATIVO	ENCARGADO DE OBRA	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC NO CALIFICADA	NO	N/A	NOVIA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMA	LIZY YURANY RUIA RODAS	ESPOSA	312296353
5	ICCONO S.A.S	JUAN CAMILO USUGA PULGARIN	1.017.134.441	MASCULINO	ACTIVO	15/08/2023		OPERATIVO	OFICIAL DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	NOVIA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMA	LIZY PEREZ	COMPAÑERA	314661045
6	ICCONO S.A.S	WILSON DARIO GUZMAN HERNANDEZ	1.216.727.200	MASCULINO	ACTIVO	NA		OPERATIVO	OFICIAL DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	SAVA SALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	GERARDO ANTONIO	AMIGO	323595941
7	ICCONO S.A.S	DENYER DE JESUS MUÑOZ USUGA	1.001.610.265	MASCULINO	ACTIVO	26/07/2023		OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC NO CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	LINA MARCELA	COMPAÑERA	323538659
8	ICCONO S.A.S	JUAN CARLOS MAZO AMAYA	1.039.287.153	MASCULINO	ACTIVO	26/07/2023		OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	SI	HABLA / AFASIA	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	NOELIA AMAYA	MADRE	3135317158
9	ICCONO S.A.S	WILDEMAN LOPEZ URIBE	8.419.172	MASCULINO	ACTIVO	27/07/2023		OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	COLPENSIONES	COMFAMA	MARLY HIDALGO	COMPAÑERA	312742541
10	ICCONO S.A.S	YEINER LEANDRO SALAS GRACIANO	1.039.289.329	MASCULINO	ACTIVO	31/11/2022		OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	SI	HABLA / AFASIA	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	YENIFER SALAS	HERMANA	320556284
11	ICCONO S.A.S	JOAN ANDRES CARMONA MUÑOZ	1.040.800.700	MASCULINO	ACTIVO	10/08/2023		OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	NOVIA EPS	SURA	PROTECCION	COMFAMA	IVERT VILLA	COMPAÑERA	314575560
12	ICCONO S.A.S	LUIS ALBERTO DAVID GIRALDO	1.039.286.337	MASCULINO	ACTIVO	11/08/2023		OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	NANCY LUZ GARCÉS	SUEGRA	314738229
13	ICCONO S.A.S	EDINSON VARGAS PINO	1.039.289.321	MASCULINO	ACTIVO	18/08/2023		OPERATIVO	SOLDADOR	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	BEATRIS OLIVA PARRA	TIA	310366804
14	ICCONO S.A.S	FERNY CAMILO URREGO	1.039.289.276	MASCULINO	ACTIVO	18/08/2023		OPERATIVO	SOLDADOR	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	DEYANHA URREGO	MADRE	310388892
15	ICCONO S.A.S	FRANSISCO JAVIER JIMENEZ BEDOYA	71.085.022	MASCULINO	ACTIVO	18/08/2023		OPERATIVO	SOLDADOR	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	FERNY CAMILO	AMIGO	311764541
16	ICCONO S.A.S	JHON YEASTHAN AGUIRRE OSORINDO	1.06.336.387	MASCULINO	ACTIVO	18/08/2023		OPERATIVO	AYUDANTE	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	MARIN GARCIA	SUEGRA	313677386
17	ICCONO S.A.S	FRANSISCO JAVIER JIMENEZ BEDOYA	71.085.022	MASCULINO	ACTIVO	18/08/2023		OPERATIVO	SOLDADOR	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	TECNOLÓGICO	MOC CALIFICADA	NO	N/A	SAVA SALUD	SURA	PROTECCION	COMFAMA	CIUDAD VARGAS	ESPOSA	312679502
18	ICCONO S.A.S	WALTER FELIPE URREGO	8.079.833	MASCULINO	ACTIVO	31/08/2023		OPERATIVO	AYUDANTE	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	Selenya Urrego	Madre	317763315
19	ICCONO S.A.S	SERGIO OLIVER MUÑOZ	1.000.869.311	MASCULINO	ACTIVO	31/08/2023		OPERATIVO	AYUDANTE	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	NOVIA EPS	SURA	PROTECCION	COMFAMA	Maria Tuberosa	Azuela	320469099
20	ICCONO S.A.S	CRUD ANGEL MORALES CARTAGENA	8.415.805	MASCULINO	ACTIVO	12/09/2023		OPERATIVO	AYUDANTE	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	NOVIA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFAMA	MARIA RUBELA DE JESUS USUGA	ESPOSA	311585260
21	ICCONO S.A.S	CARLOS FELIPE LOPEZ MONTEVAL	1.001.620.428	MASCULINO	ACTIVO	18/09/2023		OPERATIVO	AYUDANTE	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	COLPENSIONES	COMFAMA	DEYVY DANA VARGAS	COMPAÑERA	3136177946
22	ICCONO S.A.S	JOSE HERNAN DURANGO PINO	1.027.941.661	MASCULINO	ACTIVO	22/09/2023		OPERATIVO	OFICIAL	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	COLPENSIONES	COMFAMA	DEYVY DANA VARGAS	COMPAÑERA	313612119
23	ICCONO S.A.S	OSCAR HERNAN TUBERQUIA POSSO	1.039.288.899	MASCULINO	ACTIVO	3/09/2023		OPERATIVO	AYUDANTE	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	AZUCENA POSSO CANO	MADRE	320703984
24	ICCONO S.A.S	GERARDO ANTONIO GRACIANO	8.421.289	MASCULINO	ACTIVO	22/09/2023	22/09/2023	OPERATIVO	OFICIAL ENCARGADO DE OBRA	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC NO CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	SORAYA CORREA	COMPAÑERA	312610964
25	ICCONO S.A.S	OPALVARO TORRES GRACIANO	8.421.217	MASCULINO	ACTIVO	4/09/2023	26/09/2023	OPERATIVO	OFICIAL	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	SAVA SALUD	SURA	PORVENIR RETIRADO	COMFAMA	Ara Teresa Durango	Esposa	310791462
26	ICCONO S.A.S	SANTAGO CUARTAS GONZALEZ	1.128.411.183	MASCULINO	RETIRADO	14/07/2023	29/07/2023	OPERATIVO	RESIDENTE SST	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	TECNOLÓGICO				SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMA	Luz Estela González	MAMA	322620721
27	ICCONO S.A.S	LUIS MARTIN DAVID CARDEONA	1.039.281.351	MASCULINO	RETIRADO	26/07/2023	14/08/2023	OPERATIVO	OFICIAL DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	Marta Isabel Pino	COMPAÑERA	312720787
28	ICCONO S.A.S	JUAN DAVID GONZALEZ CORREA	1.045.490.264	MASCULINO	RETIRADO	26/07/2023	16/08/2023	OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA	MOC NO CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	DANI ESTEBENSON SANCHEZ	HERMANO	314749820
29	ICCONO S.A.S	LUIS FELIPE SERNA TABARES	1.039.288.889	MASCULINO	RETIRADO	26/07/2023	21/08/2023	OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	PRIMARIA INCOMPLETA	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	LIZY KAMILA TABARES	MADRE	320443861
30	ICCONO S.A.S	BERTRAM SEPULVEDA LOPEZ	8.415.483	MASCULINO	RETIRADO	23/07/2023	28/08/2023	OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA INDIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	NO	MOC CALIFICADA	NO	N/A	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMA	LIZY ZAPATA	AMIGO	314799998
31	ICCONO S.A.S	HENRIK DE JESUS ESTABAN GONZALEZ	8.449.118.008	MASCULINO	RETIRADO	26/07/2023	01/08/2023	OPERATIVO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	NO	SUBCONTRATISTA	AI-AREA INFLUENCIA DIRECTA	DABEIBA	DABEIBA	SECUNDARIA COMPLETA	MOC NO CALIFICADA	NO	N/A	SAVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMA	LENER ANDRES BARRON	HERMANO	323676232

Ingreso Para identificar el personal que **INGRESA** usar color azul y colocar al final de la base de datos.
 Retiro Para identificar el personal que se **RETIRA** usar color rojo y colocar después de los ingresos.
 Traslado Par el personal que se **TRASLADA** (o proyecto (NO RETIRADO)) usar color amarillo y colocar después.



Anexo N° 12

Plan de trabajo anual





INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 13

Egresos del personal





PAZ Y SALVO

Medellín, 23 de septiembre de 2023

Señor Trabajador: Gerardo Antonio Graciano

Por medio de la presente se informa que el día 22 del mes de septiembre del año 2023, terminó su vínculo laboral en el cargo de Oficial de Construcción, con la empresa **ICCONO S.A.S**, en la obra **ESTADIO DABEIBA**.

Adicional solicitamos se certifique que:

Yo, **Gerardo Antonio Graciano** identificado con cedula de ciudadanía **No. 8.417.299**, hago constar que la empresa **ICCONO S.A.S** se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago salarial y certifico que a la fecha se han realizado la totalidad de pago de todas mis prestaciones sociales de acuerdo con la legislación vigente.

ICCONO S.A.S

Gerardo A. Graciano
**GERARDO ANTONIO
GRACIANO**
CC: 8417299



PAZ Y SALVO

Medellín, 20 de septiembre de 2023

Señor Trabajador: Otalvaro Torres Graciano

Por medio de la presente se informa que el día 19 del mes de septiembre del año 2023, terminó su vínculo laboral en el cargo de Oficial de Construcción, con la empresa **ICCONO S.A.S**, en la obra **ESTADIO DABEIBA**.

Adicional solicitamos se certifique que:

Yo, **Otalvaro Torres Graciano** identificado con cedula de ciudadanía **No. 8.413.217**, hago constar que la empresa **ICCONO S.A.S** se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago salarial y certifico que a la fecha se han realizado la totalidad de pago de todas mis prestaciones sociales de acuerdo con la legislación vigente.

ICCONO S.A.S

OTALVARO TORRES

GRACIANO

CC: 8413217



INFORME MENSUAL SST



Anexo N° 14 Oficios SST





CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001 Fecha:
10/11/2016

Dabeiba, 30 de septiembre de 2023

INTERCANFUTDAB-004-2023

Señores

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-ASOMUDACAR

LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA

Rep. Legal.

REFERENCIA: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA, GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.

ASUNTO: Requerimientos de seguridad y salud en el trabajo, documentos de ingreso de vehículos a la obra.

Cordial saludo,

Se le recuerda al contratista que para el cargue y descargue de materiales e ingresos de maquinaria amarilla se debe entregar con anticipación los documentos de vehículos, maquinaria y seguridad social de los conductores y operadores, ya que el día 28 de septiembre ingresaron a obra, un camión blanco con rojo de paca JYW 850 de Envigado y un mini cargador HYUNDAI modelo HSL 850-7 de color amarillo para el descargue de la grama sintética, así mismo el día 29 de septiembre del presente año ingresaron para el descargue materiales, una volqueta verde con placa OLA 293 de Frontino, y volqueta de placa SBK 120 color blanco, los cuales no contaban con la documentación requerida.

A. Documentación para vehículo:

- SOAT
- Técnico mecánica
- Matricula de propiedad
- Póliza extra contra actual

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001 Fecha:
10/11/2016

B. Documentación del personal:

- Seguridad social (Cedula, EPS, ARL, AFP)
- Licencia de conducción

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001 Fecha:
10/11/2016

Se adiciona que, aunque el contrato cuenta con una póliza, no se puede pasar por alto los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a las afiliaciones y la seguridad del trabajador (**CLAUSULA 9.2-ASOCIACION 2.22,2.23,2.24,} * [2.28)**). Si se pasa por alto las instrucciones de Interventoría, la interventoría no se hace responsable de cualquier evento, incidente o accidente de trabajo, de ser así será única y exclusivamente responsabilidad del contratista.

Cordialmente,

ANYI ALEJANDRA LÓPEZ DURANGO
Residente SST.
Sinergia interventoría y construcciones SAS



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Medellín, 2 de octubre de 2023

INTERCANFUTDAB-TEC-005-2023

Señores

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA, DARIEN Y CARIBE-ASOMUDACAR
LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA**

Rep. Legal.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No. CV-019-2023 “ANUAR EZFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERIAS CANCHA DE FÚTBOL Y ANDENES, CUBIERTA METÁLICA GRADAS DE FÚTBOL, CUBIERTA METALICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.”

ASUNTO: Presunto incumplimiento de requerimientos varios de obra, perteneciente al convenio de la referencia.

Cordial saludo,

Por medio de la presente correspondencia, se le comunica al conveniente del presunto incumplimiento en la entrega de varios requerimientos que se han venido haciendo al subcontratista de obra delegado por su asociación para la ejecución de las actividades descritas en el convenio de la referencia.

A continuación, se relacionan dichos pendientes:

1. En el correo electrónico del pasado 26 de agosto de 2023, por parte de la residente SST de interventoría Tnlga. Alejandra López se solicitaron las correcciones de los IBC a las planillas de seguridad social pagadas en los meses de agosto y septiembre de 2023.

A la fecha del presente comunicado, han pasado 37 días sin recibir ni respuesta ni las correcciones respectivas a dicho requerimiento.

Es de aclarar que el asociado, firmo la aceptación del convenio de la referencia en donde se expresa en la clausula 8 COMPORMISOS DE LAS PARTES, numeral 8.2 DE LA ASOCIACION, inciso 2.23, que cita: “Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 80 de 1993 -adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 -, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al pago de la Seguridad Social integral, así como los propios al Servicio Nacional de aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBFy las cajas de compensación familiar de todo eel personal vinculado directamente a la ejecución del convenio, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución del convenio.”

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



CORRESPONDENCIA.

MA: PE
Versión: 001
Fecha: 10/11/2016

Por lo tanto, se queda a la espera del ajuste y entrega de las planillas mencionadas en un **plazo perentorio de 5 días hábiles** a partir de la fecha de entrega del presente comunicado.

2. En la correspondencia **INTERCANFUTDAB-AMB-002-2023** del pasado 18 de septiembre de 2023, por parte del residente ambiental Ing. Juan Sepúlveda se realizaron observaciones varias al informe ambiental No. 2 presentado por el subcontratista de obra y se recalcó la entrega del informe ambiental no. 1 del periodo comprendido entre el 7 de Julio de 2023 al 6 de Agosto de 2023. De igual manera se solicito el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

A la fecha del presente comunicado, han pasado 14 días sin recibir ni respuesta ni las correcciones respectivas a dicho requerimiento.

Se le recuerda al asociado que en el convenio de la referencia en donde se expresa en la cláusula 8 COMPORMISOS DE LAS PARTES, numeral 8.2 DE LA ASOCIACION, inciso 2.1, que cita: “Ejecutar el convenio de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos elaborada para tal efecto, la cual hace parte integral de este convenio”, inciso 2.22 que cita: “adoptar las medidas ambientales , sanitarias, forestales , ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro, a las cosas o al medio ambiente, y garantiza que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y proveedores.

Por lo tanto, se queda a la espera del ajuste del informe No. 2, entrega del informe No. 1 y PMA mencionados en un **plazo perentorio de 5 días hábiles** a partir de la fecha de entrega del presente comunicado.

Agradeciendo su atención.

Sandra Milena Franco Vanegas
Representante Legal
SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 901.026.111-0

Email: sinergiasas2016@gmail.com

Celular: 3017562414-3113152735



ANEXO N°10 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL





INFORME MENSUAL N° 3 DE TRABAJO SOCIAL
SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

CODIGO: FO-GC-14

VERSIÓN: 04

OBJETO-PROYECTO:

“ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL Y ANDENES, CUBIERA METALICA, PLACA DEPORTIVA, CANCHA SINTETICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA”

INFORME # 3 -TRABAJO SOCIAL

CONTRATO N°
CV- 020 DE 2023

INTERVENTOR:
MASER

CONTRATISTA:
ASOMUDACAR

DABEIBA-ANTIOQUIA

7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 6 DE OCTUBRE DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	3
2. JUSTIFICACION	3
3. ALCANCE.....	4
4. OBJETIVOS.....	4
4.1 General.....	4
4.2 Específicos.....	4
5. MARCO LEGAL.....	4
6. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA.....	5
6.1 Localización.....	5
6.2 Zona de intervención.....	6
7. ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.....	7
7.1 Respuesta y atención PQRS.....	7
7.2 Interferencias presentadas durante la obra.....	7
8. ACTAS DE ENTORNO.....	8
9. ACTIVIDADES REALIZADAS	9
10. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.....	11
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OCTUBRE.....	12
12. GLOSARIO.....	13
12.1 BARRIOS.....	13.1
12.2 COMUNIDAD.....	13.2
12.3 COMUNICACIÓN PERSONAL.....	13.3
13. ANEXOS.....	15

1. INTRODUCCIÓN:

Las condiciones, físicas, sociales, económicas y ambientales de nuestro territorio obligan a asumir con responsabilidad e inteligencia su planificación y gestión, en busca de un municipio que además de sostenible, sea económica, ambiental y socialmente viable y eficiente. desde su mismo compromiso institucional, proyecta UNIDADES DEPORTIVAS INTEGRALES, como política de ocupación eficiente del espacio, para lo cual se propone la construcción de equipamientos deportivos nuevos y la adecuación de la población en general.

En continuación a la terminación de la UNIDAD DEPORTIVA del Municipio de Dabeiba, es necesario incluir un Trabajador Social que intervenga en los diferentes escenarios en los que se pueda buscar estrategias para un acompañamiento social a la comunidad, veedurías ciudadanía y demás participantes de obras civiles.

Por último, las obras civiles deben tener en cuenta que el Plan de Gestión Social es un instrumento de planificación que busca garantizar la participación y el compromiso de la comunidad, y de los trabajadores para el empoderamiento de la infraestructura que se realizara en dicho municipio.

2. JUSTIFICACIÓN

Es importante reconocer la labor de un Trabajador Social en el área de proyectos y obras civiles, que le permita intervenir en situaciones que se presenten en el inicio, continuidad y finalización de construcción de la obra.

El acompañamiento Social en Obra es una herramienta muy útil para ayudar a vincular la comunidad en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma y de garantizar la participación y el empoderamiento de la infraestructura

la intervención de Trabajo Social es un concepto que permite comprender la profesión, como una “forma de acción social, consciente y deliberada, que se realiza de manera expresa, integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos, con

propuestas metodológicas. Supone un proceso que parte del conocimiento de problemáticas: identificar actores/as, situaciones y circunstancias para promover su desarrollo humano; reconocer diferentes realidades subjetivas, desde perspectivas particulares; se apoya en teorías sociales que juegan un papel explicativo y guían el conocimiento, proceso y resultados”. Corvalán 1996 Citado por CIFUENTES, Rosa María (2003). Op. Cit: 5

3. ALCANCE

Este informe documenta las acciones realizadas por parte del área social para prevenir, reducir, controlar, sensibilizar, apoyar y/o mitigar de manera oportuna y eficiente el impacto generado en la construcción de UNIDAD DEPORTIVA en el municipio de Dabeiba.

4. OBJETIVOS:

4.1 General:

El Informe Social tiene por objetivo reportar a la firma Interventora SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, las actividades desarrolladas por el área social durante el período referenciado, adjuntando para ello los soportes (formatos, registros) de las actividades ejecutadas para el presente contrato.

4.2 Específicos:

- Presentar el consolidado de actividades sociales realizadas durante el corte del presente informe de Gestión Social.
- Ofrecer mecanismos claros de información y atención ciudadana, buscando aclarar dudas, inquietudes, quejas o reclamos generados por la comunidad.

- Divulgar con los líderes, representantes y comunidad los alcances de las actividades estipuladas en el contrato.

5. MARCO LEGAL:

El presente documento está elaborado teniendo en cuenta lo establecido en la siguiente normatividad dispuesta en la Constitución Política de Colombia

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

ARTICULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Reglamentado por la ley 472 de 1998.

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes.

6. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA

6.1 Localización:

La construcción de la Unidad Deportiva ubicado en el Barrio Víctor Cardenas del Municipio de Dabeiba, pretende ejercer el funcionamiento de los componentes de: graderías cancha de futbol y andenes, cubierta metálica, gradas de futbol, placa deportiva, cancha sintética de futbol y pista de trote.


La ejecución de la obra está estipulada en un terreno aproximadamente con medidas de 21 metro x 30 y 120 metros x 71.50 que da cumplimiento a los parámetros establecidos en el contrato; permitiendo que sea el disfrute para la comunidad, una vez esté finalizado la obra.





6.2 Zona de Intervención

Durante la ejecución de la obra UNIDAD DEPORTIVA en el Municipio de Dabeiba, se realizará entre los barrios Obrero y Víctor Cárdenas, como se observa en la siguiente imagen.

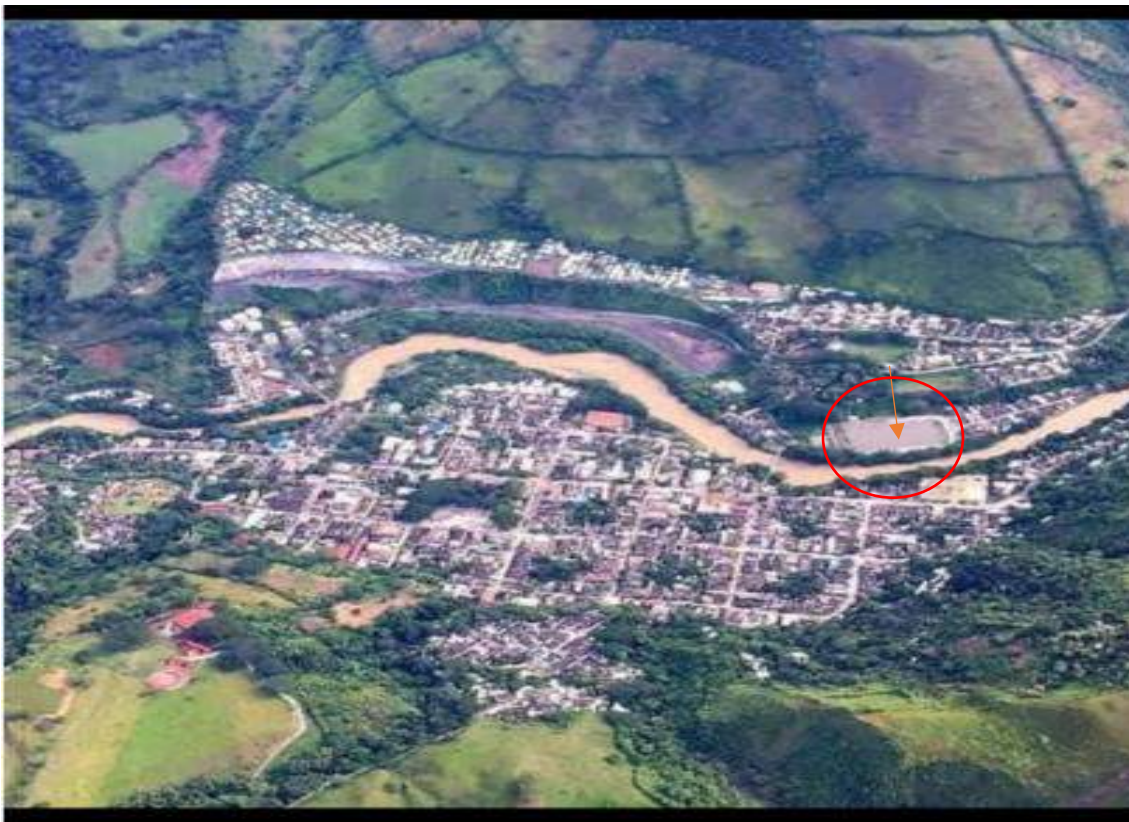

7. ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

7.1 Respuesta y atención PQRS

Durante la ejecución de la obra de la Unidad Deportiva, es posible que se presente unas series de Preguntas, Quejas, Reclamos o Sugerencias por la comunidad, de caso de ser necesario se hará su efectiva devolución para dar su respuesta, aclarando su dudas e inquietudes en acompañamiento de la alcaldía.

7.2 Interferencias Presentadas durante la Obra

En los casos en que se presentan interferencias en la accesibilidad a negocios, el profesional del área social del contratista debe realizar una visita a los afectados, comerciantes y/o propietarios con el fin de acordar conjuntamente las medidas que se tomaran para garantizar el acceso.

8. ACTAS DE ENTORNO

Las actas de entorno, se estipula en dos tiempos en el inicio y finalización de la obra, permite observar las condiciones de las vías, espacio públicos y viviendas, teniendo en cuenta que si alguna afectación que sea provocado por la construcción de la obra sea reparada por el contratista.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS # 3

Durante el periodo del mes de agosto se realizaron las siguientes actividades que dieron cumplimiento por parte del contratista de la obra en el mes de agosto, cabe resaltar que las actividades fueron acompañadas por parte de la residente social de la interventoría:

ACTIVIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Se participo en reunión de comité en los que fueron convocados: el ingeniero, -trabajadora social (alcaldía), Ingeniero civil, socioambiental, SST (contratista) - Auxiliar civil, SST y residente social (Interventoría) 	<p>Se anexa evidencias fotográficas, anexos, y actas de asistencias.</p> <p>Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>
<ul style="list-style-type: none"> Se realizo la socialización en el Barrio Víctor Cárdenas, con el objetivo de tener en cuenta las recomendaciones que se están proyectando en la ejecución del estadio. 	<p>Evidencias: Fotografías, actas de asistencia.</p> <p>Fecha: 29 de septiembre del 2023</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Se hizo encuentro con la veeduría ciudadana del municipio de Dabeiba, dado como el objetivo compromisos por parte del contratista, que tiene acabo el proyecto de la obra. • Se participo en el encuentro virtual convocada por la residente social a las profesionales de Trabajo Social de la Alcaldía y la Socioambiental de la contratista, para llevar a cabo el cronograma de actividades que ejecutaran en el mes de octubre. 	<p>Evidencias: Fotografía- acta de reunión.</p> <p>Fecha: 29 de septiembre del 2023</p> <p>Formato de acta- Pantallazo de los asistentes.</p> <p>Fecha: 5 de octubre del 2023</p>
---	---


10.EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:

- **FOTOGRAFIAS REUNION DE COMITÉ:**



• FOTOGRAFIAS SOCIALIZACION BARRIO VICTOR CARDENAS




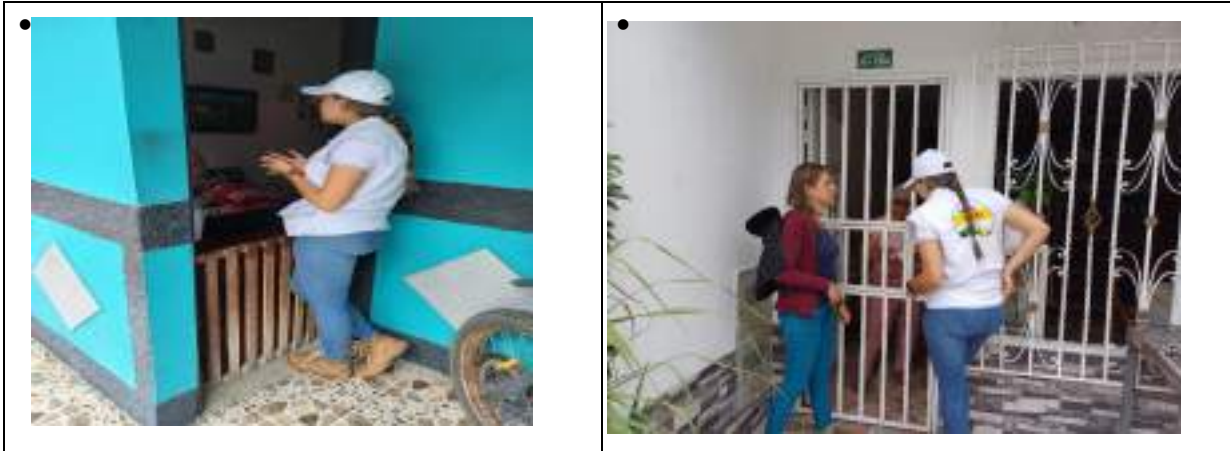

- **ENCUENTRO CON LA VEEDURIA CIUDADANA**



- **ENCUENTRO VIRTUAL CON LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA ALCALDIA, SOCIO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA Y RESIDENTE SOCIAL DE LA INTERVENTORIA**

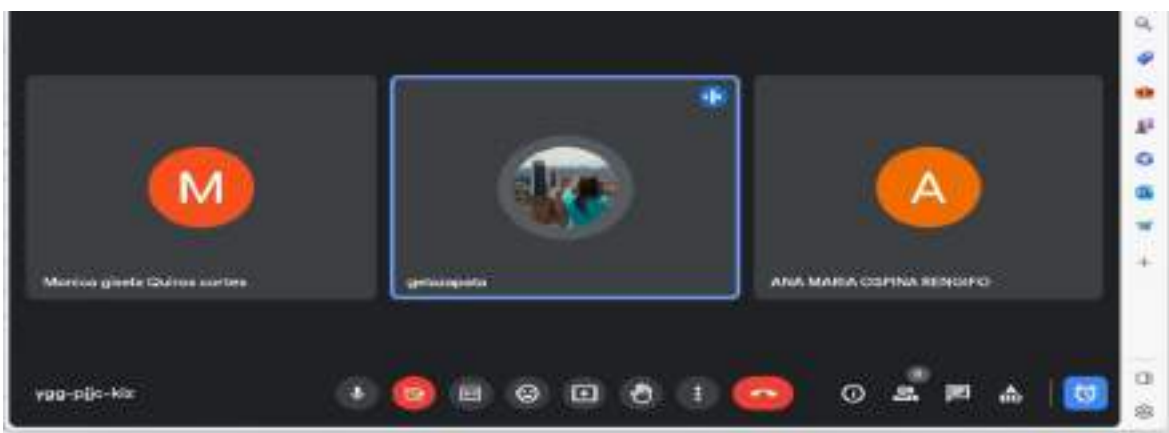

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR OCTUBRE

ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN.
<ul style="list-style-type: none"> Socialización vos a vos Barrio la Cancha y Barrio Obrero 	Evidencias fotográficas, anexos de formatos y actas
<ul style="list-style-type: none"> Continuar con la socialización faltantes a los 10 grupos de la Institución Educativa Juan H. White 	Evidencias fotográficas, anexos de formatos y actas Evidencias fotográficas, anexos de formatos y actas
<ul style="list-style-type: none"> Cuña radial en la Emisora la Municipal estereo de la Alcaldía 	Evidencias fotográficas, anexos de formatos de actas
<ul style="list-style-type: none"> Implementación Plan de gestión social equivalente al primer Informe 	Informe

13. GLOSARIO.

13.1 BARRIOS: Parte de una población de extensión relativamente grande, que contiene un agrupamiento social espontáneo y que tiene un carácter peculiar, físico, social, económico o étnico por el que se identifica.

13.2 COMUNIDAD: Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus social o roles. Por lo general, en una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o las acciones), que es compartida y elaborada por sus integrantes mediante la socialización.

13.3 COMUNICACIÓN ASERTIVA: Como comunicación asertiva denominamos aquella mediante la cual logramos manifestar a los otros de forma simple, clara y oportuna, lo que sentimos, queremos o pensamos. En este tipo de comunicación no es necesario recurrir a la agresividad para comunicar nuestras ideas. Pero tampoco implica que nos retraigamos o nos encerremos en una actitud pasiva o dócil que nos impida comunicar lo que sentimos.

14. ANEXOS



ASOMUDACAR

Anuar esfuerzos administrativos para la construcción de obras para la terminación y puesta en funcionamiento de los componentes: gradería cancha de futbol, cubierta metálica placa polideportiva, cancha sintética de futbol y pista de trote y obras complementarias de la unidad deportiva del municipio de DABEIBA ANTIOQUIA 2023



ACTA DE REUNIÓN / VISITA

Se anexa - Listado de Asistencia

Fecha 29-Septiembre-2023 Hora: 10:15 11:40am

Lugar de la Reunión / Visita Unidad Deportiva Municipal

Objetivo de la Reunión / Visita Visita de Veeduría Ciudadana

Temas tratados en la Reunión / Visita

Desarrollo de la Reunión / Visita

El día 29 de septiembre del 2023, hora 10:15am, se realizó por parte de la Veeduría visital a la unidad deportiva (los señores Absalón Cano, Daniel Eduardo Rodríguez y Luis Alfonso Ocampo, la visita fue atendida por parte de Ana María Ospina (Trabajadora Social Alcaldía) Socioambiental (Angela Zapata) y Trabajadora Social de Interventoría Monica Quirós.
El objetivo de la visita por parte de la Veeduría es de los avances que lleva la obra y algunas inquietudes que surgen acerca de las medidas y el corte de la cancha principal; otros de los puntos en conversación fue la posibilidad de que la implementación de la grama pueda tener abajo de ella Cartera de coco y un hidrante, también se resalto la iluminación para el estadio si se puede ejecutar en la obra o debe gestionarse por otros medios

Vale resaltar que los integrantes de la veeduría Ciudadana solicitan la presentación de la obra y la comunicación frente a los avances que se vayan dando durante de la ejecución

Realizar de manera asertiva por medios de comunicación las recomendaciones que debemos tener en cuenta los cuidados de la grama, la cancha y demás zonas de la obra por parte de los transeuntes del lugar.

Siendo las 11:40am se termina la visita.


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Acta de inicio de la ejecución de la obra	Ana M ^a Ospina	
medidas antes y después de la cancha	Contratista	
Programación y Presentación de los avances de la obra	Contratista/alcaldía	
contacto con el INDER para reunión con la veeduría	Ana M ^a Ospina	
Diseño de campaña para el cuidado de la grama		

Levanta el Acta :

CARGO _____ ENTIDAD _____

NOMBRE _____ Firma _____

	ACTA DE REUNIONES	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página 1 3

COMITÉ: ENCUENTRO – PROYECTO OBRA
 N°: 01

Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha			Lugar
		Día	Mes	Año	
5:00 pm	6:00 pm	5	10	2023	Video llamada- Meet

1. Asistentes

Nombre	Cargo
ANA MARIA OSPINA	TRABAJADORA SOCIAL - ALCALDIA
ANGELA ZAPATA	SOCIO AMBIENTAL-CONTRATISTA
MONICA QUIROS CORTES	RESIDENTE SOCIAL-INTERVENTORIA

2. Orden del día


- Iniciar conversatorio en el que se identifique las actividades a realizar en el mes de octubre.

3. Temas tratados/Conclusiones/Recomendaciones

Se inicia con un saludo cordial entre las participantes de la reunión.

En continuación a la terminación de la UNIDAD DEPORTIVA del Municipio de Dabeiba, es necesario incluir un Trabajador Social que intervenga en los diferentes escenarios en los que se pueda buscar estrategias para un acompañamiento social a la comunidad, veedurías ciudadanía y demás participantes de obras civiles.

El acompañamiento Social en Obra es una herramienta muy útil para ayudar a vincular la comunidad en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma y de garantizar la participación y el empoderamiento de la infraestructura

	ACTA DE REUNIONES	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página 2 3

Seguidamente, se hace alocución a las propuestas que se tiene a trabajar durante el mes de septiembre. Cabe resaltar que las acciones a realizar muestran la garantía de ejecutar las funciones dentro y afuera de la obra.


Después de entrar en los detalles particulares que se deben tener en cuenta, se realizan los siguientes compromisos:




2. Compromisos de obra


Descripción	Responsable	Plazo	ESTADO
1. Entrega de información para realizar la cuña radial	Profesional Socioambiental (contratista)	9 de octubre de 2023	Pendiente
2. Realizar cuña radial, una vez sea entregado la información por parte del contratista.	Trabajadora Social Alcaldía-Residente Social Interventoría	11 de octubre del 2023	Pendiente
3. Socialización comunidad en general para recomendaciones que se deben tener en la obrar	Profesional socioambiental (contratista)	31 de octubre del 2023	Pendiente
4. Complementar el PLAN DE GESTION	Profesional Socioambiental (contratista)	31 de octubre del 2023	Pendiente

Siendo las 06:30 PM de la tarde se concluye el presente comité de obra.

Para su constancia, firman las partes involucradas, así:

	ACTA DE REUNIONES	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página 3 3

		
Ana María Ospina (Trabajo Social-Alcaldía)	Monica Quiros Cortes (Residente Social- Interventoría)	Angela Zapata (Socioambiental-Contratista)

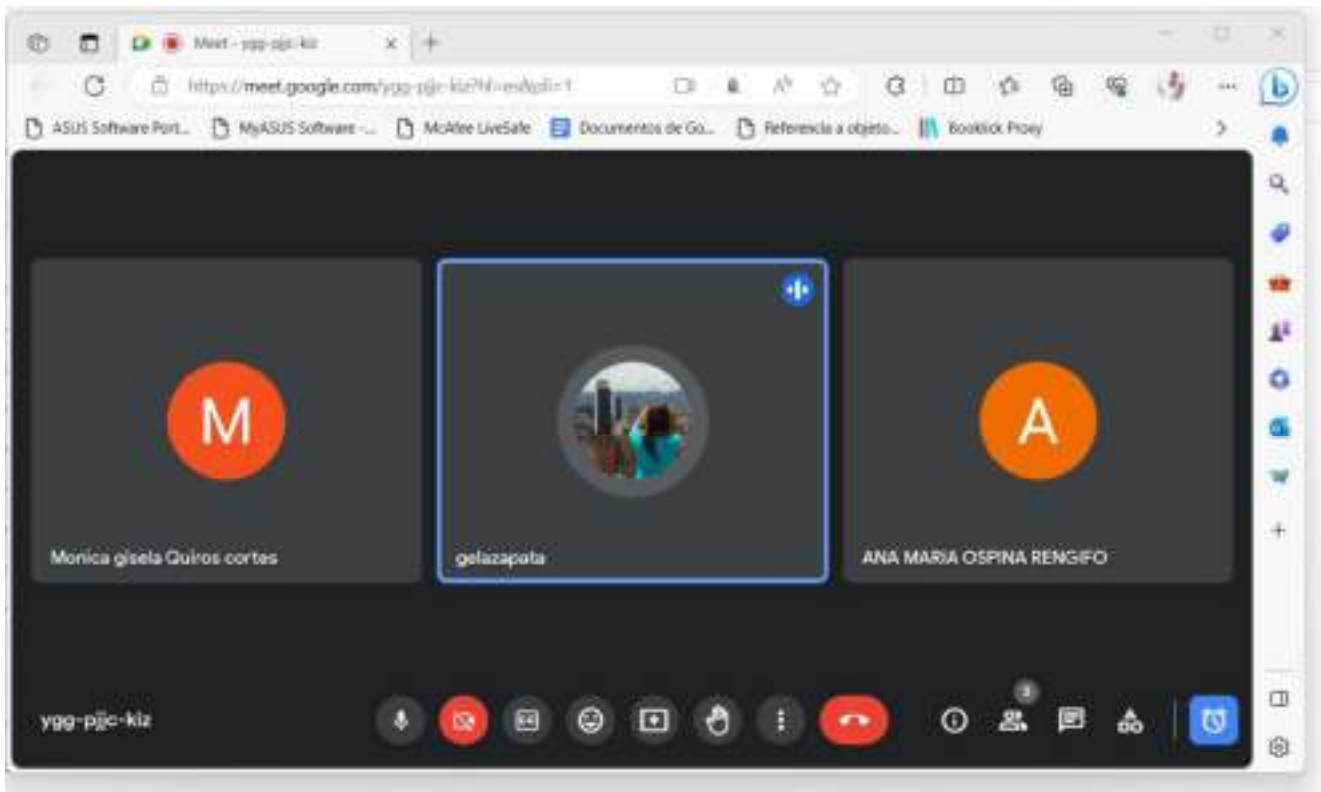

NOMBRE DEL EVENTO: Socialización Puerto x Puerto					HORA: 8:30pm
FECHA: 29 Septiembre - 2023			LUGAR: Viche Corderas		
FACILITADOR: Angela Zapata - Monica Duran - Ana M ^a U					CARGO: Socio ambiental - Trabajo Social
No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	No. CEDULA	GRUPO AL QUE PERTENECE	CELULAR DE CONTACTO	FIRMA
1	Kelly Castano	1520450863	Comunidad	3215474777	Kelly Castano
2	Nairo Jesus Gines	43415721	Comunidad	3115918221	Nairo Jesus G.
3	Carlos Castano	613.420	Comunidad	3215474777	Comunidad
4	SERGIUS VASQUEZ	7397894547	COMUNIDAD	3136428905	SERGIO VASQUEZ
5	Beatriz Fycao Zapata	43418776	Comunidad	3207610780	Beatriz Fycao
6	Alejandra R.	1037291421	Comunidad	3207928245	Alejandra
7	Juan Cab R.	1037185585	Comunidad	3206230741	Juan Cab
8	Alejandra Fajal	1015301534	Comunidad	3102999255	Alejandra F.
9	Maria Juliana M.	113415128	Comunidad	3217858936	Maria Juliana M.
10	Cruz Alvaro Cifuentes	21697348	Comunidad	3122826108	Cruz Alvaro
11	Walter Vasquez		Comunidad		Walter Vasquez
12	Ana Mercedes Vasquez	43415537	Comunidad	3136402795	Ana Mercedes

NOMBRE DEL EVENTO: Socialización obras Estadio					HORA: 8:30pm
FECHA: 29-09-2023			LUGAR: Barrio Victor Corderas		
FACILITADOR: Angelo Zapata - Monica Barros - Ana M Ospina			CARGO: Socioambiental - Trabajo Social - Residente		
No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	No. CEDULA	GRUPO AL QUE PERTENECE	CELULAR DE CONTACTO	FIRMA
1	Sergio Maria U	1039286378	Comunidad	10.355193846	Sergio U.
2	Ana Gomez		Comunidad		Ana del Barrio
3	Maryory Demis H	43418435	Comunidad	322.668.0916	Maryory Demis H
4	Dora Castano	43417210	Comunidad	311.740.4335	Dora C.
5	Sra Piedad Zapata	43416026	Comunidad	3217202889	Sra Piedad Zapata
6	Eusebio Eladio Torres	43518428	Comunidad	3217125766	Eusebio Torres
7	Mariana Guisao	32155223	Comunidad	312.279.9878	Mariana G.
8	Julia Ruiz	713091649	Comunidad		Julia
9	Ligia Zapata	4341743546	Comunidad	311.636.8847	Ligia Zapata
10	Rosa Alba Tuboquin	43415359	Comunidad	31235359524	Rosa Alba
11	Walter Ariel J	1039285444	Comunidad	3113681881	Walter
12	Lucy David	1039291187	Comunidad	3148654058	Lucy David



REGISTRO DE ASISTENCIA



Anuar esfuerzos administrativos para la construcción de obras para la terminación y puesta en funcionamiento de los componentes: gradería cancha de fútbol, cubierta metálica placa polideportiva, cancha sintética de fútbol y pista de trote y obras complementarias de la unidad deportiva del municipio de DABEIBA ANTIOQUIA 2023

NOMBRE DEL EVENTO: Comité técnico - Interventoria - Alcalde - Contratista					HORA: 4:30 pm
FECHA: 28 Septiembre 2023			LUGAR: Obra estadio - Oficina Contratista		
FACILITADOR:					
No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	No. CEDULA	GRUPO AL QUE PERTENECE	CELULAR DE CONTACTO	FIRMA
1	Ana María Ospina P.	1001617039	Trabajadora Social Alcaldia	3212143284	Ana Maria O.P.
2	Carlos Juan Ruiz	1065002380	ING civil inf	3137476389	[Signature]
3	Rafael Monte G.	1066744900	Secretario de Infraestructura Alcaldia	384232154	[Signature]
4	LEANDRO SERNA	1152705696	ING CIVIL Pes	3104442557	[Signature]
5	Juan Sepulveda O.	1.067.857.697	Ing. Sanitario y Ambiental	3054572534	[Signature]
6	Monica Ojitos C.	1036649373	Reside Social	3117768867	[Signature]
7	Silvana Montoya	1066673910	Tec. aux interventoria	3205300640	Silvana
8	Anny Alvarado Lopez	1028034664	R. SST Interventoria	3216040415	[Signature]
9	Angela Zapata	32243413	Resident Socio-Ambal	3245453902	[Signature]
10	[Signature]	43.416.406	Aut SST	3122045960	[Signature]
11					
12					



INFORME DE INERVENTORÍA

ANEXO N°11 INFORME DE ESPECIALIDAD ESTRUCTURAL





INFORME N°3 DE INTERVENTORÍA, COMPONENTE ESTRUCTURAL

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA
CV -N. ° 020-2023**

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES: GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL, CUBIERTA METÁLICA PLACA POLIDEPORTIVA, CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.



06 DE OCTUBRE DE 2023



INFORME DE INERVENTORÍA

Introducción

Como parte del componente estructural del proyecto se presenta el presente informe, correspondiente al tercer mes de ejecución de la obra para la terminación y puesta en funcionamiento de los componentes: gradería cancha de futbol, cubierta metálica placa polideportiva, cancha sintética de futbol y pista de trote y obras complementarias de la unidad deportiva del municipio de Dabeiba Antioquia. El informe tiene un enfoque únicamente estructural y presenta el avance realizado hasta la fecha, comprobando que se está siguiendo con lo establecido en los diseños estructurales, que los procesos constructivos son los concernientes para cada actividad, que los materiales de construcción son los idóneos y cumplen con lo establecido en los diseños, todo esto teniendo siguiendo de forma estricta lo establecido en la normatividad vigente.

Objetivo general

Realizar un informe con un enfoque en la parte estructural de las diferentes edificaciones que componen el proyecto de construcción de la unidad deportiva del municipio de Dabeiba Antioquia.

Objetivos específicos

- Verificar que la ejecución de la obra se está llevando a cabo de forma correcta, verificando la calidad de los materiales y procesos constructivos correspondientes en cada componente.
- Brindar las recomendaciones y correcciones necesarias para la correcta construcción de los diferentes elementos estructurales, siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.
- Proporcionar una oportuna respuesta a las dudas e inquietudes que presenta el contratista sobre los diferentes elementos que componen el proyecto.



Descripción del alcance

El alcance del informe presente está estipulado como parte del proceso de interventoría establecido en la minuta del convenio, que dispone que, como parte de los procedimientos a cargo de la interventoría, está el de tener un control sobre el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades llevadas a cabo, para la correcta realización de la presente obra, y que para el presente informe se centra únicamente en el componente estructural. Para este caso, se desea validar que la obra se esté desarrollando acorde a lo establecido en la etapa de diseños y que los procesos constructivos sean los óptimos para garantizar el cumplimiento de dichos requerimientos, específicamente las obras referentes al periodo comprendido entre 7 de septiembre del 2023 hasta el 6 de octubre del 2023.

Información del avance del contrato de obra

Se presenta a través de material fotográfico el avance alcanzado hasta la fecha de entrega del presente informe de las estructuras que conforman la gradería y andenes del estadio municipal y coliseo cubierto de Dabeiba. Los trabajos se han enfocado principalmente en la construcción de la estructura que compone el coliseo polideportivo, para esto se construyeron las vigas de fundación, formadas por hormigón reforzado con barras de acero corrugado, dejando instaladas las barras que componen el refuerzo de los pedestales de soporte de la estructura de cubierta, y la placa base de acero que hace la conexión entre ambos sistemas. Además, se realizó el suministro de la perfilería de acero que conforma la estructura metálica anteriormente mencionada, la cual se está armando in situ con las dimensiones correspondientes, las cuales se determinaron en el proceso de diseño estructural.



INFORME DE INERVENTORÍA



INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME DE INERVENTORÍA



SINERGIA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME DE INERVENTORÍA



SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



Observaciones realizadas.

Las actividades estructurales realizadas durante el periodo que comprende el presente informe estuvieron basadas en la estructura del coliseo cubierto. Las vigas de fundación cuentan con acero que cumple con la cuantía mínima, según lo establecido por la norma. Se realizó el vaciado del concreto siguiendo los lineamientos previamente definidos en los diseños, con una sección de 30cm x 30cm y una resistencia de 21 MPa, y con acero corrugado de diámetro #4 con una resistencia de 4200 Kg/cm². Cada vez que se realiza el vaciado de hormigón, se solicita la construcción de cilindros con el concreto utilizado, con el fin de realizar el ensayo de compresión de cilindros de concreto a 28 días.





INFORME DE INERVENTORÍA

		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13				Código: FL-001 Versión: 01 Fecha: 01/07/2017 Página: 1 de 1				
PROYECTO:	Unidad Deportiva de Dabeiba									
CLIENTE:	ICCONO S.A.S.	LOCALIZACIÓN:	Dabeiba - Antioquia							
RESPONSABLE:	Ingeniero Leonardo Correa Roldán		CONSECUTIVO:	CL-314-2023						
No.	REFERENCIA	FECHA			DIAMETRO (cm)	CARGA (kN)	TIPO DE FALLA	RESISTEN. (MPa)	RESIST. ESPECIF. (MPa)	PORCENT. DESARR. (%)
		VACIADO	FALLA	EDAD (días)						
1	Columna	25-08-23	23-08-23	28	9.9	238.6	5	31.0	21.0	147.6
2	Pilotes	22-08-23	28-08-23	28	9.9	277.8	5	35.1	21.0	171.7
3	Pilotes	30-08-23	28-08-23	28	9.8	288.1	5	38.2	21.0	181.8
4	Pilotes	32-08-23	28-08-23	28	9.9	321.8	2	41.8	21.0	199.1
5	Pilotes	02-09-23	28-08-23	28	9.9	214.4	3	26.6	21.0	169.7
6	Gratas	13-08-23	11-10-23	28	9.9	270.9	5	30.2	21.0	167.6
7	Gratas	13-08-23	11-10-23	28	9.9	365.2	3	47.4	21.0	229.9
8	V.F	25-08-23	24-10-23	28	9.8	252.2	5	33.4	21.0	159.2
9	V.F	25-08-23	24-10-23	28	9.9	303.6	5	38.4	21.0	187.8
10	Viga de fundación	28-08-23	26-10-23	28	9.9	288.1	8	37.4	21.0	178.2
11	Viga de fundación	28-08-23	26-10-23	28	9.9	300.8	5	38.1	21.0	185.8
12	V.F	29-08-23	27-10-23	28	9.9	251.8	5	32.8	21.0	165.3
13	V.F	29-08-23	27-10-23	28	9.8	265.8	5	35.1	21.0	167.3
14	V.F	30-08-23	28-10-23	28	9.9	197.4	5	25.6	21.0	122.1
15	V.F	30-08-23	28-10-23	28	9.9	188.1	8	24.4	21.0	120.4

Luego de ser fallados los cilindros de concreto en el laboratorio, se obtuvo la capacidad real de estos, donde se puede apreciar que todos presentan una resistencia mayor a los 21 MPa con los que se realizó el diseño, de forma que el concreto utilizado cumple a cabalidad.

Por otro lado, la periferia suministrada para la estructura metálica cuenta con los parámetros de calidad requerida y establecida por normatividad y en el proceso de diseño. Las piezas se están uniendo a través de soldadura in situ, siguiendo los parámetros de calidad de materiales y del diseño estructural. Se solicita al contratista que el almacenamiento de estos elementos se realice de forma que no queden expuestos a la lluvia que deteriore su calidad.



INFORME DE INERVENTORÍA

Relación de comunicados

El presente informe se entrega de parte del grupo de encargado del ámbito estructural vía correo electrónico y directamente vía WhatsApp, de este modo queda el soporte y respaldo de la entrega de estos mismos. No se tuvo durante este periodo comunicación o resolución de dudas con el contratista a cargo de la ejecución de la obra.

Se relacionan a continuación los correos electrónicos cruzados con el contratista de obra:





INFORME DE INERVENTORÍA



Sinergia Interventora y Construcción S.A.S. <interventoriadabeiba2021@gmail.com>

ACLARACION CUENTIA VIGA DE FUNDACION

1 mensaje

Leer más <leerindicacionesorden@yaho.com>

3 de octubre de 2023, 19:36

Para: Secretaría Planeación Dabeiba-entolopla <secretariaplaneacion@dabeiba-entolopla.gov.co>, "Severina 26" <severina.26@hotmail.com>, "Severina 26" <severina.26@hotmail.com>, "Sinergia Interventora Y Construcion S.A.S." <sinvestigoriadabeiba2021@gmail.com>

En oficio enviado por interventoria del 9 de septiembre la interventoria sostiene que la viga de fundacion no cumple con la cantidad minima del acero de 0.0033. Esta afirmacion solo deja ver el desconocimiento que posee quien elabora el oficio, pues la viga posee una seccion de 45x45cm, por lo que la dosificacion de acero minimo es de 45x45x0.0033= 6.68cm². La viga posee 6 barras de 102, que tienen cada una, un area de 1.27cm² barras=7.62cm² suministradas, cifra mayor a la cantidad minima. En este sentido, se advierte a la interventoria que se encuentran totalmente equivocados en su apreciación.

OFICIO DE INTERVENTORIA EST DABEIBA.pdf
30KB



Sinergia Interventora y Construcción S.A.S. <interventoriadabeiba2021@gmail.com>

Revisión del especialista a viga de fundacion

1 mensaje

Leer más <leerindicacionesorden@yaho.com>

4 de octubre de 2023, 0:58

Para: "Sinergia Interventora Y Construcion S.A.S." <interventoriadabeiba2021@gmail.com>, Secretaría Planeación Dabeiba-entolopla <secretariaplaneacion@dabeiba-entolopla.gov.co>, Infraestructura Infraestructura <infraestructura@dabeiba-entolopla.gov.co>, "Severina 26" <severina.26@hotmail.com>, "Severina 26" <severina.26@hotmail.com>

Cordial saludo

Remito revisión del Especialista estructural de la empresa constructora con respecto a la viga de fundacion que aparece diseñada en el proyecto entregado por Indepotes al municipio de Dabeiba

Atentamente,

LEONARDO CORREA ROLDAN
DIRECTOR DE OBRA

3 adjuntos

CIPMA MARIO DOMINGUEZ MAYO 2021.pdf
74KB

matricula profesional.pdf
10KB

RESPUESTA A OBSERVACION.pdf
32KB

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.



INFORME DE INERVENTORÍA

Conclusiones

A partir de lo expuesto en el presente informe de interventoría, se puede concluir que las actividades que forman parte el componente estructural de la obra se han estado realizando siguiendo los lineamientos establecidos en el diseño estructural, ejecutando todas las obras sin omitir ninguna característica de estos. Se pudo constatar que la calidad de los materiales, tanto de aceros como concretos cumplen con lo establecido en los diseños, verificado a través de ensayos de laboratorio para el caso del concreto, los cuales se presentaron en el presente informe. En cuanto a los procesos constructivos, se concluye que se ha estado trabajando de forma correcta, siguiendo las recomendaciones de la normatividad vigente y teniendo como base en todo momento los lineamientos del diseño.

Atentamente,

Deiler Palacios C.

Deiler Palacios Cortés
Ingeniero Civil
Mat. 011037-0631620 ANT

Juan Sebastián Monsalve Giraldo

Juan Sebastián Monsalve Giraldo
Ingeniero civil | M.SC. | D. Sc.
Mat. 05202233052 ANT

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
