

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	13	FECHA:	22	de	JULIO	de	2025
----------------------------	-----------	--------	-----------	----	--------------	----	-------------

PERIODO:	DEL	1		JUNIO	de	2025	AL	11	de	JUNIO	de	2025
----------	-----	----------	--	--------------	----	-------------	----	-----------	----	--------------	----	-------------

CONTRATO No:	3230	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	2022004150318
--------------	-------------	----	-------------	--------------------	----------------------

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se ubica en el corredor vial que conduce de Monquirá al municipio de Togüi, en el departamento de Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA


NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT 900.916.608-4	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR - CC.52.461.611

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO MONQUIRA NIT 901.740.222-1	JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

ADICIONALES Y PRÓRROGAS					
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO		
1	ADICIONAL EN VALOR No. 01, Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3230 DE 2023	\$ 175,669,652.93	03 MESES		
2	ADICIONAL EN VALOR N°2 Y PRORROGA No. 2	\$ 11,763,392.61	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 187,433,045.54	04 MESES Y DIEZ (10) DIAS		
VALOR INICIAL:	\$ 361,963,536.00	VALOR ADICIONALES:	\$ 187,433,045.54	VALOR TOTAL:	\$ 549,396,581.54

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	7	de	DICIEMBRE	de	2024
---	----------	----	------------------	----	-------------

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	11	de	JUNIO	de	2025
--	-----------	----	--------------	----	-------------

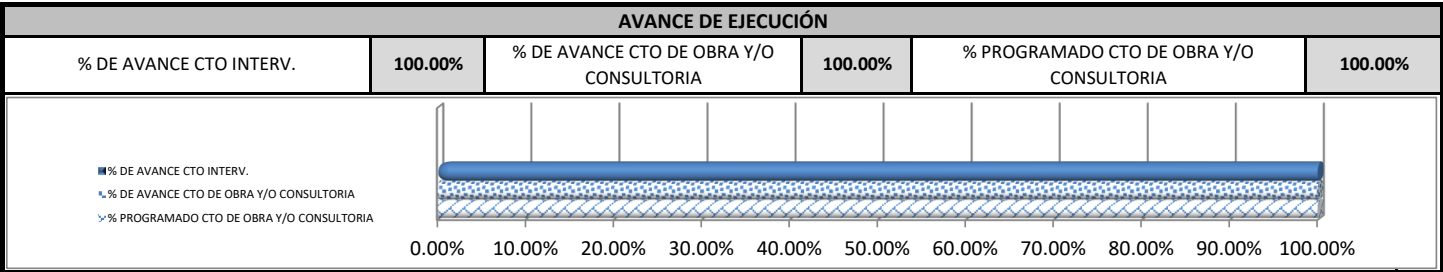

 GOBIERNO DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA							
No PÓLIZA	CSC-100035562	3/12/2024	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE		VIG. HASTA	
				dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO				17	3	2025	\$ 109,879,316.31
PRESTACIONES SOCIALES				17	3	2025	\$ 27,469,829.08
CALIDAD DEL SERVICIO				12	6	2025	\$ 109,879,316.31

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
DESCRIPCIÓN				FECHA
				dd mm aaaa
ACTA DE INICIO				8 4 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN 1				5 12 2024
ACTA DE REINICIO 1				19 12 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN 2				17 3 2025
ACTA PRORROGA 1 DE SUSPENSIÓN 2				2 4 2025
ACTA DE PRORROGA 2 DE SUSPENSIÓN 2				22 4 2025
ACTA DE REINICIO 2				30 4 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Verificación de actividades ejecutadas en obra	K4+090-K6+270
RevisiÚn de documentaciÚn entregada por el contratista	N/A
VerificaciÚn de afiliaciones del personal a seguridad social	N/A
Registro diario en bitacora de obra	N/A

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Automovil EIQ365	Transporte	100%	
Campamento Oficina		100%	
Observaciones y aclaraciones: Para el presente informe se registra utilización de equipos por parte de la interventoria, de acuerdo al contenido y evidencias del informe mensual.			

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	6	9	2024	\$ 117,239,989.00
ACTA PARCIAL No. 2	11	10	2024	\$ 64,972,455.00
ACTA PARCIAL No. 3	28	11	2024	\$ 17,555,232.00
ACTA PARCIAL No. 4	5	2	2025	\$ 93,618,755.00
ACTA PARCIAL No. 5	18	2	2025	\$ 70,483,711.00
ACTA PARCIAL No. 6	17	2	2025	\$ 38,602,063.00
ACTA PARCIAL No. 7	20	5	2025	\$ 78,854,140.00
ACTA PARCIAL No. 8	17	6	2025	\$ 13,130,578.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				\$ 494,456,923.00
Observaciones y aclaraciones:				

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
CMONQUIRÁ-CE-233 05/06/25	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME MENSUAL NO 12	
GIC-CB-333-25 05/06/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 11 DE INTERVENTORÍA	
GIC-CB-334-25 06/06/24	CONSORCIO MONQUIRÁ	SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL Y LIMPIEZA DE LA OBRA	
GIC-CB-335-25 06/06/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	REITERACIÓN COMUNICACIÓN NECESIDAD DE ACTIVIDADES DE DESMONTE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MONQUIRÁ Y TOGÜI	
CMONQUIRÁ-CE-234 11/06/25	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	ENTREGA BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA.	
GIC-CB-336-25 11/06/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	COMUNICACIÓN CMONQUIRÁ-CE-244 - ENTREGA BALANCE DE	
Observaciones y aclaraciones: Se relaciona la correspondencia acumulada cruzada entre contratista, supervisión y dependencias de la entidad			

 GOBERNACIÓN DE Boyacá 	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA										
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	1.022.363.189	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAES	79.758.293	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
JAIRÓ ANDRÉS MEZA ROSAS	13.874.430	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
DIANA PATRICIA APONTE LOZANO	60.422.959	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
IVAN ANDRES PINILLA CORTES	80.174.574	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
FABIAN ANDRES POVEDA RODRÍGUEZ	1.000.622.784	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
IVAN DARÓO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	1.022.363.189
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397
ESPECIALISTA GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAES	79.758.293
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRÓ ANDRÉS MEZA ROSAS	13.874.430
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	DIANA PATRICIA APONTE LOZANO	60.422.959
TOPÓGRAFO	IVAN ANDRES PINILLA CORTES	80.174.574
CADENERO 1	FABIAN ANDRES POVEDA RODRÍGUEZ	1.000.622.784
CADENERO 2	IVAN DARÓO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151

*Se incluyó personal nuevo en el periodo (hoja de vida con aprobación de supervisión)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se realiza verificaci�n diaria del uso de elementos de protecci�n personal por parte de los trabajadores en obra.	N/A
Se verifica la realizaci�n de preoperacionales de maquinaria, charlas de seguridad y demas actividades de seguridad y salud ocupacional.	N/A
Observaciones y aclaraciones: Se registran las actividades de control, manejo ambiental y seguridad industrial por parte de la interventoria. Lo anterior teniendo en cuenta el reporte y las evidencias del informe mensual.	

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia concreto pantallas muro No. 7A, 4000 psi	31	5	2025	145% de resistencia a los 47 días
Resistencia concreto cunetas, 3000 psi	31	5	2025	212% de resistencia a los 46 días.

 GOBERNACIÓN DE Boyacá 	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité de obra	11	5	2025	Acta de Comité


Nota: Se relacionan los comités realizados en marco de los contratos de obra e interventoría. (ver anexo. Actas de comité en informe cero, informe mensual

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de supervisión No.1	8	4	2024	7	5	2024	
Informe de supervisión No.2	8	5	2024	7	6	2024	
Informe de supervisión No.3	8	6	2024	7	7	2024	
Informe de supervisión No.4	8	7	2024	7	8	2024	
Informe de supervisión No.5	8	8	2024	7	9	2024	
Informe de supervisión No.6	8	9	2024	7	10	2024	
Informe de supervisión No.7	8	10	2024	7	11	2024	
Informe de supervisión No.8	8	11	2024	7	12	2024	
Informe de supervisión No.9	19	12	2024	18	1	2024	
Informe de supervisión No.10	19	1	2025	18	2	2025	
Informe de supervisión No.11	19	2	2025	17	3	2025	
Informe de supervisión No.12	30	4	2025	31	5	2025	

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
Luego de realizo comité de obra y verificación en campo, se procede con el trámite administrativo de actas de Terminación, posterior a esto actas de recibo con recorrido previo de interventoría, dejando constancia como informe 13, como último de los periodos contractuales de seguimiento

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

FIRMA:	
NOMBRE:	JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

 GOBERNACIÓN DE Boyacá Contratación	PUBLICADO MARILYN XIOMARA PACHECO BUENO Fecha: 03/09/2025
--	--

GIC-GB-337-25

Bogotá, D.C., 16 de junio de 2025

Ingeniero

JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Supervisor de proyecto

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**GOBERNACIÓN DE BOYACA****DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**

Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá

despacho.infraestructura@boyaca.gov.co

Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá”.

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 53 - Contrato de Interventoría No. 3230-2023


Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite los informes semanales para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 53	Del 26/05/25 al 01/06/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**Luz Andrea Fajardo Corredor**

Representante legal

Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Anexo: Informes Semanales No. 53

Copia: Archivo

Elaboró: NDG

Revisó: EAO



I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENCIÓN:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONQUIRÁ			INTERVENIOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No:	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	\$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No:	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	\$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	9/04/2024	VALOR ADICIONES:	\$ 2.556.286.001,18	FECHA DE INICIO:	9/04/2024	VALOR ADICIONES:	\$ 187.433.045,54
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 7.492.887.854,32	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2025	VALOR ACUMULADO:	\$ 549.396.581,54
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/06/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ 1.480.980.555,96	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/06/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -
		VALOR AMORTIZADO:	\$ 1.480.980.555,96			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4.936.601.853	\$ 2.556.286.001		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 935.457.124	\$ 2.556.286.001		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 361.963.536	\$ 11.763.393		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 129.480.171			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 232.483.365	\$ 11.763.393		

INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	\$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	\$	175.669.652,93	
ADICIÓN 2	\$	11.763.392,61	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	549.396.581,54	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	539.222.570,77	98,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	539.222.570,77	98,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	10.174.010,77	2,81%
	\$	10.174.010,77	2,81%
Observaciones: N.A			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	\$ 1.480.980.555,95
Amortizado \$	\$ 1.480.980.555,95
Saldo \$	\$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	97,09%	Avance o Atraso Físico %	-0,83%
Meta Física Ejecutada %	96,25%	Avance tiempo contrato	98,93%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	99.52%	98.68%
II. VARIOS	86.06%	70.25%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	85.75%	97.59%
TOTAL OBRA	97.09%	96.25%

TRAMO VÍA MONQUIRÁ-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELÉCTRICA 100 KVA	1	1
UNIDAD ELÉCTRICA 50 HP	1	1
UNIDAD HIDRÁULICA 30 HP	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTO CARGANTE	1	1
SALINARES		2
Total	5	13

Equipo mínimo correspondiente al existido en el sitio de condiciones.

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:	
----------------	--

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


7.6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.	
Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.	
Se ejecutaron actividades de relleno con material de base compactado en muros No. 1, 11, 7A, 12, 13, 14 y 15.	
Se realizaron trabajos de instalación de riego de liga y mezcla asfáltica en muros No. 1, 11, 7A, 12, 13, 14 y 15	
Se ejecutaron actividades de instalación de mezcla asfáltica en caliente en muros No. 1, 11, 7A, 12, 13, 14 y 15	

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- * Se efectuarán trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muros No. 14 y 15.
- * Se realizarán actividades de corte y excavación para construcción de cunetas en muros No. 14 y 15.
- * Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



FECHA

10/6/2025
(Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

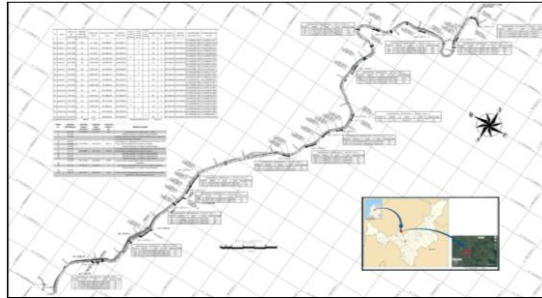

PUNTOS CRÍTICOS VÍA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 1.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.

FECHA

10/6/2025
(Día / Mes / Año)



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 7A.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 7A.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 11.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 11.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 12.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 12.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 13.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 13.

	INFORME SEMANAL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
		FECHA 10/6/2025 (Día / Mes / Año)
Muro No. 14 abscisa K6+140 Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 14. Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 14.		
Muro No. 15 abscisa K6+270 Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 15. Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 15.		
DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA * A través del comunicado No. GIC-GB-331-25 del 28 de mayo de 2025, la interventoría remite al contratista Reiteración comunicación GIC-GB-255-24 Solicitud documentación para liquidación contrato de obra. * Por medio del oficio No. GIC-GB-330-25 del 27 de mayo de 2025, la interventoría remite al supervisor del contrato Entrega Informe Semanal No. 52 - Contrato de Interventoría No. 3230-2023. * Con el comunicado No. GIC-GB-332-25 del 30 de mayo de 2025, la interventoría remite al contratista Solicitud de inicio de actividades de cunetas. * El día 30 de mayo del 2025 se realiza comité de seguimiento de obra, con presencia de supervisor del contrato, contratista e interventoría, cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA NOMBRE: ING. EDGAR ARAGÓN OTERO Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-340-25

Bogotá, D.C., 19 de junio de 2025

Ingeniero

JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Supervisor de proyecto

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**GOBERNACIÓN DE BOYACA****DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**

Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá

despacho.infraestructura@boyaca.gov.co

Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá”.

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 54 - Contrato de Interventoría No. 3230-2023


Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite los informes semanales para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 54	Del 02/06/25 al 08/06/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**Luz Andrea Fajardo Corredor**

Representante legal

Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Anexo: Informes Semanales No. 54

Copia: Archivo

Elaboró: NDG

Revisó: EAO



I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	\$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	\$	175.669.652,93	
ADICIÓN 2	\$	11.763.392,61	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	549.396.581,54	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	549.396.581,54	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	549.396.581,54	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	10.174.010,77	2,81%
	\$	10.174.010,77	2,81%
Observaciones: N.A			

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JT454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELÉCTRICA 100 KVA	1	1
UNIDAD ELÉCTRICA 50 HP	1	1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
AUTO CARGANTE	1	1
SAL TARIRES	2	2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:	
----------------	--

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizarán actividades de corte y excavación para construcción de cunetas en muros No. 14 y 15.

* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topografica.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	

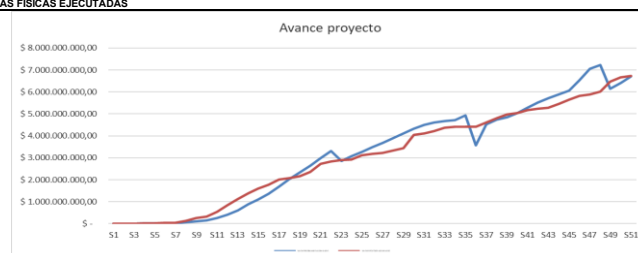

FECHA

8/06/2025
(Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

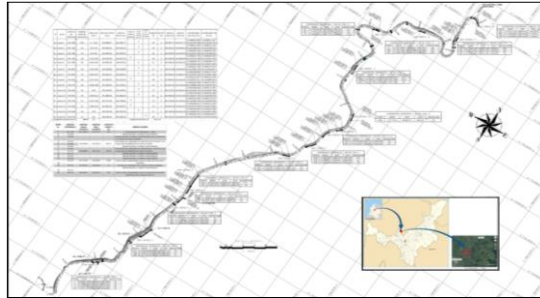

PUNTOS CRÍTICOS VÍA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 1.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.

FECHA

8/06/2025
(Día / Mes / Año)



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.



Carpeta asfáltica en muro No. 7A.



Carpeta asfáltica en muro No. 7A.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 11.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 11.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 12.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 12.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 13.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 13.

	INFORME SEMANAL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
		FECHA 8/06/2025 (Día / Mes / Año)
Muro No. 14 abscisa K6+140  Demolición de cunetas antiguas en muro No. 14. Excavación manual y amarre de acero de refuerzo para cunetas en muro No. 14.		
Muro No. 15 abscisa K6+270  Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en muro No. 15. Excavación para cunetas en muro No. 15.		
DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA * A través del comunicado No.GIC-GB-335-25 del 6 de junio de 2025, la interventoría remite al supervisor del contrato Necesidad de actividades de desmonte, limpieza y mantenimiento del corredor vial que comunica los municipios de Monquirá y Togui. * Por medio del oficio No.GIC-GB-334-25 del 6 de junio de 2025, la interventoría remite al contratista Solicitud de ingreso de personal y limpieza general de la obra. * Con el comunicado No. GIC-GB-333-25 del 5 de junio de 2025, la interventoría remite al supervisor del contrato Remisión Informe Mensual No. 12 de Interventoría - Contrato de Interventoría No. 3230-2023.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA  NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO Matricula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-346-25

Bogotá, D.C., 01 de julio de 2025

Ingeniero

JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Supervisor de proyecto

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**GOBERNACIÓN DE BOYACA****DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**

Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá

despacho.infraestructura@boyaca.gov.co

Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá”.

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 55 - Contrato de Interventoría No. 3230-2023


Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite los informes semanales para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 55	Del 09/06/25 al 11/06/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**Luz Andrea Fajardo Corredor**

Representante legal

Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Anexo: Informes Semanales No. 55

Copia: Archivo

Elaboró: NDG


Revisó: EAO



FECHA

11/06/2025
(Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

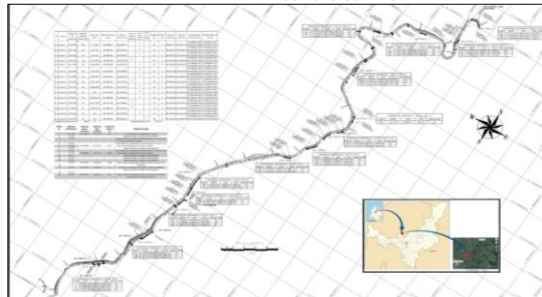

PUNTOS CRÍTICOS VÍA MONQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 1.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.

FECHA

11/06/2025
(Día / Mes / Año)

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.

Muro No. 07A abscisa K5+080



Carpeta asfáltica en muro No. 7A.



Carpeta asfáltica en muro No. 7A.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 11.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 12.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 12.

Muro No. 13 abscisa K5+910



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 13.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 13.

	INFORME SEMANAL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
		FECHA 11/06/2025 (Día / Mes / Año)
Muro No. 14 abscisa K6+140  Fundida de cunetas en concreto en muro No. 14. Fundida de cunetas en concreto en muro No. 14.		
Muro No. 15 abscisa K6+270  Fundida de cunetas en concreto en muro No. 15. Fundida de cunetas en concreto en muro No. 15.		
DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA * A través del comunicado No.CMONIQUIRÁ-CE-244 del 10 de junio de 2025, el contratista remite a la interventoría Entrega Balance de cantidades de obra. * El día 11 de junio de se realiza recorrido en obra con presencia del supervisor del contrato, contratista e interventoría para recibir las obras a satisfacción y quedando unos pendientes de remates de cunetas que se ejecutarán en el transcurso de la siguiente semana.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA NOMBRE: ING. EDGAR ARAGÓN OTERO Matrícula Profesional No.: 25202228695 CND
