

 I&D Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".	
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 1 de 26

CONTRATO No. 056 de 22 de octubre de 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS - I&D

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

26/06/2025 AL 30/06/2025

BOGOTÁ D.C, septiembre 15 de 2025

 CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 2 de 26

INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría tiene como objetivo evaluar el cumplimiento del contrato de "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ celebrado entre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas y la empresa INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS - I&D., en el periodo 26/06/2025 al 30/05/2025, con el fin de garantizar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato 052 del 18 de septiembre de 2024 y las disposiciones legales aplicables. La interventoría se realiza con base en las inspecciones de seguimiento, revisión de documentos y el análisis de los resultados entregados hasta la fecha.

Contextualización:

CONTRATO No.	: 056 de 22 de octubre del 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima Cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: MC-25 de 2024
OBJETO	: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".
LOCALIZACIÓN	: Sede Judicial AYDÉE ANZOLA LINARES (CAN), ubicado en la carrera 57 # 43 - 91 en la ciudad de Bogotá.
VALOR	: \$ 76'133.450 M/CTE
PLAZO	: Cuatro (4) meses sin superar la vigencia 2024
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO	: 24 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 31 de diciembre del 2024
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	: INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS - I&D
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	: Ing. GUSTAVO ADOLFO SERRANO DÍAZ

 Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 3 de 26
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024		

1. OBJETIVOS DEL INFORME

El objetivo principal de este informe es evaluar y documentar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato 052 del 18 de septiembre de 2024 en el periodo comprendido entre el 26 de junio 2025 y el 30 de junio de 2025, para la optimización y modernización de la iluminación Sede Judicial AYDÉE ANZOLA LINARES (CAN), ubicada en la carrera 57 # 43 - 91 en la ciudad de Bogotá. Los objetivos específicos de este informe son los siguientes:

1. Verificar el cumplimiento de las actividades pendientes de entrega contempladas en periodo entre el 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025
2. Relacionar lineamientos de calidad resultantes de proceso de certificación ante el operador de red encargado de realizar certificaciones de red.
3. Comprobar el avance financiero y las certificaciones de pago emitidas por el contratista, verificando que se ajusten a los entregables y condiciones contractuales.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA

La interventoría se ha llevado a cabo mediante los siguientes procedimientos:

1. Revisión de Documentación Contractual

- Análisis detallado del contrato y sus anexos.
- Verificación de las especificaciones técnicas del proyecto.
- Revisión de actas de inicio, cronogramas y planes de ejecución.
- Evaluación de solicitudes de modificación y prórrogas contractuales.
- Aplicación de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 en los procesos de control contractual.

2. Verificación del Cumplimiento de Normas Legales y Contractuales

- Evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad laboral.
- Supervisión de la gestión ambiental en la ejecución del contrato.
- Revisión de documentación legal del contratista, como licencias y certificaciones.
- Aseguramiento del cumplimiento de normas técnicas en instalación y operación.
- Aplicación del Decreto 1073 de 2015 en lo referente a sistemas de generación eléctrica, enfatizando la normativa energética en relación con el proyecto fotovoltaico.

3. Evaluación Financiera y Control de Avances

- Seguimiento del presupuesto ejecutado frente al aprobado.
- Verificación de facturación y certificaciones de pago.
- Análisis de costos adicionales derivados de modificaciones del contrato.
- Identificación de desviaciones presupuestales y aplicación de correctivos.

4. Salud y Seguridad en el Trabajo

- Aplicación de la Resolución 0312 de 2019 en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Indicadores de resultados desde la implementación del SGSST

 Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 4 de 26
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024		

5. Gestión Ambiental

- Cumplimiento de la Resolución 1401 de 2017 sobre manejo de residuos de construcción y demolición.
- Implementación de un plan de manejo ambiental para minimizar el impacto de la obra.
- Entrega de certificación de disposición final RESPEL.

6. Cronograma de dedicación al proyecto de parte de la interventoría

De acuerdo con las condiciones del contrato No. 056 de 22 de octubre de 2024:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

En el periodo del 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025 se contó con un personal de interventoría con la siguiente dedicación para lo pertinente al cierre de contrato de obra.

- DIRECCION 50%
- INGENIERO RESIDENTE 50%
- INGENIERO RESIDENTE 100%
- PROFERSIONAL SST 100 %

3. AVANCES POR PERIODO

1. Octavo Periodo (26/06/2025 – 30/06/2025)

- Residuos aprovechables: Se realizo el almacenamiento temporal y despacho del material aprovechable el día 02 de julio de 2025, se anexa la respectiva remisión de recogida, a la espera del certificado de disposición final.
- Residuos peligrosos y no aprovechables: Se realiza el almacenamiento de los residuos y el 01 de julio de 2025 se procede a la entrega para gestión final de residuos de aparatos electrónicos no peligros.
- Se entrega por parte del consorcio UT FEXXA-COINSI certificado de disposición de residuos especiales el 20 de agosto 2025.



 Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".							
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025						Versión: 1	
							Página: 5 de 26	
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024								

4. RESUMEN DEL PROYECTO

En el marco del Contrato No. 052 de 2024, suscrito entre la Unión Temporal UT Coinsi – Fexxa y la Rama Judicial de Cundinamarca, se presentan las cantidades de obra ejecutadas en la Sede Judicial Aydée Anzola Linares – CAN, correspondientes al período comprendido entre el 26 y el 30 de junio de 2025.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA No 7		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
1	SÓTANO 1								
SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS									
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED INCRUSTAR DIAMETRO REDONDO 32 W	UN	0	\$ 180.178	5	\$ 900.890,00	52	\$ 9.369.256	100%
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES					\$ -			
1,07	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO BALA	UN	62	\$ 22.556	9	\$ 203.004,00	61	\$ 1.375.916	100%
1,08	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO CUADRADA	UN	340	\$ 22.556	5	\$ 112.780,00	338	\$ 7.623.928	100%
	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO					\$ -			
1,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x16AWG DESDE CAJA DE PASO CON ACCESORIO DE FIJACIÓN Y EMPLAME ELECTRICO	UN	240	\$ 12.335	13,2	\$ 162.822,00	324,00	\$ 3.996.540	100%
1,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN ZONA DE	UN	27	\$ 93.663	10	\$ 936.630,00	29	\$ 2.716.227	100%





Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Versión: 1

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

Página: 6 de 26

	ILUMINACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA CUMPLIR REQUERIMIENTO RETILAP .								
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN. SE INCLUYE INSTALACIÓN DE CURVAS, UNIONES, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	185	\$ 44.850	81,84	\$ 3.670.524,00	110,00	\$ 4.933.500	100%
	OBRAS CIVILES					\$ -			
1,28	REPARACION DE MURO AFECTADO POR INTERRUPTOR DE ENCENDIDO POR LUMINARIAS NUEVAS	UN	8	\$ 33.743	9	\$ 303.687,00	9	\$ 303.687	100%
2	PISO 1					\$ -			
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS					\$ -			
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED INCRUSTAR DIAMETRO REDONDO 32 W	UN	0	\$ 180.178	4	\$ 720.712,00	34	\$ 6.126.052	100%
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA REF 919406020731 PHILIPS 5 W	UN		\$ 126.032	13	\$ 1.638.416,00	24	\$ 3.024.768	100%
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES								
2,7	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO BALA	UN	24	\$ 22.556	8	\$ 180.448,00	24	\$ 541.344	100%
2,8	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO CUADRADA	UN	370	\$ 22.556	134	\$ 3.022.504,00	370	\$ 8.345.720	100%



Calle 63 # 22 – 10
Manizales – Colombia



Teléfono: (606) 8793009
Celular: +57 311 4210825



soluciones@iyd.com.co
www.iyd.com.co



Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

Versión: 1

Página: 7 de 26

	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO					\$ -			
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PROVOLT	UN	36	\$ 1.780.296	2	\$ 3.560.592,00	19	\$ 33.825.624	100%
2,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA 4 BOTONES PARA ATENUAR LUMINARIA A TRAVES DE SENSOR	UN	25	\$ 359.644	7	\$ 2.517.508,00	15	\$ 5.394.660	100%
2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO	UN	11	\$ 629.255	5	\$ 3.146.275,00	15	\$ 9.438.825	100%
2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE CONTROL DE LAMPARA A LAMPARA CON CABLE DE CONTROL DE 2x20 AWG QUE VA EN LAS LUMINARIAS QUE UTILIZAN ATENUADOR DE 0-10v	ML	560	\$ 11.331	587,3	\$ 6.654.696,00	1005,0	\$ 11.387.655	100%
2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x16AWG DESDE CAJA DE PASO CON ACCESORIO DE FIJACIÓN Y EMPLAME ELECTRICO	ML	260	\$ 12.335	67,20	\$ 828.912,00	320,40	\$ 3.952.134	100%
2,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN ZONA DE ILUMINACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA CUMPLIR REQUERIMIENTO RETILAP .	UN	36	\$ 93.663	13	\$ 1.217.619,00	24	\$ 2.247.912	100%
2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAD ELECTRICA PARA INTERRUPTOR	UN	7	\$ 145.232	7	\$ 1.016.624,00	15	\$ 2.178.480	100%



Calle 63 # 22 – 10
Manizales – Colombia



Teléfono: (606) 8793009
Celular: +57 311 4210825



soluciones@iyd.com.co
www.iyd.com.co



Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Versión: 1

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

Página: 8 de 26

2,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	5	\$ 27.298	6	\$ 163.788,00	11	\$ 300.278	100%
2,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UN	0	\$ 35.833	1	\$ 35.833,00	4	\$ 143.332	100%
2,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN. SE INCLUYE INSTALACIÓN DE CURVAS, UNIONES, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	ML	185	\$ 44.850	110	\$ 4.933.500,00	110	\$ 4.933.500	100%
	OBRAS CIVILES					\$ -			
2,26	REPARACION DE HUECO LUMINARIA RETIRADA	UN	165	\$ 21.567	74	\$ 1.595.958,00	355	\$ 7.656.285	100%
2,30	PINTURA DE TECHO ZONAS AFECTADAS POR ADECUACIONES REALIZADAS PARA SALIDAS ELECTRICAS EN CONTROL.	M2	12	\$ 28.836	370,48	\$ 10.683.161,00	1412,00	\$ 40.716.432	100%
3	PISO 2					\$ -			
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS					\$ -			
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LEDVANCE DOWNLIGHT RT 14W/18W/24W 4CCT	UN	26	\$ 295.958		\$ -	0	\$ -	
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED INCRUSTAR DIAMETRO REDONDO 32 W	UN	0	\$ 180.178	5	\$ 900.890,00	26	\$ 4.684.628	100%
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA REF 919406020731	UN		\$ 126.032	6	\$ 756.192,00	24	\$ 3.024.768	100%



Calle 63 # 22 – 10
Manizales – Colombia



Teléfono: (606) 8793009
Celular: +57 311 4210825



soluciones@iyd.com.co
www.iyd.com.co



Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

Versión: 1

Página: 9 de 26

	PHILIPS 5 W								
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES					\$ -			
3,7	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO BALA	UN	21	\$ 22.556	21	\$ 473.676,00	21	\$ 473.676	100%
	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO					\$ -			
3,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERNOR DE MOVIMIENTO	UN	11	\$ 629.255	3	\$ 1.887.765,00	10	\$ 6.292.550	100%
3,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x16AWG DESDE CAJA DE PASO CON ACCESORIO DE FIJACIÓN Y EMPLAME ELECTRICO	ML	350	\$ 12.335	147	\$ 1.813.245,00	310,20	\$ 3.826.317	100%
3,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN ZONA DE ILUMINACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA CUMPLIR REQUERIMIENTO RETILAP .	UN	27	\$ 93.663	6	\$ 561.978,00	24	\$ 2.247.912	100%
2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAD ELECTRICA PARA INTERRUPTOR	UN	5	\$ 145.232	2	\$ 290.464,00	2	\$ 290.464	100%
3,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UN	2	\$ 35.833	2	\$ 71.666,00	2	\$ 71.666	100%
3,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN. SE INCLUYE INSTALACIÓN DE CURVAS, UNIONES, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS DE	ML	185	\$ 44.850	115	\$ 5.157.750,00	115	\$ 5.157.750	100%



Calle 63 # 22 – 10
Manizales – Colombia



Teléfono: (606) 8793009
Celular: +57 311 4210825



soluciones@iyd.com.co
www.iyd.com.co



Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Versión: 1
Página: 10 de 26

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

	DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.								
	OBRAS CIVILES					\$ -			
3,26	REPARACION DE HUECO LUMINARIA RETIRADA	UN	165	\$ 21.567	45	\$ 970.515,00	366	\$ 7.893.522	100%
3,28	REPARACION DE MURO AFECTADO POR INTERRUPTOR DE ENCENDIDO POR LUMINARIAS NUEVAS	UN	8	\$ 33.743	2	\$ 67.486,00	2	\$ 67.486	100%
4	PISO 3					\$ -			
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS					\$ -			
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA REF 919406020731 PHILIPS 5 W	UN		\$ 126.032	3	\$ 378.096,00	22	\$ 2.772.704	100%
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES					\$ -			
4,8	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO CUADRADA	UN	344	\$ 22.556		\$ -	350	\$ 7.894.600	100%
	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO					\$ -			
4,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN. SE INCLUYE INSTALACIÓN DE CURVAS, UNIONES, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	ML	124	\$ 44.850	14,3	\$ 641.355,00	109,00	\$ 4.888.650	100%
5	PISO 4					\$ -			
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES					\$ -			



Calle 63 # 22 – 10
Manizales – Colombia



Teléfono: (606) 8793009
Celular: +57 311 4210825



soluciones@iyd.com.co
www.iyd.com.co



Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

Versión: 1
Página: 11 de 26

5,7	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO BALA	UN	6	\$ 22.556	6	\$ 135.336,00	6	\$ 135.336	100%
6	PISO 5					\$ -			
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES					\$ -			
6,70	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO BALA	UN	6	\$ 22.556	6	\$ 135.336,00	6	\$ 135.336	
	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO					\$ -			
6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN. SE INCLUYE INSTALACIÓN DE CURVAS, UNIONES, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	UN	124	\$ 44.850	99	\$ 4.440.150,00	109,58	\$ 4.914.663	100%
7	PISO 6					\$ -			
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES					\$ -			
7,8	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO BALA	UN	21	\$ 22.556	6	\$ 135.336,00	6	\$ 135.336	100%
7,10	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO HERMETICA	UN	9	\$ 22.556	4	\$ 90.224,00	4	\$ 90.224	100%
	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO					\$ -			
7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAD ELECTRICA PARA INTERRUPTOR	UN	3	\$ 145.232	2	\$ 290.464,00	2	\$ 290.464	100%
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	2	\$ 27.298	2	\$ 54.596,00	2	\$ 54.596	100%



Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Versión: 1

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

Página: 12 de 26

7,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN. SE INCLUYE INSTALACIÓN DE CURVAS, UNIONES, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	ML	124	\$ 44.850	84,7	\$ 3.798.795,00	113,05	\$ 5.070.293	100%
8,00	CERTIFICACIONES					\$ -			
8	INSPECCION Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETILAP 2024	GL	1	\$ 29.150.331	1	\$ 29.150.331,00	1	\$ 29.150.331	100%
9,00	ITEM NO PREVISTOS					\$ -			
NP1	Suministro e instalación de caja 12*12*5" metálica con pintura electrostática para empalme de circuitos de iluminación en bandeja tipo malla. Incluye salida de tubo 3/4"	UN		\$ 48.005	81,00	\$ 3.888.405,00	220	\$ 10.561.100	100%
NP3	Suministro e instalación de cable 3*12 AWG LSHF salida para lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	ML		\$ 15.848	891,69	\$ 14.131.503,00	8870,33	\$ 140.576.990	100%
NP4	Desmante de cable existente 3*12 AWG	ML		\$ 5.594		\$ -	0	\$ -	
NP5	Suministro e instalación de conductor desnudo en cable de cobre 6 AWG para la puesta a tierra de bandeja tipo malla.	ML		\$ 21.743	1358,00	\$ 29.526.994,00	1358,00	\$ 29.526.994	100%
NP6	Suministro e instalación de registro de inspección tipo escotilla en marco de aluminio blanco en cielo raso de 30*30 cm	UN		\$ 40.813	6,0	\$ 244.878,00	119,00	\$ 4.856.747	100%



Calle 63 # 22 – 10
Manizales – Colombia



Teléfono: (606) 8793009
Celular: +57 311 4210825



soluciones@iyd.com.co
www.iyd.com.co



Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Versión: 1

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

Página: 13 de 26

NP7	Suministro e instalación de tubería conduit pvc sch40-3/4" para ramales de iluminación. Se incluye instalación de curvas, uniones, terminales, soportes, accesorios de derivación y fijación.	ML		\$ 34.773	130,65	\$ 4.543.092,00	4550,47 00	\$ 158.233.493	100%
NP8	Suministro e instalación de tubería conduit pvc sch40 1". Incluye instalación de curvas, uniones, terminales, soportes, accesorios de derivación y fijación.	ML		\$ 38.280	35,20	\$ 1.347.456,00	1100,00	\$ 42.108.000	100%
NP9	Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado led de 34 w 60 x 60 . Driver 120-277 v . Dimerizable. Philips incluye el marco en aluminio o similar de sobreponer	UN		\$ 218.460	40	\$ 8.738.400,00	1004,00	\$ 219.333.840	100%
NP10	Suministro e instalación de luminaria rectangular philips panel 34w 300x1200 4000k incluye el marco en aluminio o similar de sobreponer	UN		\$ 222.149	6	\$ 1.332.894,00	230	\$ 51.094.270	100%
NP11	Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado led de 34,9 w 60 x 60 . Driver 100-227 v . Dimerizable. Troffer modul incluye el marco en aluminio o similar de sobreponer	UN		\$ 218.410	4	\$ 873.640,00	112	\$ 24.461.920	100%
NP16	PROCESO OPERADOR DE RED, RETIE CERTIFICACIÓN SOLAR ORGANISMO AVALADO POR LA ONAC, Presentación y documentación Incentivos tributarios ley 1715 - CERTIFICADO Para obtener el certificado	UN		\$ 23.100.000	1	\$ 23.100.000,00	1	\$ 23.100.000	100%



Calle 63 # 22 – 10
Manizales – Colombia



Teléfono: (606) 8793009
Celular: +57 311 4210825



soluciones@iyd.com.co
www.iyd.com.co



Conectando Culturas
Con Energía
NIT. 900448366-9

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Versión: 1

CONTRATO No.
056 de 22 de
octubre del 2024

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA
26/06/2025 AL 30/06/2025

Página: 14 de 26

	de la UPME,								
NP2 2	Suministro e instalacion de breaker enchufables 1*20A para el cambio de los existentes, debido a que actualmente se estan compartiendo circuitos de iluminacion y tomas en la misma proteccion	UN		\$ 42.477	130	\$ 5.522.010,00	130,0	\$ 5.522.010	100%
NP2 3	Suministro e instalacion de tablero de 30 circuitos trifasico con espacio para totalizador equipo con todas las protecciones totalizador y protecciones enchufables aproximadamente 24uni, Incluye desmontaje del existen, peinado y marquillado	UN		\$ 2.620.070	1	\$ 2.620.070,00	1,0	\$ 2.620.070	100%
NP2 4	Suministro e instalacion de sensor ON OFF ODC0S-11W LEVITON de presencia hasta 3,5 mts de cobertura	UN		\$ 296.225	83	\$ 24.586.675,00	141,0	\$ 41.767.725	100%
NP2 5	Suministro, logistica, serguro, transporte, izaje e instalacion de ESTRUCTURA SOLAR FV PARA CUBIERA PISO - Producido bajo normas del Aluminium Association y ANSI H35.2 en relacion a propiedades mecanicas, composicion quimica y tolerancias dimensionales.construido con aleacion de aluminio 6005 T6	M2		\$ 263.267	365,84	\$ 96.313.599,00	521,40	\$ 137.268.105	100%
NP2 6	Bajante en acometida eléctrica trifásica 500kcm. Incluye tubería EMT, Tubería	ML		\$ 1.037.576	55,22	\$ 57.297.691,00	55,22	\$ 57.297.691	100%



Calle 63 # 22 – 10
Manizales – Colombia



Teléfono: (606) 8793009
Celular: +57 311 4210825



soluciones@iyd.com.co
www.iyd.com.co

		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.						
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024		INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025				Versión: 1		
						Página: 15 de 26		
	IMC, coraza americana, curvas, uniones, caja de paso, cable de tierra, perforación sobre placa, accesorios de conexión y soportería.							
	SUBTOTAL				\$ 374.475.836,00		\$ 2.236.247.860,00	100,000%
	ADMINISTRACION			20,00%	\$ 74.895.167,20		\$ 447.249.572,00	100,000%
	IMPREVISTOS			1,00%	\$ 2.242.090,46		\$ 22.362.479,29	100,000%
	UTILIDAD			5,00%	\$ 18.723.791,80		\$ 111.812.393,00	100,000%
	IVA SOBRE U			19,00%	\$ 3.557.520,44		\$ 21.244.354,67	100,000%
	COSTO TOTAL CONTRATO				\$ 473.894.405,90		\$ 2.838.916.658,96	100,00%

De acuerdo a las actividades de obra ejecutadas por el contratista al 30 de junio de 2025, la interventoría informa que se ejecutó el 100% de estas; dando cumplimiento a lo establecido de forma contractual y de manera correcta, garantizando la estabilidad y funcionamiento de todo lo instalado.

 I&D Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".	
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 16 de 26

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO

Dar a conocer las diferentes actividades relacionadas con la gestión en seguridad y salud en el trabajo, siendo estas acordes con la legislación actual y políticas de gestión de la obra, con el fin de asegurar el cumplimiento de requisitos de riesgos laborales, alcanzando permanentemente la mejora continua.

Ingreso de contratistas

Dentro de los documentos iniciales el contratista debe entregar los documentos correspondientes al SG-SST, dando cumplimiento a la legislación vigente; como herramienta fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y prevenir accidentes laborales en las empresas y estos deben estar aterrizados a las actividades que se van a ejecutar en el proyecto.

Las actividades adelantadas en el corte del 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025, se relacionan a las actividades pendientes de entrega por parte del contratista **UT FEXXA-COINSI**, de acuerdo a lo establecido en el acta de recibo del 30 de junio de 2025:

1. La Interventoría en conformidad con las funciones desempeñadas conceptúa que: "El contratista se encuentra con un avance físico del 100%, del contrato que cumplió satisfactoriamente".
2. La interventoría consigna que se recibe la obra con observaciones para subsanación que deberán ser aportadas antes de la fecha de cobro final:
 - Entrega de certificado de disposición final de residuos especiales
 - Entrega de dictámenes RETIE y Retilap emitidos por el operador de red

Retiros personal

Durante el 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025 no se presentaron retiros de personal.

Personal en el proyecto

Para que el personal pueda ingresar, el contratista debe entregar a la interventoría la documentación mencionada para validación y aprobación. Cuando la interventoría revisa, el contratista realiza la inducción por parte de su profesional SST, todo el personal estará debidamente uniformado y en las áreas de trabajo deberán portar los EPP" S de acuerdo a la actividad que van a realizar.

Inducción y capacitación

No se han realizado actividades de capacitaciones ni charlas de seguridad durante el 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025.

 CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 17 de 26

Para el periodo del 26 de junio 2025 al 30 de junio, se presentan los indicadores de resultados referentes a la implementación del SG-SST:


REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

DURANTE EL 26 DE JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025 NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES LABORALES, NI REPORTE DE ENFERMEDADES LABORALES
No se presentaron accidentes, ni reporte de enfermedades laborales

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION SST


INDICE DE FRECUENCIA

Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo

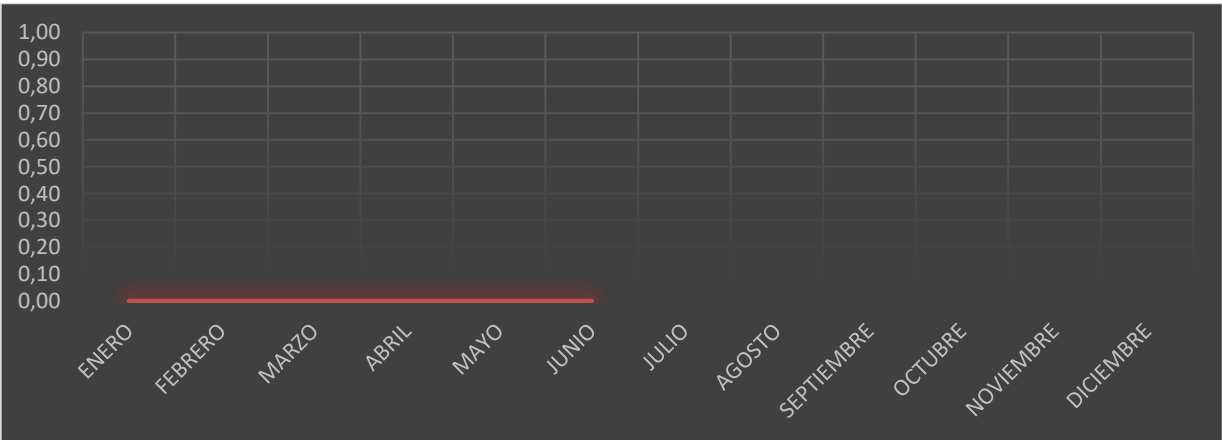

INDICE DE SEVERIDAD


Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo.

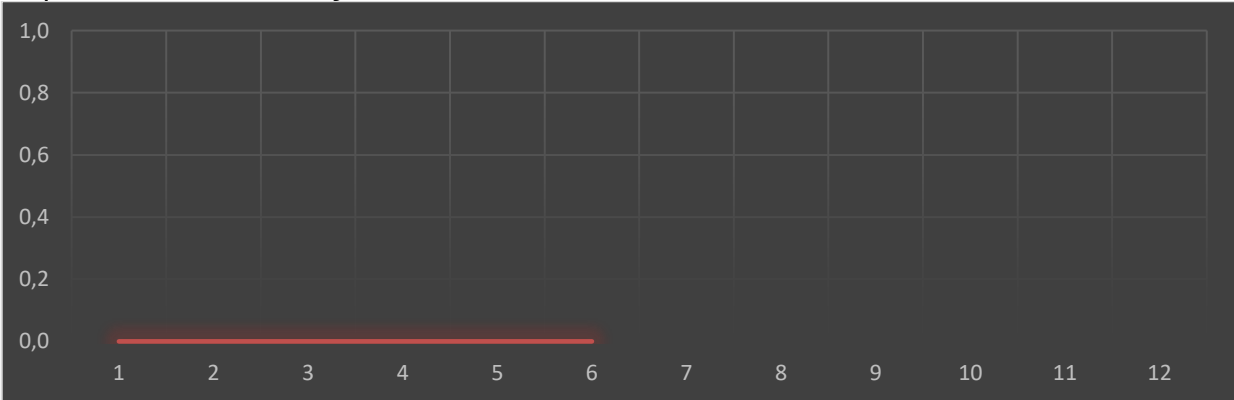

 Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 18 de 26
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024		


PROPORCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES

En el periodo del 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025, el 0,0% de accidentes de trabajo fueron mortales.

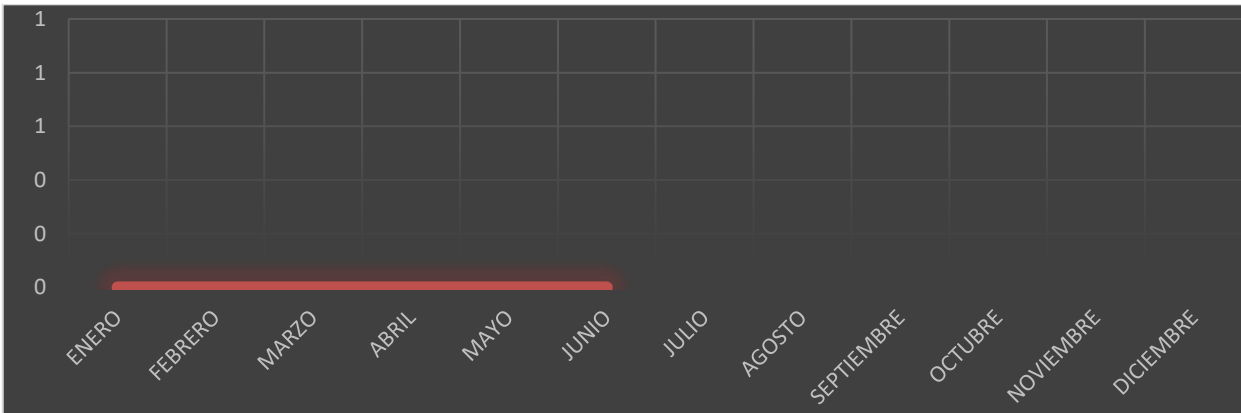

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL


Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo de 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025.



PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL


Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo de 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025.

 Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 19 de 26
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024		

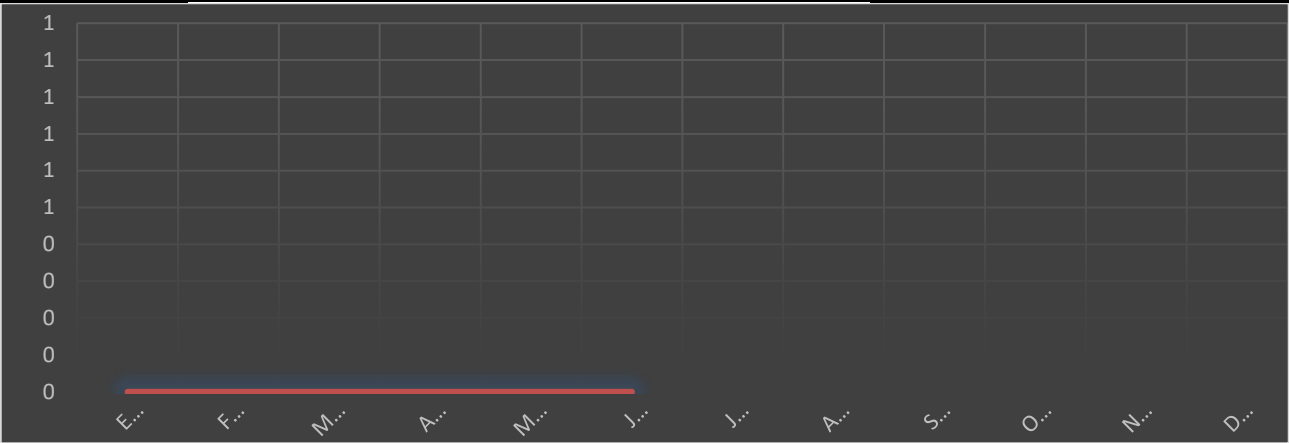

PORCENTAJE DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA

En el periodo de 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025 se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica

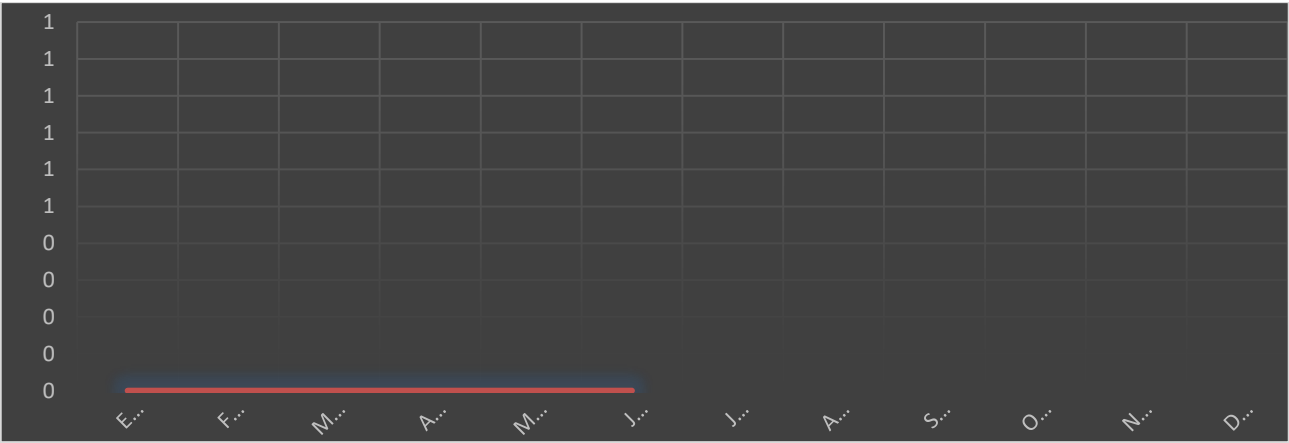

PROPORCION DE AUSENTISMO

En el periodo de 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025 se perdió 00% de días programados de trabajo por incapacidad médica

 CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 21 de 26

Se adjuntan anexos de evidencias y registros suministrados por el contratista **UTE FEXXA-COINSI**:

1. Registro de certificado de disposición final RESPEL.
2. Registro y certificado dictamen RETIE.

Se adjuntan anexos de registros fotográfico del 26 de junio 2025 al 30 de junio 2025:



 Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 22 de 26
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024		

6. MEDIO AMBIENTE

La Interventoría Ambiental se define como la toma de responsabilidad directa por la supervisión y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y específica para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados.

Objetivos y Funciones

La interventoría ambiental, tiene entre otros, los siguientes objetivos y funciones:

- Hacer un seguimiento detallado del Plan de Manejo Ambiental según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades.
- Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental.
- Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el Plan de Manejo Ambiental.
- Colaborar con el contratista para la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental.
- Hacer cumplir los compromisos adquiridos.

El contratista hace entrega de las licencias de las empresas de las cuales realizaran la disposición de los residuos peligroso (Luminarias), residuos especiales (Drywall) y residuos reutilizables (cartón y pastico).

Se relaciona el listado de las compañías que realizan la disposición

- ECOPLANET SOLUCIONES -Drywall, cartón y plástico
- PCSHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS-Luminarias.

 CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 23 de 26

Se retira material para disposición final y para reutilización, se adjunta certificado de su disposición final

SOPORTE DE CERTIFICADOS

 ASOREAMB Asociación de Recuperadores Ambientales NIT: 900.698.305-1	CERTIFICACION DISPOSICION DE RESIDUOS	CODIGO	OP-FM-06
		FECHA	28/06/2023
		VERSION	0.0

Bogotá D.C. 02 de Julio 2025

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

La Asociación de Recuperadores Ambientales ASOREAMB, prestador de la actividad de aprovechamiento del servicio público de Aseo, con Registro Único de Prestador de Servicio- RUPS- 20251036874443656 certifica que la entidad **UNIÓN TEMPORAL FEXXA-COINSI (EDIFICIO SEDE JUDICIAL AYDEE ANZONLA LINARES)** con número de identificación tributaria (NIT) 901865489-8 realizo la entrega de residuos aprovechables el día 21 de JUNIO de 2025 que se relacionan a continuación:

Residuo Aprovechable	Composición aproximada %	Peso Kg.
CHATARRA (ILUMINARIAS) (248UND)	100%	793,6
ARCHIVO	100%	0
CARTÓN	100%	166,8
PERIÓDICO	100%	0
PLÁSTICO POLIPROPILENO	100%	0
SOPLADO	100%	0
PET TRANSPARENTE	100%	0
PET VERDE	100%	0
PET ACEITE	100%	0
VIDRIO	100%	0
ALUMINIO	100%	0
TETRAPACK	100%	0
TOTAL		960,4

El material fue recolectado y transportado a la Estación de Clasificación y Aprovechamiento – ECA ubicada en el barrio **HACIENDA LOS MOLINOS** de la Localidad **RAFAEL URIBE URIBE** donde se realizó la actividad de selección, clasificación y comercialización.

Cordialmente,


EDGAR BARRERA RUIZ
Representante Legal Asoreamb

Calle 49b Sur 1G - 27
Cel: 3118425758
Email: Asoreamb01@gmail.com www.asoreamb01.wixsit.e.com/laasociacion

 CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 24 de 26

						Código: COL-ADM-F-06
05/07/2025	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO / EQUIPOS DE ILUMINACIÓN / TUBOS FLUORESCENTES	Y29	105.8	1785	ALMACENAMIENTO / TRATAMIENTO / RECICLAJE	LITO

GESTOR AMBIENTAL:

PCSHEK-COTA: Resolución No. 20217000183 del 23 de abril del 2021, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

LITO: Resolución 056-7 de 2004 Y ampliación con Resolución N° 4179 de 2007. Gestión para el tratamiento térmico (Tóner). El vidrio y el aluminio tratados en el proceso de reciclaje de residuos de iluminación mediante un sistema cerrado de trituración y libres de mercurio son aprovechados como materia prima en otros procesos y los polvos de fosforo con mercurio serán destinados a disposición final adecuada con gestores debidamente autorizados para tal fin.

Los anteriores procesos están enmarcados dentro del enfoque de economía circular, maximizando el aprovechamiento de los residuos y minimizando el impacto que puede generar su gestión.

Nuestros procesos son auditados verificados y evaluados bajo los estándares internacionales, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, R2V3, NTC 6352.

La presente certificación se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de **PCSHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS.**



ALEJANDRA ORTIZ PINZÓN
Profesional Ambiental
Poshek Tecnología y Servicios



Autopista Medellín Km 3.5 costado sur,Vía Siberia
Terminal Terrestre de Carga, Módulo 3-Bodega 9,10 y 24
Cota, Cundinamarca,250017,Colombia
+57 3103126276 - 57+1 8415192 - 8415721



SA-201501 TR-CO2192086 TR-CO2192086 RAEE 21-08194 RAEE 22-08194

2/2 - CG25441

 CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 25 de 26

Se anexa registro fotográfico de las actividades ejecutadas:

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES	
	
Acopio para retiro de Driwall	
	
Cargue y retiro Driwall	
	
Retiro de cartón y plástico	
	
Retiro de carcasas	




 Conectando Culturas Con Energía NIT. 900448366-9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 26/06/2025 AL 30/06/2025	Versión: 1 Página: 26 de 26
CONTRATO No. 056 de 22 de octubre del 2024		

7. CONCLUSIONES

Cumplimiento contractual

El contratista ejecutó en su totalidad las actividades establecidas en el objeto contractual, realizando los ajustes necesarios en el cronograma para garantizar calidad, cumplimiento normativo y entrega final de la obra. Se completaron las actividades de iluminación en pisos 2, 1 y sótano, así como la instalación y puesta en marcha del sistema solar fotovoltaico.

De acuerdo con la supervisión, el contrato alcanza el 100% de ejecución.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ:
Ing. Alexander Bedoya Duque	Ing. Alexander Bedoya Duque Director interventoría	Supervisor del Contrato
		
Fecha:	Fecha:	Fecha:
