

	Informe Acta Cobro 02 contratista	Código:	MHG - 1
		Fecha:	06/10/2025
		Versión:	01
	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA	Paginas:	Página 1 de 6

INFORME ACTA DE COBRO 02

(COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2025 al 06/10/2025)

1. INTRODUCCION

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

2. OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	4182.010.32.1.634-2025
CONTRATISTA	MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

Documento de identificación del contratista: 16.758.135-8

Interventoría: INARCONST S.A.S

Obra Física Ejecutada Acumulada: 86.42 %

COMPONENTE JURÍDICO

Fecha de Inicio: 01/08/2025

Fecha de Terminación Inicial: 01/11/2025

Suspensiones del contrato: N/A

Reanudación del contrato: N/A

-

Modificaciones del contrato: Del 2 de agosto del 2025, Se ajustan clausulas Cuarta y Vigésima octava debido a un error en el número del CDP emitido inicialmente para la obra.

-

Suspensiones del contrato: N/A

-

COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:

	Informe Acta Cobro 01 contratista	Código:	MHG - 1
		Fecha:	22/08/2025
		Versión:	01
	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA	Paginas:	Página 2 de 6

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$708.291.172,00)

- **Resumen Contable y Financiero:**

Valor Total del Contrato	Valor pagado a la fecha	Valor Cuota por cancelar	Saldo por Cancelar
\$708.291.172	\$ 247.321.291,00	\$ 364.809.245,00	\$ 96.160.636,00

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA



REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA

Durante el periodo correspondiente a la presente acta de cobro, se ejecutaron las actividades de relleno con material de sitio y su respectiva compactación. Se realizó el bombeo continuo de agua producto del nivel freático existente en el área de trabajo, permitiendo el adecuado desarrollo de las labores. Posteriormente, se efectuó el armado y encofrado de formaleta para zapatas, la instalación de cinta PVC, y la fundición de zapata en concreto premezclado impermeabilizado de resistencia 4000 psi (28 MPa).



De manera simultánea, continuaron las actividades de instalación de acero en el muro de contención, seguido del armado y encofrado en formaleta de madera para muros de contención. Se ejecutó la construcción de una plataforma temporal en plaquetas de madera para circulación durante la fundición del muro con concreto bombeado. Finalmente, se realizó la fundición del muro de contención con concreto impermeabilizado de 4000 psi, así como las labores de limpieza general, organización de materiales, acopio de residuos y desencofrado de formaletas de madera en la zona de recogida.

	Informe Acta Cobro 01 contratista		Código:	MHG - 1
			Fecha:	22/08/2025
	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA		Versión:	01
			Paginas:	Página 3 de 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO MOVIMIENTO DE TIERRAS

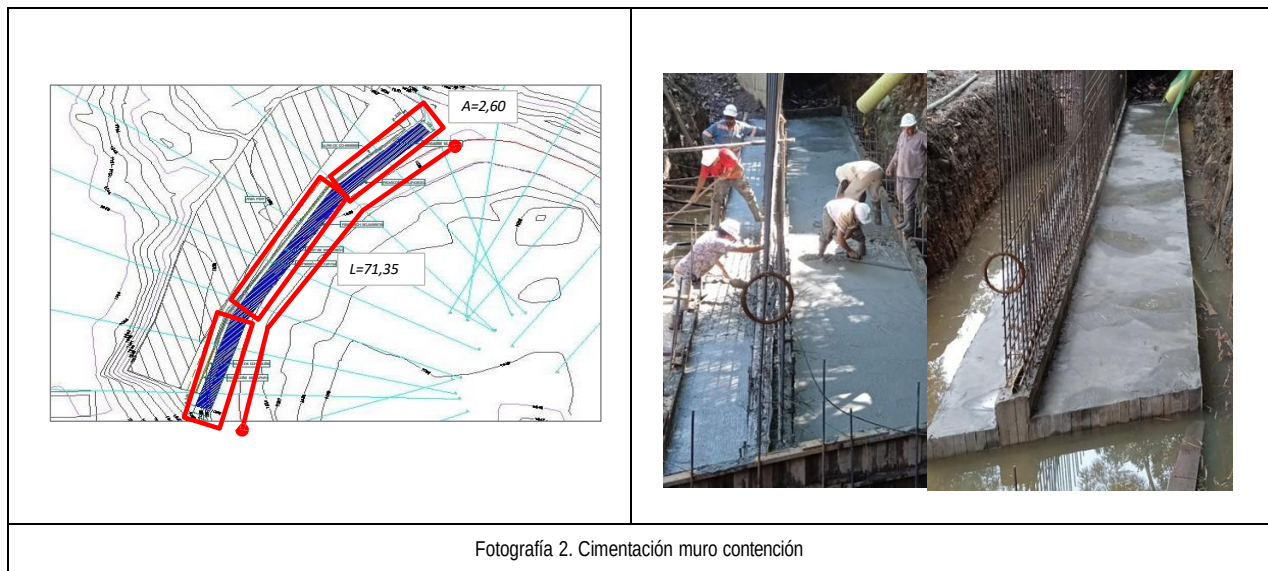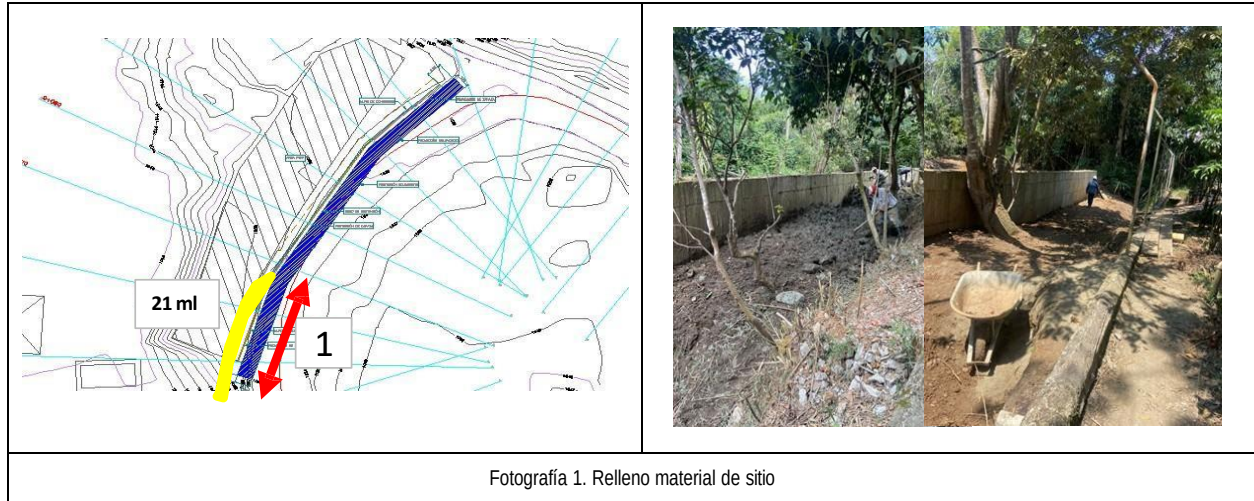

	Informe Acta Cobro 01 contratista		Código:	MHG - 1
			Fecha:	22/08/2025
	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA		Versión:	01
			Paginas:	Página 4 de 6

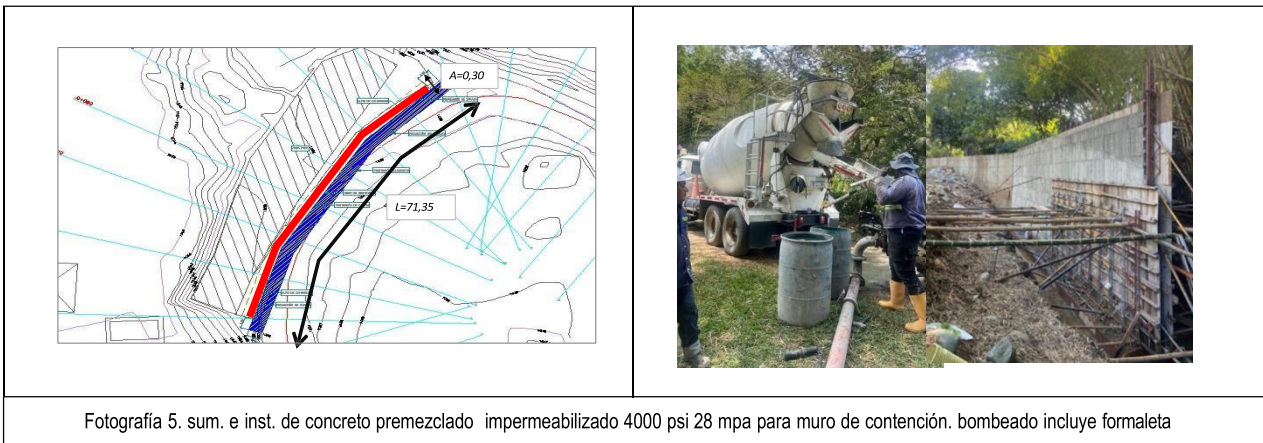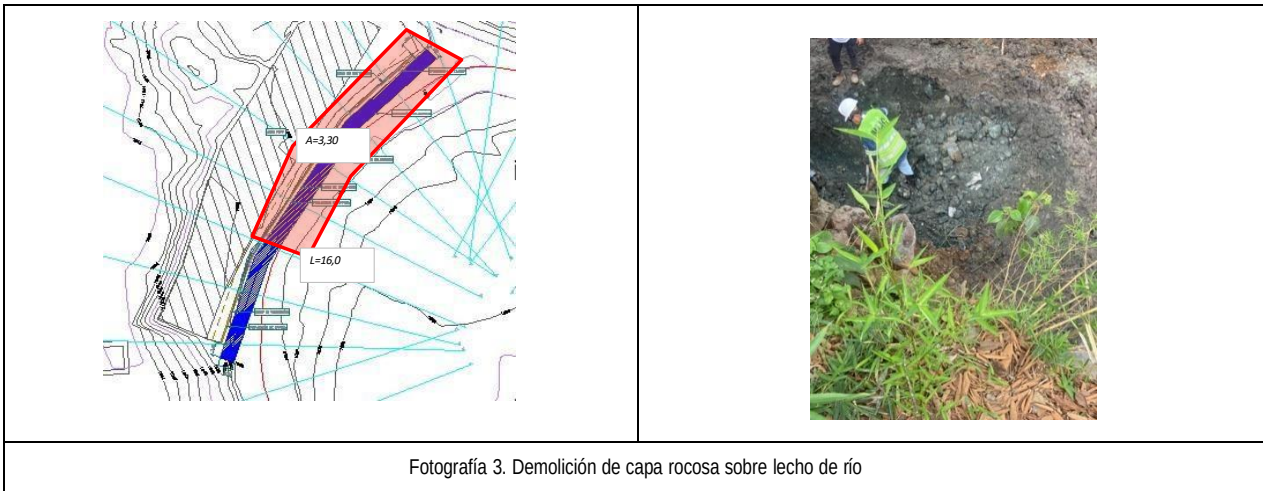

	Informe Acta Cobro 01 contratista		Código:	MHG - 1
			Fecha:	22/08/2025
	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA		Versión:	01
			Paginas:	Página 5 de 6



Fotografía 6 . pase de tubería novafort 8" para desagüe de ptar



Fotografía 7. retiro de escombros, disposición en sitio autorizado certificado (incl. factor de expansión)




Fotografía 8. COMPACTACION DE RELLENO/BASE DE BOLSA CRETO

	Informe Acta Cobro 01 contratista	Código:	MHG - 1
		Fecha:	22/08/2025
	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA	Versión:	01
		Paginas:	Página 6 de 6



Fotografía 9. BOLSACRETO 120X240 CONCRETO 3100 PSI



MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
CONTRATISTA
