

01

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG	
	INFORME DE INTERVENTORIA	Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 1 de 13
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM411 de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 1 (MES NOVIEMBRE 2023)

MENSUAL

☒

FINAL

☐

Objeto Contrato: _ INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: LA ARGENTINA.

DEPARTAMENTO: HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.indershulla.gov.co - atenciomusuario@indershulla.gov.co
Neiva-Huila

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 2 de 13
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

CONTRATO DE (INTERVENTORIA) No. CIHCM411 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

APOYO A LA SUPERVISIÓN		ING. Oscar León Escobar. /		ENTIDAD		INDERHUILA /		
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		CIHCM411 DE 2023 /						
OBJETO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA /			PERIODO DEL INFORME		Entre 23 de Noviembre al 30 De Noviembre de 2023 /	
CONTRATISTA		SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA /			NIT:		891.101.100-5 /	
REPRESENTANTE LEGAL:		JAVIER BARRERO MOSSOS /			C.C:		7685694 /	
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):			01 / NOVIEMBRE / 2023 /					
FECHA DE INICIO (D/M/A):			09 / NOVIEMBRE / 2023 /					
PLAZO INICIAL			TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. /					
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):			N/A. /					
PLAZO TOTAL:			TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. /					
VALOR INICIAL:			OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS (\$85.798.121) M/CTE /					
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):			N/A. /					
VALOR TOTAL:			OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS (\$85.798.121) M/CTE /					
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA								
CONTRATO DE OBRA No.		CLPIH392 DE 2023 /						
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA. /						


02

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023			Página 3 de 13

CONTRATISTA	CONSORCIO INDER A & S.	NIT:	901.767.134-9.
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	C.C:	1.182.774.968
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	03 MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A.		
PLAZO TOTAL:	03 MESES.		
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 488.701. 732.00)./		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A.		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la vereda La Esperanza municipio de La Argentina Huila. A 46.9km de La Plata -Huila.

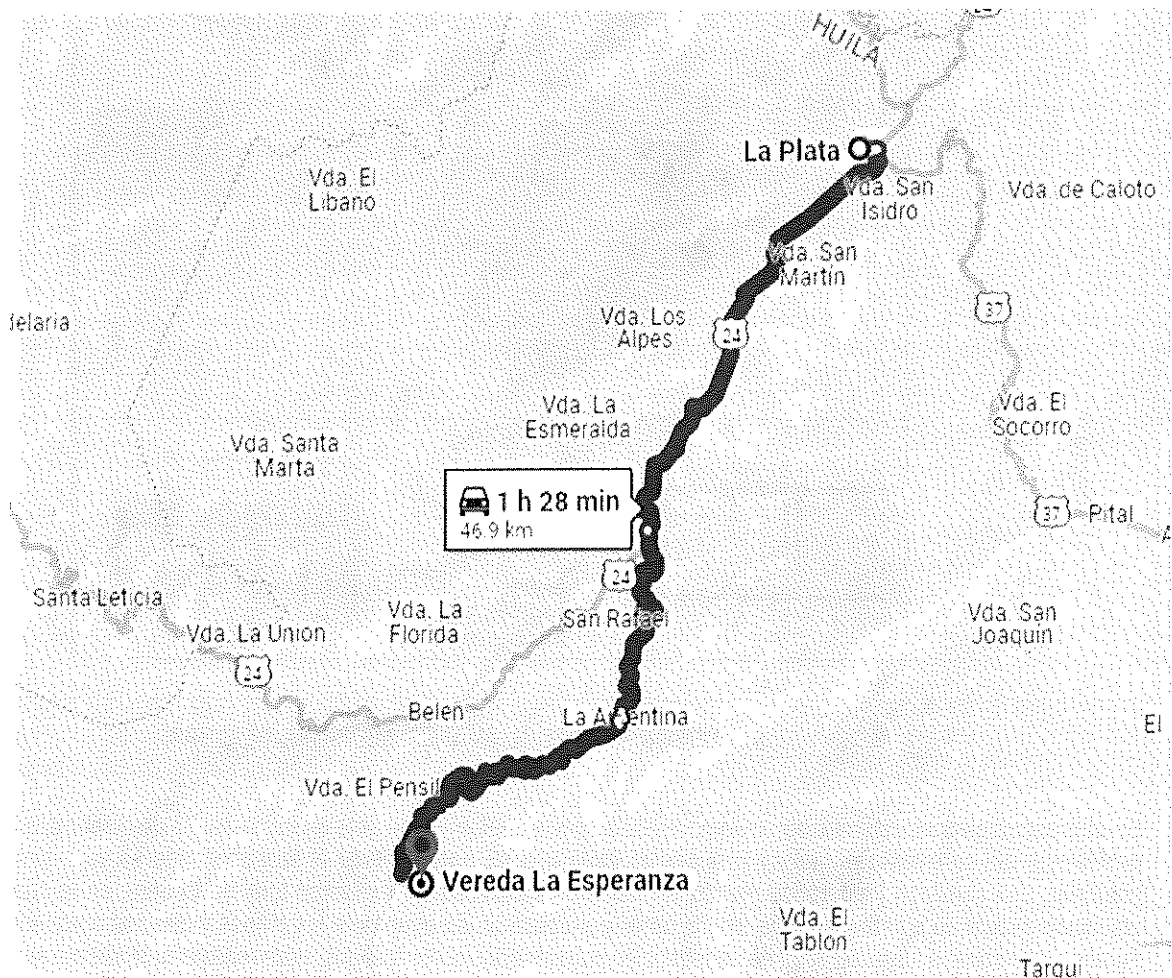


 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 4 de 13

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 536,56 m² por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; correspondientes a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, placa de contrapiso en concreto reforzado de 3000 PSI Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESITENTE de 2010 - NSR-10.

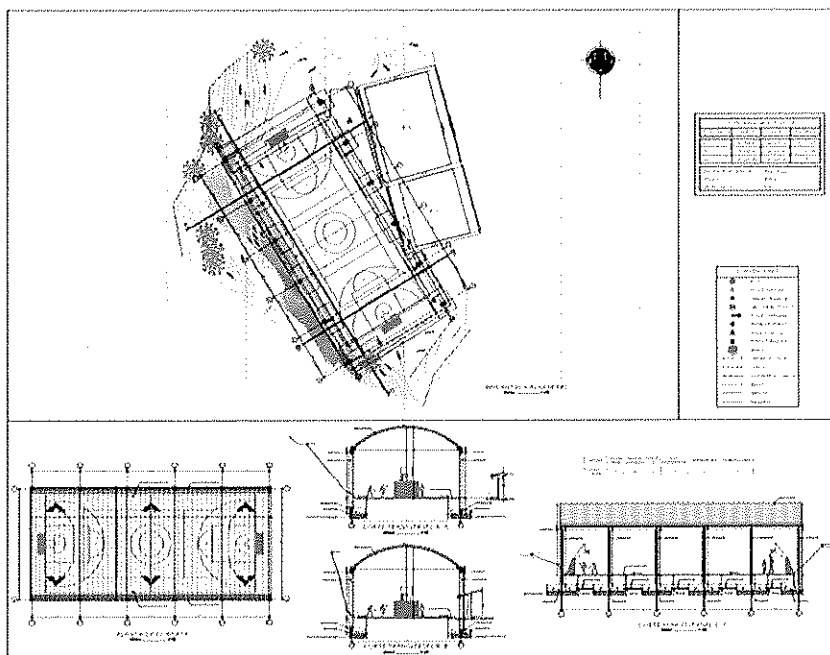

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

En el presente periodo del mes de noviembre 2023, previa conformación acta de inicio del 23 de noviembre 2023, el personal profesional del contratista e interventoria realizo visita a obra, para verificar el terreno donde se va a ejecutar el proyecto, posterior, una comisión topográfica realizo la respectiva localización y replanteo total de la obra, en la cual encontramos la ubicación exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo a los planos y diseños aprobados, se localizaron puntos de referencia fuera del área de construcción para tenerlos como testigos, para realizar este trabajo se utilizaron equipos de precisión como estación total y nivel.

03

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Versión: 2	
	Página 5 de 13	

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	23 noviembre 2023 ✓	8 ✓	0 ✓	N/A ✓
Suspension No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiniciación No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMINACIÓN Cto.	22 febrero 2024 ✓	N/A ✓	N/A ✓	N/A ✓
TOTAL DIAS		8 ✓	0 ✓	
7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)				
Tipo de Acta		No.	Fecha	
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA		01 ✓	09 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓	
ACTA DE INICIO DE OBRA		01 ✓	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓	
8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO (Cumplimiento Obligaciones del contrato).				
a). Obligaciones de Carácter General.	Interventoría realizo reconocimiento del sitio ejecución del proyecto. ✓			
b). Actividades Administrativas.	Se realizo y se firmó acta de inicio. ✓			
c). Actividades Operativas.	Se verifico y se midió la implantación del proyecto ✓			
d). Actividades Logísticos.	Traslado personal de topografía y residente interventoría. ✓			
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	Se solicito al contratista los permisos ambientales de la fuente de material a utilizar en obra como recibos y materiales pétreos para concreto. También permiso para la disposición de escombros. ✓			
f). Actividades Financieras.	Se gestiona recursos anticipos. ✓			
g). Actividades Jurídicos.	Se verifican pólizas de cumplimiento del contrato de obra. ✓			
9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO				
FECHA	MAÑANA	TARDE. ✓		
23/11/2023	SOLEADO	SOLEADO		

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Página 6 de 13	

24/11/2023	SOLEADO	SOLEADO ✓
25/11/2023	LLUVIAS LEVES	SOLEADO ✓
26/11/2023	SOLEADO	SOLEADO ✓
27/11/2023	SOLEADO	SOLEADO ✓
28/11/2023	SOLEADO	SOLEADO ✓
29/11/2023	LLUVIA FUERTES	LLUVIAS FUERTES ✓
30/11/2023	SOLEADO	SOLEADO ✓

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
<i>Diseños de mezcla para los concretos.</i>	N/A	N/A ✓
<i>Diseños de mezcla para base.</i>	N/A	N/A ✓
<i>Compresión simple al concreto.</i>	N/A	N/A ✓
<i>Ensayo de compactación de campo</i>	N/A	N/A ✓

NOTA: Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Artículo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
N/A	N/A	N/A	7	14	28	N/A	N/A	N/A

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
N/A	N/A	N/A	7	14	28	N/A	N/A	N/A

01

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
		Página 7 de 13

11. CONTROL DE ANTICIPO				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (30%)	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Parcial No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Parcial No. 2	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Parcial No. 3	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Recibo Final No.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 488.701.732,00	\$0,00	\$ 488.701.732,00	\$ 3.094.466,38	\$ 485.607.265.62
12. COMITES DE OBRA				
Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)		
30/11/2023	OBRA.	Se verifico los documentos y planos que hacen parte integral del proyecto y que de acuerdo a la revisión de los estudios y diseños estructurales por parte de los profesionales especialistas adscritos al proyecto por el contratista, se evidencio algunas circunstancias que se encuentran afectando negativamente la ejecución del proyecto entre ellos la programación de obra y el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato de la referencia, observaciones que fueron dadas a conocer mediante oficio No. 04- CLPIH 392 DE 2023 a la interventoría y supervisión.		
13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS				
TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)	
Pólizas de cumplimiento (Endoso 0 (No. 61-44-101051738))	07 NOVIEMBRE 2023	N/A	Físico.	
Pólizas R.C (Endoso 0 (No. 61-40-101018843))	07 NOVIEMBRE 2023	N/A	Físico	
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	N/A	N/A	N/A	
Informe HSEQ (periodo del (23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	N/A	N/A	N/A	

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 8 de 13
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

Actas de socialización e inicio de obra	N/A	N/A	N/A
Actas de conformación de veeduría ciudadana	N/A	N/A	N/A
Acta de vecindad	N/A	N/A	N/A
Actas de comités (periodo del (23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	30/11/2023	30/11/2023	Digital.
Registros de ensayos de laboratorio (periodo del (23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	N/A	N/A	N/A
Registros de ensayos de calidad (periodo del (23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	N/A	N/A	N/A
Copia bitácora de obra (periodo del (23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	N/A	N/A	N/A
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	15 diciembre 2024 (MES DE DICIEMBRE)	N/A	Digital
Correspondencia (periodo del (23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	30/11/2023	30/11/2023	Correo electrónico
Registro fotográfico de valla	26/11/2023	26/11/2023	Digital.
Registro fotográfico (Dotación, PAPSO, PGIO) (Periodo del 23/Nov./2023) al (30/Nov./2023))	N/A	N/A	N/A

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
Javier Barrera Mossos	7685694 ✓	Director interventoria	Indefinido. ✓
Juan Carlos Angarita Puerto	7695985	Residente Interventoria	Obra y labor. ✓

Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
		Página 9 de 13

15. RELACION DE PAGOS						
TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)		No. COMPROBANTE			FECHA	
N/A		N/A			N/A	
N/A		N/A			N/A	
16. RELACION DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL						
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
Javier Barrera Mossos	\$960.000	\$240.000	\$417.600	\$240.000	\$240.000	28130598
Juan Carlos Angarita Puerto	\$560.000	\$140.000	\$ 243.600	\$140.000	\$140.000	28206671
17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA						
POLIZA LEGALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO – ENDOZO 1 Y ENDOZO 2						
Póliza legalización del CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Perfeccionamiento contrato)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	0	07/11/2023	Cumplimiento del contratº	01/11/2023	01/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/02/2024	01/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Perfeccionamiento contrato)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	0	07/11/2023		01/11/2023	01/02/2024
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ACTA DE INICIO)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	2	01 ENERO 2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta inicio)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	2	01 ENERO 2024		09/11/2023	09/02/2024



INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: IDH-CGID-F06

Fecha Aprobación:
13/02/2023

INFORME DE INTERVENTORIA

Versión: 2

Página 11 de 13

1. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA											
DIAGRAMA DE AVANCE											
CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL				EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VRUNITARIO	VRJTOTAL	CANT	VRJTOTAL	% EJECUCION	CANT	% EJECUCION	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.										
1.01	Localización y replanteo.	M2	700.7	\$4.416,25	\$3.094.466,38	700.7	\$3.094.466,38	0,63%	700.7	0,63%	✓
	SUB-TOTAL CAPITULO				\$3.094.466,38		\$3.094.466,38	0,63%		0,63%	✓
% AVANCE DE OBRA										0,63%	✓

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.



ING. NIXON GERMAN DIAZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRA




ING. JAVIER BARRERA MOSSOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Para el presente periodo del 23 noviembre 2023 al 30 noviembre 2023, el contratista de obra junto Interventoría, reconoció el sitio del proyecto, instalo la vaya informativa e inicio actividades de obra con el levantamiento e implantación del proyecto. Avanzo 0,63% contra 0,0% programado.


Para el presente periodo hay un avance positivo del 0,63%

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE INTERVENTORIA	Código: IDH-CGID-F06
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 12 de 13

2. REGISTRO FOTOGRAFICO

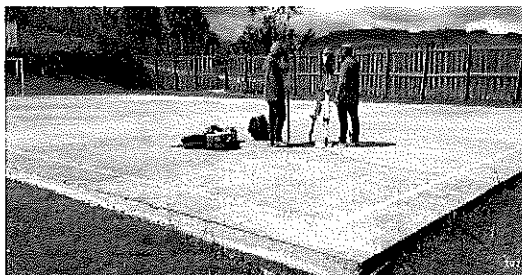

Levantamiento e implantación topográfica - 28 noviembre 2023

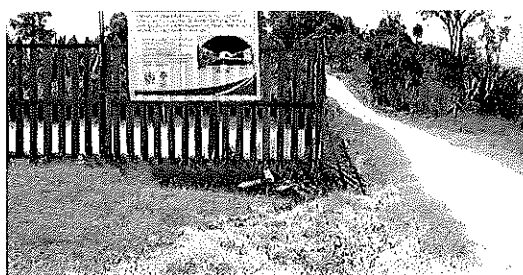

Levantamiento e implantación topográfica - 27 noviembre 2023

3. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES


- Se realiza reconocimiento del sitio del proyecto.
- Se instala vaya informativa del proyecto.
- Se realiza implantación, replanteo y levantamiento topográfico.
- Se solicita al contratista de obra conformar veeduría ciudadana y realizar la socialización, en conjunto con interventoría.

07

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoría	Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 13 de 13
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

4. ANEXOS

- ACTAS CONFORMACION DE VEEDURIAS CIUDADANA - FORMATO PM-GID-F04. ✓
- ACTA DE SOCIALIZACION. ✓
- ACTAS DE COMITÉS. ✓
- BITACORA DE OBRA. ✓
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA. ✓
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO. ✓

		
ING. Javier Barrera Mossos	(01/diciembre/2023)	ING. Oscar León Escobar.
FIRMA ORIGINAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo APOYO SUPERVISION

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
 Identificación: NI - 891101100
 Sucursal: INTERX
 Periodo Pensión: 2023-10
 Periodo Salud: 2023-11
 Fecha Pago Planilla: 2023-11-14

Tipos Identificación	EC
Numero Identificación	891101100
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Hula COMFAMILAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Numero Planilla	28130598
Referencia de Pago(PN)	F
Tip Planilla	2023-10
Periodo Pensión	2023-11
Periodo Salud	Dependiente
Tip Colizante	No aplica
Subtipo de Cotizante	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Ingresos	ISE	Fecha de Inicio	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha VAC	VCT	Fecha VCT	IRL	Fecha IRL	Fecha IRL
											X											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Integridades E.G	Numero Autorización	Valor	Valor
30	6.000.000	0.0400000	\$ 240.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Almado	Aportante	Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsidios	Valor no retenido
30	6.000.000	0.1600000	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de control de trabajo
30	6.000.000	0.0890000	\$ 417.000	891101100

APORTES PARA FISCALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IBCF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
30	6.000.000	0.0400000	\$ 240.000	0	0	0

CONSULTA EMPLEADO
Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación: NI - 891101100
Sicursal: 4896
Período Pensión: 2023-10
Período Salud: 2023-11
Fecha Pago Planilla: 2023-11-14

Tip. Identificación	CC
Número Identificación	76525615
Nombre	JUAN CARLOS ANDARITA PUERTO
EPS	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AEP	Administración Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Hual COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	83206671
Referencia de Pago(PRe)	
Tip. Planilla	E
Período Pensión	2023-10
Período Salud	2023-11
Tip. Coliante	Dependiente
Subtipo de Coliante	No aplica

ING	Fecha INC	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin apco	IGE	Fecha 1º Inca	Fecha 2º Inca	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha VAC	VAC Ph	AVP	VCT	Fecha VCT	Fecha VCT	Fecha RL

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.500.000	0,0400000	\$ 140.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante			
30	3.500.000	0,1600000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria		Cot. de riesgo con cargo de trabajo	
			Afiliado	Aportante	Afiliado	Aportante
30	3.500.000	0,0980000	\$ 244.600	\$ 0	\$ 244.600	\$ 0

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria
30	3.500.000	0,0400000	\$ 140.000	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

BITACORA DE OBRA

Contrato de Obra
CLP1H 392 de 2023

"Construcción de cubierta Autoportante
con iluminación para la vereda
La Esperanza de la zona rural
del municipio de La Argentina
departamento del Huila"

Fecha de inicio : 23-Noviembre de 2023

23-11-2023 * Actividades Realizadas

El personal del contratista e interventoria realizan la respectiva acta de inicio, para poder realizar actividades contempladas en el contrato.

* ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Contratista de Obra - Director de Obra - Inspector de obra.

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Contratista de Interventoria - Director de Interventoria - Ing Residente de Interventoria

* Equipo en OBRA: Hira menor.

Pulgar
Ing Obra

Juan Carlos Argarita
Ing Interventoria

24-11-2023 * Actividades Realizadas

El personal profesional del contratista realizó visita a obra, para verificar el terreno donde se va a ejecutar el proyecto.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Director de Obra - Inspector de Obra - Maestro de Obra - 3 Ayudantes - SST.

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Director de Interventoria - Ing Residente de Interventoria

* Equipo en Obra: Hira menor.

Pulgar
Ing Obra

Juan Carlos Argarita
Ing Interventoria

25-11-2023 * ACTIVIDADES REALIZADAS

Se está organizando la logística para iniciar labores el día 27-11-2023.

PERSONAL CONTRATISTA: Director de Obra - Inspector de Obra - Maestro de Obra

PERSONAL INTERVENTORIA: Director de Interventoria - Ing Residente de Interventoria

NKE

23-11-2023 * Actividades Realizadas

El personal del contratista e interventoria realizan la respectiva acta de inicio, para poder realizar actividades contempladas en el contrato.

* ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Contratista de Obra - Director de Obra - Inspector de Obra.

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Contratista de Interventoria - Director de Interventoria - Ing Residente de Interventoria

* EQUIPO EN OBRA: Hira menor.

Pulgar
Ing. Obra

Juan Carlos Angarita
Ing. Interventoria

24-11-2023 * Actividades Realizadas

El personal profesional del contratista realizó visita a obra, para verificar el terreno donde se va a ejecutar el proyecto.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Director de Obra - Inspector de Obra - maestro de Obra - 3 Ayudantes - SST.

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Director de Interventoria - Ing Residente de Interventoria

* Equipo en Obra: Hira menor.

Pulgar
Ing. Obra

Juan Carlos Angarita
Ing. Interventoria

25-11-2023 * ACTIVIDADES REALIZADAS

Se está organizando la logística para iniciar labores el día 27-11-2023.

PERSONAL CONTRATISTA: Director de Obra - Inspector de Obra - maestro de Obra

PERSONAL INTERVENTORIA: Director de Interventoria - Ing Residente de Interventoria

NICE

* EQUIPO EN OBRA: Hira menor.

Luján
Ing. Obra

Juan Carlos Angarita
Ing. Intervención

27-11-2023 * ACTIVIDADES:

Se inicio a realizar Localización y replanteo de las obras a intervenir. Se utilizó estación total para el trabajo.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado.

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Director de Obra - Inspector SST -
Topógrafo - Inspector de Obra - maestro.

3

* PERSONAL DE INTERVENCIÓN: Ing. Residente.

* EQUIPO EN OBRA: Hira menor - Estación total de topografía

Luján
Ing. Obra

Juan Carlos Angarita
Ing. Intervención

28-11-2023 * ACTIVIDADES:

Se continuo realizando Localización y replanteo de las obras a intervenir.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

* PERSONAL CONTRATISTA: Inspector Obra - SST - Topógrafo - Maestro

* PERSONAL INTERVENCIÓN: Ing. Residente.

3

* EQUIPO EN OBRA: Hira menor - Estación total de topografía

Luján
Ing. Obra

Juan Carlos Angarita
Ing. Intervención

29-11-2023 * Actividades *

En obra se reunieron Ing Residente de obra e interventor para socializar información en comité el día 30-11-2023.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvias fuertes
TARDE: Lluvias fuertes.

* PERSONAL CONTRATISTA: Inspector de Obra - maestro - 3 Ayudantes

* PERSONAL INTERVENTORA: Ing Residente.

* EQUIPO EN OBRA: Híra menor.

NOTA: No se realizaron Actividades por lluvias fuertes

Pulgar

Ing Obra

Juan Carlos Angarita

Ing Interventoria

30-11-2023 * Actividades *

Se realizó localización de topografía por parte del maestro para dar inicio a las excavaciones.

Se realizó balance del presupuesto por parte del equipo profesional.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado.

* PERSONAL CONTRATISTA: Inspector de obra - maestro - 3 Ayudantes,

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente

* EQUIPO EN OBRA: Híra menor

Pulgar

Ing Obra

Juan Carlos Angarita

Ing Interventoria

01-12-2023 * Actividades *

Se realizó comité técnico en sitio donde se hizo presencia delegado por parte del contratista de obra, delegado de la interventoría, delegado de la supervisión, realizando recorrido se verificó los documentos y planos que hacen parte integral de las partes presentes. Se evidencian algunas algunas circunstancias que se encuentran afectando negativamente la ejecución del proyecto.

NICE

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG		Código: DIH-CFLD-F03
	ACTA DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA/CONSULTORIA		Versión: 2
	Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 1 de 3

FECHA: <u>13/02/2023</u>	MUNICIPIO: <u>Neiva</u>	SITIO/UBICACIÓN: <u>Obra CLPIH 392 de 2023</u>	Nº PAG. <u>1</u>
HORA: <u>10:00</u>	Nº DEL ACTA: <u>411</u>		
OBJETIVO: <u>CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA/CONSULTORIA N°CLPIH392 DE 2023 CUYO OBJETO ES "construcción cubierta deportiva con iluminación vereda la esperanza zona rural de la Argentina", y CONTRATO DE INTERVENTORIA N°411 DE 2023 CUYO OBJETO ES "Interventoría técnica administrativa legal y financiera al contrato de obra CLPIH 392 de 2023"</u>			

ORDEN DEL DÍA:

ITEMS	TEMA	RESPONSABLE
1	Saludo y control de asistencia	Inderhuila
2	Presentación de las empresas contratistas del Proyecto	Supervisor Inderhuila
3	Socialización de las condiciones técnicas del Proyecto.	Supervisor Inderhuila
4	Socialización de fecha de Inicio de obra y el manejo de la mano de obra no calificada	Contratista de Obra e Interventoría
5	Conformación de Veeduría Ciudadana	Supervisor, contratista de Obra e Interventoría
6	Compromisos por parte del Municipio con la Obra	Supervisor Inderhuila – Representante del Municipio
7	Varios	

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	TELEFONO	DIRECCION	FIRMA
1	Gabriel Beltran	10222222222222	Abogado	313 305 1	UD Esperanza	

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 -- 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila



Fecha Aprobación:
13/02/2023

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
-MIPG-

Código: DIH-CFLD-F03

Versión: 2

Página 2 de 3

ACTA DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE
OBRA/CONSULTORIA

Nº	NOMBRE	CEDULA	Ocupacion	TELEFONO	DIRECCION	FIRMA
	Crislito Riquelme	1080260674	Presidente	313266902	Vda la Esperanza	Crislito Riquelme
	Tomás Miguel Ortiz	6693592	Agricultor	3381114455	Vda la Esperanza	Tomás Miguel Ortiz
	Pedro Nel Ceron	83218392	Agricultor	3167770467	Vda la Esperanza	Pedro Nel Ceron
	Kelly Turiani Pajaron	1080260630	amade casa	3157002635	Vda la Esperanza	Kelly Turiani Pajaron
	Rosario Ortiz N	55212067	Madecasa	313403716	Vda la Esperanza	Rosario Ortiz N
	Luz Dany Luligo	3638222	amade casa	373477342	Vda la Esperanza	Luz Dany Luligo
	Orlando Motta R	93241250	Agricultor	3111179496	Vda la Esperanza	Orlando Motta R
	Fernando Garces	4979059	Agricultor	3208336254	Vda la Esperanza	Fernando Garces
	Teresa Niyereth Motta	1080262530	Amade casa	3167311738	Vda la Esperanza	Teresa Motta
	Yadira Motta Luligo	1080260272	amade casa		Vda la Esperanza	Yadira Motta
	Roman B. Yarb	1665236	Independiente	311343	La Esperanza	Roman B. Yarb
	Leydiara Sanchez	10297330	agricultor		La Esperanza	Leydiara Sanchez
	Genaro un. Garza	74698326	agricultor	744770429	La Esperanza	Genaro un. Garza
	M Luz Dany Muchica	106204984	amade casa	314470425	La Esperanza	M Luz Dany
	Andri Lizeth uni Muchi	1081405813	amade casa	314470425	La Esperanza	Andri Lizeth
	Juan Carlos Argentea Puro	768905	Ing. Civil	3102438173	SOTA LTOA	Juan Carlos Argentea Puro

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG		Código: DIH-CFLD-F03
	ACTA DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA/CONSULTORIA		Versión: 2
	Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 3 de 3

Andrés Bello Bonifaz	108273301	Residente de Obra 3108869288	Vrb Espinoza	Consorcio Indor ABS
----------------------	-----------	------------------------------	--------------	---------------------


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A

Observaciones:

Supervisor INDERHUILA:

Nombre: Ing Oscar Escobas Leora

Firma: 

Se anexa registro fotográfico.

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	Código: DIH-CGID-F04
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA	Versión: 2 Página 1 de 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL HUILA
 MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

ACTA No. _____

Siendo las 12:30 AM del día 01 de Diciembre de 2023 se reunieron los representantes de la comunidad del municipio de La Argentina, con el fin de conformar el comité de veeduría ciudadana del contrato de obra N° CLPIH392 de 2023 cuyo objeto es "construcción cubierta autoportante con iluminación" y del contrato de Interventoría N° CIH04 de 2023 cuyo objeto es "Interventoría Tec. Administrativa, legal y financiera al Cto 392-23".

A decisión unánime se postularon los siguientes miembros de la comunidad, quedando conformado por los siguientes integrantes; estableciendo el comite de veeduría ciudadana en el municipio de

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
Crisanto B	Bravo Sanchez	1080260 674	3132066902	Crisanto
Pedro Nel	Ceron Rojas	8328392	3167770467	Pedro Nel Ceron
Orlando Motta		83211280	3144779496	Orlando Motta
Senfaroza Sanchez	Romero	12227330		Senfaroza

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co -
atencionusuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila



INDERHUILA

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: DPA-CGID-R#5

Versión: 1

Fecha de Aprobación: 13/09/2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA

LOCALIZACIÓN: VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO INDER A&S

INTERVENTOR: SOTA LTDA

Capítulo: 1

Item: 1.1


Actividades Preliminares: Localización y replanteo.

Unidad: M2

Memorias de Cálculo: 1

Acta Modificatoria No.: 1

ESQUEMAS:



DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Localización y replanteo.	30.00	22.75				700.70	
TOTAL						700.70	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son realmente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y consultaron en el terreno.

Julius

Yo Co. PAOLA ANDREA JIMENEZ MARVAEZ
RESIDENTE DE OCRA

Juan Carlos Anarita

Yo Co. JUAN CARLOS ANARITA PUERTO
RESIDENTE DE INTERVENTORA



NIXON GARMAY DIAZ MUNOZ
DIRECTOR DE OCRA



JAVIER BARRERO MOSSOS
DIRECTOR DE INTERVENTORA
