

 <small>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD MM AAAA
06 / Noviembre / 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: consorcio summar 2025
 NIT/CC No.: 9.019.658.202

Información Contractual

Contrato No.: 25000762 H4 DE 2025
 Objeto del contrato: "53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."
 Fecha de suscripción: 15 / sep / 2025 DD / MM / AAAA
 Fecha de terminación: 15 / nov / 2025 DD / MM / AAAA

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
\$ 119.509.705,73		\$ 90.953.875,38	\$ 28.555.830,35

Información para pago

Concepto de Pago:

☐ ASEO

☐ MANTENIMIENTO

☐ TRANSPORTE DE CARGA

☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN

☒ OBRA

☐ TRANSPORTES PASAJEROS

☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN

☐ RESOLUCIÓN

☐ VIGILANCIA

☐ INTERVENTORÍA

☐ SERVICIOS PÚBLICOS

☐ OTRO: _____

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura
Factura Electrónica	FE1	06-nov-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo?
 Valor inicial del anticipo
 Valor total amortizado a la fecha
 Amortización presente pago
 Saldo pendiente de amortizar \$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No
 ¿Se requiere endosar el pago? No
 Tipo cuenta bancaria Ahorros

NIT Fiducia
 NIT beneficiario de endoso
 Cuenta bancaria No. 351336078

 Nombre entidad bancaria Banco de Bogota


Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">No. Compromiso presupuestal / RP 1</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">36425</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Código rubro presupuestal a afectar</td> <td style="text-align: center;">Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización</td> </tr> <tr> <td>C-2403-0600-43-52104E-2403002-02</td> <td style="text-align: right;">\$ 90.953.875,38</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total a pagar:</td> <td style="text-align: right;">\$ 90.953.875,38</td> </tr> </table>	No. Compromiso presupuestal / RP 1	36425	Código rubro presupuestal a afectar	Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02	\$ 90.953.875,38											Total a pagar:	\$ 90.953.875,38	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">No. Compromiso presupuestal / RP 2</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Código rubro presupuestal a afectar</td> <td style="text-align: center;">Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total a pagar:</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> </table>	No. Compromiso presupuestal / RP 2	 	Código rubro presupuestal a afectar	Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización											Total a pagar:	\$ -
No. Compromiso presupuestal / RP 1	36425																																		
Código rubro presupuestal a afectar	Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización																																		
C-2403-0600-43-52104E-2403002-02	\$ 90.953.875,38																																		
Total a pagar:	\$ 90.953.875,38																																		
No. Compromiso presupuestal / RP 2	 																																		
Código rubro presupuestal a afectar	Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización																																		
Total a pagar:	\$ -																																		

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma: 
 Nombre: Yessica Katherine Buitrago Ortiz
 Cargo: Bombero Aeronautico
 Dependencia: SEI/ Direccion Regional Aeronautica Oriente

Firma: _____
 Nombre: _____
 Cargo: _____
 Dependencia: _____

OBSERVACIONES

CONSORCIO SUMMAR 2025
 NIT: 901965820-2
 Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
 Persona Jurídica
 CL 24 1 191, Villavicencio, Meta, Colombia
 Tel. 3214760697
 Email. consorciosummar@gmail.com
 Autorización factura electrónica de venta No. 18764101224334 válida desde 2025-11-06 hasta 2027-11-06 rango desde FE1 hasta FE200.

Nombre o Razón Social:
NIT :
Dirección:
Teléfono:
Email:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 899999059
 av cl 26 103 15, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

 Notificaciones_Judiciales@aerocivil.gov.co

Forma de Pago:
Medio de Pago:
Fecha de Pago:
Total de Lineas:

Crédito
 Instrumento no definido
 06/12/2025
 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :
MONEDA:
HORA EMISIÓN:
FECHA FIRMADO:

FE1
 COP Colombia, Pesos
 20:51:12-05:00
 06/11/2025 20:51:16

FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO


DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	11	2025	06	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	COSTO DIRECTO CONTRATO DE OBRA CIVIL NUMERO 53600CO681 Cuyo objeto es la construcción de un tanque nuevo elevado para abastecimiento de agua para maquinas de bomberos de aeropuerto VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO ACTA NUMERO 001	EA	1,00	\$75.199.566,25				0,00	\$75.199.566,25
2	002	ADMINISTRACION 14%	EA	1,00	\$10.527.939,28				0,00	\$10.527.939,28
3	003	IMPREVISTOS 1%	EA	1,00	\$751.995,66				0,00	\$751.995,66
4	004	UTILIDAD	EA	1,00	\$3.759.978,31	IVA	19%	\$714.395,88	0,00	\$3.759.978,31

Notas: SON: (noventa millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y cinco pesos treinta y ocho centavos) CUFE: 1ca413ebae66bcb767ad614588c471fb158a553f4234b66dacd8b2786c5a0be040c577079836751f27430d75e1f4b476	Subtotal:	\$90.239.479,50
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$714.395,88
	Total:	\$90.953.875,38

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.759.978,31	19,00%	\$714.395,88

Firma Digital: OrTRNKgg+JcL5Ovtr3RGecQtgNKHKL4D+bT6KxabP+XLzbd0Lqs7OTt1wGCxfLhB
 QGln5BOzy3fZspvfcW36qORd0nt8hwE1k6NC6iZvrW4TNLpSm
 8wWj/MKRr5U6v4M 5dpgSLqXGZOHO8Fd/HPu5g4689qAaJ69P/Gwz1mw3kSHk3lhUP+TXaYGLQg0zNZM 5kv7ZJyHkRlmmfuxqUSr02Cf6JxuHh80z73
 2wRm7fFpvaZWwh+CDQeH3glY2c810h B0zzR+SzCeoz8IHnkFfGuklm3jY9GTnlvH9YjG2pXg8C7PFLC1MCY3GJoj8KAo vZexSzZt6zAcovsJknYV
 Qg==
 Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO CON TARJETA PROFESIONAL 204109-T DEL CONSORCIO SUMMAR 2025

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002, ley 863 de 2003 y el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

CERTIFICO

Que el **CONSORCIO SUMMAR 2025** con NIT 901.965.820-2, quien ejecuto el contrato de obra número 25000762 H4 de 2025, cuyo objeto fue la “**CONSTRUCCION DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO**”, se encuentra a PAZ Y SALVO y ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales durante el mes de septiembre del año 2025 se canceló el día 20 de octubre del año 2025 bajo el número de planilla 9493459213 y la planilla de octubre del año 2025 se canceló el día 07 de noviembre del año 2025 bajo el numero de planilla 9494512380.

De conformidad con anterior se firma en la ciudad de Villavicencio a los seis (08) días del mes de noviembre del 2025.



**ARLEY
AGUDELO**
CONTADOR PÚBLICO

Donovan Arley Agudelo Doncel
Contador Público
Tarjeta profesional No 204109-T



[Handwritten signature]



CEDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Apellidos
AGUDELO DONCEL

NUIP 1.121.883.974

Nombres
DONOVAN ARLEY

Nacionalidad
COL

Fecha de nacimiento
19 DIC 1991

Lugar de nacimiento
CUMARAL (META)

Fecha y lugar de expedición
13 ENE 2010, VILLAVICENCIO


Fecha de expiración
23 SEPT 2032

Firma *[Handwritten signature]*




CO

004575490



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL004575490052001<<<<<<<<<<
9112193M3209239COL1121883974<<
AGUDELO<DONCEL<<DONOVAN<ARLEY<

PARA. _____
C.C o Nit. _____
DIRIGIDO A. _____

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

H C 8 0 A 4 1 A 2 1 9 7 B F 5 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DONOVAN ARLEY AGUDELO DONCEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121883974 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 204109-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



CONTRATO: 25000762 H4 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

FECHA ACTA PARCIAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO SUMMAR 2025
VALOR DEL CONTRATO: \$ 119.509.705,73
SUPERVISIÓN: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	% AVANCE
1	PRELIMINARES							
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	\$ 3.150,00	\$ 160.650,00	51,00	\$ 160.650,00	100,00%
	SUBTOTAL				\$ 160.650,00		\$ 160.650,00	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	\$ 67.208,33	\$ 652.592,92	9,71	\$ 652.592,92	100,00%
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	\$ 38.133,33	\$ 176.176,00	4,62	\$ 176.176,00	100,00%
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	\$ 1.583,33	\$ 11.415,83	7,21	\$ 11.415,83	100,00%
	SUBTOTAL				\$ 840.184,75		\$ 840.184,75	
3	CONCRETOS							
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	\$ 602.583,33	\$ 867.720,00	1,44	\$ 867.720,00	100,00%
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	\$ 939.041,67	\$ 2.206.747,92	2,35	\$ 2.206.747,92	100,00%
3.3	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	\$ 1.001.750,00	\$ 2.294.007,50	2,29	\$ 2.294.007,50	100,00%
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	\$ 1.370.275,00	\$ 4.563.015,75	3,33	\$ 4.563.015,75	100,00%
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	\$ 1.338.058,33	\$ 5.245.188,67	3,92	\$ 5.245.188,67	100,00%
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	\$ 1.159.291,67	\$ 6.619.555,42	5,71	\$ 6.619.555,42	100,00%
3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	\$ 33.825,00	\$ 1.319.175,00		\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 23.115.410,25		\$ 21.796.235,25	
4	ACEROS							
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPa (4200KGf/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	\$ 7.408,33	\$ 24.595.296,25	3319,95	\$ 24.595.296,25	100,00%
4.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	\$ 28.741,67	\$ 10.220.536,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
4.3	Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	\$ 520.875,00	\$ 2.343.937,50	0,00	\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 37.159.770,42		\$ 24.595.296,25	
5	CUBIERTAS							
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	\$ 83.791,67	\$ 4.926.950,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 4.926.950,00		\$ 0,00	
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS							
6.1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	\$ 41.725,00	\$ 1.669.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 44.933,33	\$ 449.333,33	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	\$ 41.708,33	\$ 83.416,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 419.283,33	\$ 838.566,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 879.350,00	\$ 1.758.700,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 12.216.933,33	\$ 24.433.866,67	2,00	\$ 24.433.866,67	100,00%
6.7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 1.686.666,67	\$ 3.373.333,33	2,00	\$ 3.373.333,33	100,00%
	SUBTOTAL				\$ 32.606.216,67		\$ 27.807.200,00	
	SUBTOTAL OBRAS				\$ 98.809.182,08		\$ 75.199.566,25	76,11%
	ADMINISTRACION			14%	\$ 13.833.285,49		\$ 10.527.939,28	76,11%
	IMPREVISTOS			1%	\$ 988.091,82		\$ 751.995,66	76,11%
	UTILIDAD			5%	\$ 4.940.459,10		\$ 3.759.978,31	76,11%
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 938.687,23		\$ 714.395,88	76,11%
	VALOR TOTAL				\$ 119.509.705,73		\$ 90.953.875,38	76,11%

JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTA LEGAL
CONTRATISTA

YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA
SUPERVISORA

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025		Página 1
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

INFORME DE PARCIAL NO. 01

CONTRATO DE OBRA NO. 25000762 H4 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: “53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.”



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO SUMMAR 2025

SUPERVISOR O INTERVENTOR: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NOVIEMBRE DE 2025

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 2
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

REVISIÓN

Objeto del Contrato:	“53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.”
Título de Documento:	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL No. 01 RECIBO PARCIAL NOVIEMBRE 2025

APROBACIÓN

Responsable por la elaboración	Nombre:	CONSORCIO SUMMAR 2025 R.L: JESUS DAVID DIAZ CORTES
	Firma:	
	Fecha:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 3
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME	4
3.	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	4
3.1.	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	5
3.2.	CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA	6
3.3.	ESTADO ADMINISTRATIVO	6
3.4.	RELACION SEGURIDAD SOCIAL	6
3.5.	LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	7
3.6.	INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	8
3.7.	AVANCE FISICO	8
4.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 25000762 H4 DE 2025	8
4.1.	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.	8
5.	INFORME DEL ESTADO FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL	10
5.1.	VALOR DEL CONTRATO	10
5.2.	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESAL – CDP	10
5.3.	AVANCE FINANCIERO	11
5.4.	FORMA DE PAGO	11
6.	INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO	11
6.1.	RELACIÓN ACTAS GENERADAS	11
6.2.	CONTROL DE POLIZAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA	11
7.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE CORTE PARCIAL NO. 01	12
8.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	14
9.	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA	22
10.	LABORATORIOS REALIZADOS	22
11.	CONCLUSIONES	22

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 4
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

1. INTRODUCCIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL, mediante invitación el 03 de junio de 2025, se dio apertura al proceso de mínima cuantía No. 25000762 H4 DE 2025., cuyo objeto es **“53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.”** una vez surtido todos los términos del proceso y de forma consecuente, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL mediante comunicado CCE-EICP-IDI-46 Anexo2, adjudicó al CONSORCIO SUMMAR 2025, representado legalmente por JESUS DAVID DIAZ CORTES, la ejecución de la Obra, por un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$ 119.509.705,73) y un tiempo de ejecución de dos (02) meses

El **CONSORCIO SUMMAR 2025** representado legalmente por el Ing. **JESUS DAVID DIAZ CORTES**, identificado con C.C. 7.179.331 de Tunja, en el contrato de obra de obra No 25000762 H4 - 2025 que tiene por objeto **“53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.”** en cumplimiento de las obligaciones contractuales, correspondientes, presenta el siguiente informe en el cual se evidencian las actividades desarrolladas y ejecutadas en el marco del contrato objeto de intervención.

En el presente informe acta parcial de obra No. 01, se describen las actividades contractuales, ejecutadas por el contratista y supervisadas por parte de la supervisora encargada, en el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2025 al 14 de noviembre de 2025 y el avance que se ha presentado hasta este periodo.

2. OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME

Presentar un Informe consolidado de las características y desarrollo del proyecto objeto del **Contrato de obra pública 25000762 H4 - 2025**, cuyo objeto es el **“53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.”**, que contiene los siguientes aspectos: Generalidades del Proyecto, descripción del proyecto, Condiciones del Contrato de obra civil; Control de pólizas contrato de obra civil, Organigrama general del proyecto, Seguimiento y Evaluación de los Planes y Especificaciones; Aspectos ambientales, Equipos y personal utilizado por el contratista, Programación de obra, Localización, Estado Financiero, entre otros. Lo anterior enmarcado entre la fecha de corte del presente informe.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO.	25000762 H4 DE 2025
MODALIDAD DE CONTRATO	INVITACION PRIVADA
CONTRATANTE	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NIT CONTRATANTE	899.999.059-3

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 5
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

CONTRATISTA	CONSORCIO SUMMAR 2025
CONTRATO DE OBRA NO.	25000762 H4 DE 2025
NIT CONTRATISTA	901.965.820-5
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JESUS DAVID DIAZ CORTES C.C 7.179.331 DE TUNJA
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA	CONSORCIOSUMMAR@GMAIL.COM
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD	YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
OBJETO DE CONTRATO:	"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. M/CTE (\$119.509.705,73).
FECHA DEL CONTRATO	02 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES

Tabla 1. Generalidades del contrato

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El aeropuerto Vanguardia se encuentra en Villavicencio, municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta. Tiene una extensión de 1328 km² y una población aproximada de 558.299 habitantes. Se encuentra a una altura de 467 m s. n. m., con temperaturas que oscilan entre los 23 y 32 °C. Dentro de su infraestructura aeroportuaria, se han identificado necesidades específicas relacionadas con el servicio de extinción de incendios y salvamento, esenciales para la seguridad operacional.

En este contexto, se ha determinado la reubicación del cuerpo de bomberos aeronáuticos dentro del aeropuerto, lo que exige la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para garantizar la respuesta efectiva ante emergencias. La ausencia de estos tanques en la nueva ubicación podría comprometer la capacidad operativa del servicio de bomberos, afectando la seguridad aeroportuaria y el cumplimiento de los estándares internacionales de protección y respuesta ante incendios aeronáuticos.

La falta de esta infraestructura crítica podría derivar en una reducción de la categoría de salvamento y extinción de incendios del aeropuerto, limitando la operación de determinadas aeronaves y afectando la conectividad aérea de la región. Para evitar estas consecuencias, es fundamental desarrollar la infraestructura necesaria que permita mantener la prestación del servicio con los estándares de seguridad requeridos.

3.2. CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA.

Considerando el diagnóstico actual y la necesidad de garantizar la operatividad continua del aeropuerto, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como responsable de la seguridad operacional aeroportuaria, ha identificado la necesidad de contratar la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua. Este proyecto asegurará que el servicio de extinción de incendios cuente con los recursos necesarios para responder a cualquier eventualidad, minimizando riesgos y garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

Esta intervención se encuentra alineada con las políticas del Plan de Acción de la Entidad, particularmente con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios aeroportuarios para responder a las necesidades del sector en un contexto ambientalmente sostenible. Asimismo, se enmarca en el cumplimiento del Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC), que establece los requisitos mínimos de seguridad para la operación de aeropuertos y aeródromos en el país.

Conscientes de la necesidad y requerimiento de mejorar la infraestructura de servicio de apoyo al cuerpo de bomberos aeronáuticos la unidad administrativa de aeronáutica civil. dispuso a través contrato de obra pública No. 25000762 H4 de 2025, la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua.

3.3. ESTADO ADMINISTRATIVO

CARGO	NOMBRE
RESIDENTE DE OBRA	Nombre: ORLANDO CORTES REYES Profesión: Ingeniero civil Matricula profesional: 25202-80246 CND
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	Nombre: DAYANA CUBIDES PEREZ Profesión: Profesional en salud Ocupacional Matricula Profesional: LIC. 4809 DE 2018

Tabla 2. Profesionales del contrato 25000762 H4 de 2025

3.4. RELACION SEGURIDAD SOCIAL

RESIDENTE DE OBRA
JESUS DAVID DIAZ CORTES

N°	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION
1	ORLANDO CORTES REYES	79.483.825	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	PROTECCIÓN

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
DAYANA CUBIDES PEREZ

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 7
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

Nº	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION
2	DAYANA CUBIDES PÉREZ	1.121.933.871	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR

3.5. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Las obras que comprenden el desarrollo del **25000762 H4 - 2025**, cuyo objeto es el **“53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.”**, se ejecutaran el aeropuerto vanguardia del Municipio de Villavicencio, departamento del Meta.



Ilustración 1 Localización del aeródromo.

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 8
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

3.6. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista cuenta con una oficina ubicada en la calle 24 # 1 – 191 en el municipio de Villavicencio donde se coordina todos los aspectos administrativos del proyecto, y donde se atenderá al público en general.

3.7. AVANCE FISICO

En virtud de lo anterior, la ejecución de actividades refleja a la fecha un avance ejecutado de 76,11 % acumulado a fecha del 14 de noviembre del 2025 y para la presente Acta de Pago parcial No. 01 se va a reportar un avance acumulado de 76,11%.

RESUMEN DE AVANCE	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y SIETE (47) DÍAS
PORCENTAJE EJECUTADO	76,11%
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 01	\$ 90.953.875,38

Tabla 3. Avance físico

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 25000762 H4 de 2025

4.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.

Las obras que se tienen previstas para realizar se enmarcan en los siguientes puntos e ítems, es importante señalar que las cantidades de obra aquí presentadas corresponden a las pactadas en el contrato de obra N° 25000762 H4 DE 2025 designado al CONSORCIO SUMMAR 2025. A continuación, condiciones iniciales del contrato:

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	\$ 3.150,00	\$ 160.650,00
	SUBTOTAL				\$ 160.650,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	\$ 67.208,33	\$ 652.592,92
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	\$ 38.133,33	\$ 176.176,00
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	\$ 1.583,33	\$ 11.415,83
	SUBTOTAL				\$ 840.184,75



CONSORCIO SUMMAR 2025

CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025

Página 9

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CONCRETOS				
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	\$ 602.583,33	\$ 867.720,00
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	\$ 939.041,67	\$ 2.206.747,92
3.3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	\$ 1.001.750,00	\$ 2.294.007,50
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	\$ 1.370.275,00	\$ 4.563.015,75
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	\$ 1.338.058,33	\$ 5.245.188,67
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	\$ 1.159.291,67	\$ 6.619.555,42
3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	\$ 33.825,00	\$ 1.319.175,00
	SUBTOTAL				\$ 23.115.410,25
4	ACEROS				
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	\$ 7.408,33	\$ 24.595.296,25
4.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	\$ 28.741,67	\$ 10.220.536,67
4.3	Escalera tipo gato tanq.elev. (paraales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	\$ 520.875,00	\$ 2.343.937,50
	SUBTOTAL				\$ 37.159.770,42
5	CUBIERTAS				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	\$ 83.791,67	\$ 4.926.950,00
	SUBTOTAL				\$ 4.926.950,00
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
6.1	TUBERÍA PVC/P RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	\$ 41.725,00	\$ 1.669.000,00
6.2	ACCESORIO PVC/P 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 44.933,33	\$ 449.333,33
6.3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	\$ 41.708,33	\$ 83.416,67

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025		Página 10
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 419.283,33	\$ 838.566,67
6.5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 879.350,00	\$ 1.758.700,00
6.6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 12.216.933,33	\$ 24.433.866,67
6.7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 1.686.666,67	\$ 3.373.333,33
SUBTOTAL					\$ 32.606.216,67
SUBTOTAL OBRAS					\$ 98.809.182,08
ADMINISTRACION					14% \$ 13.833.285,49
IMPREVISTOS					1% \$ 988.091,82
UTILIDAD					5% \$ 4.940.459,10
IVA SOBRE LA UTILIDAD					19% \$ 938.687,23
VALOR TOTAL					\$ 119.509.705,73

Tabla 4. Condiciones iniciales

5. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

5.1. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$ 119.509.705,73)

5.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESAL – CDP

CDP No.	FECHA	DENOMINACIÓN	FUENTE	No. AFECTADO.	PRESUPUESTO ASIGNADO
5825	06 de marzo de 2025	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	24-12-00-700 RME DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	02-50006	\$ 130.000.000,00
TOTALES					\$ 130.000.000,00

Tabla 5. CDP Contrato 25000762 H4 de 2025.

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 11
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

5.3. AVANCE FINANCIERO

A la fecha no se encuentra tramitando cobros parciales y/o anticipos.

CONCEPTO	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO (Anticipo a Fiducia)	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
VALOR DEL CONTRATO	\$ 119.509.705,73			
ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$ 0,00		
VALOR FALTANTE POR FACTURAR	\$ 119.509.705,73			\$ 129.937.523,26
SUMAS IGUALES	\$ 119.509.705,73			\$ 129.937.523,26

Tabla 6. Relación de actas de pago parcial.

5.4. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

6. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista y la entidad las siguientes actas:

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATO	02/07/2025	Se suscribe Contrato No. 25000762 H4 de 2025 entre la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. (Contratante) y el Consorcio SUMMAR 2025 (Contratista), mediante plataforma transaccional SECOP II.
ACTA DE INICIO	15/09/25	Firma del Acta de Inicio del contrato No. 25000762 H4 de 2025 por parte del ingeniero JESUS DAVID DIAZ CORTES – Representante Legal Consorcio SUMMAR 2025 (Contratista) y por parte de la supervisión YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ

6.2. CONTROL DE POLIZAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

Pólizas De Cumplimiento Según Suscripción Del Contrato.

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Obra (iniciales):

PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO			
Póliza de Cumplimiento	30-40-101024438		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	100008463		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición.	29 de julio de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del contrato	03/07/2025	03/01/2026	\$ 23.901.941,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/05/2023	17/07/2024	\$ 23.901.941,20
Estabilidad y calidad de la obra	Ver nota aclaratoria*		\$ 23.901.941,20
Predios, labores y operaciones	03/07/2025	03/09/2025	\$ 284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	03/07/2025	03/09/2025	\$ 284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	03/07/2025	03/09/2025	\$ 284.700.000,00
Responsabilidad civil patronal	03/07/2025	03/09/2025	\$ 284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	03/07/2025	03/09/2025	\$ 284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	03/07/2025	03/09/2025	\$ 284.700.000,00

Tabla 7. Pólizas Iniciales

Nota aclaratoria: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo (si ampara por cinco años)

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01

En el cuadro detallado de balance de obra se evidencian las actividades ejecutadas por el Contratista y las cantidades de obra, así mismo dichas actividades son descritas a continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	% AVANCE
1	PRELIMINARES							
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	\$ 3.150,00	\$ 160.650,00	51,00	\$ 160.650,00	100,00%
	SUBTOTAL				\$ 160.650,00		\$ 160.650,00	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				0		0	
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	\$ 67.208,33	\$ 652.592,92	9,71	\$ 652.592,92	100,00%
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	\$ 38.133,33	\$ 176.176,00	4,62	\$ 176.176,00	100,00%
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	\$ 1.583,33	\$ 11.415,83	7,21	\$ 11.415,83	100,00%
	SUBTOTAL				\$ 840.184,75		\$ 840.184,75	



CONSORCIO SUMMAR 2025

CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025

Página 13

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

3	CONCRETOS						0	
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	\$ 602.583,33	\$ 867.720,00	1,44	\$ 867.720,00	100,00%
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	\$ 939.041,67	\$ 2.206.747,92	2,35	\$ 2.206.747,92	100,00%
3.3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	\$ 1.001.750,00	\$ 2.294.007,50	2,29	\$ 2.294.007,50	100,00%
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	\$ 1.370.275,00	\$ 4.563.015,75	3,33	\$ 4.563.015,75	100,00%
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	\$ 1.338.058,33	\$ 5.245.188,67	3,92	\$ 5.245.188,67	100,00%
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	\$ 1.159.291,67	\$ 6.619.555,42	5,71	\$ 6.619.555,42	100,00%
3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	\$ 33.825,00	\$ 1.319.175,00		\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 23.115.410,25		\$ 21.796.235,25	
4	ACEROS						0	
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPa (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	\$ 7.408,33	\$ 24.595.296,25	3319,95	\$ 24.595.296,25	100,00%
4.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	\$ 28.741,67	\$ 10.220.536,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
4.3	Escalera tipo gato tanq.elev. (para les ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	\$ 520.875,00	\$ 2.343.937,50	0,00	\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 37.159.770,42		\$ 24.595.296,25	
5	CUBIERTAS				0		0	
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	\$ 83.791,67	\$ 4.926.950,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 4.926.950,00		\$ 0,00	
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS						0	
6.1	TUBERÍA PVC RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	\$ 41.725,00	\$ 1.669.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.2	ACCESORIO PVC 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 44.933,33	\$ 449.333,33	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	\$ 41.708,33	\$ 83.416,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 419.283,33	\$ 838.566,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 879.350,00	\$ 1.758.700,00	0,00	\$ 0,00	0,00%

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025		Página 14
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

6.6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 12.216.933,33	\$ 24.433.866,67	2,00	\$ 24.433.866,67	100,00%
6.7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 1.686.666,67	\$ 3.373.333,33	2,00	\$ 3.373.333,33	100,00%
SUBTOTAL					\$ 32.606.216,67		\$ 27.807.200,00	
SUBTOTAL OBRAS					\$ 98.809.182,08		\$ 75.199.566,25	76,11%
ADMINISTRACION				14%	\$ 13.833.285,49		\$ 10.527.939,28	76,11%
IMPREVISTOS				1%	\$ 988.091,82		\$ 751.995,66	76,11%
UTILIDAD				5%	\$ 4.940.459,10		\$ 3.759.978,31	76,11%
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	\$ 938.687,23		\$ 714.395,88	76,11%
VALOR TOTAL					\$ 119.509.705,73		\$ 90.953.875,38	76,11%

Tabla 8. Cantidades parcial No. 01

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

A continuación, se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2025 al 14 de noviembre de 2025, en cada uno de los alcantarillados: pluvial, sanitario y combinado: los cuales se intervienen con el presente contrato:

CAP 1. PRELIMINARES

1.1. LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	51,00	100,00%



Observaciones: se realizó la localización y replanteo del área requerida para la cimentación de la estructura del tanque de almacenamiento cuya área es de 7.50m x 8.00m para un área total de 60.00m²

CAP 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	9,71	100,00%
2.1	 				

Observaciones: se realizó la excavación manual para cuatro zapatas y cuatro vigas de cimentación.

2.2. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	4,62	4,62	100,00%

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 16
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO				
				
Observaciones: Se realizó el relleno con material de río de tamaño máximo 3" en las excavaciones realizadas para la cimentación de la estructura.				

2.3. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	7,21	100,00%
2.3	<div></div>	<div></div>			
Observaciones: se realizó el transporte del material granular del ítem anterior utilizado para el relleno de las excavaciones de la cimentación.					

CAP 3. CONCRETOS

3.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI).

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
------	-------------------------	--------	----------------------	------------------------------	----------------

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 17
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	1,44	100,00%
					

Observaciones: se realizó instalación de concreto solado de limpieza en el área de las zapatas y las vigas de cimentación.

3.2. ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	2,35	100,00%
					

Observaciones: se realizó la instalación de concreto de 3500 psi para 4 zapatas.

3.3. VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
------	-------------------------	--------	----------------------	------------------------------	----------------

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 18
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	2,29	100,00%
3.3.					
Observaciones: se realizó la instalación de concreto de 3500 psi para cuatro vigas de cimentación, dos en cada dirección para el cierre perimetral de la cimentación.					

3.4. COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

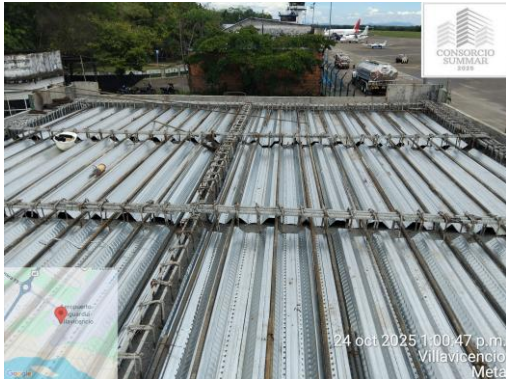
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	3,33	100,00%
	<div><div><div><div></div><div>11 oct 2025 11:33:21 a.m. Villavicencio Meta</div></div></div><div><div><div></div><div>17 oct 2025 12:47:13 p.m. Villavicencio Meta</div></div></div></div>				
Observaciones: se realizó la instalación de concreto de 4000 PSI para 4 columnas.					

3.5 VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 19
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	3,92	100,00%
	<div><div><div>23 oct 2025 6:22:07 a.m.</div></div><div></div></div>				
Observaciones: se realizó la fundida de cuatro vigas y tres viguetas.					

3.6. PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	5,71	100,00%
	<div><div></div><div></div></div>				
Observaciones: se realizó la fundida de la placa maciza con espesor de 0.20m.					

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 20
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

CAP 4. ACEROS

4.1. ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	3319,95	100,00%
<div>   </div>					
Observación:					

CAP 6. INSTALACIONES HIDRAULICAS

6.6. TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
6.6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	2,00	100,00%



Observación:

6.7. TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	2,00	100,00%
6.7	 				

Observación:

9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA

Se realiza el cerramiento perimetral preventivo delimitando el área de las actividades constructivas con la finalidad de informar a la comunidad la presencia de obras y evitar riesgos y/o peligros a los mismos consiguiendo mayor seguridad en la obra.

DOTACIÓN

A continuación, se realiza el listado de los implementos de dotación que han sido entregados al personal de trabajo que se encuentra en realización de actividades.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CARGO
Guantes	Residente, oficiales y obreros
Casco	Residente, oficiales y obreros
Gafas	Residente, oficiales y obreros
Camisa	Residente, oficiales y obreros
tapa oídos	Residente, oficiales y obreros

10. LABORATORIOS REALIZADOS

Para los concretos instalados en obra se realizó el suministro de concretos premezclados con la empresa CONCREMACK donde se realizaron laboratorios a los concretos, obteniendo los siguientes resultados.

Fecha	Código del Producto	Muestra	Remisión	7 días (kg/cm ²)	RC %R7	14 días (kg/cm ²)	RC %R14
25/09/2025	1-280-28-125±25-G25	5842	26615	252	90	305	109
02/10/2025	1-280-28-125±25-G25	5858	26653	260	93	309	110
10/10/2025	1-280-28-150±25-G13	5877	26706	305	109	0	0

11. CONCLUSIONES

Se inició actividades el 15 de septiembre de 2025 y el contrato se encuentra en ejecución.

Durante el periodo que se establece en el presente informe, del 15 de septiembre de 2025 al 14 noviembre de 2025 se reporta el cobro del 76,11% correspondiente a \$ 90.953.875,38.

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

- Localización, trazado y replanteo obra arquitectónica. incluye comisión topográfica, cartera y planos.
- Excavación manual en material común h = 0.00 - 2.00 m incluye cargue

	CONSORCIO SUMMAR 2025	
	CONTRATO No. 25000762 H4 DE 2025	Página 23
INFORME ACTA PARCIAL No. 01		

- Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño máx. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado
- Transporte de material granular
- Solado, limpieza en concreto 12.6 MPa (2000 psi)
- Zapata en concreto 24.1 MPa (3500 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Viga en concreto 24.1 MPa (3500 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Columna en concreto 27.6 MPa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Viga aérea en concreto 27.6 MPa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Placa de entrepiso maciza en concreto 27.6 MPa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Afinado pisos mortero 1:4, e= 50 mm
- Acero de refuerzo $f_y=420\text{mpa}$ (4200kgf/cm², 60.000 psi) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre
- Suministro e Instalación de Tanques: 2 DE 10.000 Lt y 2 de 2000 Lt

A continuación, se relacionan los Documentos anexos que aplican para la presente modificatoria.

- ✓ Anexo 1. Memorias de cálculo.
- ✓ Anexo 2. Laboratorios.
- ✓ Anexo 3. Planillas de seguridad social.



JESUS DAVID DIAZ CORTES
Representante Legal
Consortio SUMMAR 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901739671	3	IGLU DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 9 Sur # 39 A - 23	VILLAVICENCIO-META	5555555	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859678157	9493302659	E	2025/10/17	2025/10/17	BANCOLOMBIA	0	\$1,643,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	CC	1006857584	FUENTES RAMIREZ NATALIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	CC	1122139401	CASAS SERNA YEFERSON ALEXIS	X	X																230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF34	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	CC	79483825	CORTES REYES ORLANDO	X																	25-14	15	\$711,750	\$113,900	EPS005	15	\$711,750	\$28,500	CCF34	15	\$711,750	\$28,500	14-11	15	\$711,750	6.960%	\$49,600	15	\$0	\$0	Si	\$220,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	CC	1122139565	GUTIERREZ ROJAS JHON ALEXANDER	X																	230201	15	\$711,750	\$113,900	EPS037	15	\$711,750	\$28,500	CCF34	15	\$711,750	\$28,500	14-11	15	\$711,750	6.960%	\$49,600	15	\$0	\$0	Si	\$220,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	CC	1121846104	HOYOS HERNANDEZ MONICA LORENA	X																	230201	15	\$711,750	\$113,900	EPS005	15	\$711,750	\$28,500	CCF34	15	\$711,750	\$28,500	14-11	15	\$711,750	6.960%	\$49,600	15	\$0	\$0	Si	\$220,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	CC	1038477189	JIMENEZ PEÑATE YONAIRO ANTONIO	X																	230301	15	\$711,750	\$113,900	EPSC34	15	\$711,750	\$28,500	CCF34	15	\$711,750	\$28,500	14-11	15	\$711,750	6.960%	\$49,600	15	\$0	\$0	Si	\$220,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	CC	79574231	LONDOÑO ZULLUAGA ROBINSON	X																	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS002	12	\$569,400	\$22,800	CCF34	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	6.960%	\$39,700	12	\$0	\$0	Si	\$176,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	CC	4208202	VARGAS MONSALVE OSCAR DARIO	X																	25-14	15	\$711,750	\$113,900	EPSC34	15	\$711,750	\$28,500	CCF34	15	\$711,750	\$28,500	14-11	15	\$711,750	6.960%	\$49,600	15	\$0	\$0	Si	\$220,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Total Afiliados(8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739671	3	IGLU DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	DG 9 Sur # 39 A - 23	VILLAVICENCIO-META	5555555	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-10	1859678157	9493302659	E	2025/10/17	2025/10/17	BANCOLOMBIA	0	\$1,643,100	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					8	\$896,100	\$0	\$0	\$896,100	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$298,600	\$0	\$0	\$298,600	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	8	\$298,600	\$0	\$0	\$298,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$224,200	\$0	\$0	\$224,200	
COFREM		CCF34	892,000,146	3	8	\$224,200	\$0	\$0	\$224,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					8	\$224,200	\$0	\$0	\$224,200	
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	2	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$24,700	\$0	\$0	\$24,700	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
TOTAL					8	\$1,643,100	\$0	\$0	\$1,643,100	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1878142132	9493858583	E	2025/10/22	2025/10/27	NU		\$1,681,700

CONCLUSIONS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965820	2	CONSORCIO SUMMAR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 24 1 191	VILLAVICENCIO-META	3133479458	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-10	1866013401	9493459213	E	2025/10/06	2025/10/20	NU	\$107,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1121933871	CUBIDES PEREZ DAYANA		X	X																230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$6,000	CCF34	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$3,400	1	\$47,450	\$2,500	No	\$21,400	
2	CC	1121830964	MARTINEZ GIOVANNY ANDRES		X																	230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS002	4	\$189,800	\$23,800	CCF34	4	\$189,800	\$7,600	14-11	4	\$189,800	\$13,300	4	\$189,800	\$9,500	No	\$84,600	
Total		Afiliados(2)																						\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$29,800			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,700			\$237,250	\$12,000		\$106,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965820	2	CONSORCIO SUMMAR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 24 1 191	VILLAVICENCIO-META	3133479458	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1866013401	9493459213	E	2025/10/06	2025/10/20	NU		\$107,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$38,000	\$0	\$38,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$38,000	\$0	\$38,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$16,700	\$0	\$16,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$16,700	\$0	\$16,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$9,500	\$0	\$9,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	\$9,500	\$0	\$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$29,800	\$0	\$30,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$29,800	\$0	\$30,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$7,200	\$0	\$7,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$7,200	\$0	\$7,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$4,800	\$0	\$4,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$4,800	\$0	\$4,900
TOTAL				2	\$106,000	\$0	\$107,200

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000762 H4 de la vigencia 2025
Nombre del Contratista:	Consorcio Summar 2025
Periodo informe:	15 de septiembre 2025 al 14 de noviembre 2025
Nombre de Supervisor:	Yessica Katherine Buitrago Ortiz
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Dirección Regional Aeronáutica Oriente

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 6

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	% AVANCE
1	PRELIMINARES							
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	\$ 3.150,00	\$ 160.650,00	51,00	\$ 160.650,00	100,00%
	SUBTOTAL				\$ 160.650,00		\$ 160.650,00	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	\$ 67.208,33	\$ 652.592,92	9,71	\$ 652.592,92	100,00%
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	\$ 38.133,33	\$ 176.176,00	4,62	\$ 176.176,00	100,00%
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	\$ 1.583,33	\$ 11.415,83	7,21	\$ 11.415,83	100,00%
	SUBTOTAL				\$ 840.184,75		\$ 840.184,75	
3	CONCRETOS							
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	\$ 602.583,33	\$ 867.720,00	1,44	\$ 867.720,00	100,00%
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	\$ 939.041,67	\$ 2.206.747,92	2,35	\$ 2.206.747,92	100,00%
3.3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	\$ 1.001.750,00	\$ 2.294.007,50	2,29	\$ 2.294.007,50	100,00%
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	\$ 1.370.275,00	\$ 4.563.015,75	3,33	\$ 4.563.015,75	100,00%
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	\$ 1.338.058,33	\$ 5.245.188,67	3,92	\$ 5.245.188,67	100,00%
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	\$ 1.159.291,67	\$ 6.619.555,42	5,71	\$ 6.619.555,42	100,00%
3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	\$ 33.825,00	\$ 1.319.175,00		\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 23.115.410,25		\$ 21.796.235,25	
4	ACEROS							
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPa (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	\$ 7.408,33	\$ 24.595.296,25	3319,95	\$ 24.595.296,25	100,00%
4.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	\$ 28.741,67	\$ 10.220.536,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
4.3	Escalera tipo gato tanq.elev. (paraes ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	\$ 520.875,00	\$ 2.343.937,50	0,00	\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 37.159.770,42		\$ 24.595.296,25	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 6

5	CUBIERTAS							
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	\$ 83.791,67	\$ 4.926.950,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				\$ 4.926.950,00		\$ 0,00	
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS							
6.1	TUBERÍA PVC P RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	\$ 41.725,00	\$ 1.669.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.2	ACCESORIO PVC P 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 44.933,33	\$ 449.333,33	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	\$ 41.708,33	\$ 83.416,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 419.283,33	\$ 838.566,67	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 879.350,00	\$ 1.758.700,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 12.216.933,33	\$ 24.433.866,67	2,00	\$ 24.433.866,67	100,00%
6.7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 1.686.666,67	\$ 3.373.333,33	2,00	\$ 3.373.333,33	100,00%
	SUBTOTAL				\$ 32.606.216,67		\$ 27.807.200,00	
	SUBTOTAL OBRAS				\$ 98.809.182,08		\$ 75.199.566,25	76,11%
	ADMINISTRACION			14%	\$ 13.833.285,49		\$ 10.527.939,28	76,11%
	IMPREVISTOS			1%	\$ 988.091,82		\$ 751.995,66	76,11%
	UTILIDAD			5%	\$ 4.940.459,10		\$ 3.759.978,31	76,11%
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 938.687,23		\$ 714.395,88	76,11%
	VALOR TOTAL				\$ 119.509.705,73		\$ 90.953.875,38	76,11%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 6

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El contratista cumplió con las actividades programadas correspondientes a localización, trazado, excavación, relleno con material mixto, transporte de material granular, solado, limpieza en concreto, zapatas en concreto, viga en concreto, columna en concreto, viga aérea en concreto, placa de entepiso maciza en concreto, suministro de acero de refuerzo incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre, dos (2) tanques plástico para agua de 10000 ltrs, dos (2) tanques plástico para agua de 2000 ltrs. Del periodo entre el 15 de septiembre de 2025 al 14 de Noviembre de 2025

PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Informe de avances 01	1	05/11/2025	SI	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Ninguna.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 6

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 6

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PERIODO	CONCEPTO	VALOR	ACUMULADO	PORCENTAJE
15 de septiembre al 14 de noviembre 2025	Fe1	\$ 90,953,875,38	\$ 90,953,875,38	76,11%

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No. DE INFORME	PERIODO	PORCENTAJE
1	15 de septiembre al 14 de noviembre de 2025	76,11%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
1127387180
SUPERVISOR

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 25000762 H4 DE 2025 OBJETO: "53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO." AEROPUERTO: VANGUARDIA PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 PLAZO FINAL: DOS (02) MESES	VALOR INICIAL: <div style="text-align: right;">\$ 119.509.705,73</div> VALOR ADICIONAL: <div style="text-align: right;">\$ 0,00</div> VALOR FINAL : <div style="text-align: right;">\$ 119.509.705,73</div>	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATISTA: CONSORCIO SUMMAR 2025 INTERVENTOR: N/A SUPERVISOR: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
---	--	--	--

El día 05 de NOVIEMBRE de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto VANGUARDIA de la Ciudad de VILLAVICENCIO el Ingeniero JESUS DAVID DIAZ CORTES en representación del contratista consorcio SUMMAR 2025 y la funcionaria YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ, en representación de la supervisión, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2025 al 14 de noviembre 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES
--	----------------

1. Valor inicial contrato	119.509.705,73
2. Valor modificación No.1	0,00
3. Valor total del contrato (1+2)	119.509.705,73
4. Valor pagado del anticipo %	0%
5. Valor que resta por pagar (3-4)	119.509.705,73
6. Valor presente acta	90.953.875,38
7. Valor amortizado en la presente acta	0%
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)	90.953.875,38
9. Acumulado pagos actas anteriores	0,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores	0,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)	90.953.875,4
12. Saldo por pagar del presente contrato	28.555.830,4
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)	-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha	76,11%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA		
--	--	--

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Obra	-
3- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		-

AMORTIZACIÓN	
C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.



NOMBRE
JESUS DAVID DIAZ CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA



NOMBRE
YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
 BOMBERO AERONAUTICO
 SUPERVISORA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



**MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN**

OBJETO DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA AERONÁUTICA CIVIL

DESCRIPCION DEL ITEM : LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.

ITEM: 1.1 **FECHA:** 15/10/2025 **UNIDAD:** M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
ÁREA TOTAL EN PLANTA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TANQUES	6,00	8,50		1,00	51,00
SUMATORIA TOTAL:					51,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : 
NOMBRE : ORLANDO CORTES REYES
CARGO : RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ : 
NOMBRE: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
CARGO : SUPERVISORA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)				
ITEM:	3.1	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
ZAPATAS		1,40	1,40	0,10	4,00	0,78
VIGAS DE CIMENTACION		5,20	0,30	0,10	2,00	0,31
		5,70	0,30	0,10	2,00	0,34
SUMATORIA TOTAL:					1,44	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : 
NOMBRE : **ORLANDO CORTES REYES**
CARGO : **RESIDENTE DE OBRA**

APROBÓ : 
NOMBRE: **YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ**
CARGO : **SUPERVISORA**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA AERONÁUTICA CIVIL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE				
ITEM:	2.1	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
EXCAVACIÓN DE ZAPATAS		1,40	1,40	1,00	4,00	7,84
EXCAVACION DE VIGAS DE AMARRE TIPO 100		4,20	0,30	0,35	2,00	0,88
EXCAVACIÓN DE VIGAS DE AMARRE TIPO 101		4,70	0,30	0,35	2,00	0,99
SUMATORIA TOTAL:					9,71	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : 
NOMBRE : **ORLANDO CORTES REYES**
CARGO : **RESIDENTE DE OBRA**

APROBÓ : 
NOMBRE : **YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ**
CARGO : **SUPERVISORA**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"				
ITEM:	2.2	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
RELLENO PARA LAS ZAPATAS		1,40	1,40	0,70	4,00	5,49
(-) COLUMNAS		0,40	0,40	0,70	-4,00	-0,45
(-) VIGAS		0,50	0,30	0,35	-8,00	-0,42
SUMATORIA TOTAL:					4,62	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : 
NOMBRE : **ORLANDO CORTES REYES**
CARGO : **RESIDENTE DE OBRA**

APROBÓ : 
NOMBRE: **YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ**
CARGO : **SUPERVISORA**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



**MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN**

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL			
DESCRIPCION DEL ITEM :		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR			
ITEM:	2.3	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3/KM
LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	M3	FACTOR DE EXPANSION 1,20	KM		
RELLENO PARA LAS ZAPATAS	4,62	1,20	1,30	1,00	7,21
SUMATORIA TOTAL:					7,21
OBSERVACIONES:					

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : 
NOMBRE : ORLANDO CORTES REYES
CARGO : RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ : 
NOMBRE: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
CARGO : SUPERVISORA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y				
ITEM:	3.2	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
ZAPATAS A1, A2, B2		1,40	1,40	0,30	3,00	1,76
ZAPATA B		1,40	1,40	0,30	1,00	0,59
SUMATORIA TOTAL:					2,35	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : 
NOMBRE : **ORLANDO CORTES REYES**
CARGO : **RESIDENTE DE OBRA**

APROBÓ : 
NOMBRE: **YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ**
CARGO : **SUPERVISORA**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y				
ITEM:	3.3	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
VIGA 101		5,20	0,30	0,35	2,00	1,09
VIGA 100		5,70	0,30	0,35	2,00	1,20
SUMATORIA TOTAL:					2,29	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : _____
NOMBRE : ORLANDO CORTES REYES
CARGO : RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ : _____
NOMBRE: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
CARGO : SUPERVISORA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y				
ITEM:	3.4	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
COLUMNAS		0,40	0,40	5,20	4,00	3,33
SUMATORIA TOTAL:					3,33	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ :

NOMBRE : ORLANDO CORTES REYES
CARGO : RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ :

NOMBRE: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
CARGO : SUPERVISORA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

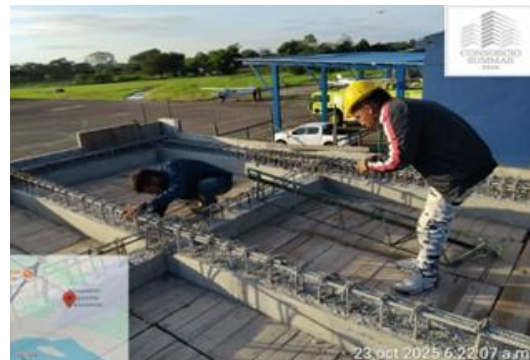
ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y				
ITEM:	3.5	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
VIGA 200		5,70	0,30	0,40	2,00	1,37
VIGA 201		5,20	0,30	0,40	2,00	1,25
VIGUETA 202		5,40	0,20	0,40	2,00	0,86
VIGUETA 203		5,50	0,20	0,4	1,00	0,44
SUMATORIA TOTAL:					3,92	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : 
NOMBRE : **ORLANDO CORTES REYES**
CARGO : **RESIDENTE DE OBRA**

APROBÓ : 
NOMBRE: **YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ**
CARGO : **SUPERVISORA**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01

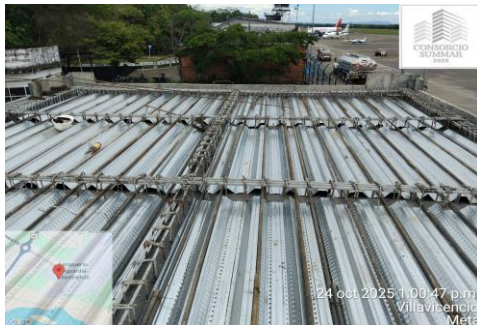


CONSORCIO
SUMMAR
2025

MEMORIAS DE OBRA
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.				
ITEM:	3.6	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	M3	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
PLACA MACIZA E=0,20 m		2,60	1,83	0,20	6,00	5,71
SUMATORIA TOTAL:					5,71	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ : _____
NOMBRE : ORLANDO CORTES REYES
CARGO : RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ : _____
NOMBRE: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
CARGO : SUPERVISORA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA AERONÁUTICA CIVIL					
DESCRIPCION DEL ITEM :		ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE					
ITEM:	4.1	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	KG		
LOCALIZACION			DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
					kg		
ZAPATA					29,70	4,00	118,80
VIGA 100					63,30	2,00	126,60
VIGA 101					58,86	2,00	117,71
COLUMNA					323,65	4,00	1294,60
VIGA 200					239,28	2,00	478,56
VIGA 201					111,91	2,00	223,81
VIGUETA 202					104,12	2,00	208,24
VIGUETA 203					49,04	1,00	49,04
LOSA					702,59	1	702,59
SUMATORIA TOTAL:							3319,95
OBSERVACIONES:							

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ :

NOMBRE : ORLANDO CORTES REYES
CARGO : RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ :

NOMBRE : YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
CARGO : SUPERVISORA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA AERONÁUTICA CIVIL			
DESCRIPCION DEL ITEM :		TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN			
ITEM:	6.6	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	UN
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD
		Area	H	kg	
TANQUE CÓNICO DE 10000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA					2,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
SUMATORIA TOTAL:					2,00
OBSERVACIONES:					

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ :

NOMBRE : ORLANDO CORTES REYES
CARGO : RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ :

NOMBRE : YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
CARGO : SUPERVISORA





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01



MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO :		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA AERONÁUTICA CIVIL				
DESCRIPCION DEL ITEM :		TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
ITEM:	6.7	FECHA:	15/10/2025	UNIDAD:	UN	
LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Area	H	kg		
TANQUE CÓNICO DE 2000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA					2,00	2,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUMATORIA TOTAL:					2,00	
OBSERVACIONES:						

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTÓ :

NOMBRE : ORLANDO CORTES REYES
CARGO : RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ :

NOMBRE: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
CARGO : SUPERVISORA





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACIÓN IVA

Clave: MSER-7.0-12-009

Versión: 02

Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No.

25000762 H4 DE 2025

SUPERVISOR:

YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ

COSTO TOTAL BRUTO OBRA

(Costo Directo + A.I.U.)

\$ 119.509.705,00

Porcentaje estimado para el A.I.U.

20,0000000000000000%

76,11%

\$ 90.953.875,00

COSTO DIRECTO

Costo Total Bruto

119.509.705,00

75.199.566,25

\$

1

\$ 75.199.565

1 + % A.I.U.

UTILIDAD

(Costo Directo x 5% estimado Utilidad)

751.995,66

\$

-

\$ 751.996

IVA OBRA

Utilidad x 19% estimado para el IVA

3.759.978,31

\$

-

\$ 3.759.978

TOTAL IVA

714.395,88

0,00 \$ 714.396

NOMBRE

JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

NOMBRE

YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
SUPERVISORA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8041385

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

2/07/2025 5:29:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

25000762 H4 DE 2025

Objeto del contrato

53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

2 Meses

Fecha de inicio de contrato

15/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

5 días para terminar (15/11/2025 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

2/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

2/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



AEROCIVIL

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



Compradores

Proveedores

CONSORCIO SUMMAR 2025

COLOMBIA, Villavicencio

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SUMMAR 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

AprobadoSUMMA INGENIERIA

Fecha de 3/07/2025 3:11:28 PM

por: Y CONSULTORIA SAS

aprobación: ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado:carlos andres

Fecha de 3/07/2025 5:26:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

por: jaramillo silva

aprobación: 05:00)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_8041385_Firmado

Contrato en ejecución:

CO1_PCCNTR_8041385_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías?

☒Sí☐No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la
oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del
contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

2/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

2/01/2026 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del
contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

2/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

1/09/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del
contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

2/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

2/09/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

200

Fecha límite
para entrega de
garantías:

3/07/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 17/09/2025 2:47:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17927219	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20 días para terminar (29/11/2025 11:59 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17926974	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	71.705.823,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/11/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17927109	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/09/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17576919	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3/09/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle
CO1.WRT.17576541	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	71.705.823,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3/09/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

1

2

»

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.8041385

Proveedor

CONSORCIO SUMMAR 2025

Creado por

Agregado en

-

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META

Ubicación

CO-MET-50001 - Villavicencio

País

COLOMBIA

Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLAVICENCIO	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1	CO01.PCONTR.8041385								
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							129.925.005,00	119.509.705,73	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72102900	53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO	1,00	UN	129.925.005,00	119.509.705,73	129.925.005,00	119.509.705,73	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CCE-EICP-IDI-46 Anexo2 Comunicacion de Aceptacion de la Oferta Tanques.pdf	CCE-EICP-IDI-46 Anexo2 Comunicacion de Aceptacion de la Oferta Tanques.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Paz		☐ Sí ☒ No *	
Destinación del gasto		Inversión	
Fuente de los recursos:		Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN		☐ Sí ☒ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP		☐ Sí ☒ No *	
Sistema General de Regalias - SGR		☐ Sí ☒ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Sí ☒ No *	
Recursos de Crédito		☐ Sí ☒ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		☒ Sí ☐ No *	119.509.705,73
Total		119.509.705,73	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Sí ☐ No

Código de autorización
Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

--

☐	5825	CDP	Con Compromiso	135.720.117 COP	129.925.005 COP	24-12-00-000	-	Editar
--------------------------	------	-----	----------------	-----------------	-----------------	--------------	---	--------

Saldo de CDP	135.720.117 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	129.925.005 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	31/05/2025 6:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 36425	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	119.509.705 COP	119.509.705 COP	10.490.295 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	119.509.705 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	119.509.705 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--------	---------	----------------	---------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Código	CCE-EICP- IDI-46	MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2
Versión No.	2	

25000762 H4 DE 2025

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 25000762 H4 DE 2025.

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA en calidad de Director Aeronáutico Regional Oriente de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL según Resolución de nombramiento número 01744 del 21 de agosto del 2024, actuando en nombre y representación de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, debidamente facultado, informa a CONSORCIO SUMMAR 2025 en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de selección abreviada menor cuantía No. **25000762 H4 DE 2025**.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es 53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:

- i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
- ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.
- iii) Suministrar oportunamente al contratista toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto del contrato.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$ 119.509.705,73)** Incluido IVA.

QUINTA. FORMA DE PAGO: La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2025, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 5825 expedido el 06 de marzo de 2025.

Código:	CCE-EICP-IDI-46	Versión:	2
----------------	-----------------	-----------------	---

Código	CCE-EICP- IDI-46	MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2
Versión No.	2	

NOVENA. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del funcionario que designe, el CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA, director regional Oriente.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del contrato las garantías señaladas en la invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO previa coordinación con el supervisor del contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en la plataforma transaccional SECOP II.


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	25000762 H4 -2025
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO SUMMAR 2025 – NIT: 901.965.820-2
OBJETO	53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR	\$ 119.509.705, 73 Iva Incluida
PLAZO	DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio
CDP	130.000.000,00
RP	119.509.705,73
FECHA LEGALIZACIÓN	15 septiembre 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Yessica Katherine Buitrago Ortiz

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2

En la ciudad de Villavicencio - Meta, el 15/09/2025 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: JESUS DAVID DIAZ CORTES identificada con Cédula de Ciudadanía 7.169.331 de TUNJA, obrando en calidad de contratista y el FUNCIONARIO YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ identificado con Cédula de Ciudadanía 1.127.387.180 de PUERTO CARREÑO como supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.


 Contratista


 Supervisor



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante


Usuario Solicitante: MHjhurtado JOHANNA ANDREA HURTADO REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-11:02 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5825 de fecha 2025-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	36425	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	119.509.705,73	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	119.509.705,73	Saldo x Obligar:	119.509.705,73				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901965820	Razón Social:	CONSORCIO SUMMAR 2025					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	351336078	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1121841332	Nombre:	CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ORIENTE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25000762 H4 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-08-04
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
3612 AEROPUERTO VANGUARDIA. VILLAVICENCIO - META	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF									
						119.509.705,73	0,00						
Total:						119.509.705,73	0,00	119.509.705,73	119.509.705,73				


Objeto: 53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.


PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
70000	UAEAC - RME - REG. META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	119.509.705,73	119.509.705,73	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 01 Inscripción				4. Número de formulario 141190876837			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119087683 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 6 5 8 2 0		2		Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
CONSORCIO SUMMAR 2025							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Meta		Villavicencio		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 24 1 191							
42. Correo electrónico consorciosummar@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1			
				3 1 3 3 4 7 9 4 5 8			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4 2 9 0	2 0 2 5 0 6 0 9						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 1 6 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
16- Obligación facturar por ingresos bienes							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI X NO				60. No. de Folios: 5			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre DEVIA GAMBOA JACQUELINE			
				985. Cargo Analista IV			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141190876837			
 (415)7707212489984(8020) 000014119087683 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 6 5 8 2 0 2		2		Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 5 0 6 0 9				84. Nacional privado 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 5 0 6 0 9				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		5 0					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 5 0 6 0 9					
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141190876837			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119087683 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 6 5 8 2 0		2		Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 6 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 9 3 3 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DIAZ		105. Segundo apellido CORTES		106. Primer nombre JESUS		107. Otros nombres DAVID	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 6 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 8 6 0 8 5 0 5 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GUTIERREZ		105. Segundo apellido FLOREZ		106. Primer nombre JAIRO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141190876837			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119087683 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 6 5 8 2 0		2		Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 0 5 8 9 9 1 2		5 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social SUMMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 5 0 6 0 9			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 4 2 9 1 8 6		2 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social MATMAR CONSTRUCCIONES SAS						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 5 0 6 0 9			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

Fecha generación documento PDF: 14-07-2025 08:58:38AM

				FORMATO									
		ACTA DE COSTOS DE OBRA											
		Clave: MSER-7.0-12-003					Versión: 01		Fecha de aprobación: 15/08/2025				
		ACTA PARCIAL No. 01							PERÍODO		FECHA DE RADICACIÓN		
									15/08/2025		03/08/2025		
CONTRATO:		2800702 H4 DE 2025					OBJETO:		5088/0025 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINERÍA DE BOMBEO DE RESERVOIRIO DE LA ALACANTRA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SUMAR 2025					RE:		JESUS DAVID DIAZ CORTES				
SUPERVISOR:		YESICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ					RE:		NA				
		VALOR INICIAL:					VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 01		
		\$ 110.500.700,73					\$ 110.500.700,73		\$ 0,00		\$ 90.953.875,00		
											\$ 90.953.875,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		
											\$ 20.000.000,00		

 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDADES Y TERRITORIO		FORMATO	
ACTA DE COSTOS DE OBRA			
Código: MSMT-03-003		Versión: 03	Fecha de aprobación: 18/08/2023
NOVENA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE			
<div>SEÑALACIONES:</div>			
			
NOMBRE JESSE DAVID BAL CORTES CONTRATISTA	NOMBRE NA CONTRATISTA	NOMBRE YESSICA KATHERINE BARRAGO ORTIZ SUPERVISORA	NOMBRE NA
<p>It. Es el número de orden conservatorio de los ítems de nuevo de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no revisados se continúa con el conservatorio que corresponde.</p> <p>III. Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.</p> <p>III. Corresponde a las condiciones originales, relacionándose en el mismo orden de la propuesta económica aprobada.</p> <p>IV. Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.</p> <p>V. Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades.</p> <p>VII. Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.</p> <p>VIII. Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.</p> <p>VIII. Corresponde al saldo de cantidades sobre la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumuladas actual.</p> <p>Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.</p> <p>Los valores no pueden llevar número decimales.</p>			
