

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		VILLA COMUNITARIA INTEGRAL CORREGIMIENTO	vie 2/05/25	mié 17/03/27	
2		PRELIMINARES	vie 2/05/25	mar 20/05/2	
3		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	vie 2/05/25	mar 13/05/25	
4		CAMPAMENTO EN LAMINA DE ZINC	mié 14/05/25	mar 20/05/25	3
5		DESMONTES Y DEMOLICIONES	jue 15/05/25	mié 28/05/25	
6		DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	jue 15/05/25	mié 28/05/25	3FC+1 día
7		DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISE CONCRETO E > A 12CM	jue 15/05/25	mar 20/05/25	3FC+1 día
8		EXCAVACIONES Y RELLENOS	jue 29/05/25	mar 16/12/25	
9		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	jue 29/05/25	mié 9/07/25	6
10		EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRETAMOS SIN EXPLOSIVOS,	jue 10/07/25	mar 15/07/25	9
11		RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	mar 14/10/25	lun 24/11/25	21
12		EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS	vie 5/12/25	mar 16/12/25	14FC+2 días
13		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	mié 16/07/25	vie 13/02/26	
14		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	vie 28/11/25	mar 2/12/25	11FC+3 días
15		CONCRETO DE ZAPATAS 21 Mpa + FORMALETA	mar 2/12/25	mar 9/12/25	17FC-15 días
16		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCION RECTANGULAR	mar 9/12/25	lun 15/12/25	15
17		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 420 MPa	mar 25/11/25	mar 23/12/25	23
18		MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.5M D=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	jue 29/01/26	vie 30/01/26	16;44CC-3 días;45CC-3 días;46CC-3 días;52CC-3 días;56CC-3 días;67CC-3
19		COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa-(3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 METROS-FORMALET MADERA	mié 17/12/25	vie 26/12/25	16FC+2 días
20		LOSA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, JUNTAS DE DILATAcion Y JUNTAS DE CONSTRUCCION) E= 0.12MTS.	vie 30/01/26	lun 9/02/26	18
21		MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 Mpa-3000 PSI 1.01 MTS H 2.00 MTS	mié 16/07/25	lun 13/10/25	9;10
22		PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	mar 10/02/26	vie 13/02/26	20
23		SOLIDADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	mar 25/11/25	mar 25/11/25	11
24			mar 6/01/26	mié 14/01/26	19FC+7 días
25		ESTRUCTURA METÁLICA	vie 13/03/26	vie 27/03/26	
26		PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	vie 13/03/26	vie 27/03/26	36;55
27		INSTALACION DE ACCESORIOS COMO PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36. INCLUYE SOLDADURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	vie 13/03/26	vie 27/03/26	36;55

Proyecto: 06mar25 Cronogram
Fecha: vie 7/03/25

Tarea División

Hito Resumen

Resumen del proyecto Tarea inactiva

Hito inactivo Resumen inactivo

Tarea manual solo duración

Informe de resumen manual Resumen manual

solo el comienzo solo fin

Tareas externas Hito externo

Fecha limite Tareas criticas

División crítica Progreso

Progreso manual

Página 1

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras
68		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	mar 3/02/26	lun 9/02/26	30;31;32
69		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	vie 13/02/26	vie 20/02/26	66;67;68
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
71		CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO.	vie 20/02/26	vie 13/03/26	69
72		CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO.	vie 20/02/26	lun 2/03/26	69
73		CAJAS DE INSPECCION DE 0.5 V.D.E.V.A.CE.R.T.E.	vie 20/02/26	mié 25/02/26	69
74		APARATOS SANITARIOS	jue 16/04/26	lun 4/05/26	
75		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E	jue 16/04/26	vie 17/04/26	169
76		SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	jue 16/04/26	lun 4/05/26	169
77		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	jue 16/04/26	jue 30/04/26	169
78		INSTALACIONES ELECTRICAS	vie 2/05/26	mié 17/03/27	
79		suministro e instalación Estructura AE217 Acometida aérea de baja tensión desde red abierta bifasica. Incluye suministro e	jue 19/02/26	lun 23/02/26	85;90
80		Suministro e instalación ACOMETIDA TREBOL 2X4+ 4	jue 19/02/26	vie 20/02/26	85;90
81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO NORMA CODENSA AE303 Dimensiones	mié 4/03/26	vie 6/03/26	126;119;118;110;
82		suministro e instalación MEDIDOR BIFASICO Electromagnético de 5 a 100 AMP, calibrado y	mié 4/03/26	jue 5/03/26	126;119;118;110;
83		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THWN/THHN EN CABLE 2X4AWG + 4AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI	jue 19/02/26	mié 25/02/26	85;90
84		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC Tipo 2"	mar 3/02/26	lun 9/02/26	30;31;32
85		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE AISLADO AWG No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye	mar 10/02/26	jue 19/02/26	84;91;104;116;12
86		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de identificación,	mié 4/03/26	mié 18/03/26	126;119;118;110;
87		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO	mié 4/03/26	mié 4/03/26	126;119;118;110;

Proyecto: 06mar25 Cronogram
Fecha: vie 7/03/25

Tarea División

Hito Resumen

Resumen del proyecto Tarea inactiva

Hito inactivo Resumen inactivo

Tarea manual solo duración

Informe de resumen manual Resumen manual

solo el comienzo solo fin


Tareas externas Hito externo

Fecha limite Tareas criticas

División critica Progreso

Progreso manual

Página 3

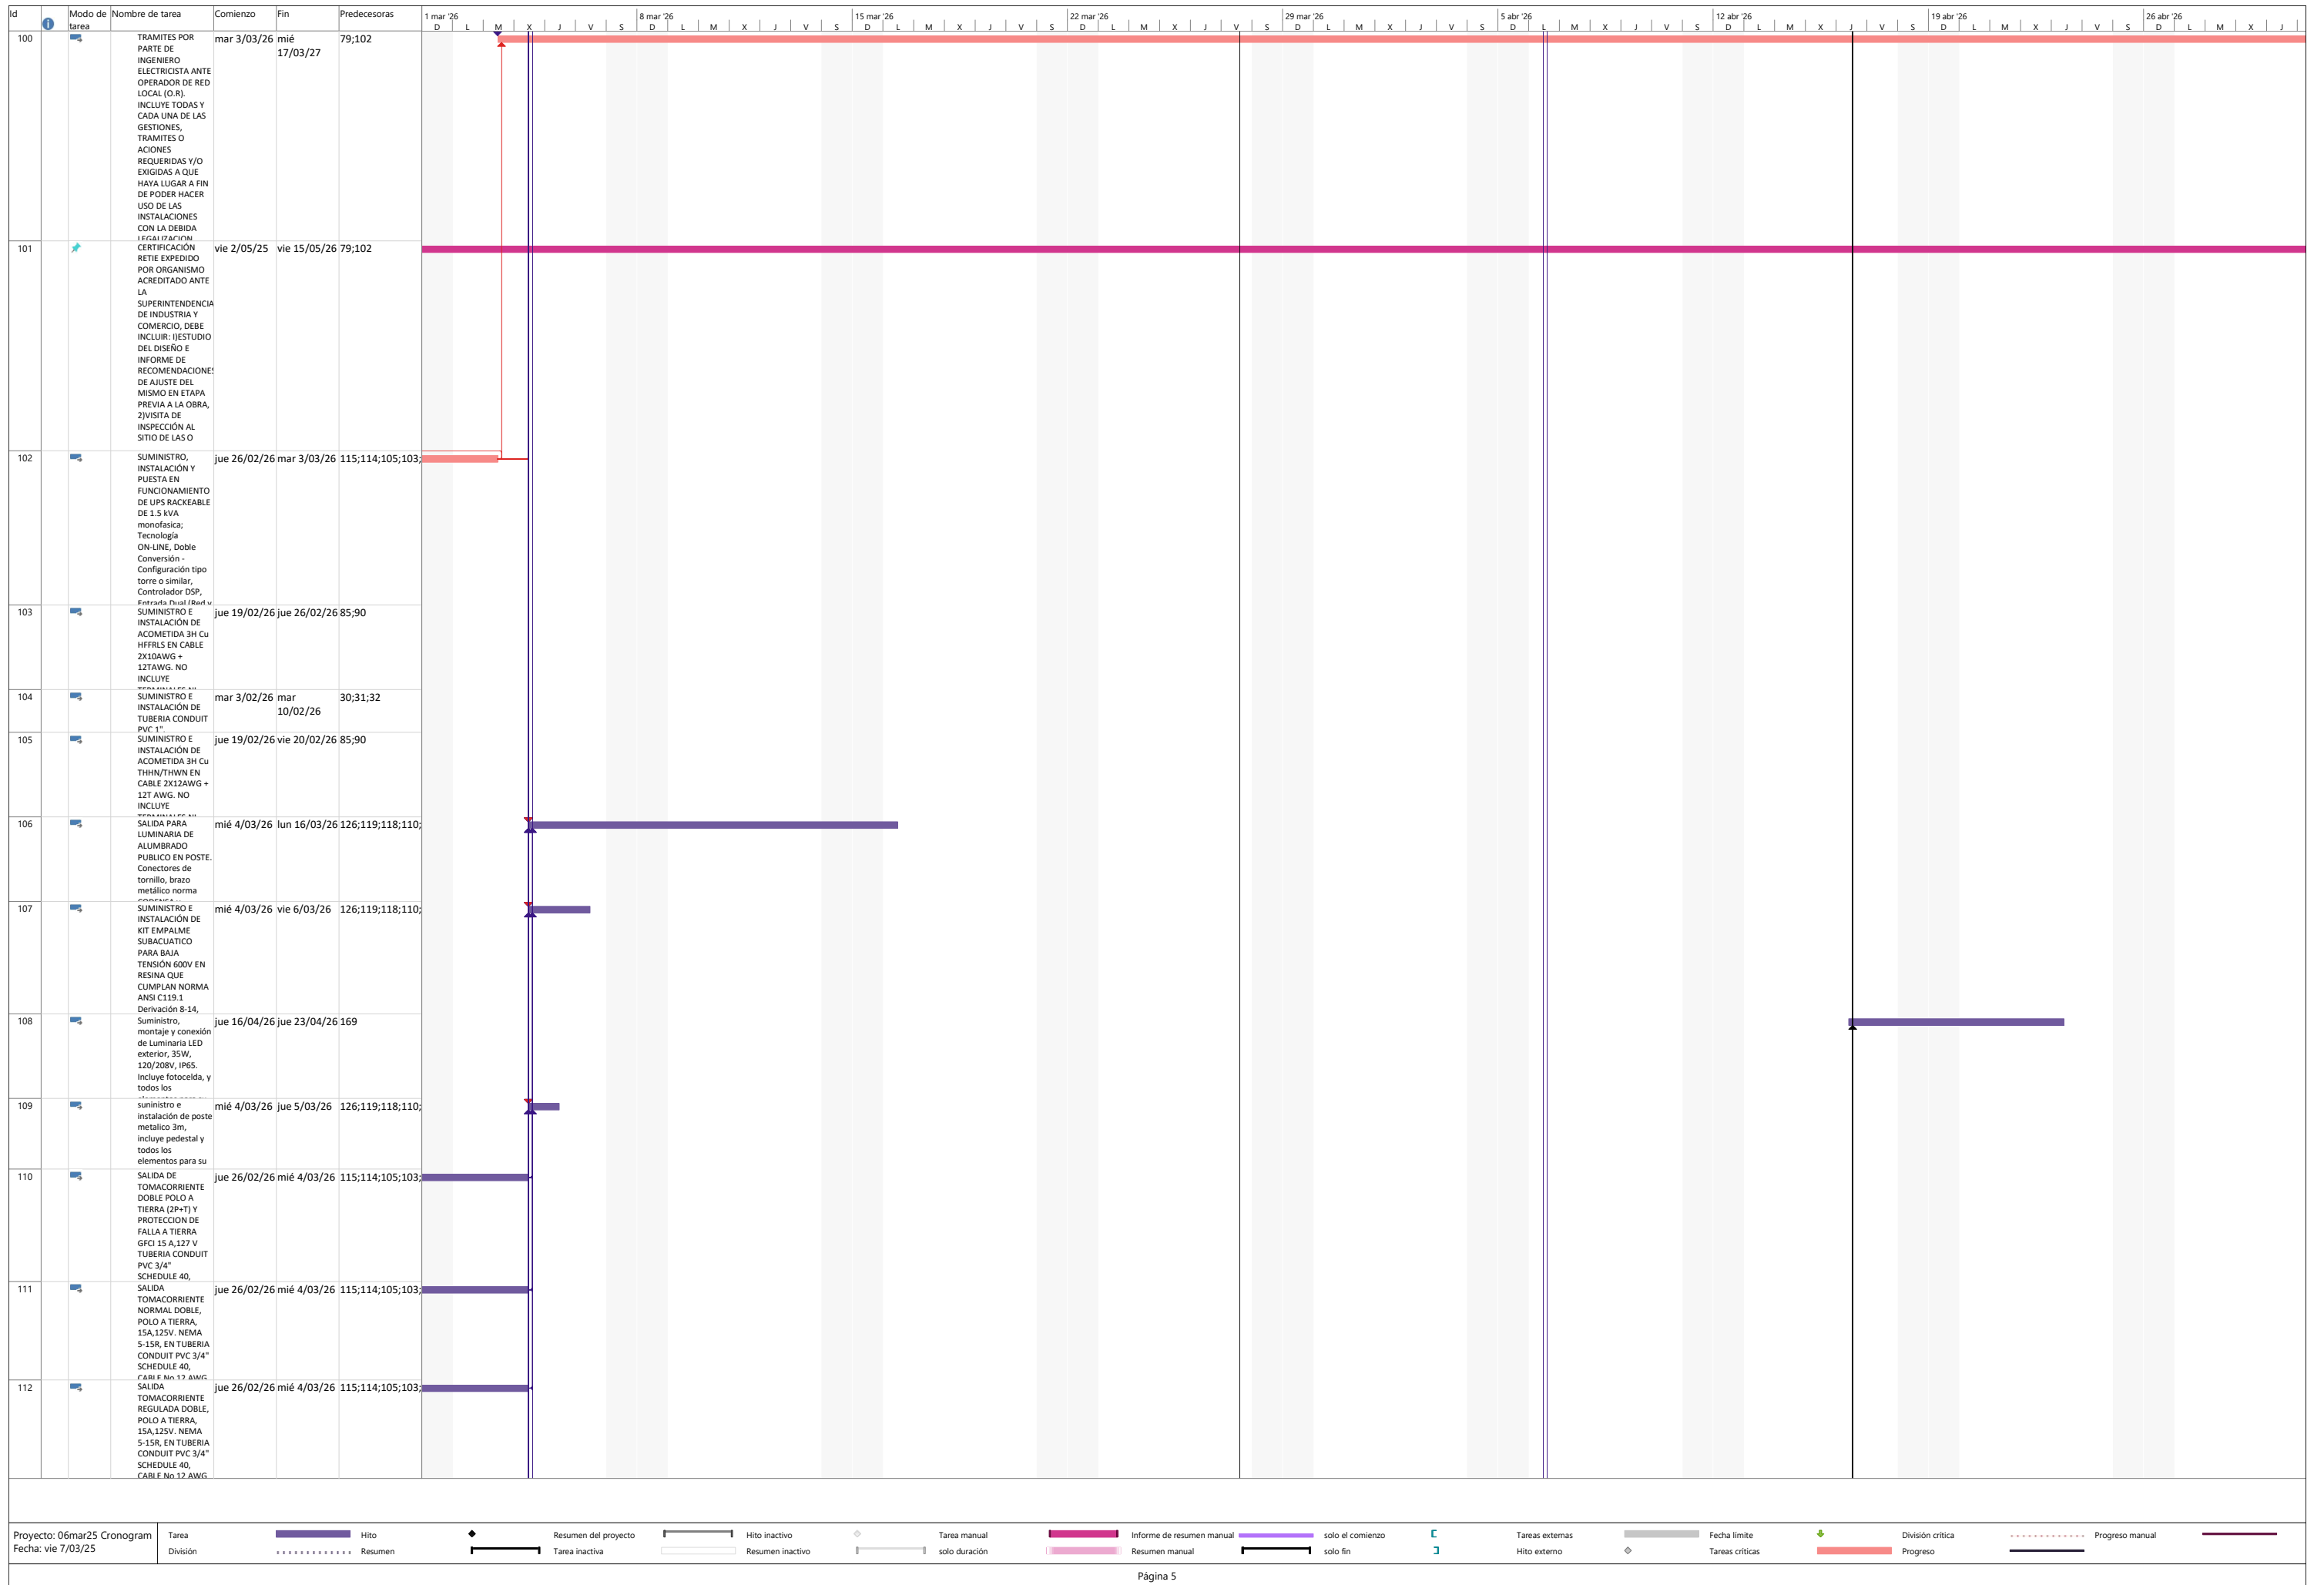

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras	1 mar '26							8 mar '26							15 mar '26							22 mar '26							29 mar '26							5 abr '26							12 abr '26							19 abr '26							26 abr '26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
126		SAUIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HHFR 15 CT. INCLUSIVE	jue 26/02/26	vie 27/02/26	115;114;105;103;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras
138	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
139	[icon]	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS TIPO OUTDOOR/INDOOR, OM3+OM4. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	mar 3/02/26	vie 6/02/26	30;31;32
140	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA MONOFÁSICA HORIZONTAL PARA RACK 12 SALIDAS, Dimensión 19", Nivel de Tensión 110V, Chasis en Calibre 22. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
141	[icon]	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMARA TIPO DOMO DIA/NOCHE DE RENDIMIENTO ALTO, CON IR, PoE, HD, VIDEO ANALYTICS, RESOLUCION MINIMA 5MP, LENTE ZOOM CON ENFOQUE AUTOMATICO, CODIFICACION H.265 Y ALTO	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
142	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6A, En calidad Ortronics, Leviton similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
143	[icon]	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLUG RJ-45 CAT 6A, Para Cable Blindado Conocido Como MPTL (Modular Plug Terminated Link), Capacidad para soportar 10Gb/s, Capacidad de ser reutilizable y reinstalado, Para SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 24 x 10/100/1000T PoE+ 370W disponibles, 2 x 10G SFP+ ports US Power Cord, con doble fuente de poder. Soporte técnico para cada uno de sus componentes por 3	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
144	[icon]	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 24 x 10/100/1000T PoE+ 370W disponibles, 2 x 10G SFP+ ports US Power Cord, con doble fuente de poder. Soporte técnico para cada uno de sus componentes por 3	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
145	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2"	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
146	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 UR, incluye accesorios de fijación, conexión y todo lo	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
147	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
148	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2"	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
149	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT DUAL BAND	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32
150	[icon]	Suministro e instalación de ducha eléctrica con resistencia blindada 120 V 3500/4000W, incluye todo lo	mar 3/02/26	mié 4/02/26	30;31;32

Proyecto: 06mar25 Cronogram
Fecha: vie 7/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Fecha limite


Tareas criticas

División critica

Progreso manual

Progreso

Página 8

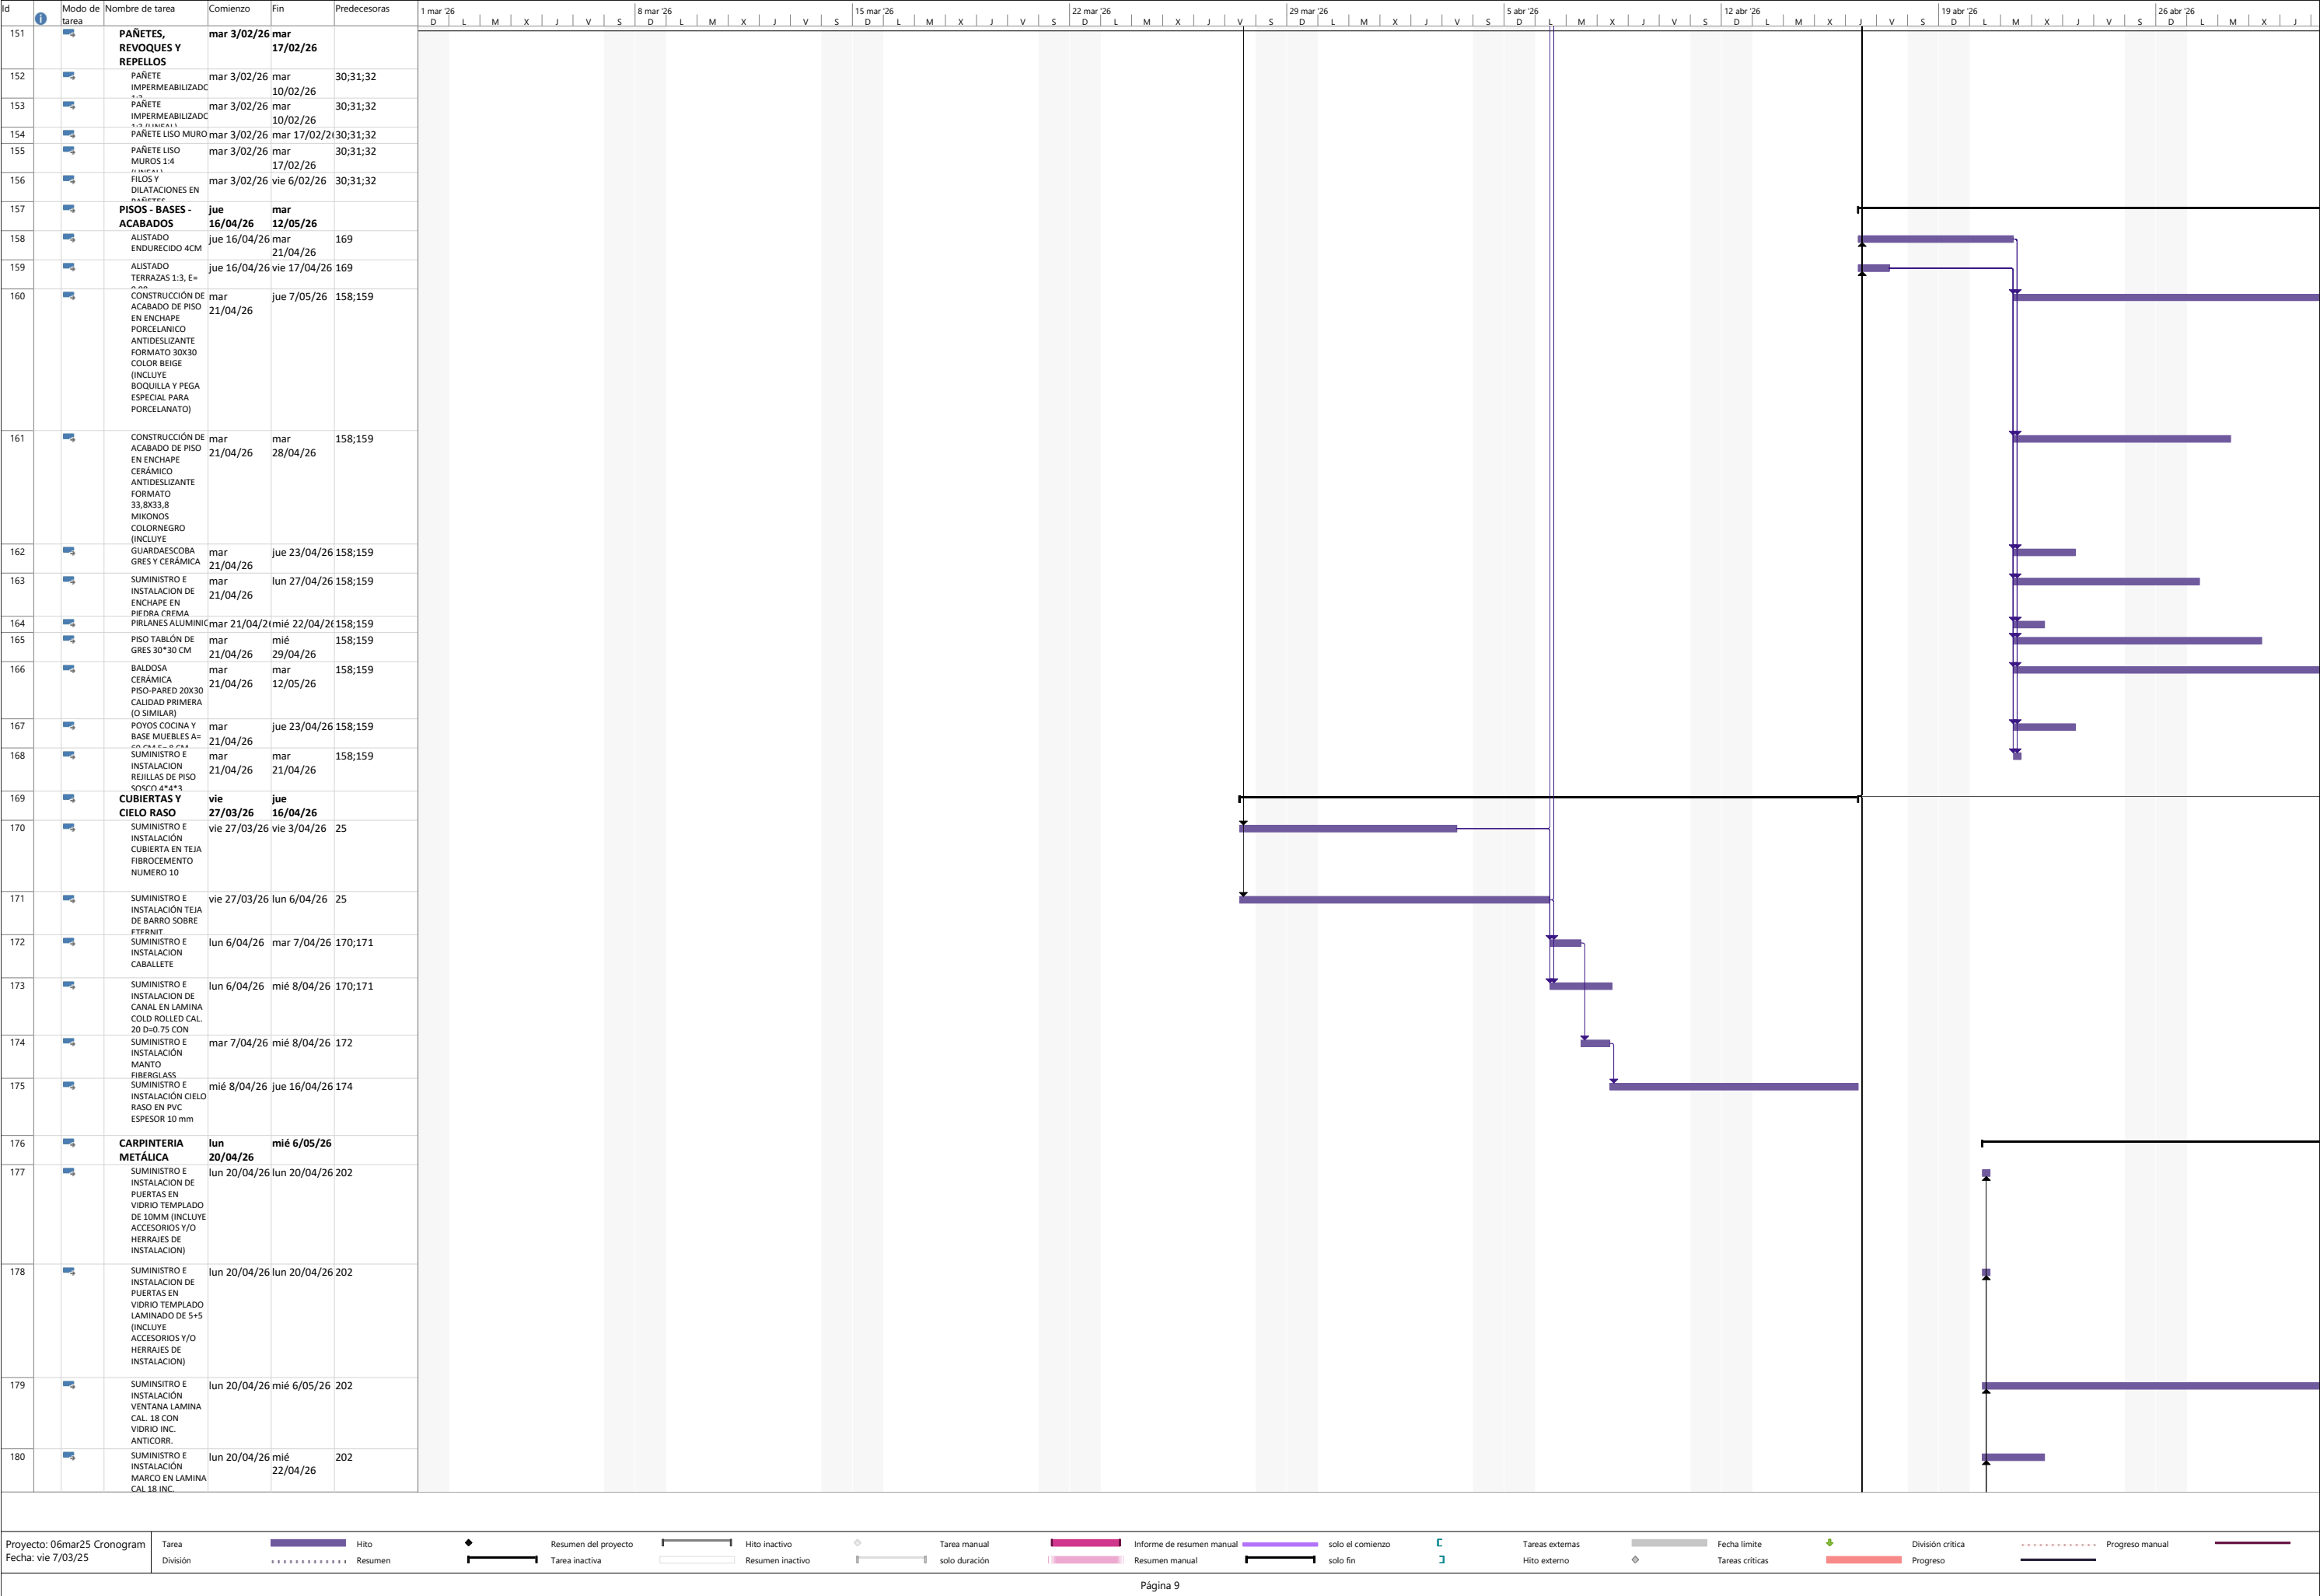

Página 9

