

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM411 de 2023
CONTRATO DE OBRA No. CLPIH392 de 2023

INFORME MENSUAL No. 01 DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el Contratista y la Interventoría desde el **23 DE NOVIEMBRE** al **30 DE NOVIEMBRE DE 2023**.

FINAL ☐

PARCIAL ☒

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA" E "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.".



MUNICIPIO: LA ARGENTINA – LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO: HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el **23 DE NOVIEMBRE al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**, en cumplimiento del contrato general de “INTERVENTORIA No. CIHCM 411 DE 2023” cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA”; y el cumplimiento del contrato general de “OBRA No. CLPIH 392 DE 2023” cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.”.

Para lo cual se efectuará en el municipio de LA ARGENTINA: “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.”.

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción del tejido social; apoyado en estrategias que benefician los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población huilense con la infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las políticas Departamentales y Nacionales.

El espacio público es un lugar de uso colectivo y de convivencia social, donde se convierte en un elemento estructurante de la calidad de vida, en un dinamizador de la ciudad y en un elemento que da soporte a los diferentes procesos y dinámicas del espacio urbano. Por su parte, el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función la formación integral de las personas, preservar y mejorar la salud del ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen un gasto público social, en la Constitución Política de Colombia, se constituye el derecho de todas las personas a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

La baja práctica de deportes o recreación en los diferentes municipios del Departamento del Huila, se relaciona con el mal estado de los escenarios deportivos o con la inexistencia de los mismos, y la falta de incentivos para

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

la práctica, lo que ocasiona incremento en los índices de sedentarismo que desembocan problemas de obesidad y que tienen como desenlace graves problemas de salud en la población Huilense.

El activar los espacios deportivos de fácil acceso, desarrolla comportamientos saludables que reducen la inactividad física, estos están equipados para el acondicionamiento y desarrollo del bienestar humano. Por consiguiente, el crear una cultura de fomento que permita el desarrollo de actividades no cotidianas, da apertura al diseño de hábitos participativos que fomenten los programas que el mismo gobierno viene desarrollando, lo que motivaría al disfrute y participación de ciudadanos que no se encuentran familiarizado con dichos espacios. El esfuerzo físico no va ligado solamente al desarrollo de un deporte de alta competencia, si no a la dedicación que se proyecte el individuo para el logro de un objetivo, que domine ante cualquier adversidad, esa sensación de satisfacción y conlleve al mejoramiento del estado psicológico del mismo.

Lo anterior deja reflejado la necesidad de crear espacios públicos, pensado en proporcionar comodidad, acercamiento de los habitantes logrando el sentimiento de afecto hacia su territorio, protagonistas del escenario, actores felices y con disposición de ayudar a conservar y usar racionalmente la infraestructura y escenarios públicos, permitiendo así mejorar la calidad de vida.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

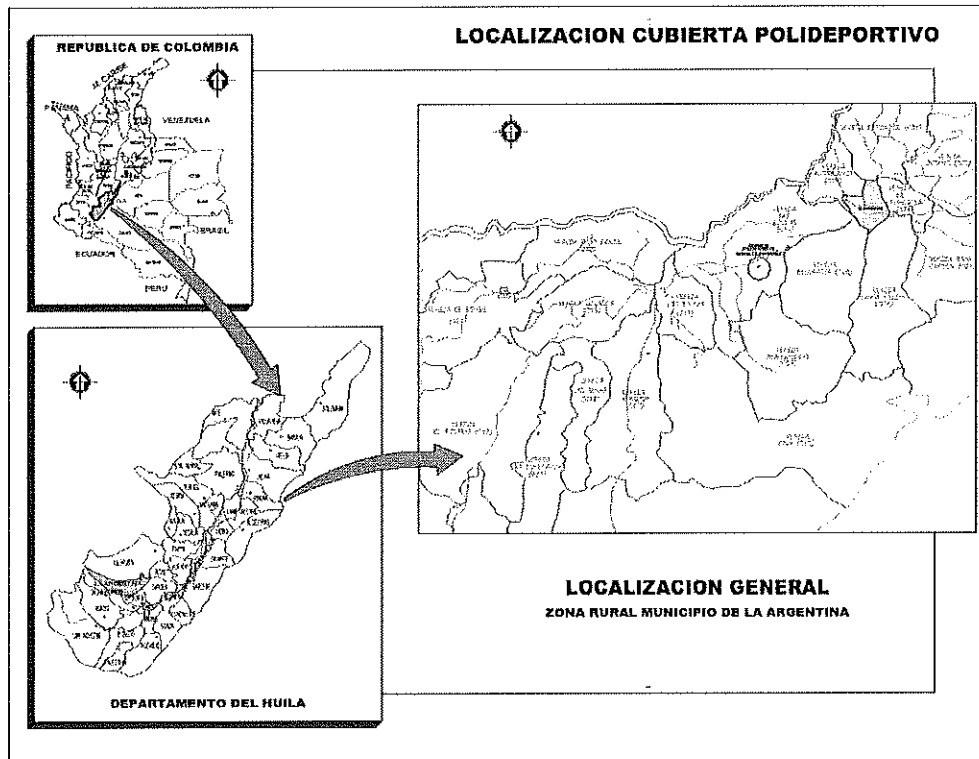
El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 723.02 m2 por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante con teja metálica cal. 22 para el polideportivo ubicado en la vereda La Esperanza de la zona rural del municipio de La Argentina – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponderá a estructura, restitución de placa, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con un sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.000 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 – NSR-10.

3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en la Vereda LA ESPERANZA del Municipio de LA ARGENTINA, Departamento del Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024



3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra consiste en la construcción de cubierta auto portante en teja de lámina calibre 22, la cual descansa sobre dos (2) pórticos en concreto cada uno conformado por seis (6) columnas de sección 40x45 de altura libre 5,80 mts, unidas por viga canal de 30,40 ml de longitud y de sección 35x40 cm, con aletas. Las columnas están apoyadas sobre zapatas de altura de 50 cm, que se encuentran soportadas sobre concreto ciclópeo, según planos y unidas por vigas de amarre. El diseño contempla las instalaciones eléctricas para tomacorrientes de 110v y 220v, con instalación de luminarias en cada columna con brazos metálicos conectados a poste existente. Igualmente se contempla el suministro e instalación de canchas en tubo multifuncionales con tableros y aros para basquetbol. Incluye igualmente la demarcación en pintura según diseño y especificaciones técnicas. Las aguas de escorrentía de la cubierta y áreas circundantes se manejan en 8 bajantes en tubería de PVC de 4" que caen a cunetas perimetrales y a cajas de recolección que se conectan con tubería de 6" y se descolan en tubería de 8".

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**
 - * Localización y replanteo.
 - * Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.
 - * Desmonte marcos canchas existentes.

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

- * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
- * Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

- CIMENTACIÓN

- * Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts
- * Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.
- * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas.
- * Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.
- * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación
- * Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga

- ESTRUCTURAS EN CONCRETO

- * Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.
- * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas
- * Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.
- * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal
- * Suministro e instalación de manto zetal viga canal.

- CUBIERTA

- * Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintura poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.

- ACABADOS - PLACAS EN CONCRETO

- * Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.
- * Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.

- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- * Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.
- * Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.
- * Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.
- * Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- * Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.
- * Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor.

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

- * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
- * Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.
- * Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"
- * Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"
- * Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.
- * Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.
- * Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.
- * Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.
- * Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.
- * Suministro e instalación de reflector led de 150 w
- * Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.
- * Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.
- * Excavación, Hincada y plomada de poste de concreto de 8 MTS X 510 KG armado y centrifugado.

- **TRANSPORTE**

- * Transporte de materiales pétreos

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que mediante Resolución No. 343 del 05 de octubre de 2023, la entidad dio apertura al proceso de Contratación No. IHCM021-023, y que por medio de la Resolución No. 387 del 25 de octubre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato, a la Empresa **SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.**, representada legalmente por el ingeniero **JAVIER BARRERO MOSSOS**.

CONTRATO No.	CIHCM411 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA"
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. NIT. 891.101.100-5 R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS C.C: 7.685.694 DE NEIVA (H)
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS (\$85.798.121) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS (\$85.798.121) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01/11/2023

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE INICIO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	08 DE FEBRERO DE 2024

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CIHCM411 DE 2023	
Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 30%	Valor pagado
Valor Anticipo				
Acta Parcial No. 1				
Acta Parcial No. 2				
Acta Recibo Final				
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 85.798.121	\$ 0	\$ 85.798.121	\$ 0	\$ 85.798.121
HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	01/11/2023			
Iniciación	09/11/2023	21	N/A	08/02/2024
Terminación	08/02/2024	N/A	N/A	N/A

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	09/11/2023

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000639 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - PROYECTO 2023004410106 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTORPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HULA, FUENTE: 1:50103-VIGENCIAS EXPIRADAS - RB RECURSOS PROPIOS - TRASLADO	\$ 41.263.288	2023
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000639 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - PROYECTO 2023004410113 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURLA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 1:50103-VIGENCIAS EXPIRADAS - RB RECURSOS PROPIOS - TRASLADO	\$ 44.534.833	2023

4.1.2. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	0	07/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/02/2024	01/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	0	07/11/2023		01/11/2023	01/02/2024

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 246 del 07 de septiembre de 2023, la Entidad dio apertura al Proceso de Contratación No. LPIH033-2023, y por medio de la Resolución 367 del 10 de octubre del 2023, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **CONSORCIO INDER A & S.**

CONTRATO No.	CLPIH392 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INDER A & S. NIT: 901767134-9 R.L. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA C.C. 1.182.774.968 DE SAN AGUSTIN (H)
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. (\$ 488.701.732,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. (\$ 488.701.732,00) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	22 DE FEBRERO DE 2024

Estado Financiero del Contrato de Obra			CLPIH392 DE 2023	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 25%	Valor pagado
Valor Anticipo (%)	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor del contrato	01/11/2023	\$ 488,701,732.00	N/A	N/A
Adicional	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMINACION Cto.	22/02/2024	\$ 488,701,732.00	N/A	\$ 488,701,732.00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 488,701,732.00	\$0.00	\$ 488,701,732.00	\$ 3,094,466.38	\$ 485,607,265.62

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	01/11/2023			
Iniciación	23/11/2023	8	N/A	22/02/2024

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.indershula.gov.co - atencionusuario@indershula.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
TERMINACIÓN Cto.	22/02/2023	N/A	N/A	22/02/2024
TOTAL, DÍAS		8	0	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO	1	01/11/2023
Inicio		23/11/2023

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000659	VALOR	VIGENCIA
Servicios de la construcción AUXILIAR: 102-Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR_43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz. SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301026-Cancha construida y dotada CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento- META: 10-Construcción y Dotación de 2 Canchas ACTIV: 1.4.2-Construir e iluminar Cubiertas PROYECTO: 2023004410106-CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE: 150103-21 RECURSOS PROPIOS TRASLADO		\$ 488.701.732	2023

4.4. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZ O	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
				Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	FORMATO			CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			VERSIÓN	1
				VIGENCIA	JUNIO 2024

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-47- 994000049461	0	03/11/2023	Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	01/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74- 994000006551	0	03/11/2023	01/11/2023	01/02/2024	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74- 994000006551	1	08/11/2023	08/11/2023	01/02/2024	

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El ingeniero **OSCAR LEÓN ESCOBAR** es designado mediante oficio por la Directora del INDERHUILA **MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH411 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de Concurso de selección de Méritos Abierto No. IHCM021-2023

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

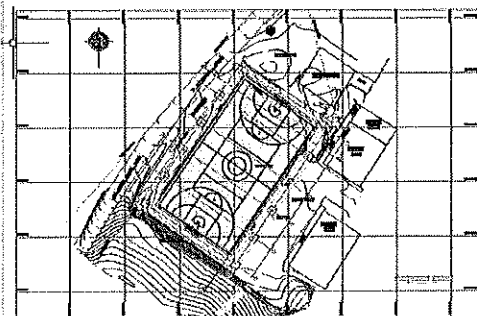
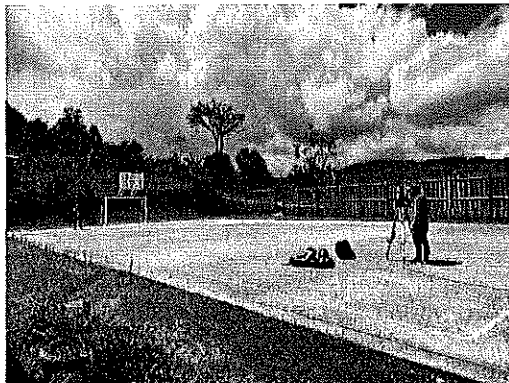
Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:


- Se realizó reuniones con el contratista de obra e interventoría para dar inicio con la ejecución de la obra

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

7. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

Visualización general de la obra:

1. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	2. REGISTRO FOTOGRÁFICO
	
<p>PRELIMINARES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localización y replanteo 	

	
	{30/11/2023}
	FECHA DE ENTREGA
FIRMA ORIGINAL APOYO A LA SUPERVISIÓN	
