

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM411 de 2023
CONTRATO DE OBRA No. CLPIH392 de 2023


INFORME MENSUAL No. 07 DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el Contratista y la Interventoría desde el **01 DE OCTUBRE** al **31 DE OCTUBRE DE 2024**

FINAL ☐

PARCIAL ☒

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA" E "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.".

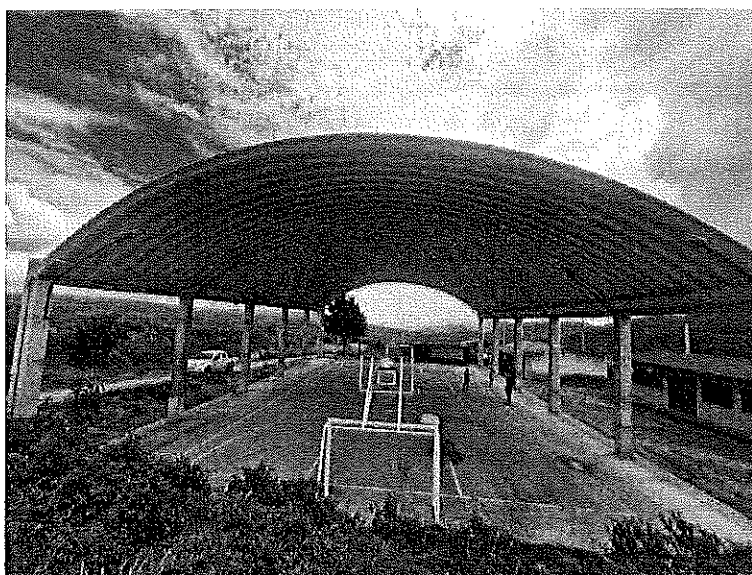

MUNICIPIO: LA ARGENTINA – LA ESPERANZA

DEPARTAMENTO: HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el **01 DE OCTUBRE al 31 DE OCTUBRE DE 2024**, en cumplimiento del contrato general de “INTERVENTORIA No. CIHCM 411 DE 2023” cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA”; y el cumplimiento del contrato general de “OBRA No. CLPIH 392 DE 2023” cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.”.

Para lo cual se efectuará en el municipio de LA ARGENTINA: “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.”.

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción del tejido social; apoyado en estrategias que benefician los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población huilense con la infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las políticas Departamentales y Nacionales.

El espacio público es un lugar de uso colectivo y de convivencia social, donde se convierte en un elemento estructurante de la calidad de vida, en un dinamizador de la ciudad y en un elemento que da soporte a los diferentes procesos y dinámicas del espacio urbano. Por su parte, el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función la formación integral de las personas, preservar y mejorar la salud del ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen un gasto público social, en la Constitución Política de Colombia, se constituye el derecho de todas las personas a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

La baja práctica de deportes o recreación en los diferentes municipios del Departamento del Huila, se relaciona con el mal estado de los escenarios deportivos o con la inexistencia de los mismos, y la falta de incentivos para

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

la práctica, lo que ocasiona incremento en los índices de sedentarismo que desembocan problemas de obesidad y que tienen como desenlace graves problemas de salud en la población Huilense.

El activar los espacios deportivos de fácil acceso, desarrolla comportamientos saludables que reducen la inactividad física, estos están equipados para el acondicionamiento y desarrollo del bienestar humano. Por consiguiente, el crear una cultura de fomento que permita el desarrollo de actividades no cotidianas, da apertura al diseño de hábitos participativos que fomenten los programas que el mismo gobierno viene desarrollando, lo que motivaría al disfrute y participación de ciudadanos que no se encuentran familiarizado con dichos espacios. El esfuerzo físico no va ligado solamente al desarrollo de un deporte de alta competencia, si no a la dedicación que se proyecte el individuo para el logro de un objetivo, que domine ante cualquier adversidad, esa sensación de satisfacción y conlleve al mejoramiento del estado psicológico del mismo.

Lo anterior deja reflejado la necesidad de crear espacios públicos, pensado en proporcionar comodidad, acercamiento de los habitantes logrando el sentimiento de afecto hacia su territorio, protagonistas del escenario, actores felices y con disposición de ayudar a conservar y usar racionalmente la infraestructura y escenarios públicos, permitiendo así mejorar la calidad de vida.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 723.02 m² por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante con teja metálica cal. 22 para el polideportivo ubicado en la vereda La Esperanza de la zona rural del municipio de La Argentina – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponderá a estructura, restitución de placa, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con un sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.000 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 – NSR-10.

3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en la Vereda LA ESPERANZA del Municipio de LA ARGENTINA, Departamento del Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

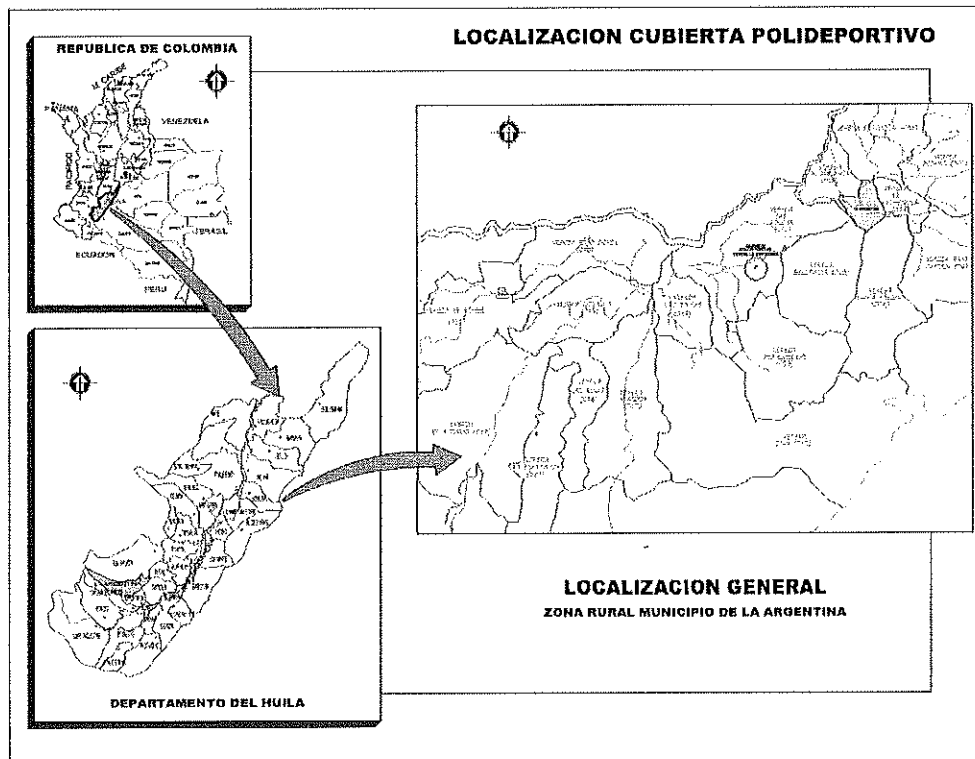

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra consiste en la construcción de cubierta auto portante en teja de lámina calibre 22, la cual descansa sobre dos (2) pórticos en concreto cada uno conformado por seis (6) columnas de sección 40x45 de altura libre 5,80 mts, unidas por viga canal de 30,40 ml de longitud y de sección 35x40 cm, con aletas. Las columnas están apoyadas sobre zapatas de altura de 50 cm, que se encuentran soportadas sobre concreto ciclópeo, según planos y unidas por vigas de amarre. El diseño contempla las instalaciones eléctricas para tomacorrientes de 110v y 220v, con instalación de luminarias en cada columna con brazos metálicos conectados a poste existente. Igualmente se contempla el suministro e instalación de canchas en tubo multifuncionales con tableros y aros para basquetbol. Incluye igualmente la demarcación en pintura según diseño y especificaciones técnicas. Las aguas de escorrentía de la cubierta y áreas circundantes se manejan en 8 bajantes en tubería de PVC de 4" que caen a cunetas perimetrales y a cajas de recolección que se conectan con tubería de 6" y se descolan en tubería de 8".

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**
 - * Localización y replanteo.
 - * Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.
 - * Desmonte marcos canchas existentes.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

- * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
- * Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.
- **CIMENTACIÓN**
 - * Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts
 - * Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.
 - * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas.
 - * Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.
 - * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación
 - * Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga
- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO**
 - * Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.
 - * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas
 - * Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.
 - * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal
 - * Suministro e instalación de manto zetal viga canal.
- **CUBIERTA**
 - * Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintura poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.
- **ACABADOS - PLACAS EN CONCRETO**
 - * Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.
 - * Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.
- **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**
 - * Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.
 - * Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.
 - * Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.
 - * Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño
- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**
 - * Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.
 - * Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor.

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

- * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
- * Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.
- * Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"
- * Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"
- * Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.
- * Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.
- * Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.
- * Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.
- * Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.
- * Suministro e instalación de reflector led de 150 w
- * Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.
- * Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.
- * Excavación, Hincada y plomada de poste de concreto de 8 MTS X 510 KG armado y centrifugado.

- **TRANSPORTE**

- * Transporte de materiales pétreos

- **ITEMS NO PREVISTOS**

- * Cerramiento perimetral con poli sombra.
- * Rejilla prefabricada para cuentas concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo. (40cm * 50cm * 0,05m)
- * Construcción placa en concreto de 3000 PSI. incluye formaleta, malla electrosoldada 5mm, corte y dilataciones.
- * Suministro, transporte e instalación de Medidor bifásico.
- * ACOMETIDA AEREA EN CABLE CONCENTRICO 2*8+8 600V.
- * Demolición de cuneta en concreto existente, hasta, ANCHO= 0.20 mt. Incluye retiro de material sobrante.
- * MANTENIMIENTO DE MARCOS DE CANCHAS FUTBOL SALA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS INCLUYE TABLERO ACRÍLICO CAL 10MM, ARO PARA BALONCESTO, MALLAS PARA CANCHAS DE FUTBOL SALA.

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que mediante Resolución No. 343 del 05 de octubre de 2023, la entidad dio apertura al proceso de Contratación No. IHCM021-023, y que por medio de la Resolución No. 387 del 25 de octubre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato, a la Empresa **SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.**, representada legalmente por el ingeniero **JAVIER BARRERO MOSSOS**.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

CONTRATO No.	CIHCM411 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA"
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. NIT. 891.101.100-5 R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS C.C: 7.685.694 DE NEIVA (H)
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS (\$85.798.121) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS (\$85.798.121) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01/11/2023
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
OTRO Sí No. 1 30/05/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL
OTRO Sí No. 2 10/07/2024	PRÓRROGA DE TRES (03) MESES Y 10 DIAS
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES Y 10 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE INICIO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	30 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CIHCM411 DE 2023	
Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 30%	Valor pagado
Valor Anticipo				
Acta Parcial No. 1				
Acta Parcial No. 2				
Acta Recibo Final				
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 85.798.121	\$ 0	\$ 85.798.121	\$ 0	\$ 85.798.121

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
FIRMA CONTRATO	01/11/2023			
Iniciación	09/11/2023			08/02/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	49		
Reiniciación No. 1	30/05/2024		154	09/08/2024
Adición plazo	10/07/2024	42	-	19/10/2024
Terminación	16/11/2024	99		
TOTAL DÍAS		190	154	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	09/11/2023
ACTA DE JUSTIFICACION DE SUSPENSION	1	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSION	1	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA EL REINICIO	2	30/05/2024
ACTA DE REINICIO	1	30/05/2024
OTROSI MODIFICATORIO NO. 01	1	30/05/2024
OTROSI MODIFICATORIO NO. 02	2	10/07/2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2025, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2025000299 DEL 09 DE MAYO DE 2025, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410106 – CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTORPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HULA, FUENTE: 1:50103-VIGENCIAS EXPIRADAS – RB RECURSOS PROPIOS - TRASLADO	\$ 41.263.288	2024

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2025, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2025000299 DEL 09 DE MAYO DE 2025, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - PROYECTO 2023004410113 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURLA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 1:50103-VIGENCIAS EXPIRADAS - RB RECURSOS PROPIOS - TRASLADO	\$ 44.534.833	2024
--	---------------	------

4.1.2. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	0	07/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/02/2024	01/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	0	07/11/2023		01/11/2023	01/02/2024
Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	1 y 2	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	1 y 2	01/01/2024		09/11/2023	09/02/2024

	FÓRMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

Poliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOS O	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	3	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOS O	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	3	01/01/2024		09/11/2023	09/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOS O	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	4	05/07/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	10/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	13/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOS O	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	4	05/07/204	-	09/11/2023	12/07/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1 (OTRO SÍ No. 2)

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1 (OTRO SÍ No. 2)						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	5	19/07/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	20/04/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	23/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-40-101018843	5	19/07/2024		09/11/2023	22/10/2024

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	6	30/08/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	30/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	01/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	6	30/08/2024	09/11/2023	22/10/2024	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	7	30/08/2024	09/11/2023	01/02/2025	

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 246 del 07 de septiembre de 2023, la Entidad dio apertura al Proceso de Contratación No. LPIH033-2023, y por medio de la Resolución 367 del 10 de octubre del 2023, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **CONSORCIO INDER A & S**.

CONTRATO No.	CLPIH392 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INDER A & S. NIT: 901767134-9 R.L. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA C.C. 1.182.774.968 DE SAN AGUSTIN (H)
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. (\$ 488.701.732,00) M/CTE
OTRO SI No. 4 (24/10/2024)	MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO – SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL VEINTE PESOS (\$ 74.813.020,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. (\$ 563,514,752.00) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

OTRO SÍ No. 1 20/06/2023	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL
OTRO SÍ No. 2 12/09/2024	PRÓRROGA DE UN (01) MES
OTRO SÍ No. 3 10/10/2024	PRÓRROGA DE UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	20 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 01:	20 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 02:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 03:	10 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024

Estado Financiero del Contrato de Obra			CLPIH392 DE 2023	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 25%	Valor pagado
Valor Anticipo (%)	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor del contrato	01/11/2023	\$ 488,701,732.00		
Adicional	24/10/2024	\$ 74.813.020		
Acta Final	13/11/2024	\$ 563.514.752	N/A	
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 488.701.732.00	\$ 74.813.020.00	\$ 563.514.752.00	\$538.227.734.38	\$ 25.287.018.62

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	01/11/2023			
Iniciación	23/11/2023			22/02/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	35		
Reiniciación No. 1	20/06/2024		173	13/09/2023
Otro si prorroga No. 1	20/06/2024			13/09/2023
Otro si prorroga No. 2	12/09/2024	85		
Otro si prorroga No. 3	10/10/2024	27		13/11/2024

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
TERMINACIÓN Cto.	13/11/2024	20		13/11/2024
TOTAL, DÍAS		167	173	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO	1	01/11/2023
Inicio		23/11/2023
Justificación de Suspensión	1	28/12/2023
Suspensión	1	28/12/2023
Justificación para el Reinicio	2	20/06/2024
Reinicio	1	20/06/2024
Justificación para otro si prórroga	1	20/06/2024
Otro si Prorroga No. 01	1	20/06/2024
Justificación para otro si prórroga No. 2	3	12/09/2024
Otro si otro si Prorroga No. 2	2	12/09/2024
Justificación para otro si prórroga No 3	4	10/10/2024
Otro si otro si Prorroga No. 3	3	10/10/2024
Justificación para otro si modificadorio de Adición No 4	5	24/11/2024
Otro si otro si modificadorio de Adición No 4	4	24/11/2024

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2024000499	VALOR	VIGENCIA
Servicios de la construcción AUXILIAR: 102-Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR_43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz. SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301026-Cancha construida y dotada CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META: 10-Construcción y Dotación de 2 Canchas		\$ 488.701.732	2024

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atenciomusuuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

ACTIV: 1.4.2-Construir e iluminar Cubiertas PROYECTO: 2023004410106-CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE: 150103-21 RECURSOS PROPIOS TRASLADO		
---	--	--

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2024000620	VALOR	VIGENCIA
Servicios de la construcción AUXILIAR: 102-Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR_43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz. SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301026-Cancha construida y dotada CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META: 10-Construcción y Dotación de 2 Canchas ACTIV: 1.4.2-Construir e iluminar Cubiertas PROYECTO: 2023004410190-Apoyo a la construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y existentes en el Departamento del Huila FUENTE: 141245-R.B Estampilla ProDesarrollo Departamental.		\$ 74.813.020	2024

4.4. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZ O	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-47- 994000049461	0	03/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	01/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74- 994000006551	0	03/11/2023	01/11/2023	01/02/2024	

	FORMATO				CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				VERSIÓN	1
					VIGENCIA	JUNIO 2024

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74- 994000006551	1	08/11/2023		08/11/2023	01/02/2024
Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-47- 994000049461	1	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	23/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	23/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	23/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74- 994000006551	2	06/12/2023		23/11/2023	01/02/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74- 994000006551	3	06/12/2023		01/02/2024	23/02/2024
Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 - ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-47- 994000049461	2	24/06/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	22/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	22/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	22/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74- 994000006551	4	24/06/2024		23/02/2024	23/08/2024
Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No. 1						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
	340-47- 994000049461	3	24/06/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	22/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	22/02/2025

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	22/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74-994000006551	5	24/06/2024		23/08/2024	23/09/2024
Póliza actualizada x PRORROGA No. 2						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-47-994000049461	4	18/09/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	22/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	22/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	22/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74-994000006551	6	17/09/2024		23/09/2024	23/10/2024
Póliza actualizada x PRORROGA No. 3						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-47-994000049461	5	22/10/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	22/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	22/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	22/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDO SO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-74-994000006551	7	22/10/2024		23/10/2024	23/11/2024

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El ingeniero **OSCAR LEÓN ESCOBAR** es designado mediante oficio por la Directora del INDERHUILA **MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH411 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de selección de Concurso de selección de Méritos Abierto No. IHCM021-2023
- El ingeniero **DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR** es designado mediante oficio por el Director del INDERHUILA **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH411 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de selección de Concurso de selección de Méritos Abierto No. IHCM021-2023.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:

- 01 de diciembre de 2023, se realizó el acta de conformación de veeduría ciudadana y el acta de concertación y socialización del inicio de la obra del contrato CLPIH392 DE 2023
- 07 de diciembre de 2023, el CONSORCIO INDER A&S remite comunicado según el asunto "Instalación valla informativa"
- 19 de diciembre de 2023, el CONSORCIO INDER A&S remite oficio No. 05-CLPIH392-2023, para solicitar la suspensión No. 01 al contrato de obra pública CLPIH392-2023.
- Se suscribe el acta de suspensión No. 01 al contrato de obra publica No. CLPIH392 DE 2023.
- Mediante oficio 1-IH-2024-0031 del 22 de enero de 2024, se remite la justificación de constitución de reserva presupuestal – contrato de obra publica No. CLPIH392 DE 2023, dirigida al señor Contralor del departamento del Huila ANDRES FELIPE VANEGAS MOSQUERA.
- El día 19 de febrero de 2024 mediante oficio IH-2-2024-142, se cita a comité técnico al contrato de interventoría No. CIHCM411 DE 2023 y al contrato de obra publica CLPIH392 DE 2023, con el fin de realizar una revisión de los avances en los diseños iniciales del proyecto.
- El día 04 de marzo de 2024 mediante oficio IH-2-2024-170, se cita a mesa de trabajo al contratista de interventoría No. CIHCM411 DE 2023 y al contratista de obra pública CLPIH392 DE 2023, para socializar las respuestas a las observaciones realizadas por el especialista en estructura, el ingeniero Cesar Joaquín Velásquez.
- El día 30 de mayo de 2024 se suscribe el acta de reinicio No. 01 y otrosí modificadorio No. 01 al contrato de interventoría
- El día 17 de junio de 2024 mediante oficio IH-2-2024-674, se realiza la entrega de manera oficial de los diseños e4structurales del contrato de obra publica CLPIH392 DE 2023, y se solicita al contratista de interventoría No. CIHCM411 DE 2023 y al contrato de obra pública CLPIH392 DE 2023, la entrega del balance de mayores y menores cantidades de obra, memorias de cantidades y esquemas básicos, y análisis de precios unitarios con su estudio de mercado y cotizaciones

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

Estos diseños fueron entregados en medio magnético con su respectivo memorial de responsabilidad suscrito por el ingeniero Cesar Joaquín Velásquez Tique.

- El día 20 de junio de 2024, se suscribe el acta de reinicio No. 01 y el otrosí modificatorio No. 01 para prorrogar por Un (01) mes al contrato de obra pública CLPIH392 DE 2023
- El día 10 de julio de 2024 se suscribe el otrosí modificatorio No. 02 al contrato de interventoría CIHCM411 DE 2023 para prorrogar por Tres (03) Meses y Diez (10) Días el plazo contractual.
- El día 06 de agosto de 2024 mediante oficio IH-2-2024-918, se cita a comité extraordinario al contratista de interventoría CIHCM411 DE 2023, acogiendo a la solicitud realizada mediante oficio No. 22 del contratista de obra pública CLPIH392 DE 2023; para el día 06 de agosto de 2024 a las 9.30 am. En la cual se tuvo acompañamiento por parte del ingeniero Eléctrico Felipe Herrera para aclarar el capítulo de instalaciones eléctricas.
- En atención al oficio No. 024 – CLPIH392-2023 emitido por el CONSORCIO INDER A&S, cuyo asunto es "Renuncia al anticipo", y conforme a lo expresado por el contratista de interventoría SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, mediante oficio No. Int.Inder021-10 del 5 de agosto de 2024, en el cual manifiesta que "una vez revisado el Contrato de Obra No. CLPIH392 de 2023, se consideran aceptables las razones expuestas por el CONSORCIO en el citado oficio", se procedió a realizar la respectiva consulta con la Oficina Jurídica y de Contratación para adelantar el trámite correspondiente.

Es por ello, que la oficina de jurídica y contratación, indicó que era necesario formalizar la aceptación de la renuncia al anticipo mediante un comunicado oficial dirigido tanto al contratista de obra como a la interventoría, a fin de validar dicho proceso. En cumplimiento de esta recomendación, se expidió el oficio No. IH-2-2024-934 con fecha del 9 de agosto de 2024, con el propósito de formalizar y dar continuidad al trámite.

- El día 06 de septiembre de 2024 mediante Acta de reunión.No. 03, se realizó la socialización de las observaciones presentadas en el balance de mayores y menores cantidades obra, para el cual asistió el ingeniero Nixon German Díaz (director de obra), Paola Andrea Jiménez (residente de obra) y el ingeniero Jeisson Otolara (Contratista Inderhuila).

En dicha reunión, se manifi

esta que para los siguientes ítems se debe realizar los respectivos ajustes:

- Ítem 8.01, TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS. Este ítem contempla el transporte del volumen de relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente, transporte que ya esta contemplado en el APU del ítem 1.05, correspondiente a relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente, lo que se debe corregir.
- Ítem NP.04, SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR BIFASICO. Solicita que se especifique dentro del APU el material de la caja de 30x30cm para la varilla de puesta a tierra. Manifiesta que el molde para soldar debe ir en el apartado de equipos y herramientas con el respectivo rendimiento
Solicita que se debe adicionar mas especificaciones técnicas del medidor bifásico, como que es trifilar y electrónico (exigido por ELECTROHUILA)
- Ítem NP. 05, ACOMETIDA AEREA EN CABLE CONCENTRICO 2*8+8 AWG. Manifiesta que este ítem es similar al ítem contractual 7.07 – suministro – instalación y cableado de medida directa en poste que hay que tener en cuenta que se debe instalar desde la red de baja tensión existente hasta el poste proyectado en cable trenzada 2x35+35 con los accesorios necesarios para su conexión

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

En la misma acta, se deja constancia que la interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA, encargada de ejercer la interventoría del proyecto no asistió al presente comité y tampoco se justificó, pese a que fue informado con antelación.

- El día 12 de septiembre de 2024 se suscribió el otrosí modificadorio No. 02 al contrato de obra publica No. CLPIH392 DE 2023, para prorrogar por Un (01) mes el contrato.
- El día 27 de septiembre de 2024 mediante oficio radica IH-1-2024-1811 del 30 de septiembre de 2024, la interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA, realiza la entrega del balance de mayores y menores cantidades con las subsanaciones según lo estipulado en el acta de reunión No. 03 del 06 de septiembre de 2024.
- El día 10 de octubre de 2024, se suscribe el Otrosí modificadorio No. 03 al contrato de obra publica No. CLPIH392 DE 2023, para prorrogar por Un (01) Mes el plazo contractual.
- El día 24 de octubre de 2024 se efectúa el Otrosí No.4 para adicionar el valor de \$74.813.020 al valor inicial del contrato.
- El día 13 de noviembre de 2024, suscripción de acta de terminación y acta de recibo final de obra.



7. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

1. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	2. REGISTRO FOTOGRÁFICO
	


	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

PRELIMINARES



- Localización y replanteo

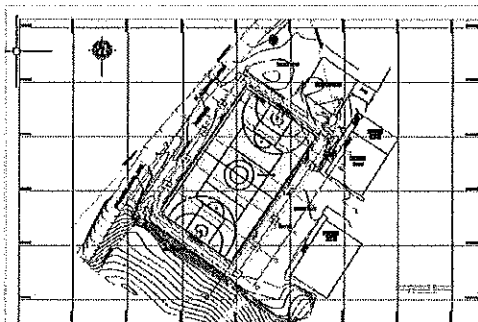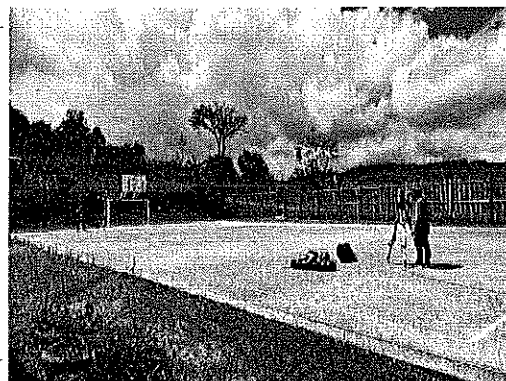

- Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.


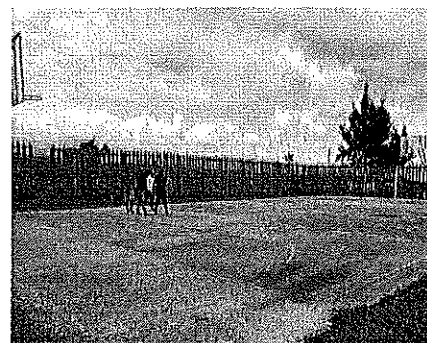


- Desmonte marcos canchas existentes.

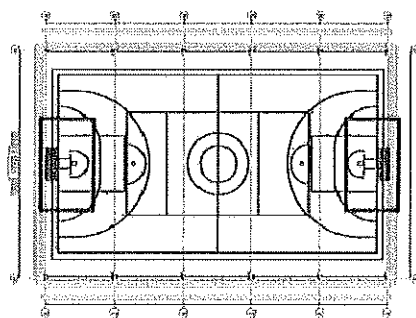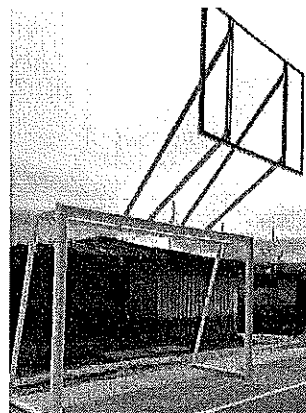


**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA**


- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.

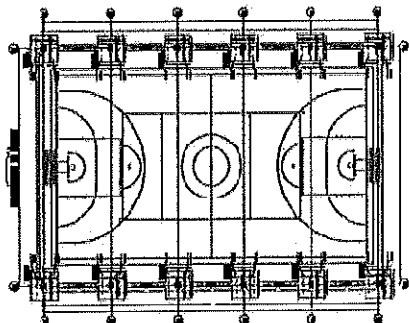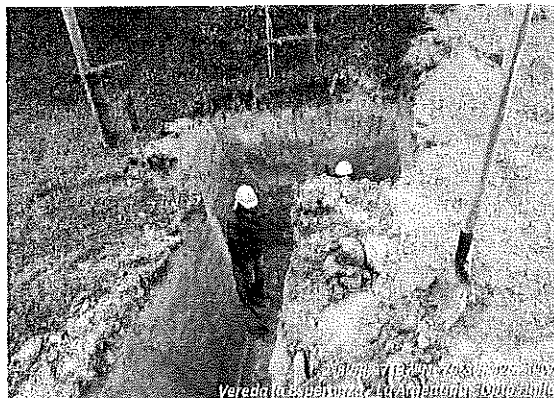

- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.

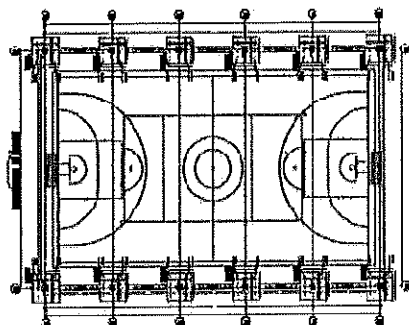



- Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

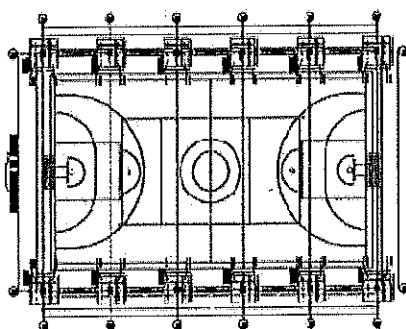



	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

CIMENTACIÓN



- Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. $e=0.05$ mts

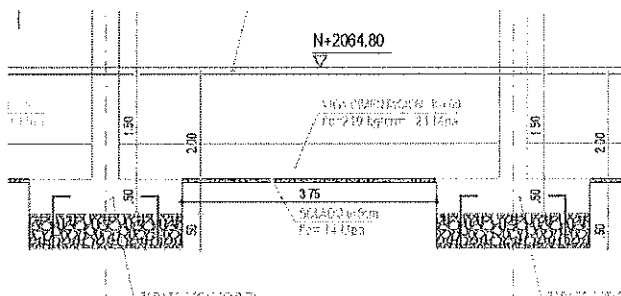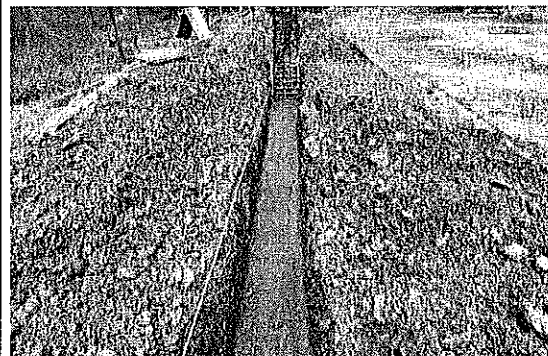



- Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.

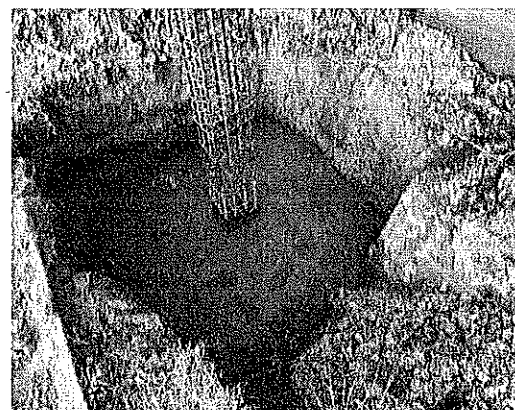



- Acero de refuerzo $F_y=60.000$ P.S.I. zapatas

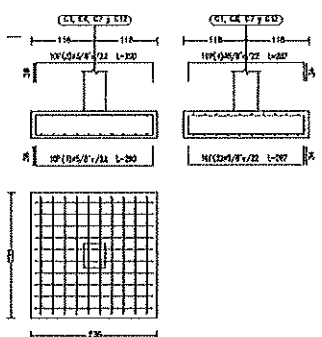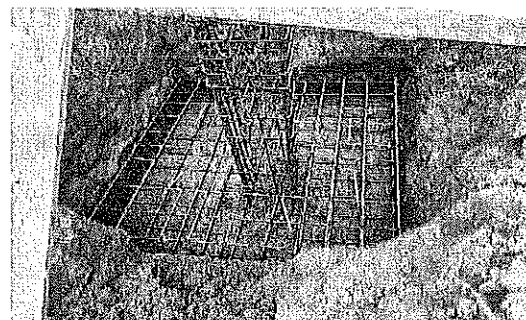



- Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM²-3000 PSI. Ver diseño

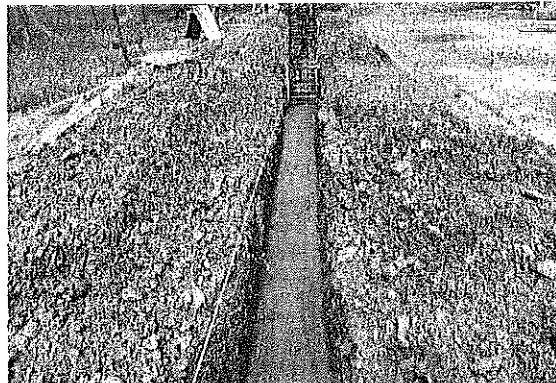


- Acero de refuerzo $F_y=60.000$ P.S.I. viga de cimentación

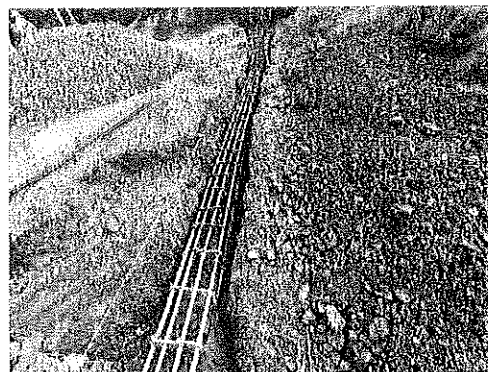


- Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM²) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media Zonga.

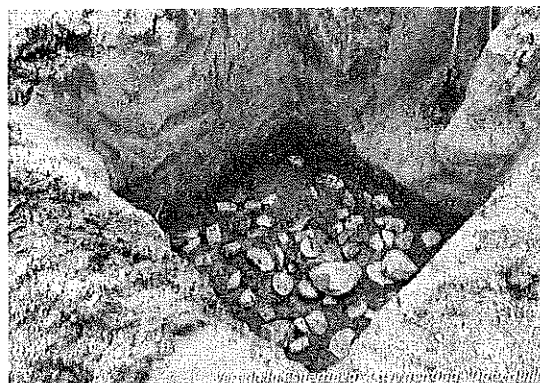



- Acero de refuerzo $F_y=60.000$ P.S.I. Viga Canal

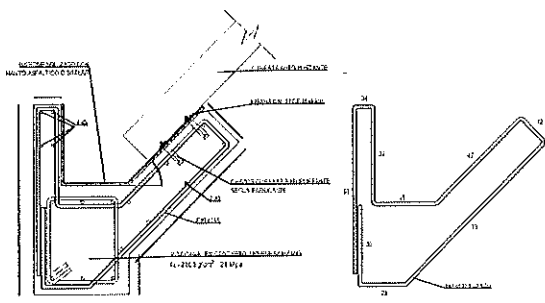

DETALLE VIGA CANAL


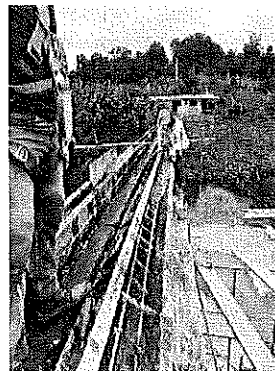


- Suministro e instalación de manto zetal viga canal.

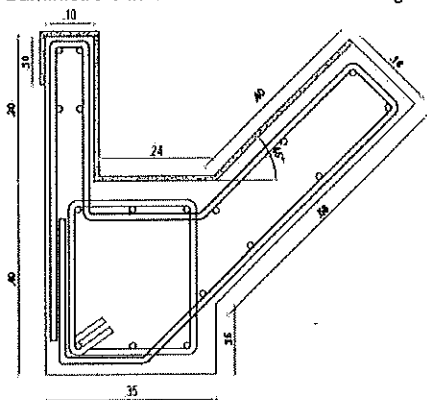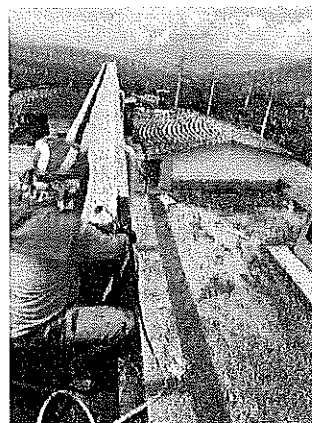

CUBIERTA



- Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pinto poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.

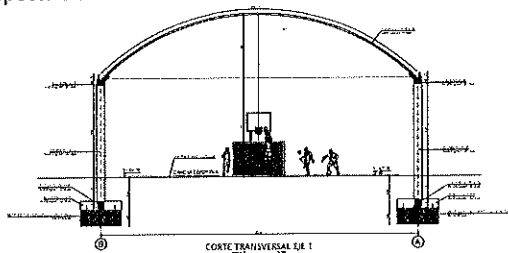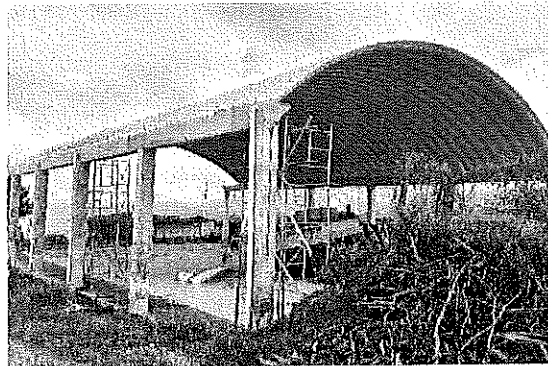



	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.

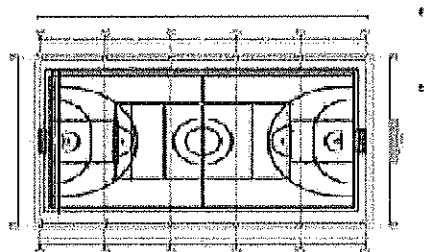
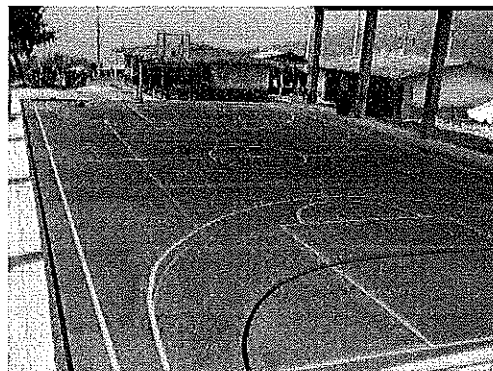


- Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.

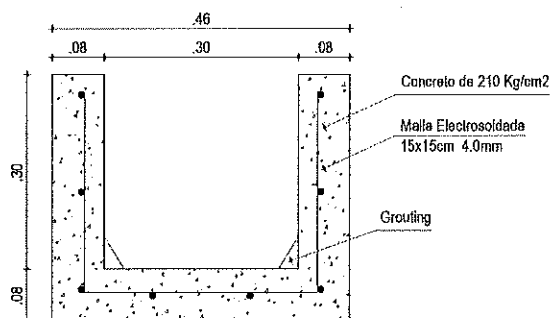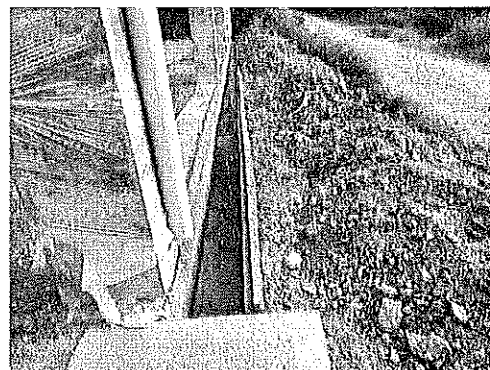



INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.

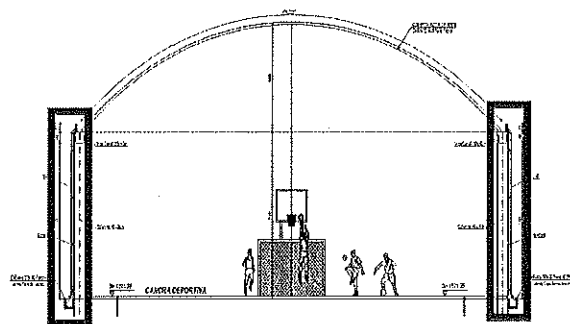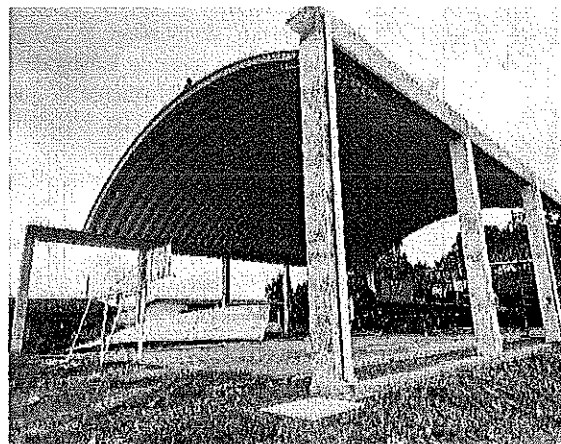


	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024


- Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües

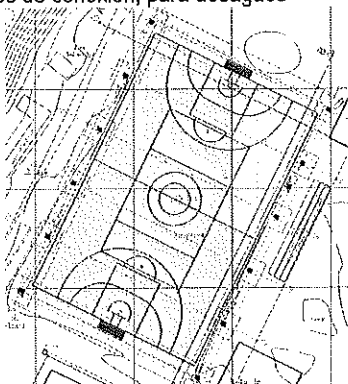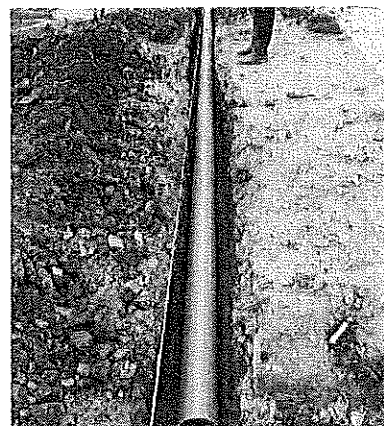

- Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para desagües

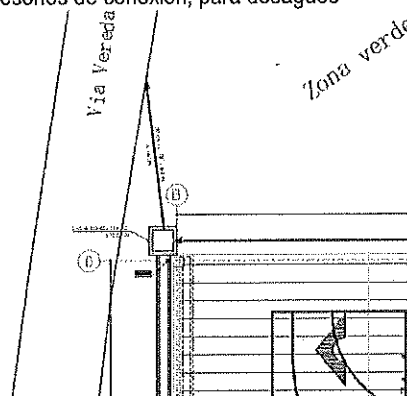

- Caja de inspección en concreto de $F'c=2500$ PSI, de sección 0.70×0.70 , H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño


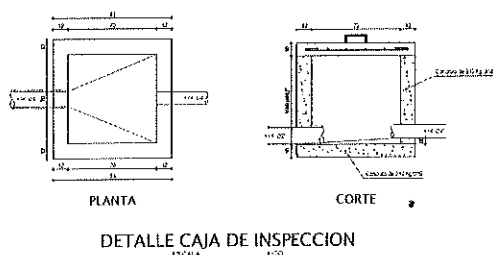


	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.

DETALLE DE LA CAJA DE INSPECCIÓN

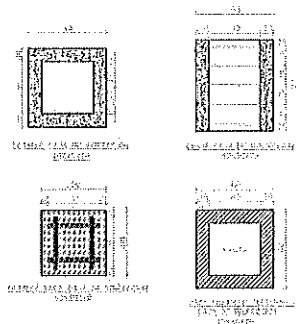
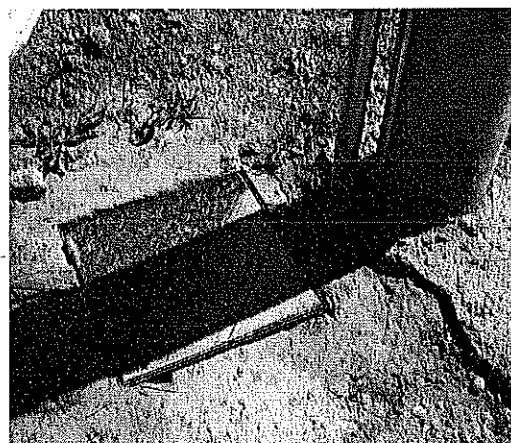


- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.

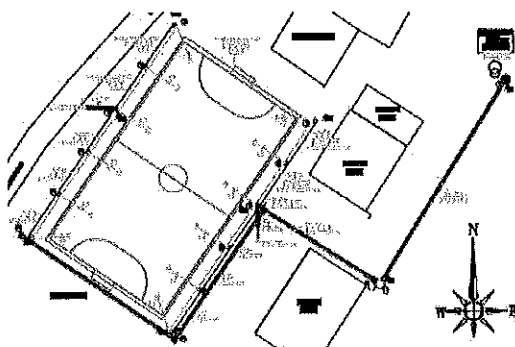
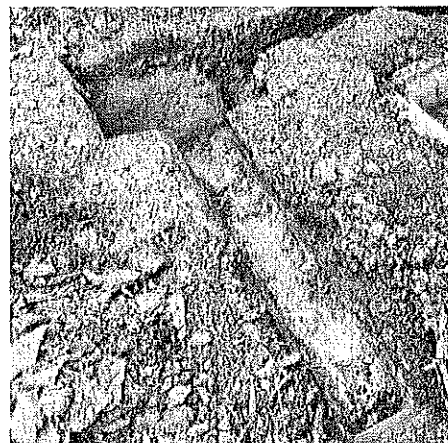


	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

- Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.

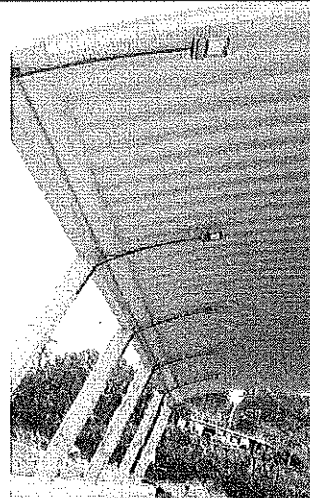


- Excavación, Hincada y plomada de poste de concreto de 8 MTS X 510 KG armado y centrifugado.

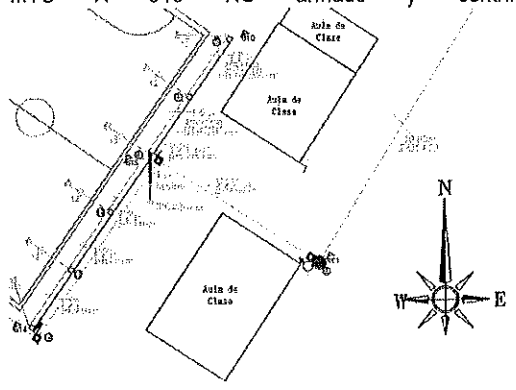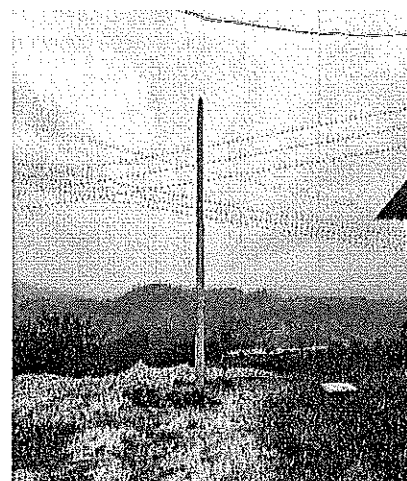


TRANSPORTE



- Transporte de materiales pétreos

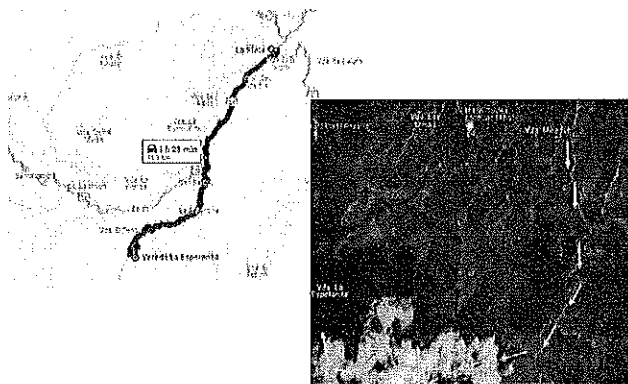

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	JUNIO 2024

Visualización general de la obra:

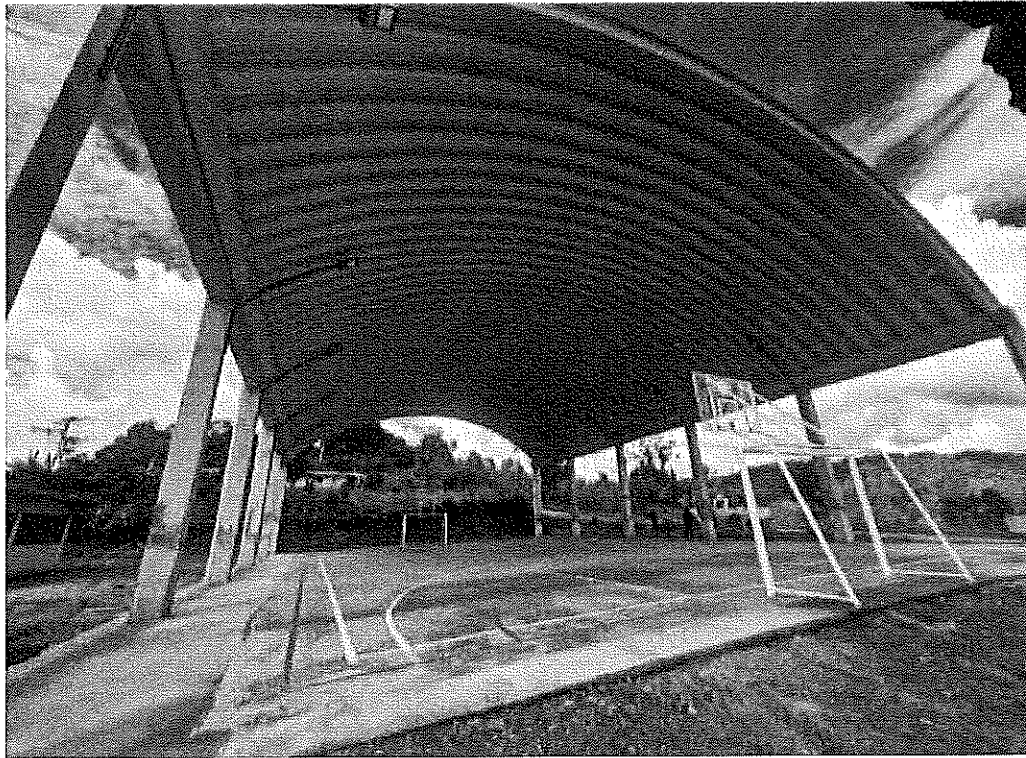

		
Ing. Daniel Felipe Molina Tafur	(30/11/2024)	Ing. Karoll Liseth Buitrago
FIRMA ORIGINAL APOYO A LA SUPERVISIÓN	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL VoBo CONTRATISTA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

