

 AERONAUTICA CIVIL Unidad Aeronáutica y Espacial	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORIA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES

Semana No.	10	Plazo total (días)	210
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	70
Del	15/10/2024	% de tiempo transcurrido	33,33%
Al	21/10/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 421.320.650,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	-\$ 421.320.650,00
Porcentaje programado	4,85%	Porcentaje ejecutado	0,00%	-4,85%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 1.545.003.450,00	Valor ejecutado	\$ 44.775.000,00	-\$ 1.500.228.450,00
Porcentaje programado	17,80%	Porcentaje ejecutado	0,52%	-17,28%

DATOS DEL COTRATO

CONTRATO DE OBRA Contratista: CONSORCIO ALFA Contrato No: 23001138 H4 DE 2024 Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00 Valor Actualizado al modificadorio : NA Valor actualizado 2: NA Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024. Plazo actualizado: NA Fecha de iniciación: 13/08/2024 Fecha de vencimiento: 16/12/2024 Modificadorio No. Prórroga No.: NA Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA Suspensión No.: NA Periodo de Suspensión No.: NA Levantamiento de la suspensión No.: NA Nueva fecha de terminación NA Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00	CONTRATO DE INTERVENTORÍA Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S. Contrato No.: 23001299 H3 DE 2024 Valor inicial: \$ 684.322.873,00 Valor actualizado al modificadorio: NA Valor actualizado 2 : NA Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024. Plazo actualizado : NA Fecha de iniciación: 13/08/2024 Fecha de vencimiento: 16/12/2024 Modificadorio No. Prórroga No.: NA Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA Suspensión No.: NA Periodo de Suspensión No.: NA Levantamiento de la Suspensión No.: NA Nueva fecha de terminación : NA Valor total actual del contrato : \$ 684.322.873,00
--	---

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
Actividades de Levatamiento Topográfico	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Mediante el comunicado T-003-2024-063-OFC de fecha 15 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-036-2024 - Remisión del Programa Detallado de Trabajo - PDT versión 3 aprobado del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. - Mediante el comunicado T-003-2024-064-OFC de fecha 15 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA Respuesta al comunicado C-ALFA-034-2024 - Traslado de Memorando del profesional Ambiental AERONAUTICA – 23001299 H3-2024-003-AM – Observaciones al plan de Manejo Ambiental en su versión 2. - Mediante el comunicado T-003-2024-065-OFC de fecha 17 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA Traslado del Comunicado 2024262000048273 – Observaciones Informe Preliminar de la apropiación de Estudios y Diseños. - Mediante el comunicado T-003-2024-066-OFC de fecha 18 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el comunicado indicando la Posible afectación económica al contrato de interventoría de la referencia. - Mediante el comunicado T-003-2024-067-OFC de fecha 18 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA Respuesta al comunicado C-ALFA-040-2024 – Observaciones al programa de gerencia de proyectos versión 2 del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. - Mediante el comunicado T-003-2024-068-OFC de fecha 19 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA el Llamado de atención por ingreso a la pista sin autorización previa de TW.R.
--

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Por parte de la interventoría se realiza la revisión del Plan de Manejo Ambiental emitiendo observaciones mediante el comunicado T-003-2024-064-OFC de fecha 15 de octubre de 2024, lo anterior dando respuesta al CONSORCIO ALFA del oficio C-ALFA-034-2024 de fecha 7 de octubre de 2024, se está a la espera del ajuste del documento por parte del contratista para su posterior revisión.
--

ACTIVIDADES SISTEMA SST


Para la presente semana no se tiene ninguna actividad SST.
--

AVANCE CANTIDADES



ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7.1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 19%					\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

--



AVANCE FINANCIERO

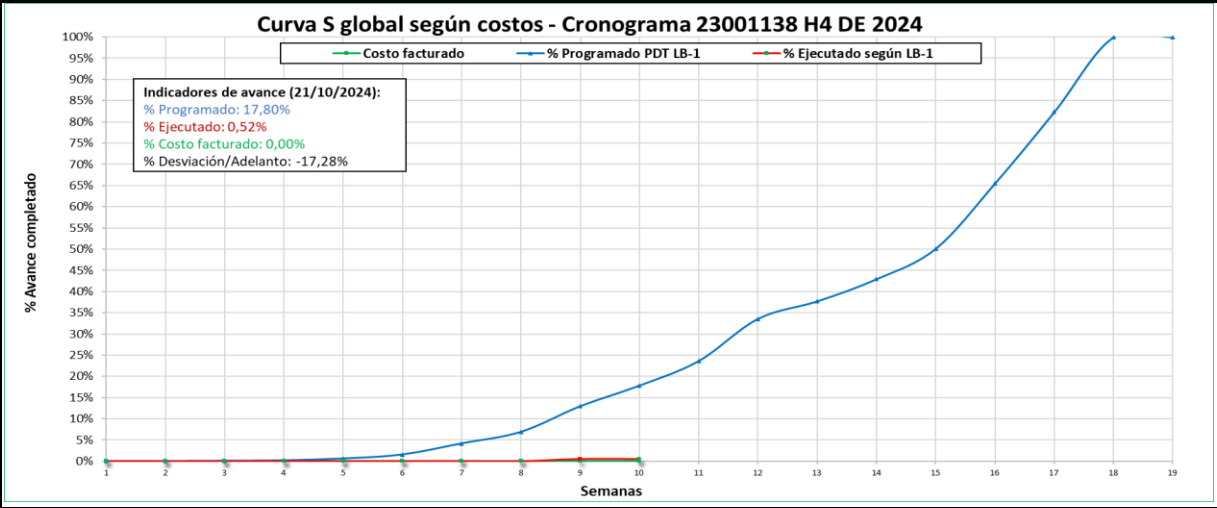

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 421.320.650,00	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	4,85%		Porcentaje	0,00%
PROGRAMADO	Valor	\$ 1.545.003.450,00	EJECUTADO	Valor	\$ 44.775.000,00
	Porcentaje	17,80%		Porcentaje	0,52%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 0,00	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	0,00%		Porcentaje	0,00%
PROGRAMADO	Valor	\$ 0,00	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	0,00%		Porcentaje	0,00%

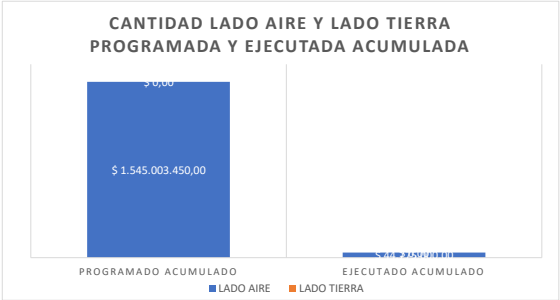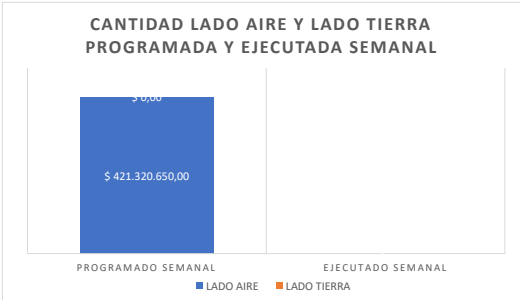

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	1
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	1
	Inspectora SISOMA	1	Vibrocompactadores	2
	Topógrafo	1		
MANO DE OBRA	Cadeneros	3		

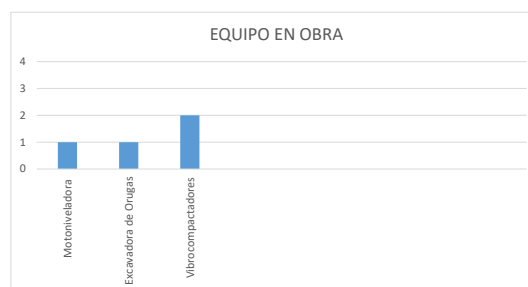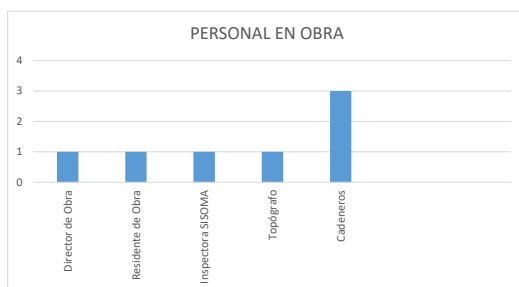

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.




CAPACITACIÓN DE BRIGADA DE INCENDIOS EN LAS INATALACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

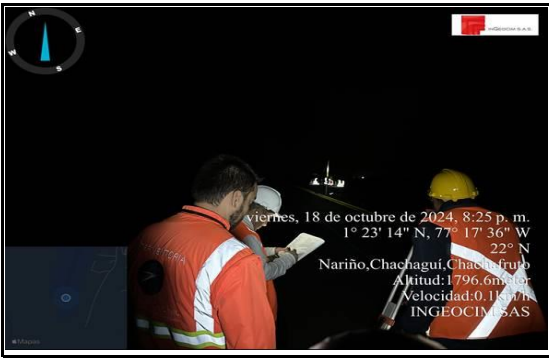

ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 3 Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-063-OFC de fecha 15 de octubre de 2024. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños. Es de resaltar que, mediante el comunicado T-003-2024-060-OFC de fecha 10 de septiembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL con copia al CONSORCIO ALFA, la reiteración de la recomendación de impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
