

	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				

DATOS GENERALES					
Semana No.		11	Plazo total (días)		210
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)		77	
Del		22/10/2024	% de tiempo transcurrido		36,67%
Al		28/10/2024	Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		\$ 504.267.225,00	EJECUTADO		BALANCE
Valor programado			Valor ejecutado		-\$ 504.267.225,00
Porcentaje programado		5,81%	Porcentaje ejecutado		-5,81%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		\$ 2.049.270.675,00	EJECUTADO		BALANCE
Valor programado			Valor ejecutado		-\$ 2.004.495.675,00
Porcentaje programado		23,61%	Porcentaje ejecutado		-23,09%

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista : GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No : 23001299 H3 DE 2024		
Valor inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificadorio : NA			Valor actualizado al modificadorio : NA		
Valor actualizado 2: NA			Valor actualizado 2: NA		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: NA			Plazo actualizado : NA		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación : 13/08/2024		
Fecha de vencimiento: 16/12/2024			Fecha de vencimiento : 16/12/2024		
Modificadorio No. Prórroga No. NA			Modificadorio No. Prórroga No.: NA		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA			Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA		
Suspensión No. NA			Suspensión No.: NA		
Periodo de Suspensión No. NA			Periodo de Suspensión No.: NA		
Levantamiento de la suspensión No. NA			Levantamiento de la Suspensión No.: NA		
Nueva fecha de terminación NA			Nueva fecha de terminación : NA		
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00			Valor total actual del contrato : \$ 684.322.873,00		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
Actividades de Levatamiento Topográfico	N.A.


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Mediante el comunicado T-003-2024-069-OFC de fecha 21 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-021-2024 - Remisión del Plan de inversión del anticipo y documentos para solicitud de anticipo del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-070-OFC de fecha 22 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado radicado AEROCIVIL No. 202426200004823 y comunicados C-ALFA-044-2024, C-ALFA-041-2024 - Remisión del Informe preliminar del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-071-OFC de fecha 22 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-042-2024 – Observaciones al diseño Topográfico del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-072-OFC de fecha 23 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe semanal No. 8 y 9 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-073-OFC de fecha 24 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-021-2024 – Alcance comunicado T-003 2024-069-OFC - Remisión del Plan de inversión del anticipo y documentos para solicitud de anticipo del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-075-OFC de fecha 25 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta a los comunicados C-ALFA-045-2024 - Remisión del Programa de Gerencia de Proyectos aprobado del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-076-OFC de fecha 25 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-046-2024 - Remisión de la actualización de las pólizas del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-077-OFC de fecha 25 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta a los comunicados C-ALFA-002-2024, C-ALFA-008-2024, C-ALFA 020-2024 - Remisión de los documentos del equipo mínimo requerido aprobado del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se realizó la revisión del Plan de Manejo Ambiental emitiendo observaciones mediante el comunicado T-003-2024-064-OFC de fecha 15 de octubre de 2024, lo anterior dando respuesta al CONSORCIO ALFA del oficio C-ALFA-034-2024 de fecha 7 de octubre de 2024, se está a la espera del ajuste del documento por parte del contratista para su posterior revisión.

ACTIVIDADES SISTEMA SST	
Actividades Interventoría: Recorrido de obra. Inspecciones de orden y aseo en oficinas. Asistencia a comité semanal seguimiento. Inducción 1 personal nuevo. Instalación de cartelera informativa con divulgación de riesgos. Conformación de COPASST.	Inspecciones locativas en campo. Revisión de versión 2 del plan HSSE. Actividades Contratista. Instalación de kit de emergencia en el campamento(camilla, extintor, botiquín). Conformación de las brigadas de emergencias. Conformación del comité de convivencia laboral.



AVANCE CANTIDADES					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7.1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				19%	\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO

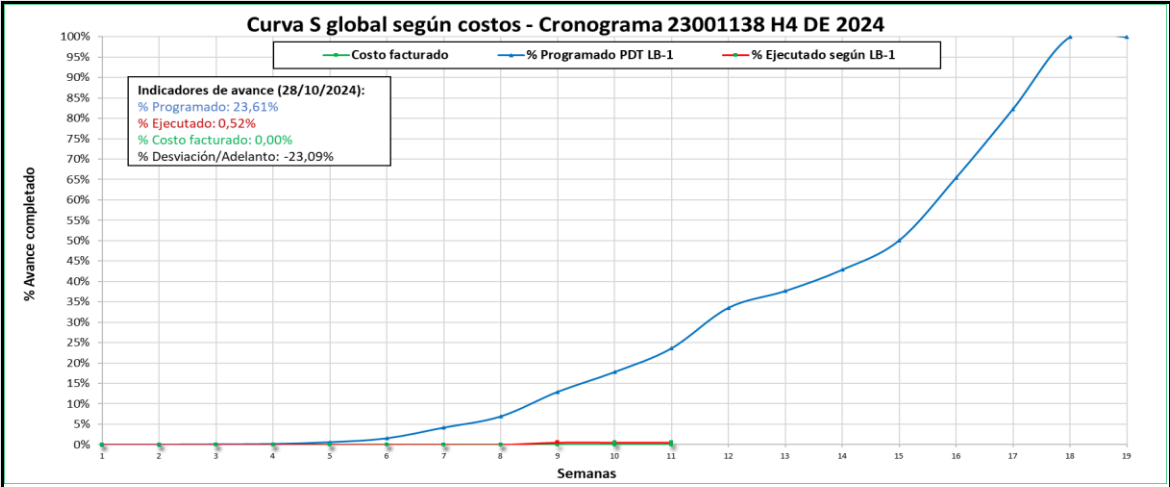

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 504.267.225,00	Valor \$ 0,00		\$ 2.049.270.675,00	Valor \$ 44.775.000,00
Porcentaje	5,81%	Porcentaje 0,00%	Porcentaje	23,61%	Porcentaje 0,52%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 0,00	Valor \$ -		\$ 0,00	Valor \$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje 0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje 0,00%

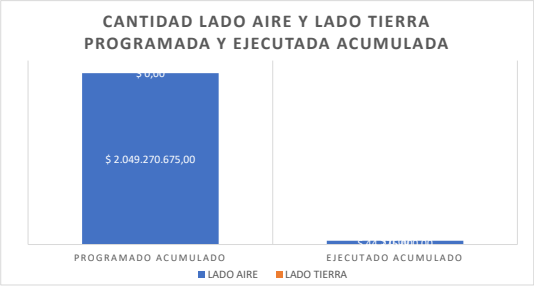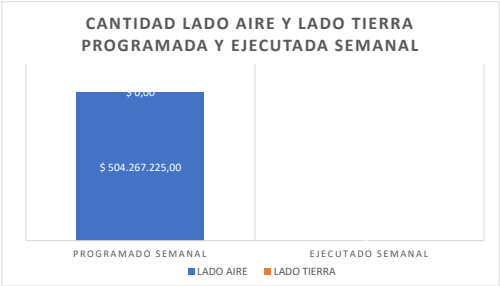

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	1
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	1
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	2
	Inspectora SISOMA	1		
	Topógrafo	1		
MANO DE OBRA	Cadeneros	3		

PERSONAL EN OBRA

EQUIPO EN OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
ACTIVIDADES DE OFICINA DEL LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 3 Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-063-OFC de fecha 15 de octubre de 2024. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños. De acuerdo con los compromisos adquiridos por parte del CONSORCIO ALFA con la suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños, es necesario que se remita el plan de contingencia y el Programa Detallado de Trabajo actualizado y grabada la línea base No. 2.	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
