

	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORIA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				

DATOS GENERALES				
Semana No.	12	Plazo total (días)	210	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	84	
Del	29/10/2024	% de tiempo transcurrido	40,00%	
Al	4/11/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 862.350.825,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	-\$ 862.350.825,00
Porcentaje programado	9,93%	Porcentaje ejecutado	0,00%	-9,93%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 2.911.621.500,00	Valor ejecutado	\$ 44.775.000,00	-\$ 2.866.846.500,00
Porcentaje programado	33,54%	Porcentaje ejecutado	0,52%	-33,03%

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: CONSORCIO ALFA	Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024	Contrato No: 23001299 H3 DE 2024
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00	Valor inicial: \$ 684.322.873,00
Valor Actualizado al modificadorio : NA	Valor actualizado al modificadorio : NA
Valor actualizado 2: NA	Valor actualizado 2 : NA
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	Plazo inicial : Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
Plazo actualizado: NA	Plazo actualizado : NA
Fecha de iniciación: 13/08/2024	Fecha de iniciación : 13/08/2024
Fecha de vencimiento: 16/12/2024	Fecha de vencimiento : 16/12/2024
Modificadorio No. Prórroga No.: NA	Modificadorio No. Prórroga No.: NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA
Suspensión No.: NA	Suspensión No.: NA
Periodo de Suspensión No.: NA	Periodo de Suspensión No.: NA
Levantamiento de la suspensión No.: NA	Levantamiento de la suspensión No.: NA
Nueva fecha de terminación NA	Nueva fecha de terminación : NA
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00	Valor total actual del contrato : \$ 684.322.873,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
Actividades de Levatamiento Topográfico	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Mediante el comunicado T-003-2024-078-OFC de fecha 28 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-050-2024 - Observaciones al informe mensual N°3 correspondiente al mes de octubre de 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-079-OFC de fecha 30 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud de Plan de Contingencia y actualización del Programa Detallado de Trabajo.
- Mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024, se remitió a la AEROCIVL el Traslado de Memorando del profesional Ambiental AERONAUTICA – 23001299 H3-2024-004-AM – Aprobación del plan de Manejo Ambiental en su versión 3.


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se realizo la revisión del Plan de Manejo Ambiental emitiendo observaciones mediante el comunicado T-003-2024-064-OFC de fecha 15 de octubre de 2024, lo anterior dando respuesta al CONSORCIO ALFA del oficio C-ALFA-034-2024 de fecha 7 de octubre de 2024, se está a la espera del ajuste del documento por parte del contratista para su posterior revisión.

ACTIVIDADES SISTEMA SST	
Actividades Interventoría: Realización del informe de interventoría mensual número tres Revisión de la información enviada por el contratista Inspección de epp Solicitud de punto de emergencia para la oficina	Actividades del Contratista: Votación y confirmación de copasst y cocolab. Elección de secretario de cada uno de los comités. Entrega de indumentaria (chaquetas y chalecos)

AVANCE CANTIDADES

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2,1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3,1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6,1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7,1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 19%					\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO

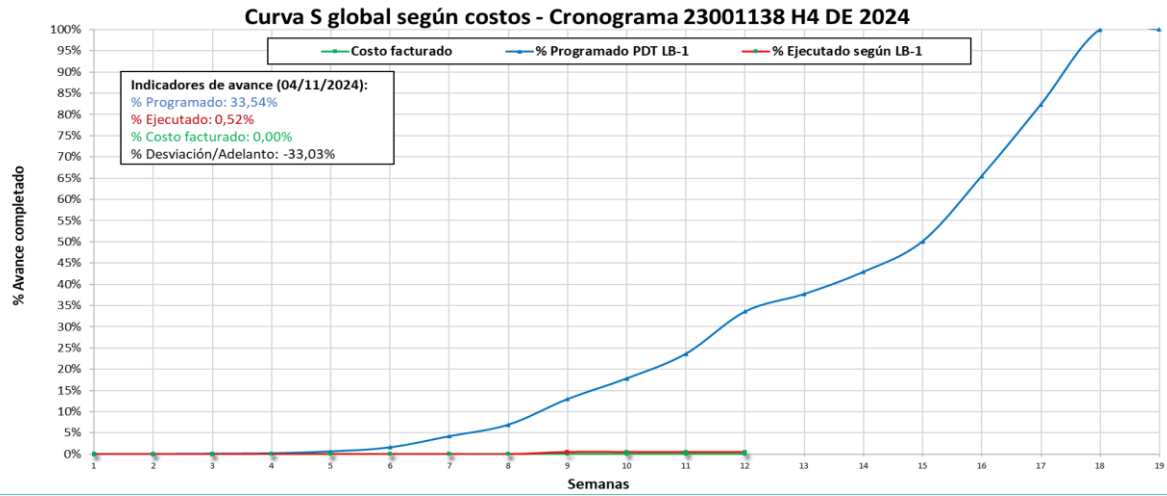


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 862.350.825,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 2.911.621.500,00	Valor	\$ 44.775.000,00
Porcentaje	9,93%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	33,54%	Porcentaje	0,52%


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA SEMANAL



CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA ACUMULADA




PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	3
MANO DE OBRA		


MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	1
Excavadora de Orugas	1
Vibrocompactadores	2

PERSONAL EN OBRA



EQUIPO EN OBRA




REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

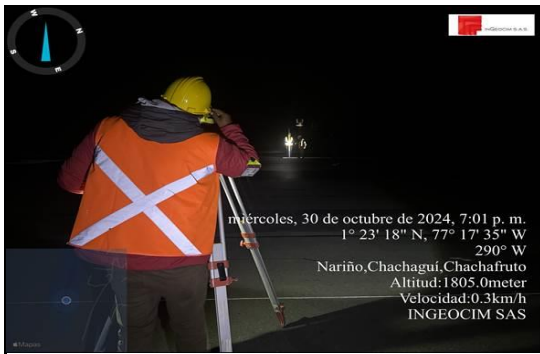

ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE OFICINA DEL LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO SUSPENDIDAS POR NUBOSIDAD Y LLUVIAS.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



sábado, 2 de noviembre de 2024, 6:10 p. m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 23" W
87° E
Nariño, Chachagüí, Chachafruto
Altitud: 1781.7 meter
Velocidad: 0.3 km/h
INGEOCIM SAS

CHARLAS SST (CONSORCIO ALFA)



sábado, 2 de noviembre de 2024, 6:31 p. m.
1° 23' 27" N, 77° 17' 34" W
194° S
Nariño, Chachagüí, Chachafruto
Altitud: 1802.4 meter
Velocidad: 0.4 km/h
INGEOCIM SAS

ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 3 Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-063-OFC de fecha 15 de octubre de 2024. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños. De acuerdo con los compromisos adquiridos por parte del CONSORCIO ALFA con la suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños, es necesario que se remita el plan de contingencia y el Programa Detallado de Trabajo actualizado y grabada la línea base No. 2.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
