

 AERONAUTICA CIVIL CORPORACIÓN AERONÁUTICA Y ESPACIAL	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORIA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES

Semana No.	13	Plazo total (días)	210
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	91
Del	5/11/2024	% de tiempo transcurrido	43.33%
AL	11/11/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 358.255.875,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	-\$ 358.255.875,00
Porcentaje programado	4,13%	Porcentaje ejecutado	0,00%	-4,13%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 3.269.877.375,00	Valor ejecutado	\$ 44.775.000,00	-\$ 3.225.102.375,00
Porcentaje programado	37,67%	Porcentaje ejecutado	0,52%	-37,15%

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: CONSORCIO ALFA	Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024	Contrato No: 23001299 H3 DE 2024
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00	Valor Inicial: \$ 684.322.873,00
Valor Actualizado al modificadorio: NA	Valor actualizado al modificadorio: NA
Valor actualizado 2: NA	Valor actualizado 2: NA
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
Plazo actualizado: NA	Plazo actualizado: NA
Fecha de iniciación: 13/08/2024	Fecha de iniciación: 13/08/2024
Fecha de vencimiento: 16/12/2024	Fecha de vencimiento: 16/12/2024
Modificadorio No. Prórroga No.: NA	Modificadorio No. Prórroga No.: NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA
Suspensión No.: NA	Suspensión No.: NA
Periodo de Suspensión No.: NA	Periodo de Suspensión No.: NA
Levantamiento de la suspensión No.: NA	Levantamiento de la suspensión No.: NA
Nueva fecha de terminación: NA	Nueva fecha de terminación: NA
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00	Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
Actividades de Digitalización del Levatamiento Topográfico	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Mediante el comunicado T-003-2024-081-OFC de fecha 6 de noviembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 3 correspondiente al mes de octubre de 2024..

- Mediante el comunicado T-003-2024-082-OFC de fecha 7 de noviembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA los Lineamientos para la elaboración al Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo del contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.

- Mediante el comunicado T-003-2024-083-OFC de fecha 7 de noviembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al correo electrónico del 5/11/2024 – Observaciones al archivo de Microsoft Project* y reiteración de la solicitud del plan de contingencia.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.

ACTIVIDADES SISTEMA SST

*Cpacificacion de los miembros del copasst y comite de convivencia laboral


*inspeccion de orden y aseo

*aseo de oficina

AVANCE CANTIDADES


ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2.1	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7.1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				19%	\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO


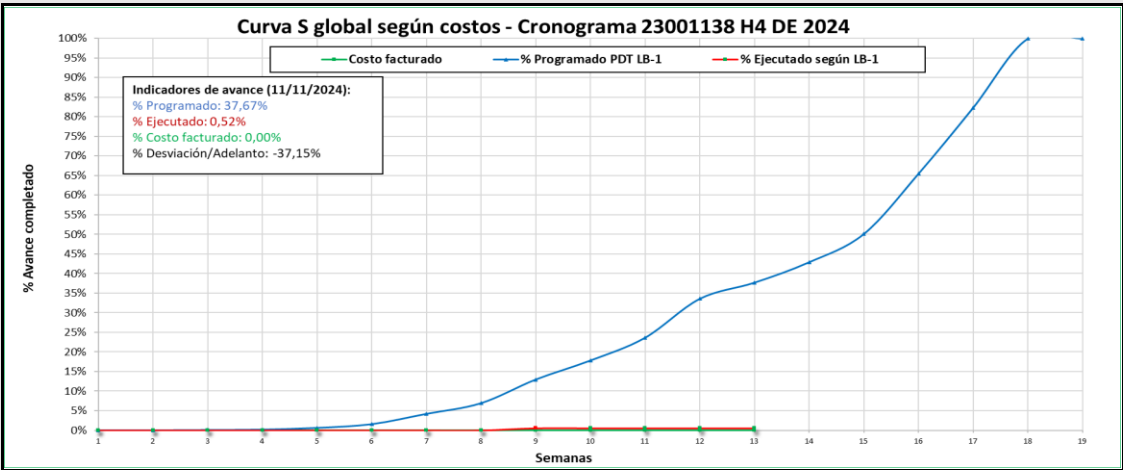


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 358.255.875,00	\$ 0,00		\$ 3.269.877.375,00	\$ 44.775.000,00
	Porcentaje 4,13%	Porcentaje 0,00%		Porcentaje 37,67%	Porcentaje 0,52%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 0,00	\$ -		\$ 0,00	\$ 0,00
	Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%		Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%

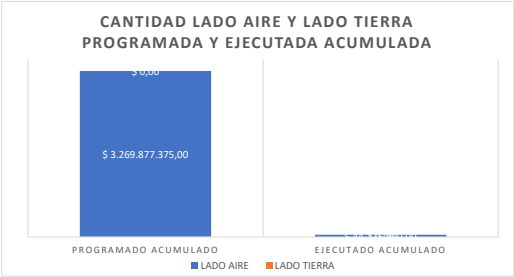

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	1
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	1
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	2
	Inspectora SISOMA	1		
	Topógrafo	1		
MANO DE OBRA	Cadeneros	3		

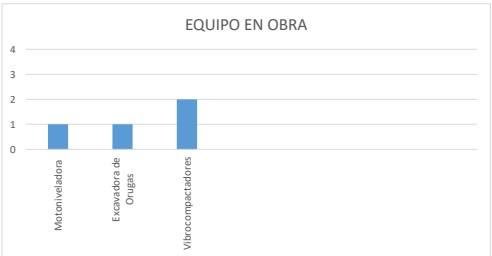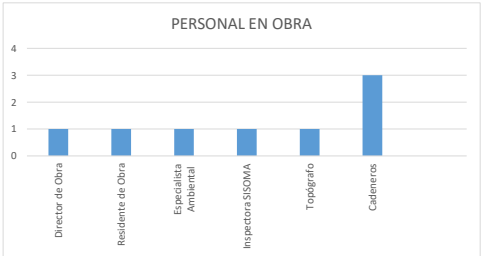

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.




ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE OFICINA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SUSPENDIDAS POR NUBOSIDAD Y LLUVIAS.

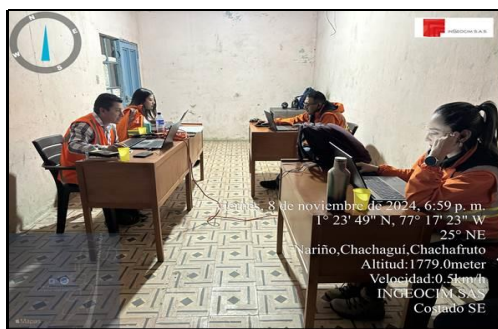

ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES

Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 3 Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-063-OF de fecha 15 de octubre de 2024. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños. De acuerdo con los compromisos adquiridos por parte del CONSORCIO ALFA con la suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños, es necesario que se remita el plan de contingencia.



FIRMA

ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
