

	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				

DATOS GENERALES					
Semana No.	15	Plazo total (días)	210		
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	105		
Del	19/11/2024	% de tiempo transcurrido	50,00%		
Al	25/11/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado	\$ 624.441.825,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	- \$ 624.441.825,00	
Porcentaje programado	7,19%	Porcentaje ejecutado	0,00%	-7,19%	

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado	\$ 4.346.844.450,00	Valor ejecutado	\$ 44.775.000,00	- \$ 4.302.069.450,00	
Porcentaje programado	50,08%	Porcentaje ejecutado	0,52%	-49,56%	

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
<u>Contratista:</u> CONSORCIO ALFA			<u>Contratista:</u> GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
<u>Contrato No:</u> 23001138 H4 DE 2024			<u>Contrato No:</u> 23001299 H3 DE 2024		
<u>Valor Inicial:</u> \$ 8.706.192.504,00			<u>Valor Inicial:</u> \$ 684.322.873,00		
<u>Valor Actualizado al modificadorio:</u> NA			<u>Valor actualizado al modificadorio:</u> NA		
<u>Valor actualizado 2:</u> NA			<u>Valor actualizado 2:</u> NA		
<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
<u>Plazo actualizado:</u> NA			<u>Plazo actualizado:</u> NA		
<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024			<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024		
<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024			<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024		
<u>Modificadorio No. Prórroga No.:</u> NA			<u>Modificadorio No. Prórroga No.:</u> NA		
<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No.:</u> NA			<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No.:</u> NA		
<u>Suspensión No.:</u> NA			<u>Suspensión No.:</u> NA		
<u>Periodo de Suspensión No.:</u> NA			<u>Periodo de Suspensión No.:</u> NA		
<u>Levantamiento de la suspensión No.:</u> NA			<u>Levantamiento de la Suspensión No.:</u> NA		
<u>Nueva fecha de terminación:</u> NA			<u>Nueva fecha de terminación:</u> NA		
<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 8.706.192.504,00			<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 684.322.873,00		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
Actividades de Digitalización del Levatamiento Topográfico	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Mediante el comunicado T-003-2024-090-OFC de fecha 18 de noviembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFAApremio No. 2 – Incumplimiento en la entrega del Plan de Contingencia y el Inicio de las actividades de Construcción de las franjas de Seguridad del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-091-OFC de fecha 22 de noviembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-061-2024 – Remisión del Informe Topográfico de las franjas de seguridad del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.

ACTIVIDADES SISTEMA SST
*Inspecciones de botiquín, camilla y extintor por parte de las brigadas de emergencia.
*Aseo de oficina

AVANCE CANTIDADES					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7.1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				19%	\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO

Curva S global según costos - Cronograma 23001138 H4 DE 2024

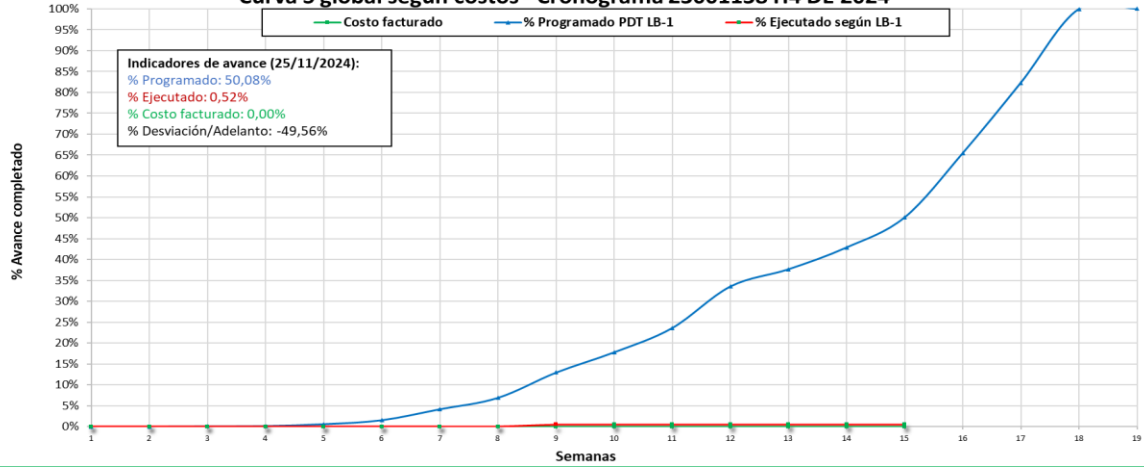


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 624.441.825,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 4.346.844.450,00	Valor	\$ 44.775.000,00
Porcentaje	7,19%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	50,08%	Porcentaje	0,52%


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA SEMANAL



CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA ACUMULADA




PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	3


MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	1
Excavadora de Orugas	1
Vibrocompactadores	2

PERSONAL EN OBRA



EQUIPO EN OBRA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN TOPOGRÁFICA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.




ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN TOPOGRÁFICA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN TOPOGRÁFICA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN TOPOGRÁFICA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

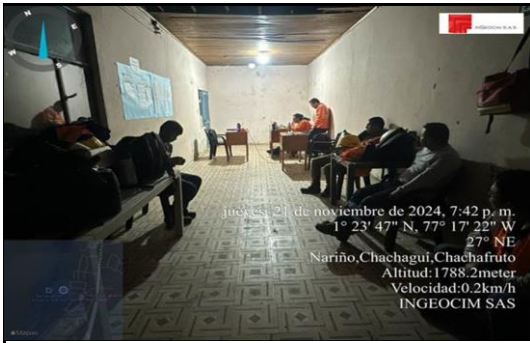

ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN TOPOGRÁFICA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN TOPOGRÁFICA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CHAFLANES PARA EXCAVACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD.



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CHAFLANES PARA EXCAVACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD.



NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO POR NUBOSIDAD DENSA DURANTE TODA LA JORNADA DEL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.



NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO POR NUBOSIDAD DENSA DURANTE TODA LA JORNADA DEL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 3 Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-063-OFC de fecha 15 de octubre de 2024. De acuerdo con los compromisos adquiridos por parte del CONSORCIO ALFA con la suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños, es necesario que se remita el plan de contingencia. 	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
