

	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				

DATOS GENERALES					
Semana No. 17		Plazo total (días) 126			
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días) 119			
Del 3/12/2024		% de tiempo transcurrido 94,44%			
Al 9/12/2024		Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado \$ 1.462.421.225,00		Valor ejecutado \$ 19.209.300,00		-\$ 1.443.211.925,00
Porcentaje programado 16,85%		Porcentaje ejecutado 0,22%		-16,63%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado \$ 7.143.760.900,00		Valor ejecutado \$ 63.984.300,00		-\$ 7.079.776.600,00
Porcentaje programado 82,30%		Porcentaje ejecutado 0,74%		-81,56%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLAN DE CONTINGENCIA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado \$ 1.128.456.357,60		Valor ejecutado \$ 23.427.956,32		-\$ 1.105.028.401,28
Porcentaje programado 13,00%		Porcentaje ejecutado 0,27%		-12,73%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA - PLAN DE CONTINGENCIA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado \$ 3.124.956.067,20		Valor ejecutado \$ 109.200.956,32		-\$ 3.015.755.110,88
Porcentaje programado 36,00%		Porcentaje ejecutado 1,26%		-34,74%

DATOS DEL COTRATO				
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No: 23001299 H3 DE 2024	
Valor inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00	
Valor Actualizado al modificadorio: NA			Valor actualizado al modificadorio: NA	
Valor actualizado 2: NA			Valor actualizado 2: NA	
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	
Plazo actualizado: NA			Plazo actualizado: NA	
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024	
Fecha de vencimiento: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024	
Modificadorio No. Prórroga No. NA			Modificadorio No. Prórroga No. NA	
Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA			Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA	
Suspensión No. NA			Suspensión No. NA	
Periodo de Suspensión No. NA			Periodo de Suspensión No. NA	
Levantamiento de la suspensión No. NA			Levantamiento de la suspensión No. NA	
Nueva fecha de terminación NA			Nueva fecha de terminación: NA	
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00			Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K2+140 al K2+080 Costado Nor Este. * Se realiza la Excavación de Mateerial No Clasificado de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K2+140 al K2+080 Costado Nor Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el K2+140 al K2+080 Costado Nor Este. * Construcción de campamento de la zona de combustible, mantenimiento de equipos y maquinaria.	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Mediante el comunicado T-003-2024-093-OFC de fecha 2 de diciembre de 2024, se remitió al AEROCIVIL el Informe semanal No. 14 y 15 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024. - Mediante el comunicado T-003-2024-094-OFC de fecha 3 de diciembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA las Observaciones al Suministro del Material Tolerable Tipo INV 220. - Mediante el comunicado T-003-2024-095-OFC de fecha 3 de diciembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-066-2024 - Aval solicitud de prórroga al plazo de ejecución del contrato de obra 23001138 H4 de 2024. - Mediante el comunicado T-003-2024-096-OFC de fecha 4 de diciembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-066-2024 - Aval solicitud de prórroga al plazo de ejecución del contrato de obra 23001138 H4 de 2024. - Mediante el comunicado T-003-2024-097-OFC de fecha 4 de diciembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Solicitud de Prórroga contrato de interventoría No. 23001299 H3 de 2024. - Mediante el comunicado T-003-2024-098-OFC de fecha 6 de diciembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe semanal No. 16 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024. - Mediante el comunicado T-003-2024-099-OFC de fecha 6 de diciembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 4 correspondiente al mes de noviembre de 2024.


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.

ACTIVIDADES SISTEMA SST	
*Preoperacionales de maquinaria	
*Charla de seguridad de actividades conjuntas con demás contratistas.	
*Inducción a personal.	
*Entrega de EPP.	
*Señalización de rutas para vehículos que ingresan a pista (conos, colombinas y luz intermitente.	
*Aseo de areas de trabajo.	


AVANCE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024					Semana No. 17 (3 Dic - 9 Dic)		
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."							
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 2 - NORESTE	\$ 7.015.540.852,00	80,82%				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	\$ 206.252.632,00	2,38%	\$ 8.200,00	231,00	\$ 1.894.200,00	0,92%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	\$ 2.850.399.720,00	32,84%	\$ 2.100,00	231,00	\$ 485.100,00	0,02%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	\$ 1.068.271.500,00	12,31%	\$ 85.000,00	198,00	\$ 16.830.000,00	1,58%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	\$ 2.429.794.000,00	27,99%	\$ 290.000,00		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	\$ -	0,00%	\$ 2.800,00		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	\$ 460.823.000,00	5,31%	\$ 11.000,00		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO						\$ 19.209.300,00	


AVANCE FINANCIERO

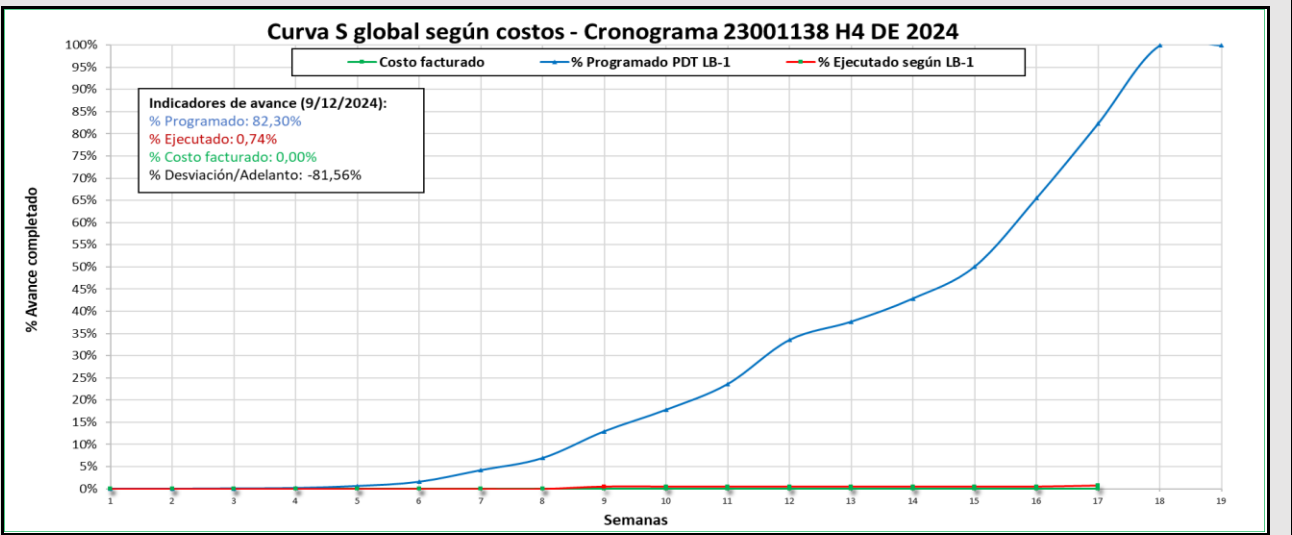

AVANCE FÍSICO

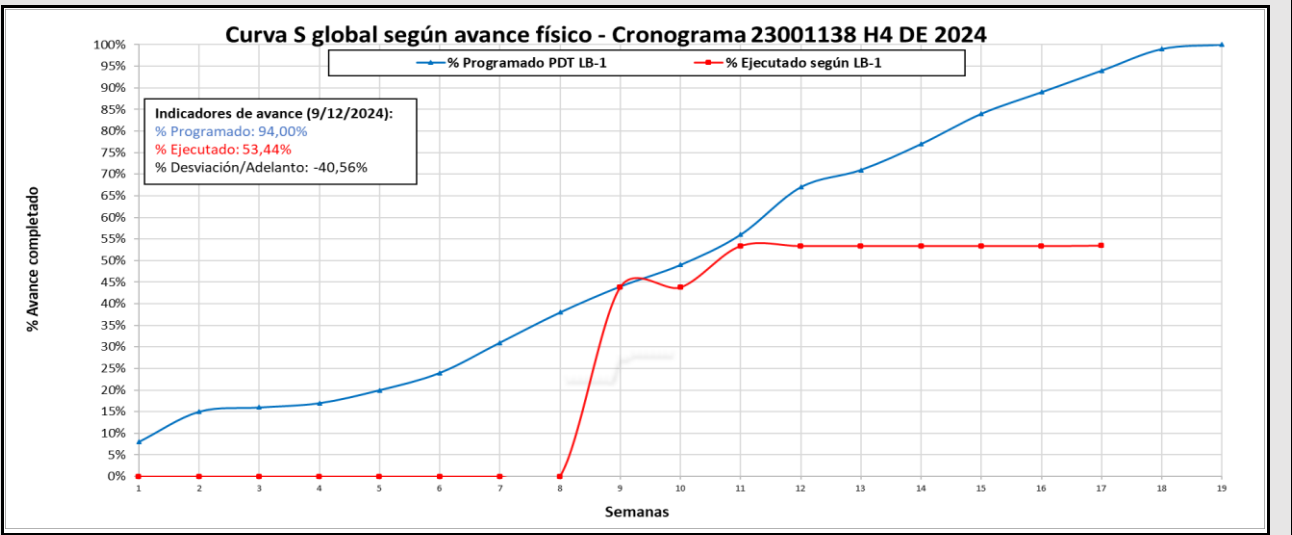


Curva S global según costos - Cronograma 23001138 H4 DE 2024

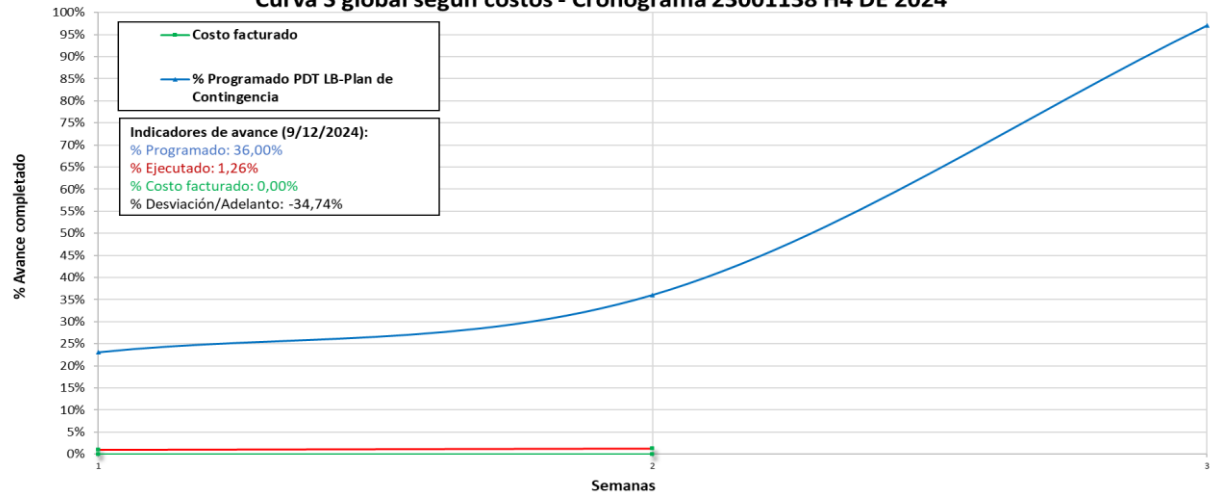

AVANCE FÍSICO - PLAN DE CONTINGENCIA

Curva S global según avance físico - Cronograma 23001138 H4 DE 2024

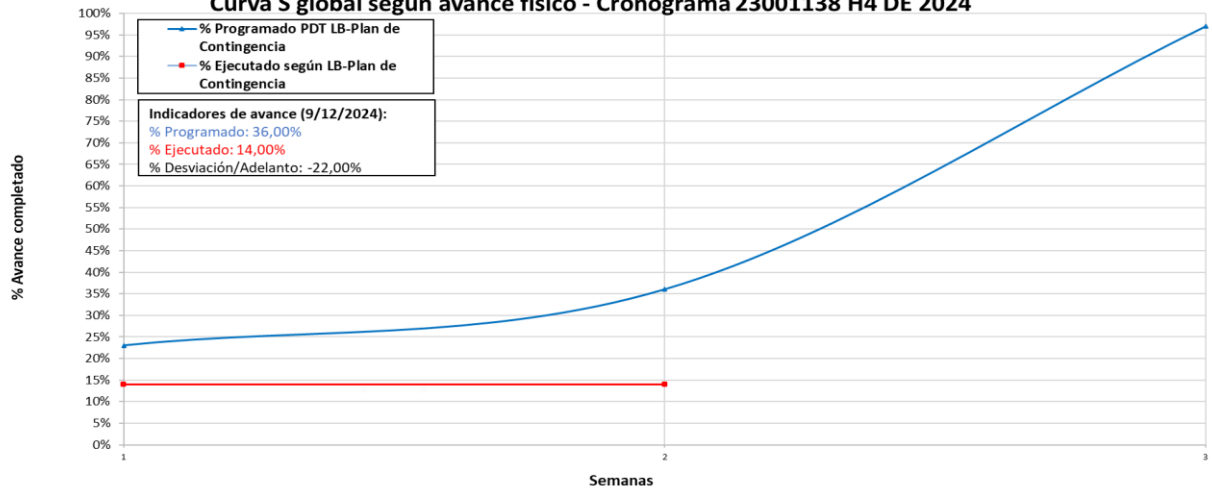

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE


SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 1.462.421.225,00	Valor	\$ 19.209.300,00	Valor	\$ 7.143.760.900,00	Valor	\$ 63.984.300,00
Porcentaje	16,85%	Porcentaje	0,22%	Porcentaje	82,30%	Porcentaje	0,74%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE - PLAN DE CONTINGENCIA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 1.128.456.357,60	Valor	\$ 23.427.956,32	Valor	\$ 3.124.956.067,20	Valor	\$ 109.200.956,32
Porcentaje	13,00%	Porcentaje	0,27%	Porcentaje	36,00%	Porcentaje	1,26%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA



SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ -	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

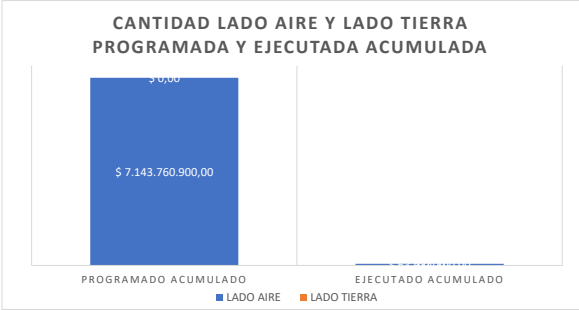

PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	3
	Operadores de Maquinaria	3

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	1
Excavadora de Orugas	1
Vibrocompactadores	2
Bulldozer	1
Carrotanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	3
Camioneta Doble Cabina	1

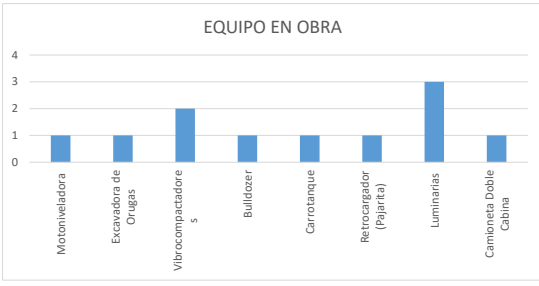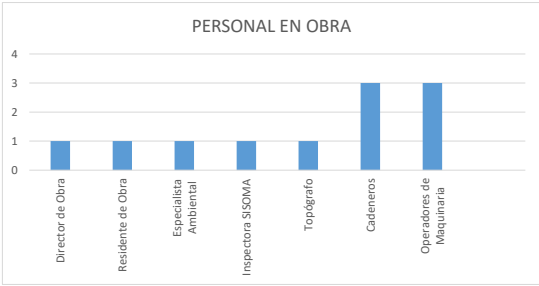

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE OFICINA.




ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE OFICINA.



ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

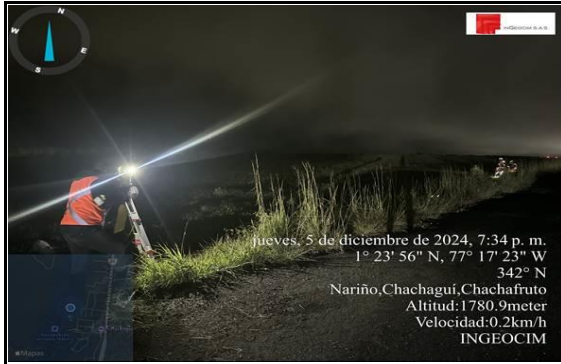


ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

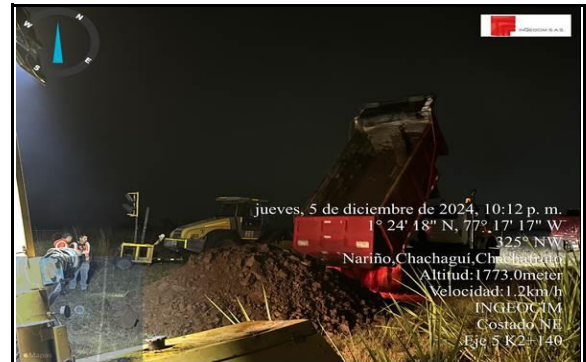

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.



ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES




ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES

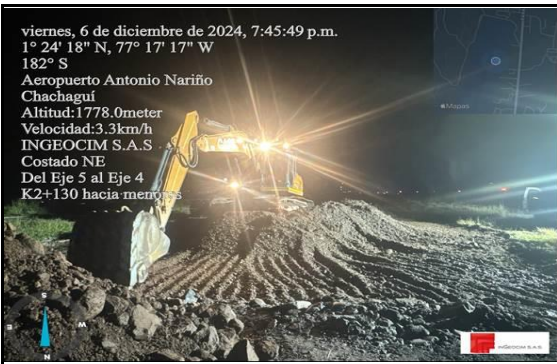


ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES




ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES

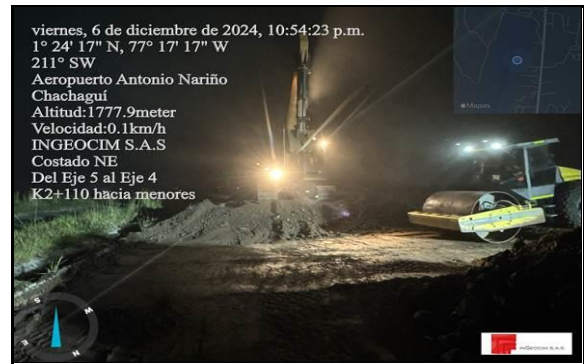


ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES

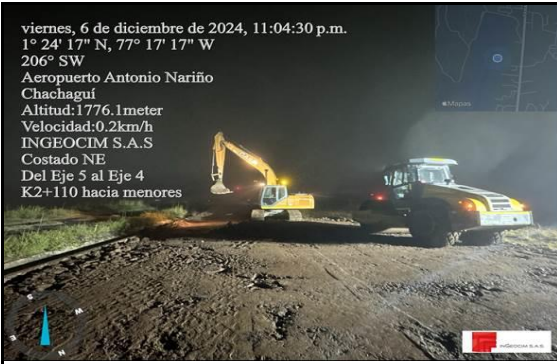


ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES

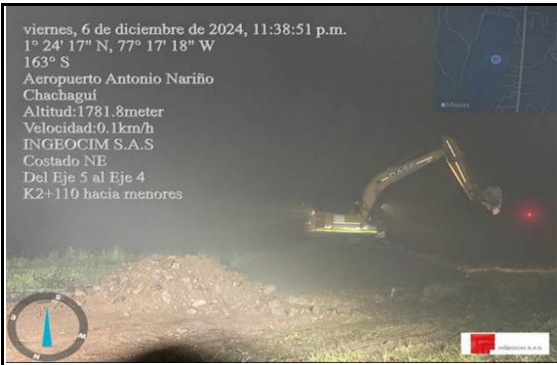

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES

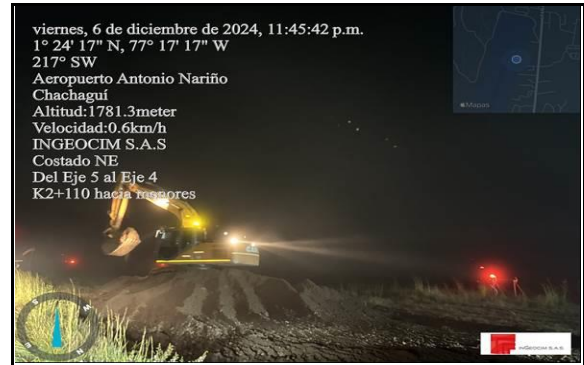


ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES




ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES





ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES

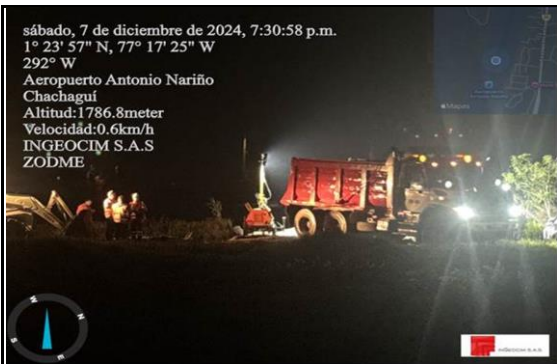

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES

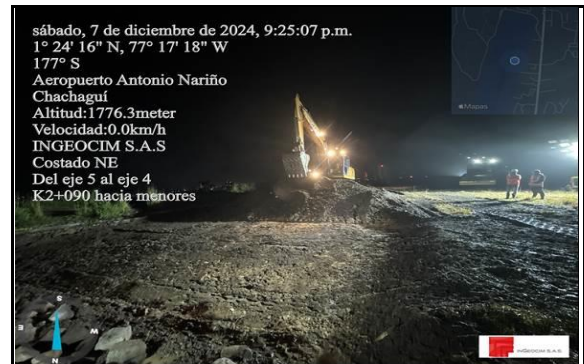

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES





ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL ACOPIO DE COMBUSTIBLES

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 3 Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-063-OFC de fecha 15 de octubre de 2024 y se realiza el seguimiento del Plan de Contingencia Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-092-OFC de fecha 22 de noviembre de 2024. 	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
