


	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No.		18	Plazo total (días)		210
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)		126	
Del		10/12/2024	% de tiempo transcurrido		60,00%
Al		16/12/2024	Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado		\$ 1.531.331.350,00	Valor ejecutado		\$ 47.956.488,00
Porcentaje programado		17,64%	Porcentaje ejecutado		0,55%
					-17,09%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado		\$ 8.675.092.250,00	Valor ejecutado		\$ 111.940.788,00
Porcentaje programado		99,94%	Porcentaje ejecutado		1,29%
					-98,65%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLAN DE CONTINGENCIA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado		\$ 5.295.064.447,20	Valor ejecutado		\$ 149.499.206,60
Porcentaje programado		61,00%	Porcentaje ejecutado		1,72%
					-59,28%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA - PLAN DE CONTINGENCIA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado		\$ 8.420.020.514,40	Valor ejecutado		\$ 258.700.162,92
Porcentaje programado		97,00%	Porcentaje ejecutado		2,98%
					-94,02%
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No: 23001299 H3 DE 2024		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificatorio: NA			Valor actualizado al modificatorio: NA		
Valor actualizado 2: NA			Valor actualizado 2: NA		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: NA			Plazo actualizado: NA		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025		
Suspensión No.: NA			Suspensión No.: NA		
Periodo de Suspensión No.: NA			Periodo de Suspensión No.: NA		
Levantamiento de la suspensión No.: NA			Levantamiento de la suspensión No.: NA		
Nueva fecha de terminación 17/03/2025			Nueva fecha de terminación: 17/03/2025		
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00			Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K2+080 al K1+880 Costado Nor Este. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K2+080 al K1+880 Costado Nor Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el K2+080 al K1+880 Costado Nor Este. * Construcción de campamento de la zona de combustible, mantenimiento de equipos y maquinaria.			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
- Mediante el comunicado T-003-2024-100-OFC de fecha 10 de diciembre de 2024, se remitió al AEROCIVIL la reiteración de la posible afectación económica al contrato de interventoría de la referencia. - Se realizó la suscripción del Modificatorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
*Prooperacionales de maquinaria *Señalización de rutas para vehículos que ingresan a pista (conos, colomabinas y luz intermitente. *Aseo de áreas de trabajo. *Asistencia a comités de seguimiento *Atencion a requerimientos dados por la interventoría sobre requisitos de ingreso de personal. *inspeccion eléctrica, orden y aseo. *charlas de seguridad. *instalacion de unidad sanitaria portátil para damas					


AVANCE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				Semana No. 18 (10 Dic - 16 Dic)		
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 2 - NORESTE		80,82%			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	25.152,76	2,38%	1.210,00	\$ 9.922.000,00	4,81%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	1.357.333,20	32,84%	2.541,00	\$ 5.336.100,00	0,19%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 226.	12.567,90	12,31%	660,00	\$ 56.100.000,00	5,25%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	8.378,60	27,99%		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	41.893,00	5,31%		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 71.358.100,00	


AVANCE FINANCIERO

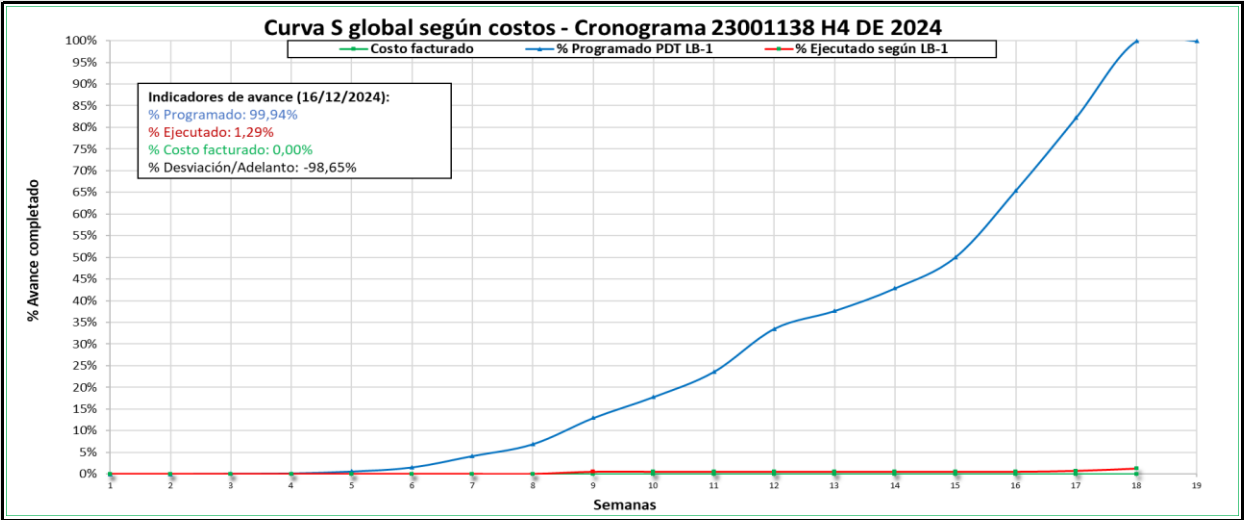


AVANCE FÍSICO

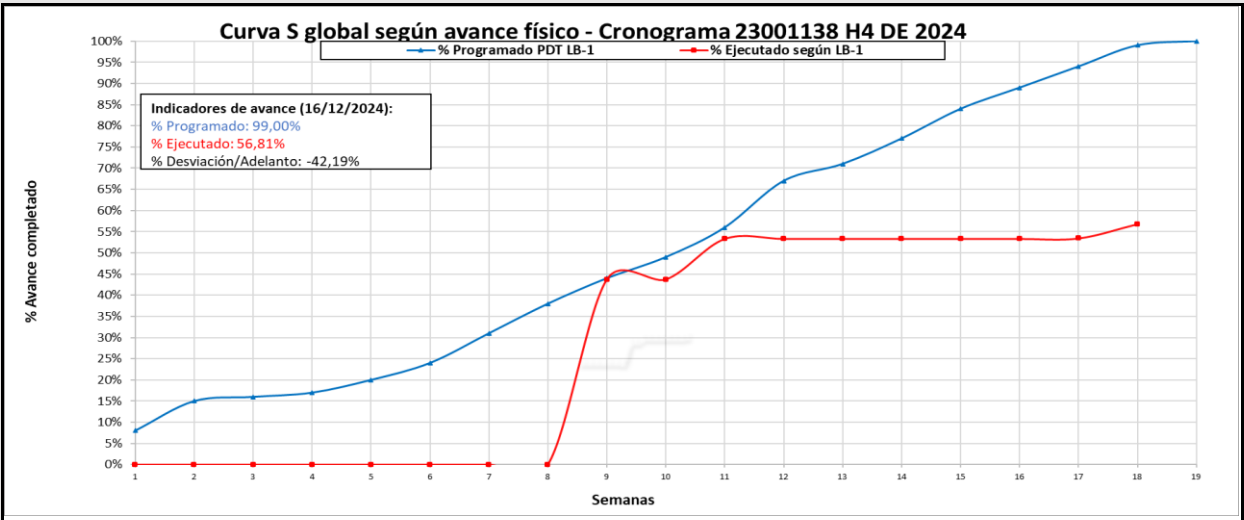

AVANCE FINANCIERO - PLAN DE CONTINGENCIA

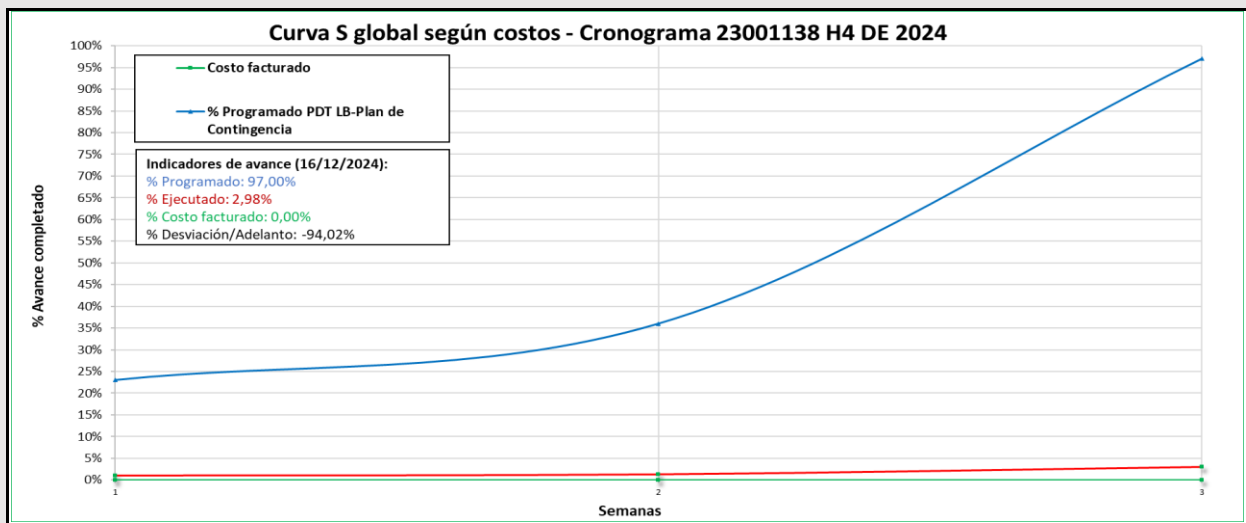

AVANCE FISICO - PLAN DE CONTINGENCIA

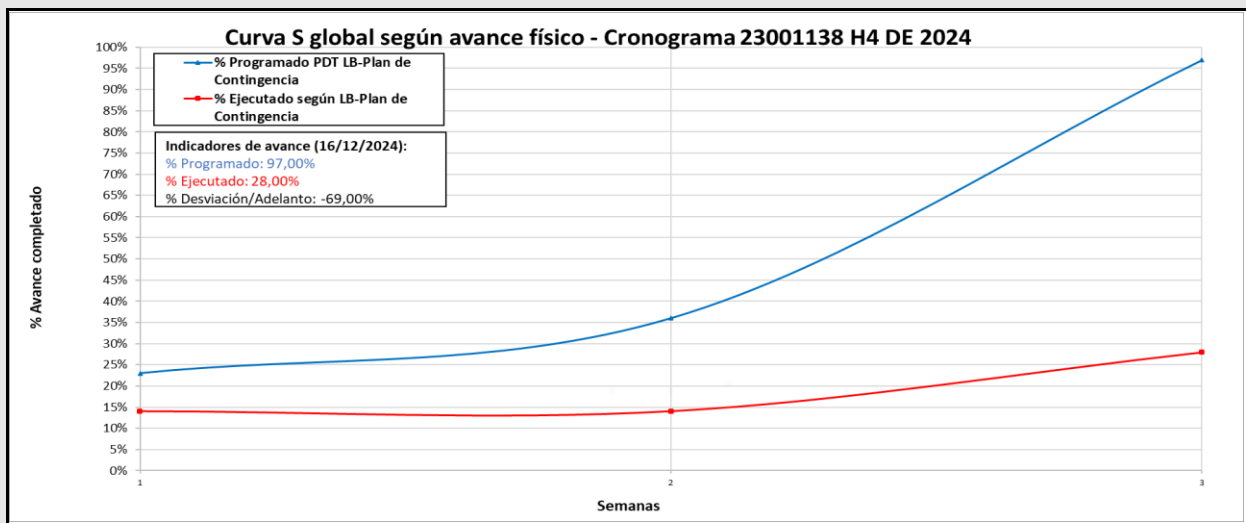

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 1.531.331.350,00	Valor	\$ 47.956.488,00	Valor	\$ 8.675.092.250,00	Valor	\$ 111.940.788,00
Porcentaje	17,64%	Porcentaje	0,55%	Porcentaje	99,94%	Porcentaje	1,29%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE - PLAN DE CONTINGENCIA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 5.295.064.447,20	Valor	\$ 149.499.206,60	Valor	\$ 8.420.020.514,40	Valor	\$ 258.700.162,92
Porcentaje	61,00%	Porcentaje	1,72%	Porcentaje	97,00%	Porcentaje	2,98%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%





PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	3
	Operadores de Maquinaria	5
	Mecánico	1
	Ayudante	7
	Conductor Volqueta	3

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	1
Excavadora de Orugas	1
Vibrocompactadores	2
Bulldozer	1
Carrotanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	3
Camioneta Doble Cabina	1

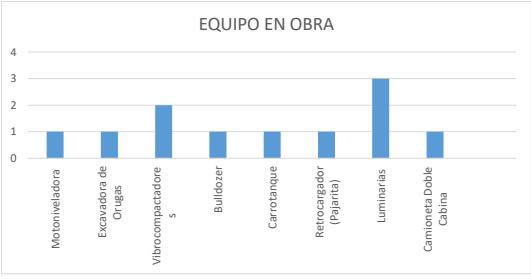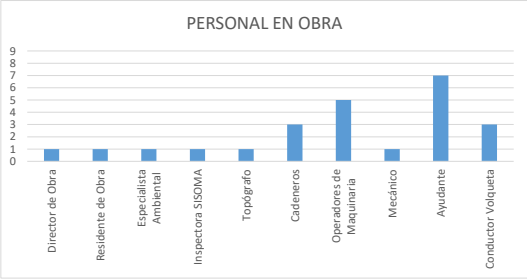

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

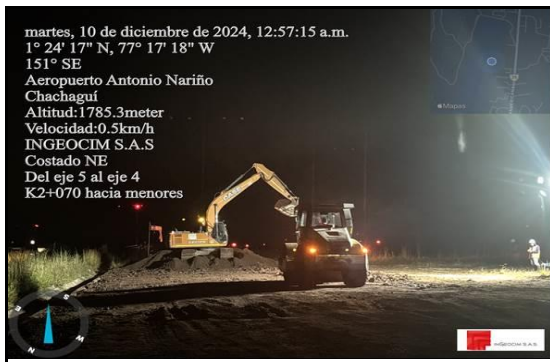

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

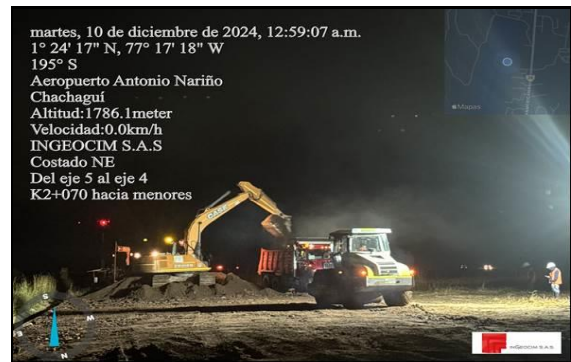


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

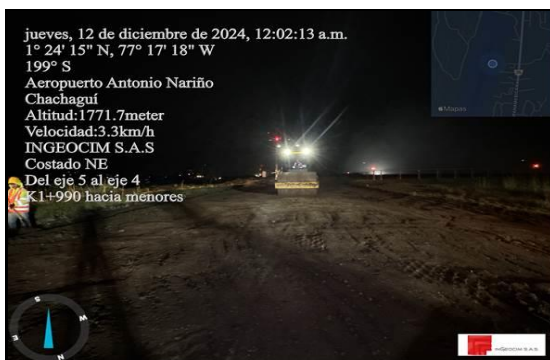

COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 12 de diciembre de 2024, 10:10:05 p.m.
1° 24' 13" N, 77° 17' 19" W
11° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1783.9meter
Velocidad: 0.3km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+990 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 12 de diciembre de 2024, 11:45:09 p.m.
1° 24' 13" N, 77° 17' 19" W
154° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1783.8meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+988 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 13 de diciembre de 2024, 12:05:49 a.m.
1° 24' 13" N, 77° 17' 18" W
196° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1796.1meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+980 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 13 de diciembre de 2024, 12:18:34 a.m.
1° 24' 14" N, 77° 17' 18" W
197° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1785.6meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+980 hacia menores

COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 13 de diciembre de 2024 01:15:25
1°23'45.023"N 77°17'22.187"W
Chachagui
Nariño
Altitud: 1823.8m

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE PLATAFORMA POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES Y AL PASO DE LAS VOLQUETAS.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 8:20:18 p.m.
1° 24' 13" N, 77° 17' 19" W
68° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1774.6meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+960 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 8:29:00 a.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 19" W
10° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1775.0meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+950 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 9:13:15 p.m.
1° 24' 13" N, 77° 17' 19" W
10° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1772.8meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+960 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 9:34:28 p.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 19" W
23° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1829.0meter
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+960 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 10:23:19 p.m.
1° 24' 11" N, 77° 17' 11" W
25° N
Tamanárica
Altitud: 1829.0meter
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+960 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 10:27:24 p.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 19" W
69° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1770.8meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+960 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 10:39:20 p.m.
1° 24' 13" N, 77° 17' 19" W
103° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1768.3meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+960 hacia menores

COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 10:56:04 p.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 19" W
23° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1722.4meter
Velocidad: 0.4km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+960 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 14 de diciembre de 2024, 11:48:55 p.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 19" W
14° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1765.5meter
Velocidad: 2.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+960 hacia menores

COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 3 Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-063-OFC de fecha 15 de octubre de 2024 y se realiza el seguimiento del Plan de Contingencia Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-092-OFC de fecha 22 de noviembre de 2024. Se realizó la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	 ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
