



INFORME SEMANAL

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."

VERSIÓN01

FECHA20/11/2023

INTERVENTORÍA:
GEOTECNIA Y CIMENTOS
INGECIM S.A.S.

DATOS GENERALES

Semana No.20

Plazo total (días)210

PERIODO

Tiempo transcurrido desde inicio (días)133

Del24/12/2024

% de tiempo transcurrido63,33%

Al30/12/2024

InterventoríaGEOTECNIA Y CIMENTOS INGECIM S.A.S.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO

EJECUTADO

BALANCE

Valor programado\$ 598.819.240,80

Valor ejecutado\$ 26.848.525,00

-\$ 571.970.715,80

Porcentaje programado6,90%

Porcentaje ejecutado0,31%

-6,59%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO

EJECUTADO

BALANCE

Valor programado\$ 1.006.794.215,28

Valor ejecutado\$ 290.014.216,32

-\$ 716.779.998,96

Porcentaje programado11,60%

Porcentaje ejecutado3,34%

-8,26%

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista: CONSORCIO ALFA

Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGECIM S.A.S.

Contrato No: 23001138 H4 DE 2024

Contrato No: 23001299 H3 DE 2024

Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00

Valor Inicial: \$ 684.322.873,00

Valor Actualizado al modificadorio: NA

Valor actualizado al modificadorio: NA

Valor actualizado 2: NA

Valor actualizado 2: NA

Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.

Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.

Plazo actualizado: NA

Plazo actualizado: NA

Fecha de iniciación: 13/08/2024

Fecha de iniciación: 13/08/2024

Fecha de vencimiento: 16/12/2024

Fecha de vencimiento: 16/12/2024

Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.

Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025

Suspensión No.: NA

Suspensión No.: NA

Periodo de Suspensión No.: NA

Periodo de Suspensión No.: NA

Levantamiento de la suspensión No.: NA

Levantamiento de la suspensión No.: NA

Nueva fecha de terminación 17/03/2025

Nueva fecha de terminación 17/03/2025

Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00

Valor total actual del contrato \$ 684.322.873,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES LADO AIRE

ACTIVIDADES LADO TIERRA

* Acopio de material tolerable

N.A.

* Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+810 al K1+750 Costado Nor Este.

* Se realiza la Excavación de Mateerial No Clasificado de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+810 al K1+750 Costado Nor Este.

* Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el K1+810 al K1+750 Costado Nor Este.

* Construcción de campamento de la zona de combustible, mantenimiento de equipos y maquinaria.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Mediante el comunicado T-003-2024-103-OFC de fecha 26 de diciembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA el Apremio No. 1 sobre el presunto incumplimiento del acompañamiento del personal SST en las actividades de obra en riesgo crítico dentro del desarrollo del contrato de obra No 23001138 H4 de 2024.

- Mediante el comunicado T-003-2024-104-OFC de fecha 28 de diciembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-068-2024 – Remisión de aprobación de la reprogramación del Plan de inversión del anticipo del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.

ACTIVIDADES SISTEMA SST

*Preoperacionales de maquinaria

*Señalización de rutas para vehículos que ingresan a pista (conos, colombinas y luz intermitente.

*Aseo de áreas de trabajo.

*Asistencia a comités de seguimiento

*Atencion a requerimientos dados por la interventoría sobre requisitos de ingreso de personal.


*Inspeccion eléctrica, orden y aseo.

*charlas de seguridad.


*Instalacion de unidad sanitaria portátil para damas

AVANCE CANTIDADES							
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024							
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."							
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado	
2.4	ZONA 2 - NORESTE		67,95%				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	39.248,54	2,38%	302,50	\$ 2.480.500,00	0,77%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	612.426,51	32,84%	4.925,25	\$ 10.343.025,00	0,80%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220	16.540,00	12,31%	185,00	\$ 14.025.000,00	1,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	8.360,00	27,99%		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA NORMA FAA P-402 INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPREDIZACIÓN INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	41.800,00	5,31%		\$ -		
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 26.848.525,00		



AVANCE FINANCIERO

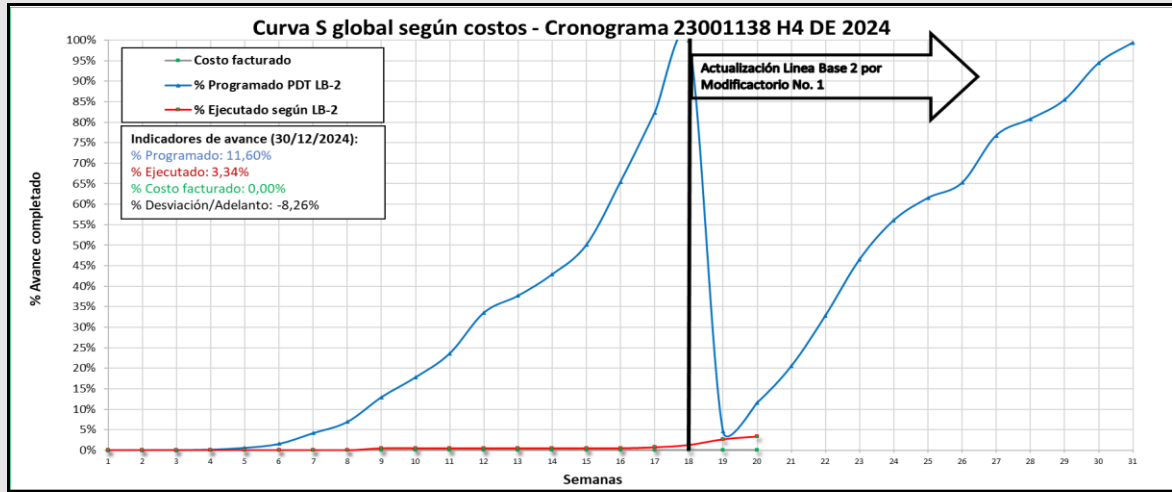

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 598.819.240,80	\$ 26.848.525,00		\$ 1.006.794.215,28	\$ 290.014.216,32
Porcentaje	6,90%	0,31%	Porcentaje	11,60%	3,34%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	0,00%	Porcentaje	0,00%	0,00%

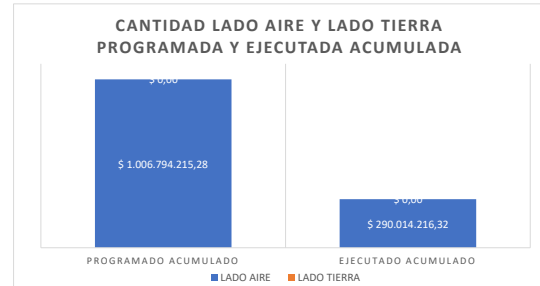

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	1
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	1
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	2
	Inspectora SISOMA	1	Bulldozer	1
	Topógrafo	1	Carro tanque	1
	Cadeneros	3	Retrocargador (Pajarita)	1
MANO DE OBRA	Operadores de Maquinaria	5	Luminarias	3
	Mecánico	1	Camioneta Doble Cabina	1
	Ayudante	7		
	Conductor Volqueta	3		

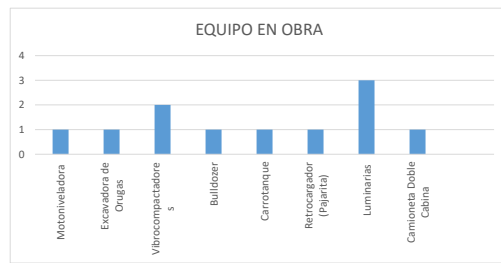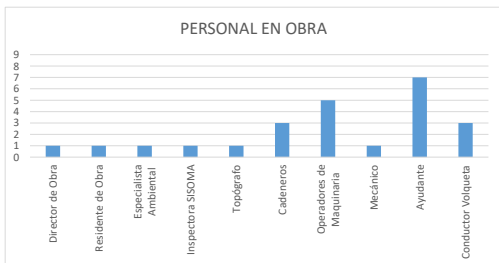

REGISTRO FOTOGRÁFICO

lunes, 23 diciembre 2024 07:51p. m.
1°24'9"N 77°17'20"W
179° S
Altitud:1807.9m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
Del Eje 5 al Eje 4



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

lunes, 23 diciembre 2024 07:35p. m.
1°24'8"N 77°17'20"W
130° SE
Altitud:1822.9m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
Del Eje 5 al Eje 4



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

lunes, 23 diciembre 2024 08:24p. m.
1°24'8"N 77°17'21"W
152° SE
Altitud:1814.5m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
Del Eje 5 al Eje 4



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

lunes, 23 diciembre 2024 08:23p. m.
1°24'8"N 77°17'20"W
200° S
Altitud:1814.0m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
Del Eje 5 al Eje 4



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

lunes, 23 diciembre 2024 09:53p. m.
1°24'8"N 77°17'20"W
102° E
Chachagüí
Altitud:1806.2m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
Del Eje 5 al Eje 4



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

jueves, 26 diciembre 2024 10:37p. m.
1°24'5"N 77°17'20"W
218° SW
Altitud:1796.5m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

jueves, 26 diciembre 2024 10:37p. m.
1°24'5"N 77°17'20"W
220° SW
Altitud:1796.3m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

viernes, 27 diciembre 2024 06:38p. m.
1°24'7"N 77°17'20"W
19° N
Altitud:1813.6m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1 +790 HACIA MENOR



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

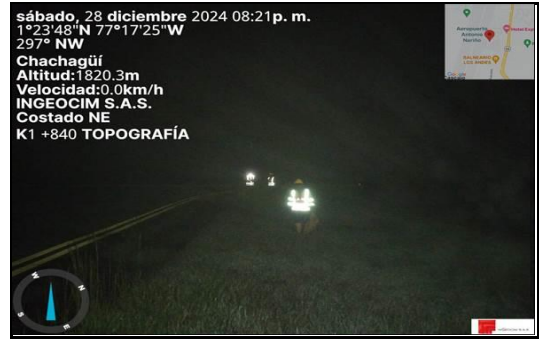

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.



ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
