

	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES				
Semana No.	3	Plazo total (días)	210	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	21	
Del	27/08/2024	% de tiempo transcurrido	10,00%	
Al	2/09/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,00%	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,00%	0,00%

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: CONSORCIO ALFA	Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024	Contrato No: 23001299 H3 DE 2024
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00	Valor inicial: \$ 684.322.873,00
Valor Actualizado al modificadorio: NA	Valor actualizado al modificadorio: NA
Valor actualizado 2: NA	Valor actualizado 2: NA
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
Plazo actualizado: NA	Plazo actualizado: NA
Fecha de iniciación: 13/08/2024	Fecha de iniciación: 13/08/2024
Fecha de vencimiento: 16/12/2024	Fecha de vencimiento: 16/12/2024
Modificadorio No. Prórroga No.: NA	Modificadorio No. Prórroga No.: NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA
Suspensión No.: NA	Suspensión No.: NA
Periodo de Suspensión No.: NA	Periodo de Suspensión No.: NA
Levantamiento de la suspensión No.: NA	Levantamiento de la suspensión No.: NA
Nueva fecha de terminación: NA	Nueva fecha de terminación: NA
Valor total actual del contrato: \$ 8.706.192.504,00	Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
N.A.	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Mediante el comunicado T-003-2024-015-OFC de fecha 26 de agosto de 2024, se remitió la respuesta de la revisión por parte de la interventoría de los documentos y hojas de vida remitidos para la ejecución del contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-016-OFC de fecha 27 de agosto de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el plan de Seguridad Operacional (PSO) para revisión y fines pertinentes.
- Mediante el comunicado T-003-2024-017-OFC de fecha 30 de agosto de 2024, se remitió al contratista, las observaciones al plan de Calidad y Plan de Inspección y ensayos (PI&E) del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-018-OFC de fecha 30 de agosto de 2024, se remitió a la AEROCIVIL, la solicitud reunión con partes interesadas y la empresa responsable de los estudios y diseños para el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-019-OFC de fecha 30 de agosto de 2024, se remitió al contratista, las observaciones al programa detallado de trabajo PDT versión 1 del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-020-OFC de fecha 31 de agosto de 2024, se remitió a la AEROCIVIL, el Informe semanal No. 1 y 2 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Se esta a la espera de la respuesta por parte del contratista del comunicado T-003-2024-012-OFC de fecha 16 de agosto de 2024, en donde se solicita el informe para radicar en el CAS.

ACTIVIDADES SISTEMA SST
Para la presente semana no se tiene ninguna actividad SST.

AVANCE CANTIDADES

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7.1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				19%	\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO

En el presente periodo no se reporta avance financiero, ya que el contrato aún se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA
PROGRAMADA Y EJECUTADA SEMANAL



CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA
PROGRAMADA Y EJECUTADA ACUMULADA



PERSONAL EN OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO		
MANO DE OBRA		

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD

PERSONAL EN OBRA



EQUIPO EN OBRA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



N.A.



N.A.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, aún no se ha presentado la programación detallada de trabajo; por esta razón, no se realiza el seguimiento correspondiente. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños, razón por la cual no se reporta porcentajes de ejecución durante esta semana. 	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Transporte



AERONÁUTICA CIVIL[®]
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Comité Semanal No. 4

Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024
Aeronáutica Civil de Colombia



Orden del Día

- Verificación de Quórum.
- Seguimiento de los Compromisos comité anterior.
- Seguimiento y avance de la semana No. 3
- Aspectos técnicos y temas por tratar.
- Planes de acción.



Seguimiento de los compromisos.

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Remitir el Análisis de precios Unitarios	Contratista CONSORCIO ALFA	27/08/2024
2	Remitir el Plan de Seguridad Operacional (PSO):	Contratista CONSORCIO ALFA	27/08/2024
3	Revisión del Programa detallado de Trabajo. (PDT).	Interventoría INGEOCIM S.A.S.	29/08/2024
4	Elaboración del acta de comité No. 3.	Interventoría INGEOCIM S.A.S.	29/08/2024
5	Remitir concepto de los estudios y diseños.	Contratista CONSORCIO ALFA	29/08/2024
6	Remitir las hojas de vida ajustadas, de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría mediante el comunicado T-003-2024-015-OFC	Contratista CONSORCIO ALFA	29/08/2024
7	Remitir hojas de vida, especialista en hidráulica, inspector de apoyo lado aire y especialista en geotecnia o geotecnia vial	Contratista CONSORCIO ALFA	29/08/2024
8	Remitir el Plan Anual de Caja (PAC).	Contratista CONSORCIO ALFA	30/08/2024
9	Remitir el Plan de Manejo de tránsito (PMT).	Contratista CONSORCIO ALFA	30/08/2024
10	Remitir acta de comité Técnico No 1 y 2 firmada por los asistentes.	Contratista CONSORCIO ALFA	30/08/2024
11	Remitir el Programa de Gerencia de proyectos.	Contratista CONSORCIO ALFA	30/08/2024
12	Remitir hoja de vida del profesional ofertado en el factor de calidad.	Contratista CONSORCIO ALFA	30/08/2024
13	Arte valla.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	Sin fecha establecida.





Objeto del Proyecto:

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

\$8.706.192.504

Datos Generales

CONTRATO DE OBRA No. 23001138 H4 DE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL DEL CONTRATO	
OBJETO CONTRATO OBRA	“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”
CONTRATO DE OBRA No.	23001138 H4 DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA NIT: 901.707.929-0
PLAZO INICIAL CONTRATO DE OBRA	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	Trece (13) Agosto de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE OBRA	Dieciséis (16) de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$8.706.192.504 INCLUYE AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001299 H3 DE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL DEL CONTRATO	
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA	“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	23001299 H3 DE 2024
CONTRATISTA	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. NIT. 800.155.100-6
PLAZO INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
FECHA INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Trece (13) Agosto de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Dieciséis (16) de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$684.322.873 INCLUIDO IVA



CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

Aeropuerto Antonio Nariño – Pasto.

Seguimiento y avance de la semana No. 3

- Mediante el comunicado T-003-2024-015-OFC de fecha 26 de agosto de 2024, se remitió la respuesta de la revisión por parte de la interventoría de los documentos y hojas de vida remitidos para la ejecución del contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-016-OFC de fecha 27 de agosto de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el plan de Seguridad Operacional (PSO) para revisión y fines pertinentes.
- Mediante el comunicado T-003-2024-017-OFC de fecha 30 de agosto de 2024, se remitió al contratista, las observaciones al plan de Calidad y Plan de Inspección y ensayos (PI&E) del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-018-OFC de fecha 30 de agosto de 2024, se remitió a la AEROCIVIL, la solicitud reunión con partes interesadas y la empresa responsable de los estudios y diseños para el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-019-OFC de fecha 30 de agosto de 2024, se remitió al contratista, las observaciones al programa detallado de trabajo PDT versión 1 del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-020-OFC de fecha 31 de agosto de 2024, se remitió a la AEROCIVIL, el Informe semanal No. 1 y 2 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.



- **Fecha de inicio:** 13 de agosto de 2024
- **Fecha terminación:** 16 de diciembre de 2024

Programado
0,00%

Ejecutado
0,00%

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024


“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

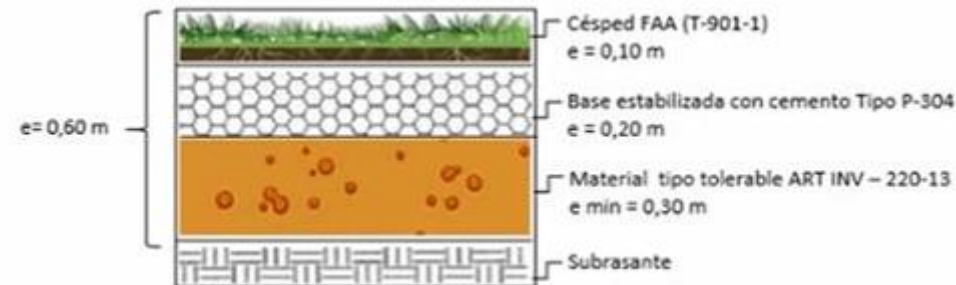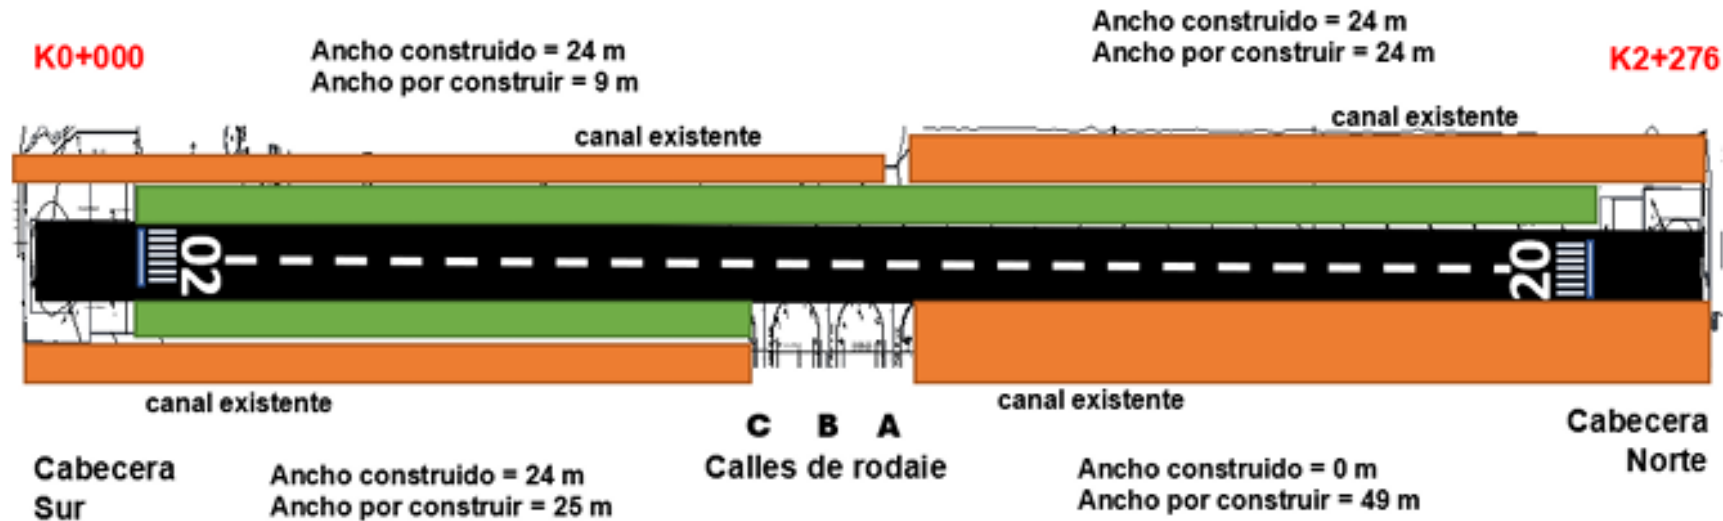

Temas por tratar.

- Hojas de vida del personal profesional requerido.
- Análisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta económica.
- Plan de Seguridad Operacional (PSO).
- Plan de Trabajo (PT).
- Programa detallado de Trabajo (PDT).
- Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
- Plan Anual de Caja (PAC).
- Programa de Gerencia de Proyectos y hoja de vida de PMP.
- Actualización de Pólizas de acuerdo con el acta de Inicio.
- Notice To Airmen (NOTAM).
- Revisión de los estudios y diseños por parte del CONSORCIO ALFA, incluidos los planos récord de las redes eléctricas y ayudas visuales existentes en las franjas de seguridad, de acuerdo con lo que remitió la entidad contratante el día 23 de agosto de 2024.
- Arte de la valla.
- Revisión del acta del comité de fecha 27 de agosto, remitida por la interventoría el día 28 de agosto, para darle visto bueno y proceder con las firmas.



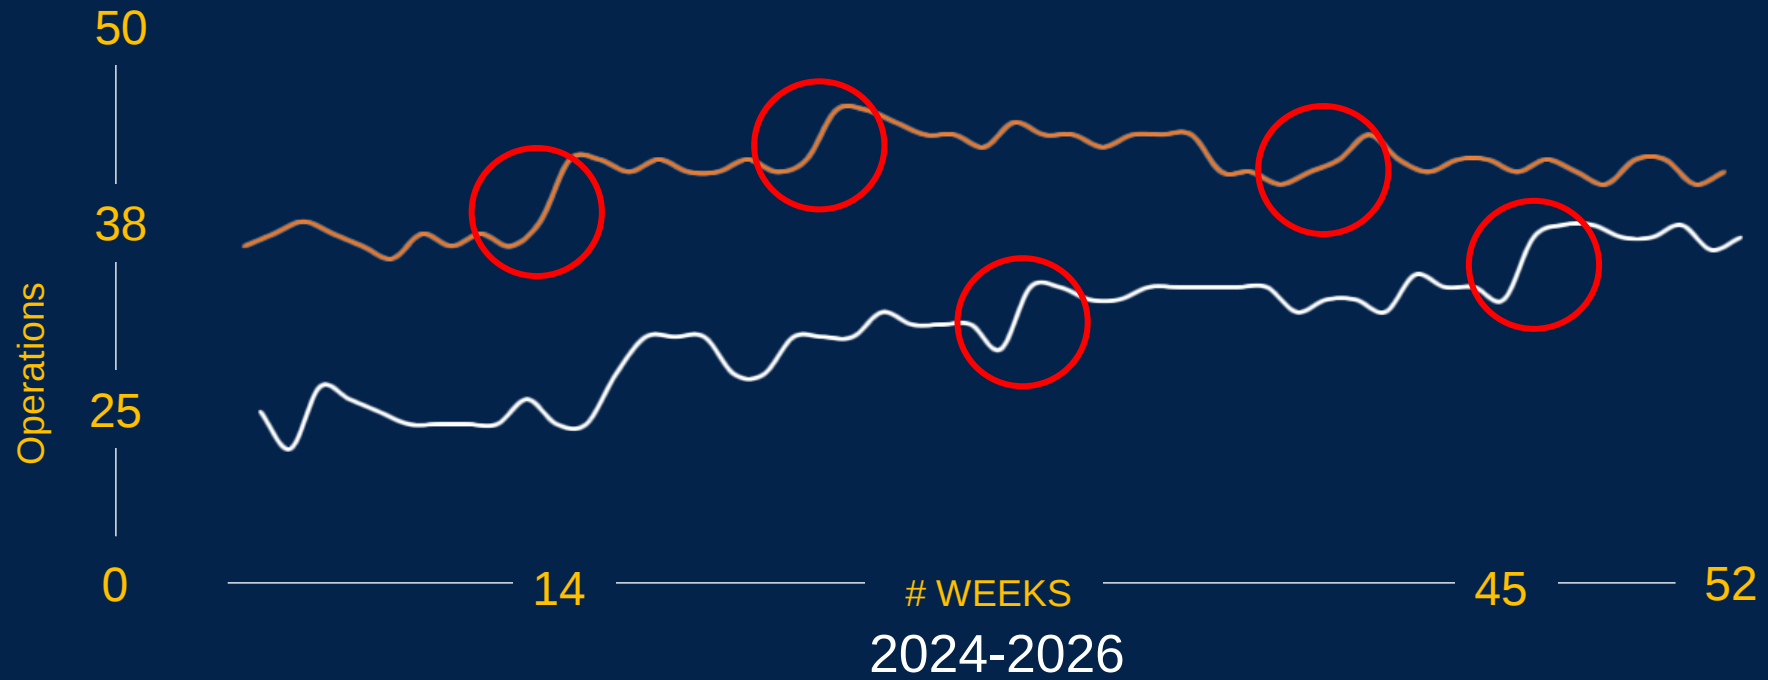

MUCHAS GRACIAS

