

	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORIA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 6		Plazo total (días)		210	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)		42	
Del 17/09/2024		% de tiempo transcurrido		20,00%	
Al 23/09/2024		Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 0,00		Valor ejecutado \$ 0,00		\$ 0,00	
Porcentaje programado 0,00%		Porcentaje ejecutado 0,00%		0,00%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 0,00		Valor ejecutado \$ 0,00		\$ 0,00	
Porcentaje programado 0,00%		Porcentaje ejecutado 0,00%		0,00%	
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No: 23001299 H3 DE 2024		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificadorio: NA			Valor actualizado al modificadorio: NA		
Valor actualizado 2: NA			Valor actualizado 2: NA		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: NA			Plazo actualizado: NA		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificadorio No. Prórroga No. NA			Modificadorio No. Prórroga No. NA		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA			Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA		
Suspensión No. NA			Suspensión No. NA		
Periodo de Suspensión No. NA			Periodo de Suspensión No. NA		
Levantamiento de la suspensión No. NA			Levantamiento de la suspensión No. NA		
Nueva fecha de terminación NA			Nueva fecha de terminación: NA		
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00			Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
N.A.			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
- Mediante el comunicado T-003-2024-036-OFC de fecha 18 de septiembre de 2024, se remitieron las Hojas de vida del personal del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024.					
- Mediante el comunicado T-003-2024-037-OFC de fecha 18 de septiembre de 2024, se realizó la reiteración de la solicitud del informe mensual del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024.					
- Mediante el comunicado T-003-2024-038-OFC de fecha 19 de septiembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA, el concepto de interventoría frente a la solicitud de prórroga de la etapa de pre-construcción - Apropiación de estudios y diseños para el contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Se esta a la espera de la respuesta por parte del contratista del comunicado T-003-2024-012-OFC de fecha 16 de agosto de 2024, en donde se solicita el informe para radicar en el CAS.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
Para la presente semana no se tiene ninguna actividad SST.					

AVANCE CANTIDADES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7.1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 6.880.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				19%	\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO


En el presente periodo no se reporta avance financiero, ya que el contrato aún se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

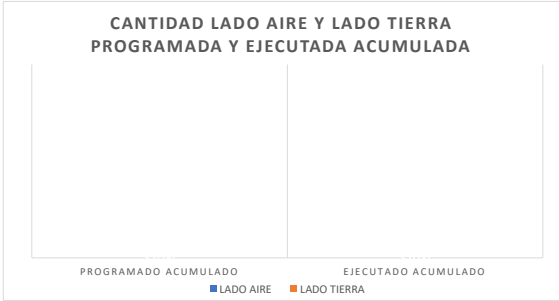

PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS
------------------	--------------------------------

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

[illegible][illegible]



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORACIÓN DE APIQUES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA, PARA VERIFICACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR.



ELABORACIÓN DE APIQUES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA, PARA VERIFICACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR.



ELABORACIÓN DE APIQUES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA, PARA VERIFICACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR.



ELABORACIÓN DE APIQUES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA, PARA VERIFICACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR.



ELABORACIÓN DE APIQUES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA, PARA VERIFICACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR.



ELABORACIÓN DE APIQUES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA, PARA VERIFICACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, aún no se ha presentado la programación detallada de trabajo; por esta razón, no se realiza el seguimiento correspondiente. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños, razón por la cual no se reporta porcentajes de ejecución durante esta semana.	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
