

 AERONÁUTICA CIVIL Corporación Aeronáutica e Industrial	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES

Semana No.	8	Plazo total (días)	210
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	56
Del	1/10/2024	% de tiempo transcurrido	26,67%
Al	7/10/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,00%	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,00%	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: CONSORCIO ALFA	Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024	Contrato No: 23001299 H3 DE 2024
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00	Valor inicial: \$ 684.322.873,00
Valor Actualizado al modificadorio: NA	Valor actualizado al modificadorio: NA
Valor actualizado 2: NA	Valor actualizado 2: NA
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
Plazo actualizado: NA	Plazo actualizado: NA
Fecha de iniciación: 13/08/2024	Fecha de iniciación: 13/08/2024
Fecha de vencimiento: 16/12/2024	Fecha de vencimiento: 16/12/2024
Modificadorio No. Prórroga No. NA	Modificadorio No. Prórroga No.: NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA
Suspensión No. NA	Suspensión No.: NA
Periodo de Suspensión No. NA	Periodo de Suspensión No.: NA
Levantamiento de la suspensión No. NA	Levantamiento de la Suspensión No.: NA
Nueva fecha de terminación NA	Nueva fecha de terminación: NA
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00	Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
N.A.	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Mediante el comunicado T-003-2024-045-OFC de fecha 30 de septiembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe de cumplimiento de funciones del personal del contrato de interventoría No. 23001299 H3 de 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-046-OFC de fecha 1 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-020-2024 – Observaciones a las hojas de vida y el equipo mínimo requerido del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-047-OFC de fecha 1 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA, Respuesta al comunicado 2024262000045244 AEROCIVIL - Traslado de observaciones de los APU.
- Mediante el comunicado T-003-2024-048-OFC de fecha 1 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA, el Traslado de Memorando de la AEROCIVIL de la Aceptación del Plan de Seguridad Operacional (PSO).
- Mediante el comunicado T-003-2024-049-OFC de fecha 1 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Remisión Hojas de Vida del personal profesional del Contrato de Interventoría No. 23001299 H3 DE 2024..
- Mediante el comunicado T-003-2024-050-OFC de fecha 3 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-029-2024 – Observaciones al cronograma y plan de contingencia.
- Mediante el comunicado T-003-2024-051-OFC de fecha 3 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-027-2024 - Remisión de las Hojas de vida aprobadas del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-052-OFC de fecha 3 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe semanal No. 5 y 6 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-053-OFC de fecha 4 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe semanal No. 7 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-054-OFC de fecha 4 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado Radicado No. 2024262000045244 – Respuesta a las observaciones APU aprobados del contrato de obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-055-OFC de fecha 4 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 2 correspondiente al mes de septiembre de 2024.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Por parte del CONSORCIO ALFA se dio respuesta a la solicitud realizada por la interventoría mediante el comunicado C-ALFA-022-2024, sin embargo, por parte de la interventoría se reviso el documento y mediante el comunicado T-003-2024-044-OFC de fecha 27 de septiembre de 2024 se remitieron las Observaciones al plan de Manejo Ambiental.

ACTIVIDADES SISTEMA SST

Para la presente semana no se tiene ninguna actividad SST.

AVANCE CANTIDADES	
-------------------	--

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2,1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3,1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6,1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7,1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				19%	\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO	
-------------------	--


En el presente periodo no se reporta avance financiero, ya que el contrato aún se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA	
--	--


SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%



PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS
------------------	--------------------------------

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

[illegible][illegible]

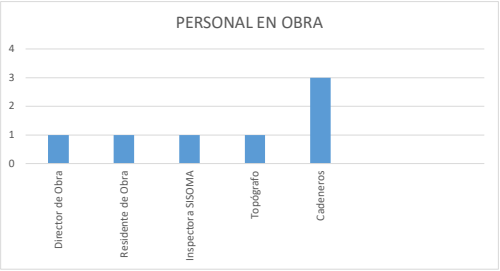

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAQUINARIA EN CAMPO

ELABORACIÓN DE LA NIVELACIÓN Y CONTRANIVELACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ELABORACIÓN DE LA NIVELACIÓN Y CONTRANIVELACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

ELABORACIÓN DE LA NIVELACIÓN Y CONTRANIVELACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ELABORACIÓN DE LA NIVELACIÓN Y CONTRANIVELACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

ELABORACIÓN DE LA NIVELACIÓN Y CONTRANIVELACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ELABORACIÓN DE LA NIVELACIÓN Y CONTRANIVELACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ELABORACIÓN DE LA NIVELACIÓN Y CONTRANIVELACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, aún no se ha presentado la programación detallada de trabajo; por esta razón, no se realiza el seguimiento correspondiente. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños, razón por la cual no se reporta porcentajes de ejecución durante esta semana. Es de resaltar que, mediante el comunicado T-003-2024-043-OFC de fecha 27 de septiembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL con copia al CONSORCIO ALFA, la recomendación de impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.	 ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Transporte



AERONÁUTICA CIVIL[®]
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Comité Semanal No. 9

Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024
Aeronáutica Civil de Colombia



Orden del Día

- Verificación de Quórum.
- Seguimiento de los Compromisos comité anterior.
- Seguimiento y avance de la semana No. 8
- Aspectos técnicos y temas por tratar.
- Planes de acción.



Seguimiento de los compromisos.

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Ajuste al informe – Plan de contingencia	CONSORCIO ALFA	1/10/2024
2	Revisión del acta de comité técnico No. 4, 5, 6 y 7.	CONSORCIO ALFA Entidad Contratante. AEROCIVIL	1/10/2024
3	Revisión del acta de reunión extraordinaria No. 2	CONSORCIO ALFA Entidad Contratante. AEROCIVIL	1/10/2024
4	Revisión de la inclusión del rubro de nómina y aportes.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	3/10/2024
5	Remitir a la interventoría el informe mensual No. 2 correspondiente al mes de septiembre.	CONSORCIO ALFA	3/10/2024
6	Remitir a la interventoría la hoja de vida del ingeniero eléctrico ajustada.	CONSORCIO ALFA	4/10/2024
7	Remitir a la interventoría la hoja de vida del profesional lado aire ajustada con la carta de compromiso	CONSORCIO ALFA	4/10/2024
8	Remitir el Programa de Gerencia de proyecto y la hoja de vida del PMP ajustado.	CONSORCIO ALFA	4/10/2024
9	Remitir a la interventoría el Plan de Manejo Ambiental ajustado.	CONSORCIO ALFA	4/10/2024
10	Remitir a la interventoría los documentos actualizados de la maquinaria en campo.	CONSORCIO ALFA	4/10/2024
11	Remitir el plan de inversión del anticipo ajustado	CONSORCIO ALFA	4/10/2024
12	Dar respuesta a las observaciones de los APU remitidas por la Entidad Contratante	CONSORCIO ALFA INGEOCIM SAS	4/10/2024
13	Revisión y visto bueno del informe semanal No. 5 y 6 de interventoría.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	4/10/2024
14	Revisión del Plan de Trabajo (PT).	Entidad Contratante. AEROCIVIL	7/10/2024
15	Remitir el Programa detallado de Trabajo. (PDT) ajustado.	CONSORCIO ALFA	8/10/2024
16	Elaboración del acta de comité No. 8.	INGEOCIM S.A.S.	8/10/2024
17	Arte valla.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	Sin fecha establecida.





Objeto del Proyecto:

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

\$8.706.192.504

Datos Generales

CONTRATO DE OBRA No. 23001138 H4 DE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL DEL CONTRATO	
OBJETO CONTRATO OBRA	“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”
CONTRATO DE OBRA No.	23001138 H4 DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA NIT: 901.707.929-0
PLAZO INICIAL CONTRATO DE OBRA	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	Trece (13) Agosto de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE OBRA	Dieciséis (16) de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$8.706.192.504 INCLUYE AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001299 H3 DE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL DEL CONTRATO	
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA	“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	23001299 H3 DE 2024
CONTRATISTA	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. NIT. 800.155.100-6
PLAZO INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
FECHA INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Trece (13) Agosto de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Dieciséis (16) de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$684.322.873 INCLUIDO IVA

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL
AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

Seguimiento y avance de la semana No. 8

- Mediante el comunicado T-003-2024-045-OFC de fecha 30 de septiembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe de cumplimiento de funciones del personal del contrato de interventoría No. 23001299 H3 de 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-046-OFC de fecha 1 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-020-2024 – Observaciones a las hojas de vida y el equipo mínimo requerido del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-047-OFC de fecha 1 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA, Respuesta al comunicado 2024262000045244 AEROCIVIL - Traslado de observaciones de los APU.
- Mediante el comunicado T-003-2024-048-OFC de fecha 1 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA, el Traslado de Memorando de la AEROCIVIL de la Aceptación del Plan de Seguridad Operacional (PSO).
- Mediante el comunicado T-003-2024-049-OFC de fecha 1 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Remisión Hojas de Vida del personal profesional del Contrato de Interventoría No. 23001299 H3 DE 2024..
- Mediante el comunicado T-003-2024-050-OFC de fecha 3 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-029-2024 – Observaciones al cronograma y plan de contingencia.
- Mediante el comunicado T-003-2024-051-OFC de fecha 3 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-027-2024 - Remisión de las Hojas de vida aprobadas del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.

Aeropuerto Antonio Nariño – Pasto.

- **Fecha de inicio:** 13 de agosto de 2024
- **Fecha terminación:** 16 de diciembre de 2024

Programado
0,00%

Ejecutado
0,00%



CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL
AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

Seguimiento y avance de la semana No. 8

- Mediante el comunicado T-003-2024-052-OFC de fecha 3 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe semanal No. 5 y 6 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-053-OFC de fecha 4 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe semanal No. 7 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-054-OFC de fecha 4 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado Radicado No. 2024262000045244 – Respuesta a las observaciones APU aprobados del contrato de obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-055-OFC de fecha 4 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 2 correspondiente al mes de septiembre de 2024.
- Avance en los Estudios y diseños de las franjas de seguridad.

Aeropuerto Antonio Nariño – Pasto.

- **Fecha de inicio:** 13 de agosto de 2024
- **Fecha terminación:** 16 de diciembre de 2024



Programado
0,00%

Ejecutado
0,00%



CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024


“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

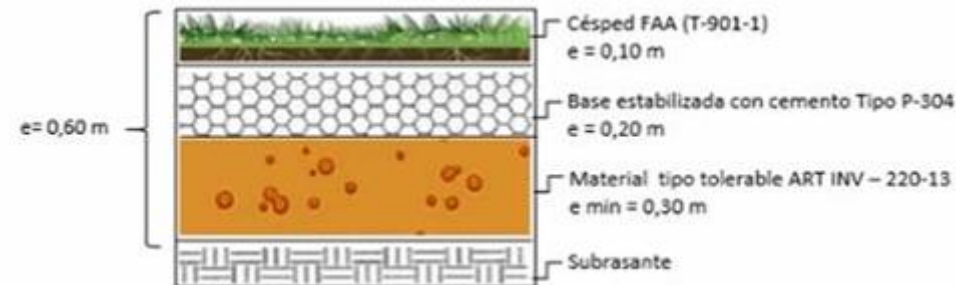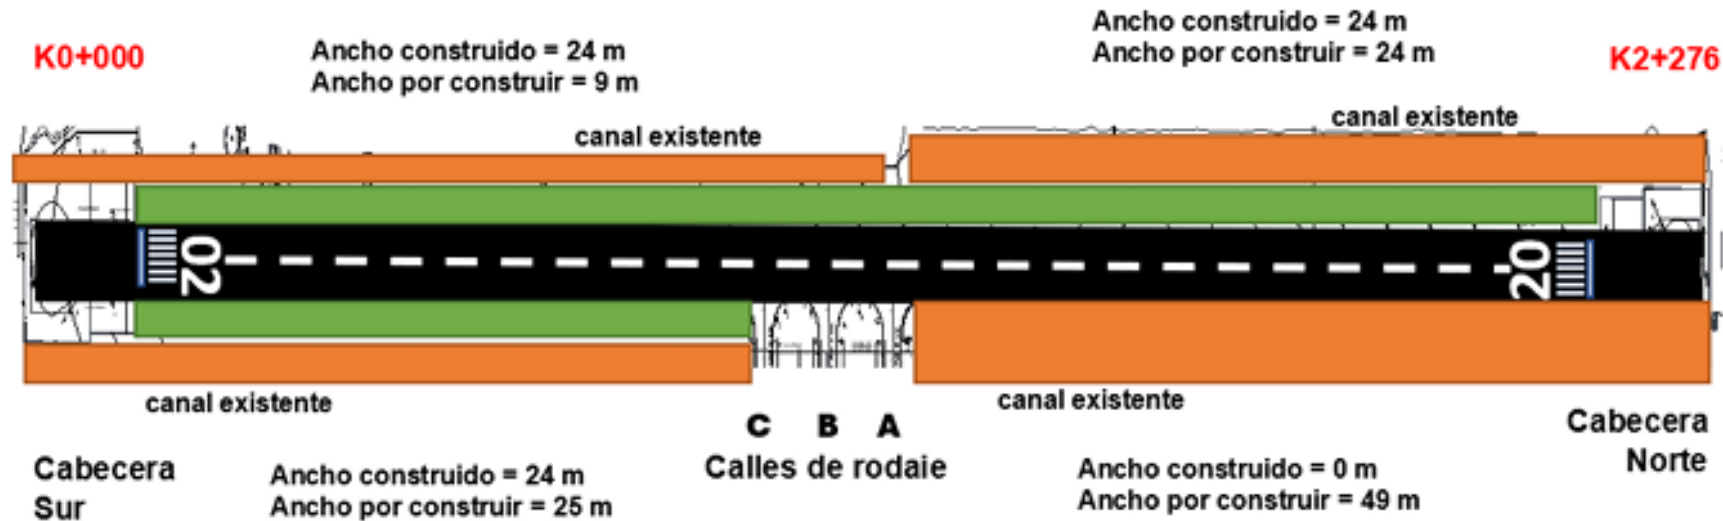

Temas por tratar.

- Avance componente Ambiental.
- Avance componente SST.
- Visita de los inspectores de Seguridad Operacional.
- Hojas de vida del personal profesional requerido.
- Documentos Faltantes del equipo mínimo requerido.
- Plan de Trabajo (PT). Revisión por parte de la Entidad Contratante.
- Programa detallado de Trabajo (PDT).
- Programa de Gerencia de Proyectos y hoja de vida de PMP.
- Avance respecto al trámite del anticipo de obra.
- Informe de la Actividad 1 del Anexo de Apropiación de los E&D.
- Informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2024.
- Arte de la valla.
- Revisión del acta del comité de fecha 1 de octubre, remitida por la interventoría el día 8 de octubre, para darle visto bueno y proceder con las firmas.



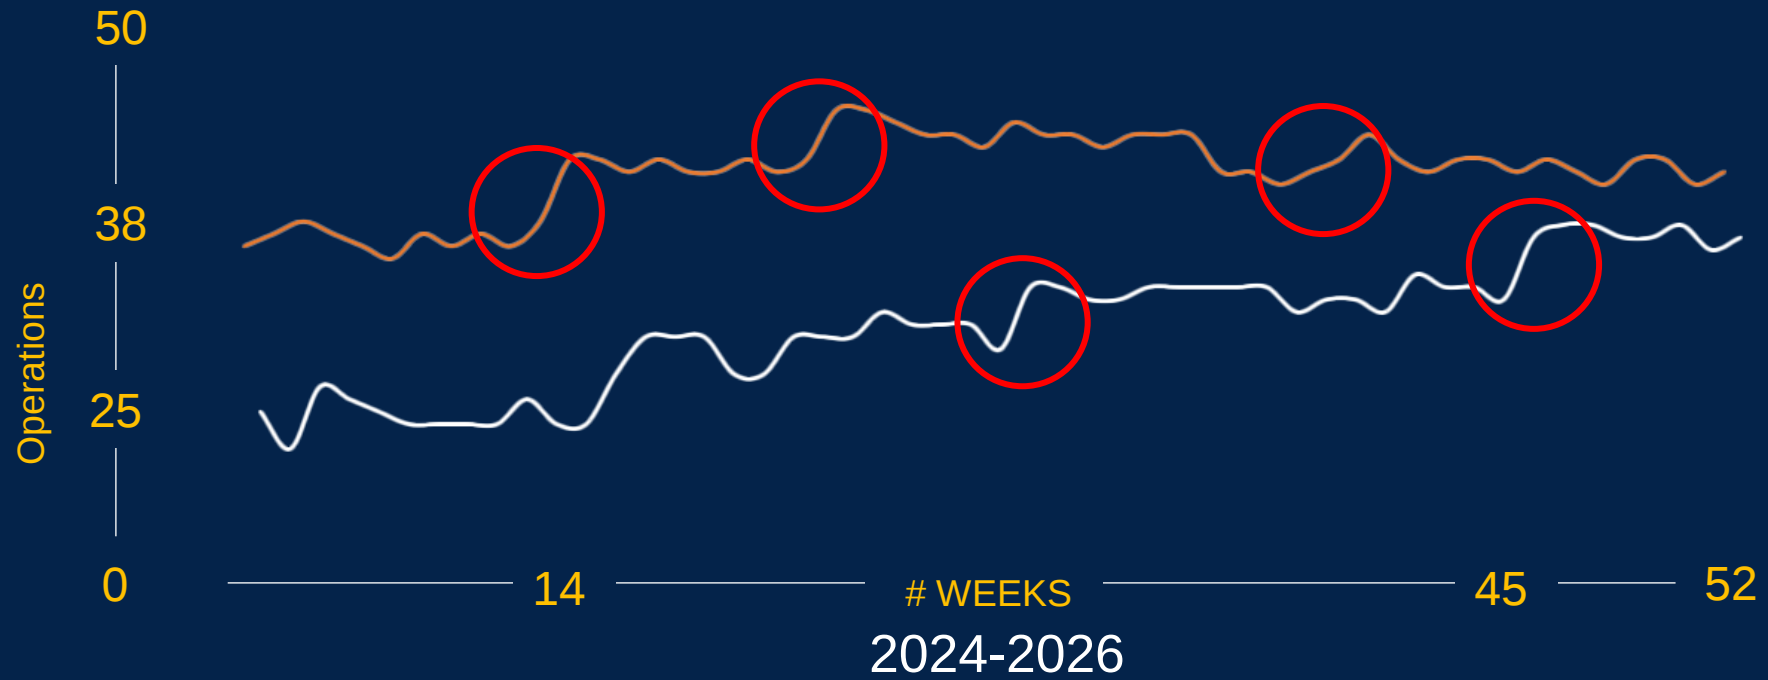

MUCHAS GRACIAS

