

 AERONÁUTICA CIVIL Corporación Aeronáutica del Ecuador	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES

Semana No.	9	Plazo total (días)	210
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	63
Del	8/10/2024	% de tiempo transcurrido	30,00%
Al	14/10/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 523.948.425,00	Valor ejecutado	\$ 44.775.000,00	-\$ 479.173.425,00
Porcentaje programado	6,04%	Porcentaje ejecutado	0,52%	-5,52%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 1.123.682.800,00	Valor ejecutado	\$ 44.775.000,00	-\$ 1.078.907.800,00
Porcentaje programado	12,95%	Porcentaje ejecutado	0,52%	-12,43%

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: CONSORCIO ALFA	Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024	Contrato No: 23001299 H3 DE 2024
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00	Valor inicial: \$ 684.322.873,00
Valor Actualizado al modificadorio: NA	Valor actualizado al modificadorio: NA
Valor actualizado 2: NA	Valor actualizado 2: NA
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
Plazo actualizado: NA	Plazo actualizado: NA
Fecha de iniciación: 13/08/2024	Fecha de iniciación: 13/08/2024
Fecha de vencimiento: 16/12/2024	Fecha de vencimiento: 16/12/2024
Modificadorio No. Prórroga No. NA	Modificadorio No. Prórroga No.: NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No.: NA
Suspensión No. NA	Suspensión No.: NA
Periodo de Suspensión No. NA	Periodo de Suspensión No.: NA
Levantamiento de la suspensión No. NA	Levantamiento de la Suspensión No.: NA
Nueva fecha de terminación NA	Nueva fecha de terminación: NA
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00	Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
Actividades de Levantamiento Topográfico	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Mediante el comunicado T-003-2024-056-OFC de fecha 7 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta a los comunicados C-ALFA-023-2024 y C-ALFA-032-2024 - Remisión del Informe preliminar del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.

- Mediante el comunicado T-003-2024-057-OFC de fecha 7 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA las recomendaciones para la entrega y radicación de informes mensuales SST.

- Mediante el comunicado T-003-2024-058-OFC de fecha 8 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la respuesta al comunicado C-ALFA-025-2024 - Observaciones a los documentos contractuales del área SST.

- Mediante el comunicado T-003-2024-059-OFC de fecha 9 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-035-2024 - Remisión de las Hojas de vida aprobadas del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.

- Mediante el comunicado T-003-2024-060-OFC de fecha 10 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Reiteración de la recomendación de impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.

- Mediante el comunicado T-003-2024-061-OFC de fecha 10 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA el Traslado de Correo electrónico de la AEROCIVIL de la Aceptación del Plan de Trabajo (PT).

- Mediante el comunicado T-003-2024-062-OFC de fecha 11 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-037-2024 – Solicitud de definición de áreas y longitudes a intervenir del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Por parte del CONSORCIO ALFA dio respuesta mediante el oficio C-ALFA-034-2024 de fecha 7 de octubre de 2024, a las Observaciones al plan de Manejo Ambiental remitidas por la interventoría mediante el comunicado T-003-2024-044-OFC de fecha 27 de septiembre de 2024.


ACTIVIDADES SISTEMA SST

Para la presente semana no se tiene ninguna actividad SST.

AVANCE CANTIDADES

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7.1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 19%					\$ 25.770.004,00
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO

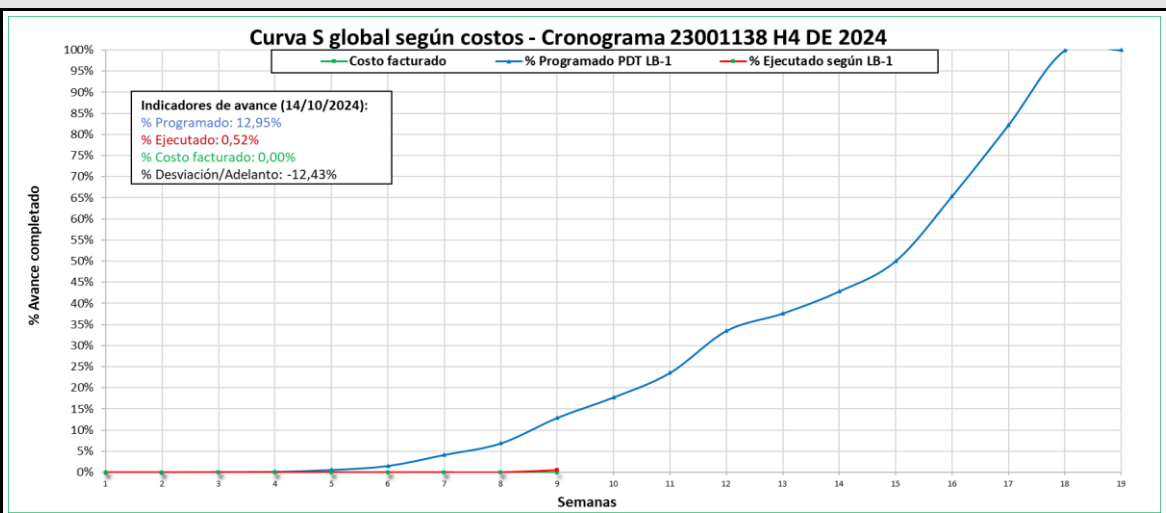


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 523.948.425,00	Valor	\$ 44.775.000,00	Valor	\$ 1.123.682.800,00	Valor	\$ 44.775.000,00
Porcentaje	6,04%	Porcentaje	0,52%	Porcentaje	12,95%	Porcentaje	0,52%


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA SEMANAL



CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA ACUMULADA





PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	3
MANO DE OBRA		

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	1
Excavadora de Orugas	1
Vibrocompactadores	2

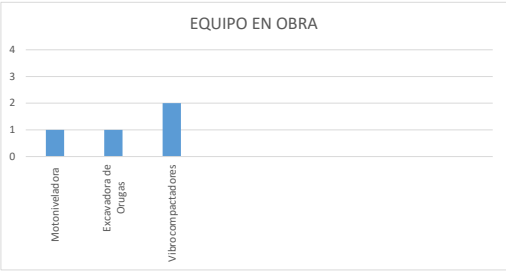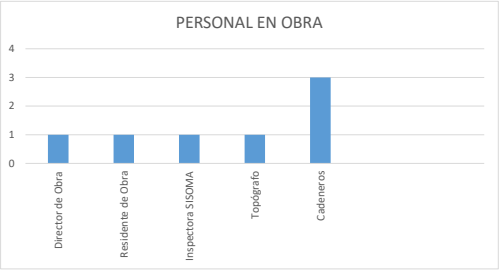

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



SOCIALIZACIÓN SOLICITUD NOTAM POR PARTE DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



SOCIALIZACIÓN SOLICITUD NOTAM POR PARTE DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ENTREGA DE DOTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ENTREGA DE DOTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.





ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.




ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 3 Aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-063-OFC de fecha 15 de octubre de 2024. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños. Es de resaltar que, mediante el comunicado T-003-2024-060-OFC de fecha 10 de septiembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL con copia al CONSORCIO ALFA, la reiteración de la recomendación de impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.	 ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA

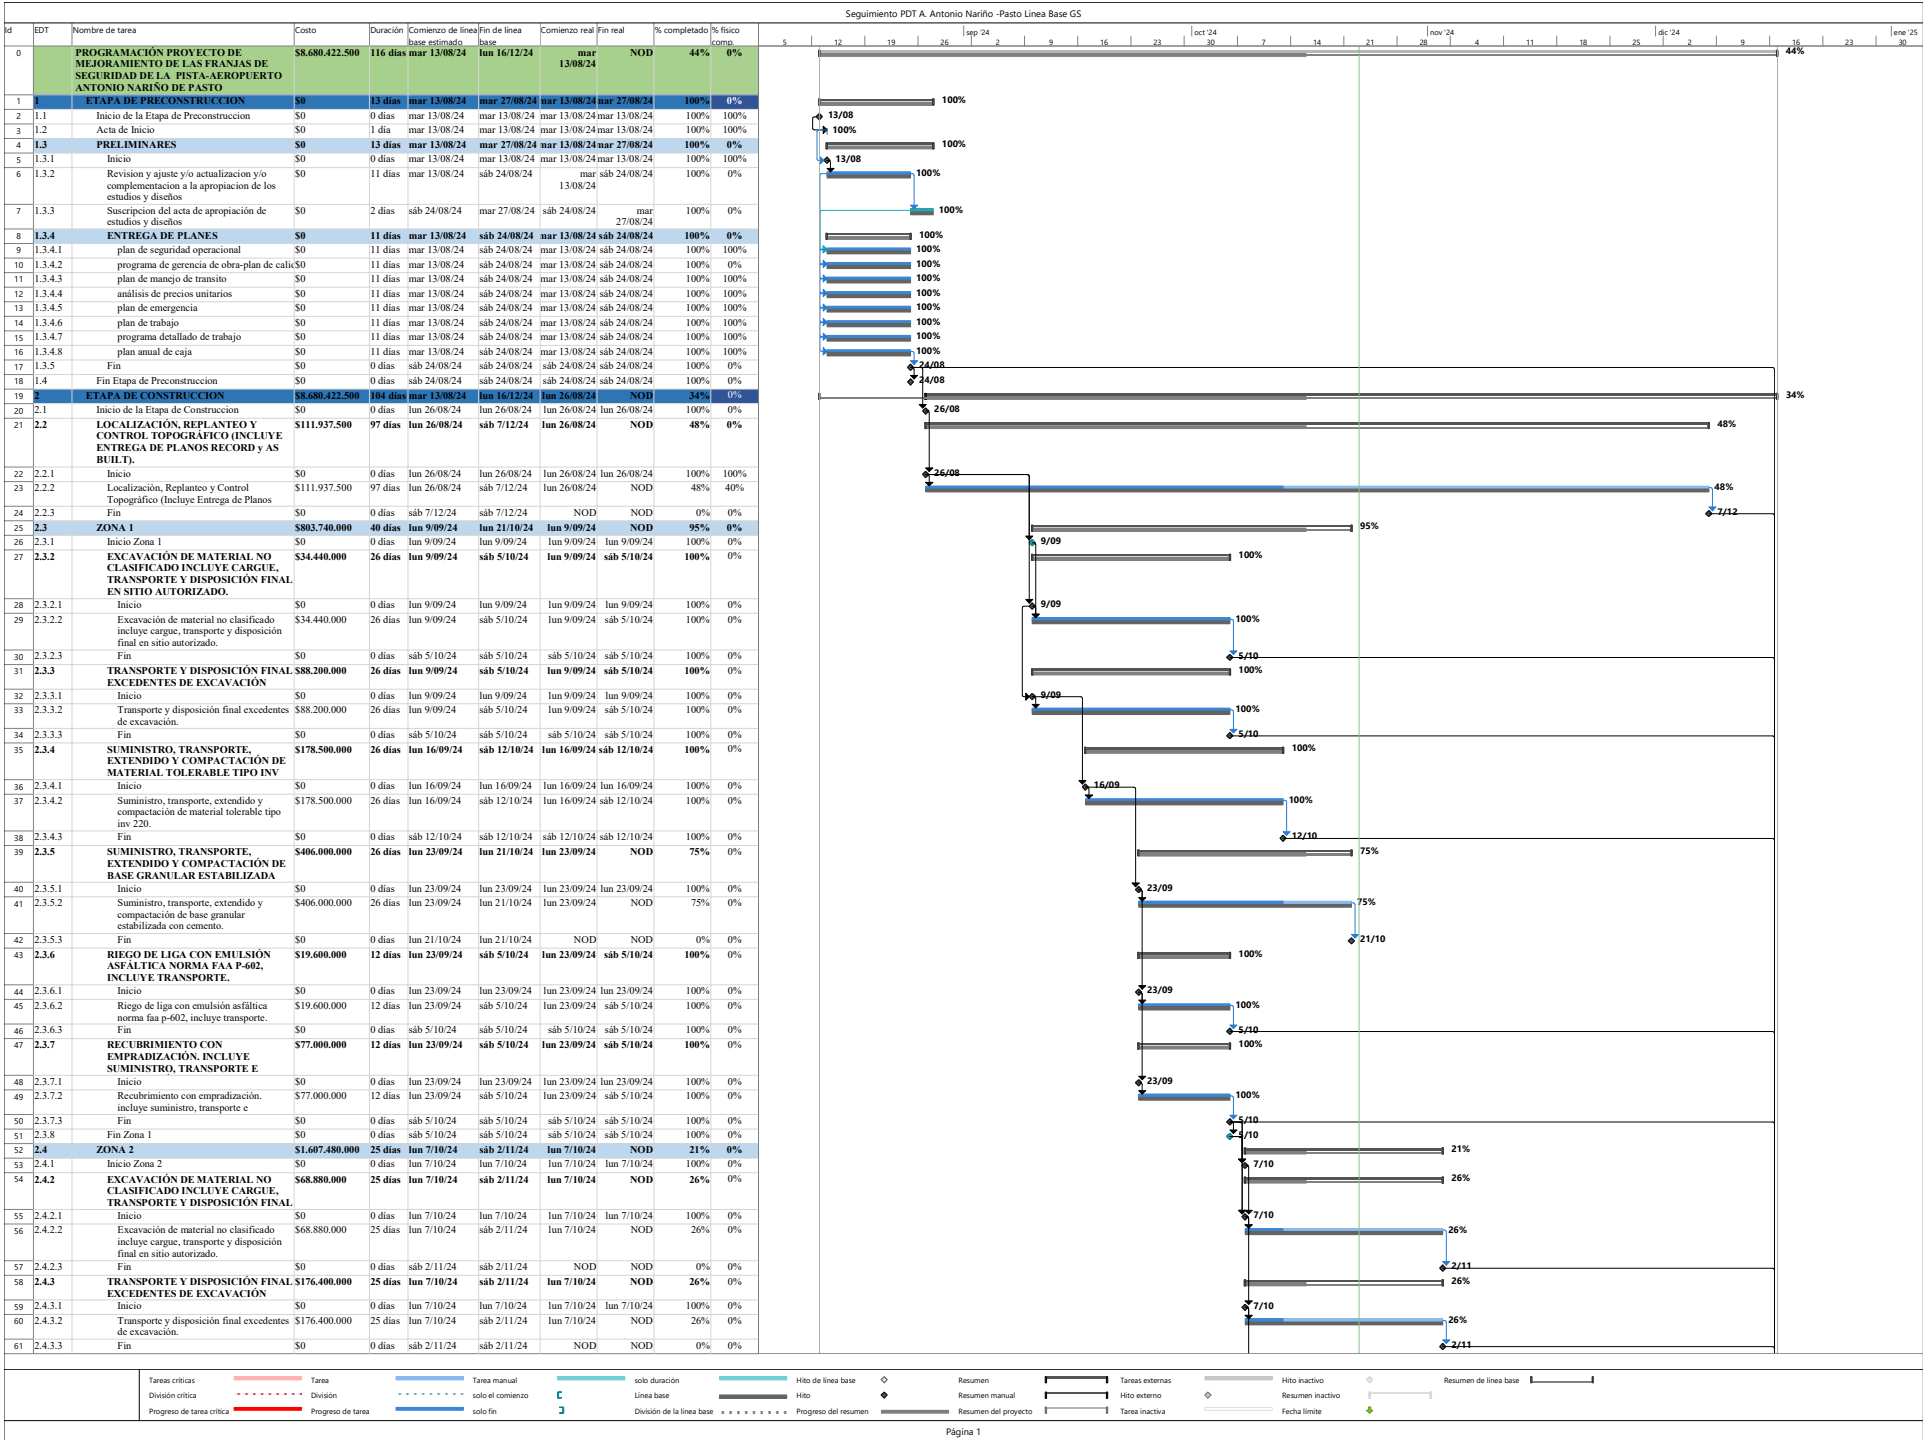

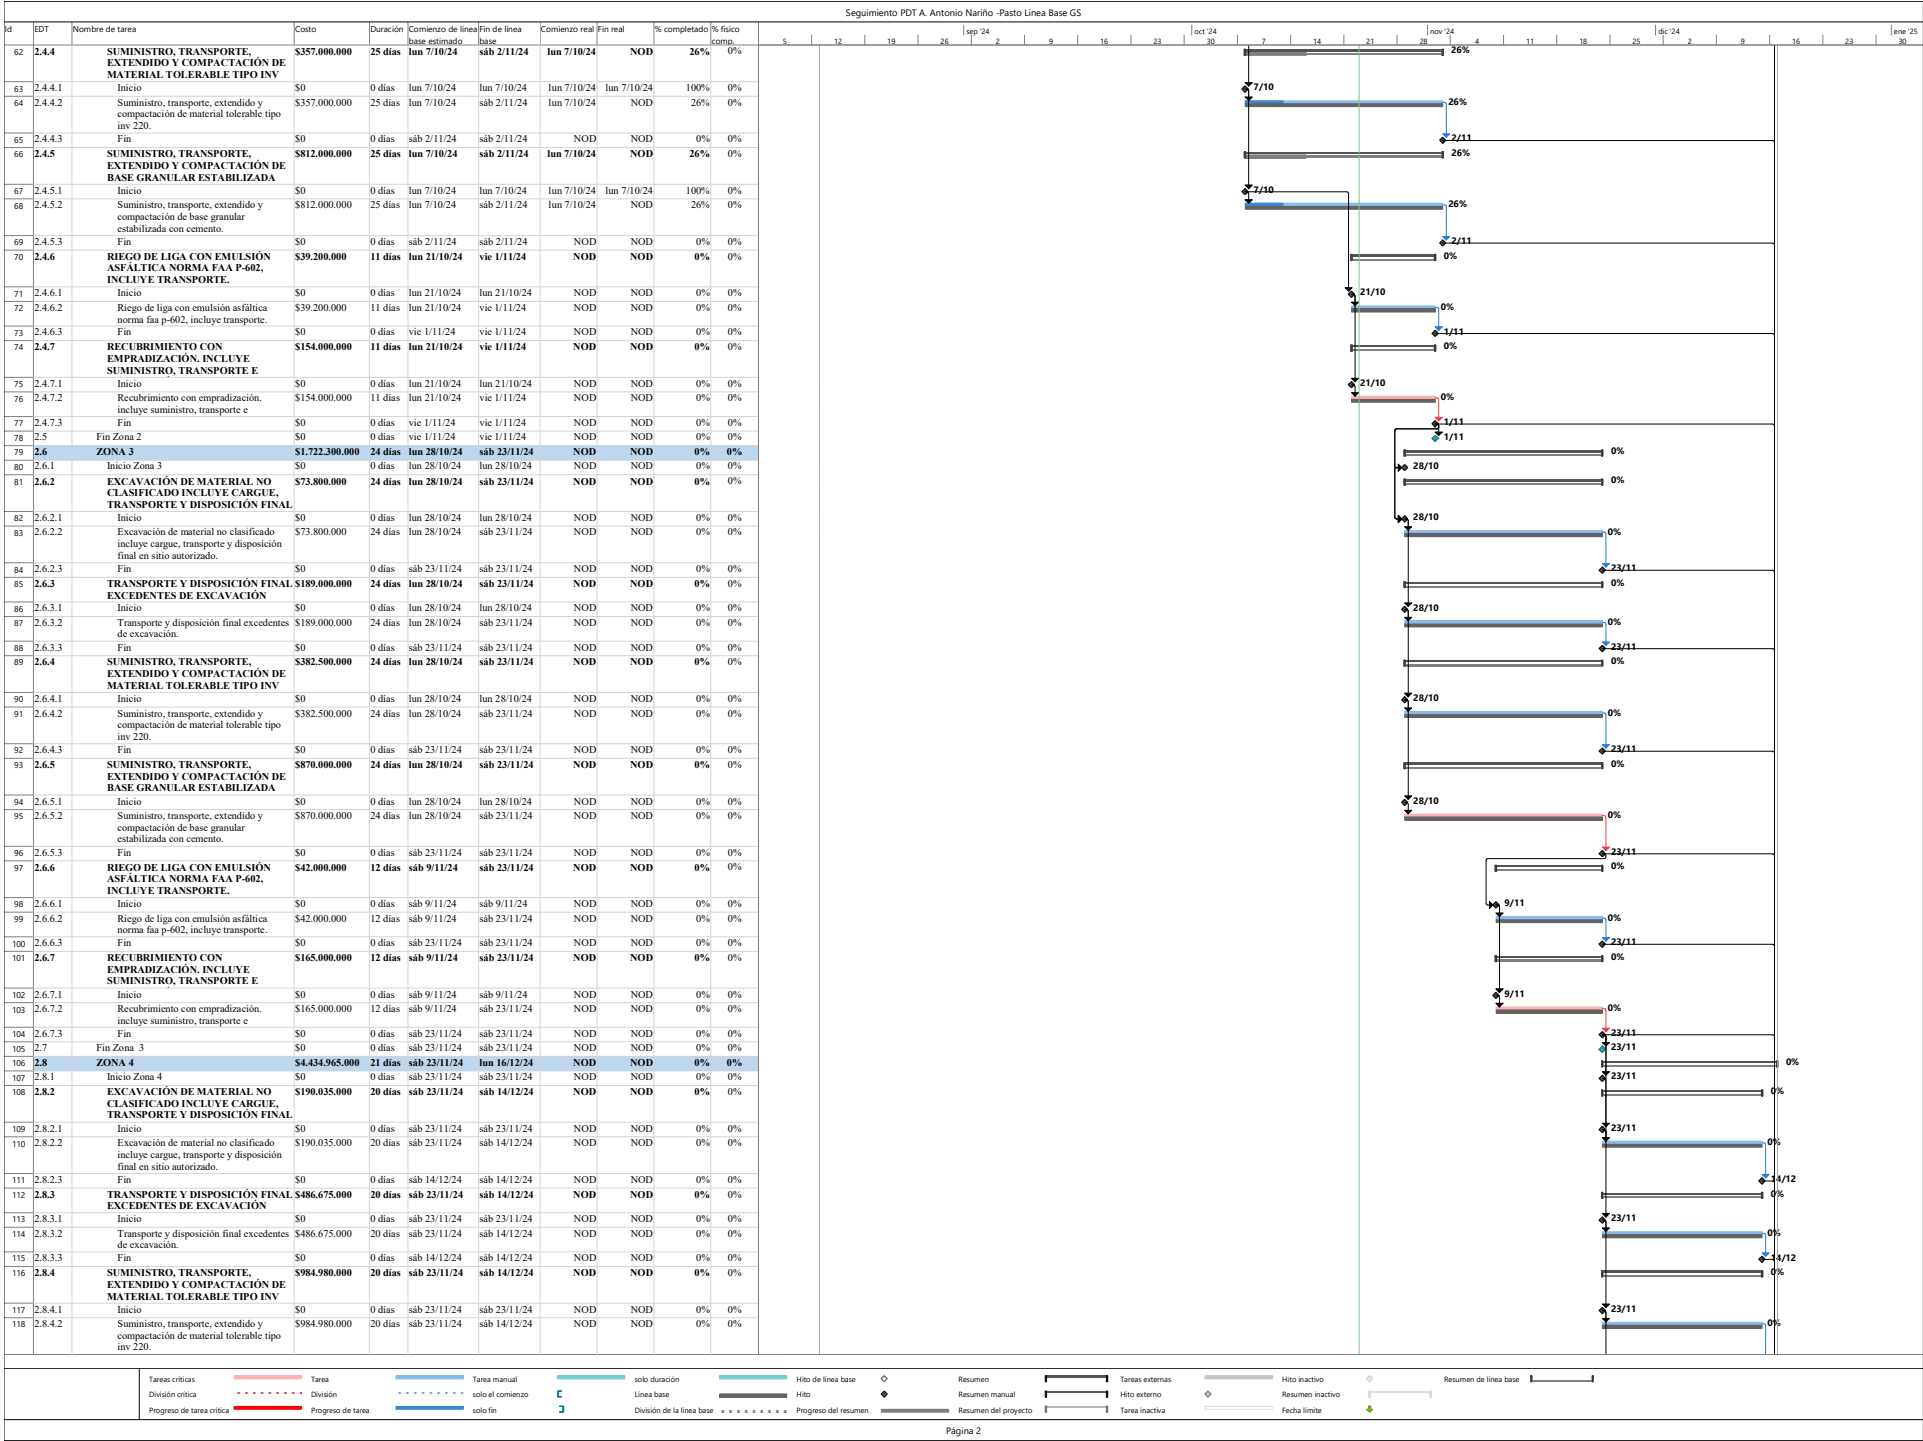

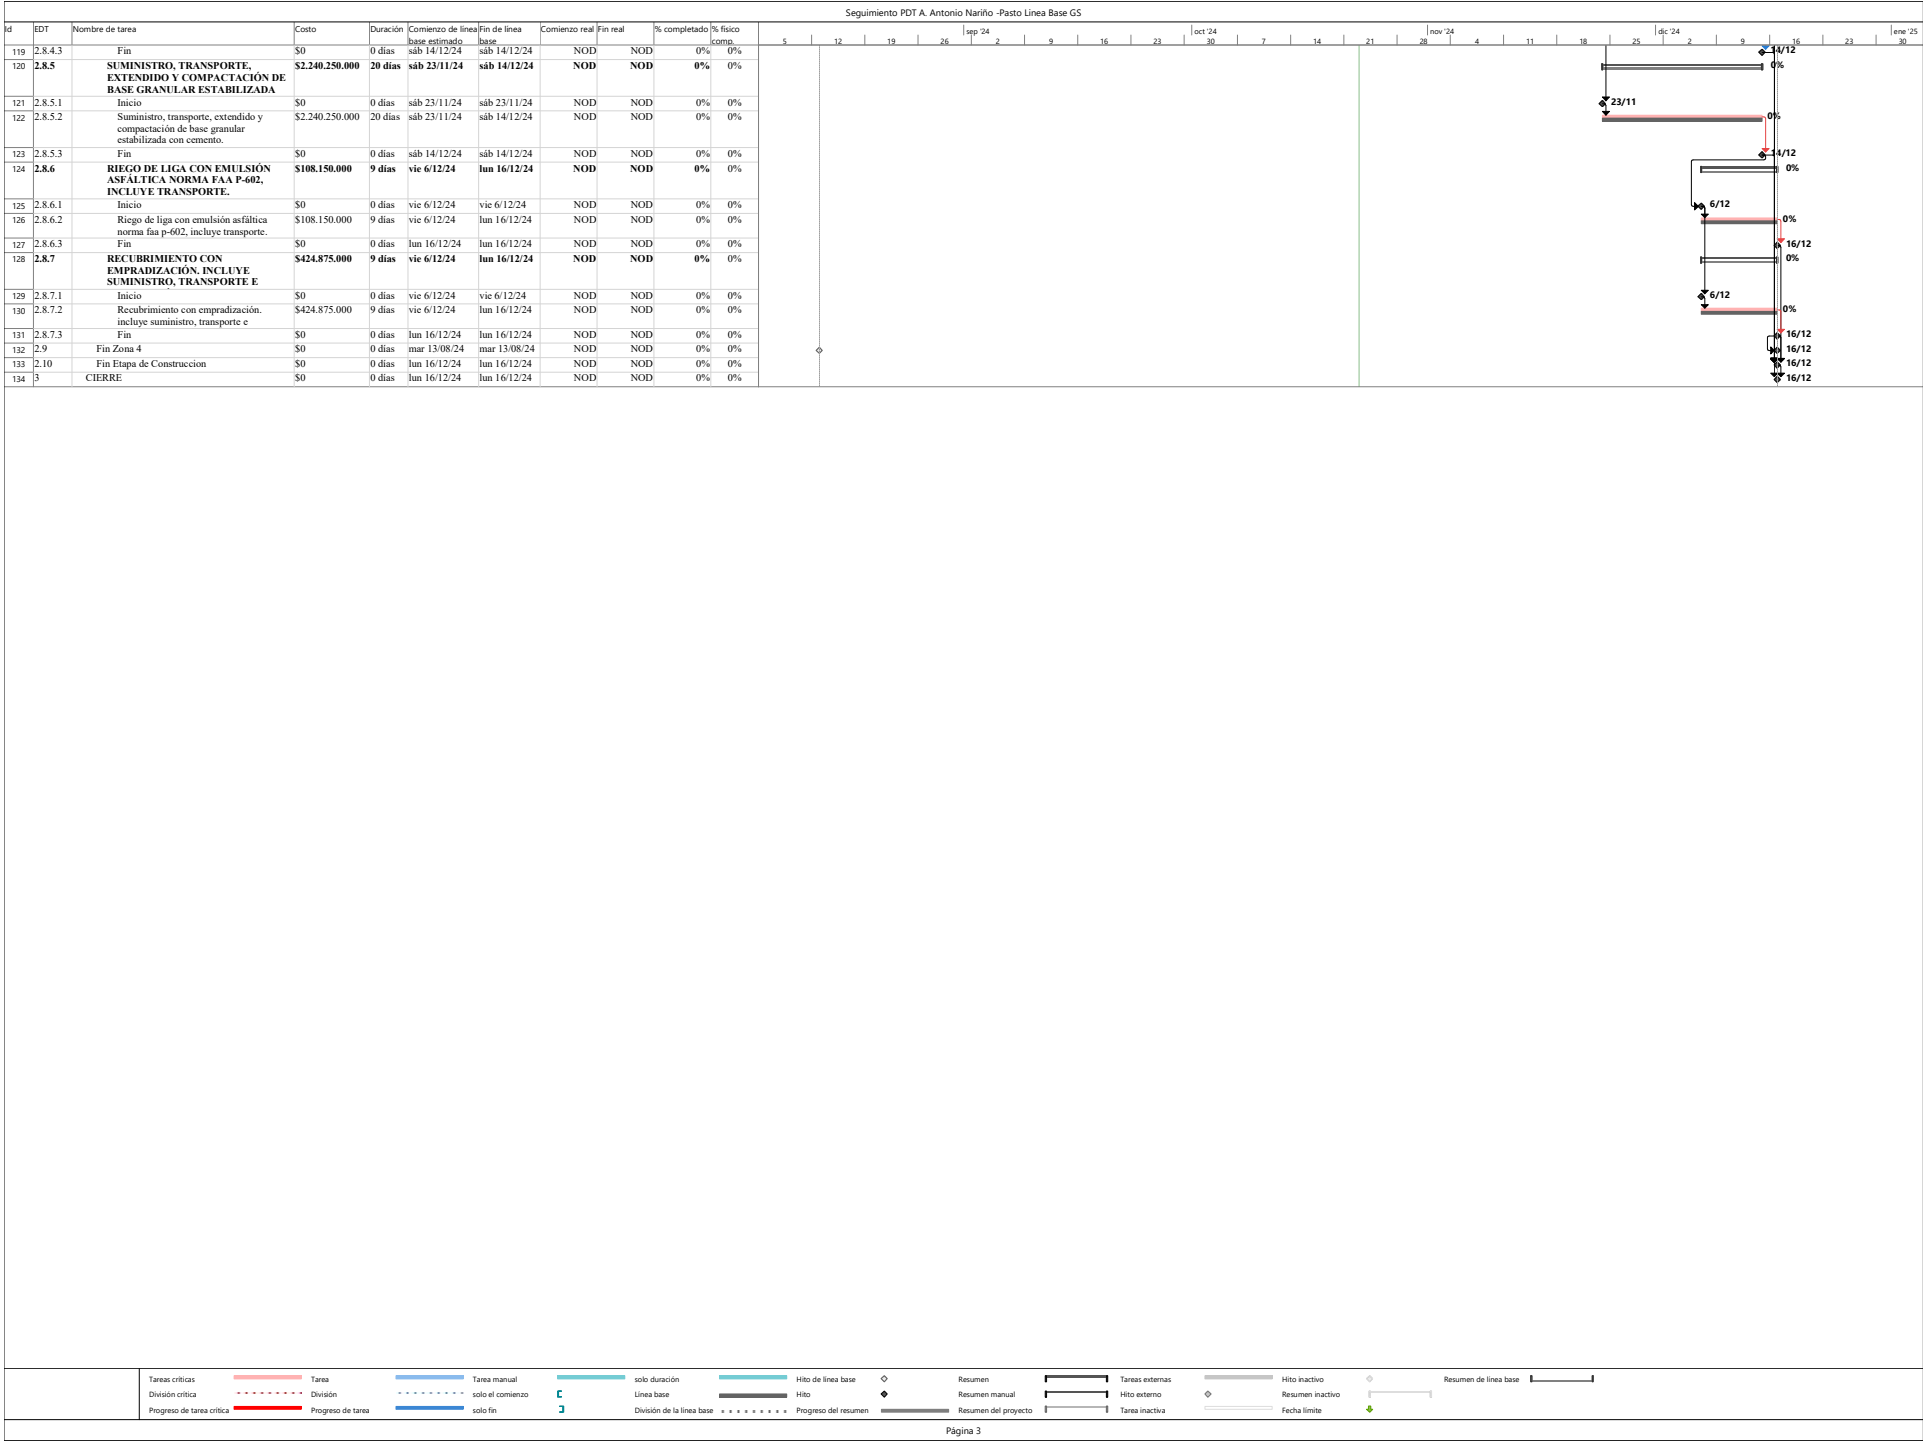

Fecha de corte: 14/10/2024		Indicadores en tiempo - Datos de Project											Indicadores en costo - Datos ponderados				
EDT	Nombre de tarea	Costo	Peso (%)	Duración	Comienzo de línea base	Fin de línea base	Comienzo real	Fin real	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto	Costo Programado	Costo ejecutado	\$ Desviación / Adelanto	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto
0	PROGRAMACIÓN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE LA PISTA-AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	\$ 8.680.422.500	100,00%	116 días	mar 13/08/24	lun 16/12/24	mar 13/08/24	NOD	44,00%	43,75%	-0,25%	\$ 1.123.682.800	\$ 44.775.000	-\$ 1.078.907.800	12,95%	0,52%	-12,43%
1	ETAPA DE PRECONSTRUCCION	\$ 0	0,00%	13 días	mar 13/08/24	mar 27/08/24	mar 13/08/24	mar 27/08/24	100,00%	80,83%	-19,17%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.1	Inicio de la Etapa de Preconstruccion	\$ 0	0,00%	0 días	mar 13/08/24	mar 13/08/24	mar 13/08/24	mar 13/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Acta de Inicio	\$ 0	0,00%	1 día	mar 13/08/24	mar 13/08/24	mar 13/08/24	mar 13/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	PRELIMINARES	\$ 0	0,00%	13 días	mar 13/08/24	mar 27/08/24	mar 13/08/24	mar 27/08/24	100,00%	42,50%	-57,50%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	mar 13/08/24	mar 13/08/24	mar 13/08/24	mar 13/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2	Revisión y ajuste y/o actualización y/o complementación a la apropiación de los estudios y diseños	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños	\$ 0	0,00%	2 días	sáb 24/08/24	mar 27/08/24	sáb 24/08/24	mar 27/08/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4	ENTREGA DE PLANES	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	70,00%	-30,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4.1	plan de seguridad operacional	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4.2	programa de gerencia de obra-plan de calidad	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4.3	plan de manejo de tránsito	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4.4	análisis de precios unitarios	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4.5	plan de emergencia	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4.6	plan de trabajo	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4.7	programa detallado de trabajo	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4.8	plan anual de caja	\$ 0	0,00%	11 días	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	mar 13/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.5	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 24/08/24	sáb 24/08/24	sáb 24/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	Fin Etapa de Preconstruccion	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 24/08/24	sáb 24/08/24	sáb 24/08/24	sáb 24/08/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	\$ 8.680.422.500	100,00%	104 días	mar 13/08/24	lun 16/12/24	lun 26/08/24	NOD	34,00%	6,67%	-27,33%	\$ 1.123.682.800	\$ 44.775.000	-\$ 1.078.907.800	12,95%	0,52%	-12,43%
2.1	Inicio de la Etapa de Construcción	\$ 0	0,00%	0 días	lun 26/08/24	lun 26/08/24	lun 26/08/24	lun 26/08/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	\$ 111.937.500	1,29%	97 días	lun 26/08/24	sáb 7/12/24	lun 26/08/24	NOD	48,00%	40,00%	-8,00%	\$ 53.730.000	\$ 44.775.000	-\$ 8.955.000	48,00%	40,00%	-8,00%
2.2.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 26/08/24	lun 26/08/24	lun 26/08/24	lun 26/08/24	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.2	Localización, Replanteo y Control Topográfico (Incluye Entrega de Planos Record Y AsBuilt)	\$ 111.937.500	1,29%	97 días	lun 26/08/24	sáb 7/12/24	lun 26/08/24	NOD	48,00%	40,00%	-8,00%	\$ 53.730.000	\$ 44.775.000	-\$ 8.955.000	48,00%	40,00%	-8,00%
2.2.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 7/12/24	sáb 7/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	ZONA 1	\$ 803.740.000	9,26%	40 días	lun 9/09/24	lun 21/10/24	lun 9/09/24	NOD	95,00%	0,00%	-95,00%	\$ 702.240.000	\$ 0	-\$ 702.240.000	87,37%	0,00%	-87,37%
2.3.1	Inicio Zona 1	\$ 0	0,00%	0 días	lun 9/09/24	lun 9/09/24	lun 9/09/24	lun 9/09/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	\$ 34.440.000	0,40%	26 días	lun 9/09/24	sáb 5/10/24	lun 9/09/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 34.440.000	\$ 0	-\$ 34.440.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.2.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 9/09/24	lun 9/09/24	lun 9/09/24	lun 9/09/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.2	Excavación de material no clasificado incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado.	\$ 34.440.000	0,40%	26 días	lun 9/09/24	sáb 5/10/24	lun 9/09/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 34.440.000	\$ 0	-\$ 34.440.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.2.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	\$ 88.200.000	1,02%	26 días	lun 9/09/24	sáb 5/10/24	lun 9/09/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 88.200.000	\$ 0	-\$ 88.200.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.3.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 9/09/24	lun 9/09/24	lun 9/09/24	lun 9/09/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3.2	Transporte y disposición final excedentes de excavación.	\$ 88.200.000	1,02%	26 días	lun 9/09/24	sáb 5/10/24	lun 9/09/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 88.200.000	\$ 0	-\$ 88.200.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.3.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	\$ 178.500.000	2,06%	26 días	lun 16/09/24	sáb 12/10/24	lun 16/09/24	sáb 12/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 178.500.000	\$ 0	-\$ 178.500.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.4.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 16/09/24	lun 16/09/24	lun 16/09/24	lun 16/09/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.4.2	Suministro, transporte, extendido y compactación de material tolerable tipo inv 220.	\$ 178.500.000	2,06%	26 días	lun 16/09/24	sáb 12/10/24	lun 16/09/24	sáb 12/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 178.500.000	\$ 0	-\$ 178.500.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.4.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 12/10/24	sáb 12/10/24	sáb 12/10/24	sáb 12/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	\$ 406.000.000	4,68%	26 días	lun 23/09/24	lun 21/10/24	lun 23/09/24	NOD	75,00%	0,00%	-75,00%	\$ 304.500.000	\$ 0	-\$ 304.500.000	75,00%	0,00%	-75,00%
2.3.5.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 23/09/24	lun 23/09/24	lun 23/09/24	lun 23/09/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.5.2	Suministro, transporte, extendido y compactación de base granular estabilizada con cemento.	\$ 406.000.000	4,68%	26 días	lun 23/09/24	lun 21/10/24	lun 23/09/24	NOD	75,00%	0,00%	-75,00%	\$ 304.500.000	\$ 0	-\$ 304.500.000	75,00%	0,00%	-75,00%
2.3.5.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%

Fecha de corte: 14/10/2024		Indicadores en tiempo - Datos de Project											Indicadores en costo - Datos ponderados				
EDT	Nombre de tarea	Costo	Peso (%)	Duración	Comienzo de línea base	Fin de línea base	Comienzo real	Fin real	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto	Costo Programado	Costo ejecutado	\$ Desviación / Adelanto	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto
2.3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	\$ 19.600.000	0,23%	12 días	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 19.600.000	\$ 0	-\$ 19.600.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.6.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 23/09/24	lun 23/09/24	lun 23/09/24	lun 23/09/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.6.2	Riego de liga con emulsión asfáltica norma faa p-602, incluye transporte.	\$ 19.600.000	0,23%	12 días	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 19.600.000	\$ 0	-\$ 19.600.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.6.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	\$ 77.000.000	0,89%	12 días	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 77.000.000	\$ 0	-\$ 77.000.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.7.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 23/09/24	lun 23/09/24	lun 23/09/24	lun 23/09/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.7.2	Recubrimiento con emhradización. incluye suministro, transporte e instalación.	\$ 77.000.000	0,89%	12 días	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 77.000.000	\$ 0	-\$ 77.000.000	100,00%	0,00%	-100,00%
2.3.7.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.8	Fin Zona 1	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4	ZONA 2	\$ 1.607.480.000	18,52%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	21,00%	0,00%	-21,00%	\$ 367.712.800	\$ 0	-\$ 367.712.800	22,88%	0,00%	-22,88%
2.4.1	Inicio Zona 2	\$ 0	0,00%	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	\$ 68.880.000	0,79%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	26,00%	0,00%	-26,00%	\$ 17.908.800	\$ 0	-\$ 17.908.800	26,00%	0,00%	-26,00%
2.4.2.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.2.2	Excavación de material no clasificado incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado.	\$ 68.880.000	0,79%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	26,00%	0,00%	-26,00%	\$ 17.908.800	\$ 0	-\$ 17.908.800	26,00%	0,00%	-26,00%
2.4.2.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 2/11/24	sáb 2/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	\$ 176.400.000	2,03%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	26,00%	0,00%	-26,00%	\$ 45.864.000	\$ 0	-\$ 45.864.000	26,00%	0,00%	-26,00%
2.4.3.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.3.2	Transporte y disposición final excedentes de excavación.	\$ 176.400.000	2,03%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	26,00%	0,00%	-26,00%	\$ 45.864.000	\$ 0	-\$ 45.864.000	26,00%	0,00%	-26,00%
2.4.3.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 2/11/24	sáb 2/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	\$ 357.000.000	4,11%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	26,00%	0,00%	-26,00%	\$ 92.820.000	\$ 0	-\$ 92.820.000	26,00%	0,00%	-26,00%
2.4.4.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.4.2	Suministro, transporte, extendido y compactación de material tolerable tipo inv 220.	\$ 357.000.000	4,11%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	26,00%	0,00%	-26,00%	\$ 92.820.000	\$ 0	-\$ 92.820.000	26,00%	0,00%	-26,00%
2.4.4.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 2/11/24	sáb 2/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	\$ 812.000.000	9,35%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	26,00%	0,00%	-26,00%	\$ 211.120.000	\$ 0	-\$ 211.120.000	26,00%	0,00%	-26,00%
2.4.5.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	lun 7/10/24	100,00%	0,00%	-100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.5.2	Suministro, transporte, extendido y compactación de base granular estabilizada con cemento.	\$ 812.000.000	9,35%	25 días	lun 7/10/24	sáb 2/11/24	lun 7/10/24	NOD	26,00%	0,00%	-26,00%	\$ 211.120.000	\$ 0	-\$ 211.120.000	26,00%	0,00%	-26,00%
2.4.5.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 2/11/24	sáb 2/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	\$ 39.200.000	0,45%	11 días	lun 21/10/24	vie 1/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.6.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.6.2	Riego de liga con emulsión asfáltica norma faa p-602, incluye transporte.	\$ 39.200.000	0,45%	11 días	lun 21/10/24	vie 1/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.6.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	\$ 154.000.000	1,77%	11 días	lun 21/10/24	vie 1/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.7.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.7.2	Recubrimiento con emhradización. incluye suministro, transporte e instalación.	\$ 154.000.000	1,77%	11 días	lun 21/10/24	vie 1/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.7.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.5	Fin Zona 2	\$ 0	0,00%	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6	ZONA 3	\$ 1.722.300.000	19,84%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.1	Inicio Zona 3	\$ 0	0,00%	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	\$ 73.800.000	0,85%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.2.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.2.2	Excavación de material no clasificado incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado.	\$ 73.800.000	0,85%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.2.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%

Fecha de corte: 14/10/2024		Indicadores en tiempo - Datos de Project											Indicadores en costo - Datos ponderados				
EDT	Nombre de tarea	Costo	Peso (%)	Duración	Comienzo de línea base	Fin de línea base	Comienzo real	Fin real	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto	Costo Programado	Costo ejecutado	\$ Desviación / Adelanto	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto
2.6.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	\$ 189.000.000	2,18%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.3.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.3.2	Transporte y disposición final excedentes de excavación.	\$ 189.000.000	2,18%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.3.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	\$ 382.500.000	4,41%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.4.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.4.2	Suministro, transporte, extendido y compactación de material tolerable tipo inv 220.	\$ 382.500.000	4,41%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.4.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	\$ 870.000.000	10,02%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.5.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.5.2	Suministro, transporte, extendido y compactación de base granular estabilizada con cemento.	\$ 870.000.000	10,02%	24 días	lun 28/10/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.5.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	\$ 42.000.000	0,48%	12 días	sáb 9/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.6.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 9/11/24	sáb 9/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.6.2	Riego de liga con emulsión asfáltica norma faa p-602, incluye transporte.	\$ 42.000.000	0,48%	12 días	sáb 9/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.6.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	\$ 165.000.000	1,90%	12 días	sáb 9/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.7.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 9/11/24	sáb 9/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.7.2	Recubrimiento con empradización. incluye suministro, transporte e instalación.	\$ 165.000.000	1,90%	12 días	sáb 9/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.7.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.7	Fin Zona 3	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8	ZONA 4	\$ 4.434.965.000	51,09%	21 días	sáb 23/11/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.1	Inicio Zona 4	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	\$ 190.035.000	2,19%	20 días	sáb 23/11/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.2.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.2.2	Excavación de material no clasificado incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado.	\$ 190.035.000	2,19%	20 días	sáb 23/11/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.2.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 14/12/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	\$ 486.675.000	5,61%	20 días	sáb 23/11/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.3.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.3.2	Transporte y disposición final excedentes de excavación.	\$ 486.675.000	5,61%	20 días	sáb 23/11/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.3.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 14/12/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	\$ 984.980.000	11,35%	20 días	sáb 23/11/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.4.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.4.2	Suministro, transporte, extendido y compactación de material tolerable tipo inv 220.	\$ 984.980.000	11,35%	20 días	sáb 23/11/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.4.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 14/12/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	\$ 2.240.250.000	25,81%	20 días	sáb 23/11/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.5.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.5.2	Suministro, transporte, extendido y compactación de base granular estabilizada con cemento.	\$ 2.240.250.000	25,81%	20 días	sáb 23/11/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.5.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	sáb 14/12/24	sáb 14/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	\$ 108.150.000	1,25%	9 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.6.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	vie 6/12/24	vie 6/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.6.2	Riego de liga con emulsión asfáltica norma faa p-602, incluye transporte.	\$ 108.150.000	1,25%	9 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.6.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%

Fecha de corte: 14/10/2024		Indicadores en tiempo - Datos de Project										Indicadores en costo - Datos ponderados					
EDT	Nombre de tarea	Costo	Peso (%)	Duración	Comienzo de línea base	Fin de línea base	Comienzo real	Fin real	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto	Costo Programado	Costo ejecutado	\$ Desviación / Adelanto	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto
2.8.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	\$ 424.875.000	4,89%	9 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.7.1	Inicio	\$ 0	0,00%	0 días	vie 6/12/24	vie 6/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.7.2	Recubrimiento con empradización. incluye suministro, transporte e instalación.	\$ 424.875.000	4,89%	9 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.8.7.3	Fin	\$ 0	0,00%	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.9	Fin Zona 4	\$ 0	0,00%	0 días	mar 13/08/24	mar 13/08/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2.10	Fin Etapa de Construccion	\$ 0	0,00%	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
3	CIERRE	\$ 0	0,00%	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	NOD	NOD	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%


Cuadro de las principales Macro-actividades teniendo en cuenta sus pesos correspondientes

EDT	Descripción Macro-Actividad	Pesos	Avance Prog. (7/octubre/2024)	Avance Real (7/octubre/2024)	Desviación (7/octubre/2024)	Avance Prog. (14/octubre/2024)	Avance Real (14/octubre/2024)	Desviación (14/octubre/2024)	Ind. Cump. (14/octubre/2024)
1.1	Inicio de la Etapa de Preconstruccion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Acta de Inicio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	Fin Etapa de Preconstruccion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1	Inicio de la Etapa de Construccion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD y AS BUILT).	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,52%	-0,10%	83,33%
2.3	ZONA 1	9,26%	0,00%	0,00%	0,00%	8,09%	0,00%	-8,09%	0,00%
2.4	ZONA 2	18,52%	0,00%	0,00%	0,00%	4,24%	0,00%	-4,24%	0,00%
2.6	ZONA 3	19,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.8	ZONA 4	51,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecución del Contrato		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,95%	0,52%	-12,43%	3,98%


Cuadro de las principales Macro-actividades con sus porcentajes de avance normalizados al 100%

EDT	Descripción Macro-Actividad	Pesos	Avance Prog. (7/octubre/2024)	Avance Real (7/octubre/2024)	Desviación (7/octubre/2024)	Avance Prog. (14/octubre/2024)	Avance Real (14/octubre/2024)	Desviación (14/octubre/2024)	Ind. Cump. (14/octubre/2024)
1.1	Inicio de la Etapa de Preconstruccion	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
1.2	Acta de Inicio	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
1.3	PRELIMINARES	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
1.4	Fin Etapa de Preconstruccion	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.1	Inicio de la Etapa de Construccion	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD y AS BUILT).	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	48,00%	40,00%	-8,00%	83,33%
2.3	ZONA 1	9,26%	0,00%	0,00%	0,00%	87,37%	0,00%	-87,37%	0,00%
2.4	ZONA 2	18,52%	0,00%	0,00%	0,00%	22,88%	0,00%	-22,88%	0,00%
2.6	ZONA 3	19,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.8	ZONA 4	51,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecución del Contrato		100,0%	0,00%	0,00%	0,00%	12,95%	0,52%	-12,43%	3,98%


Curva S global según costos - Cronograma 23001138 H4 DE 2024

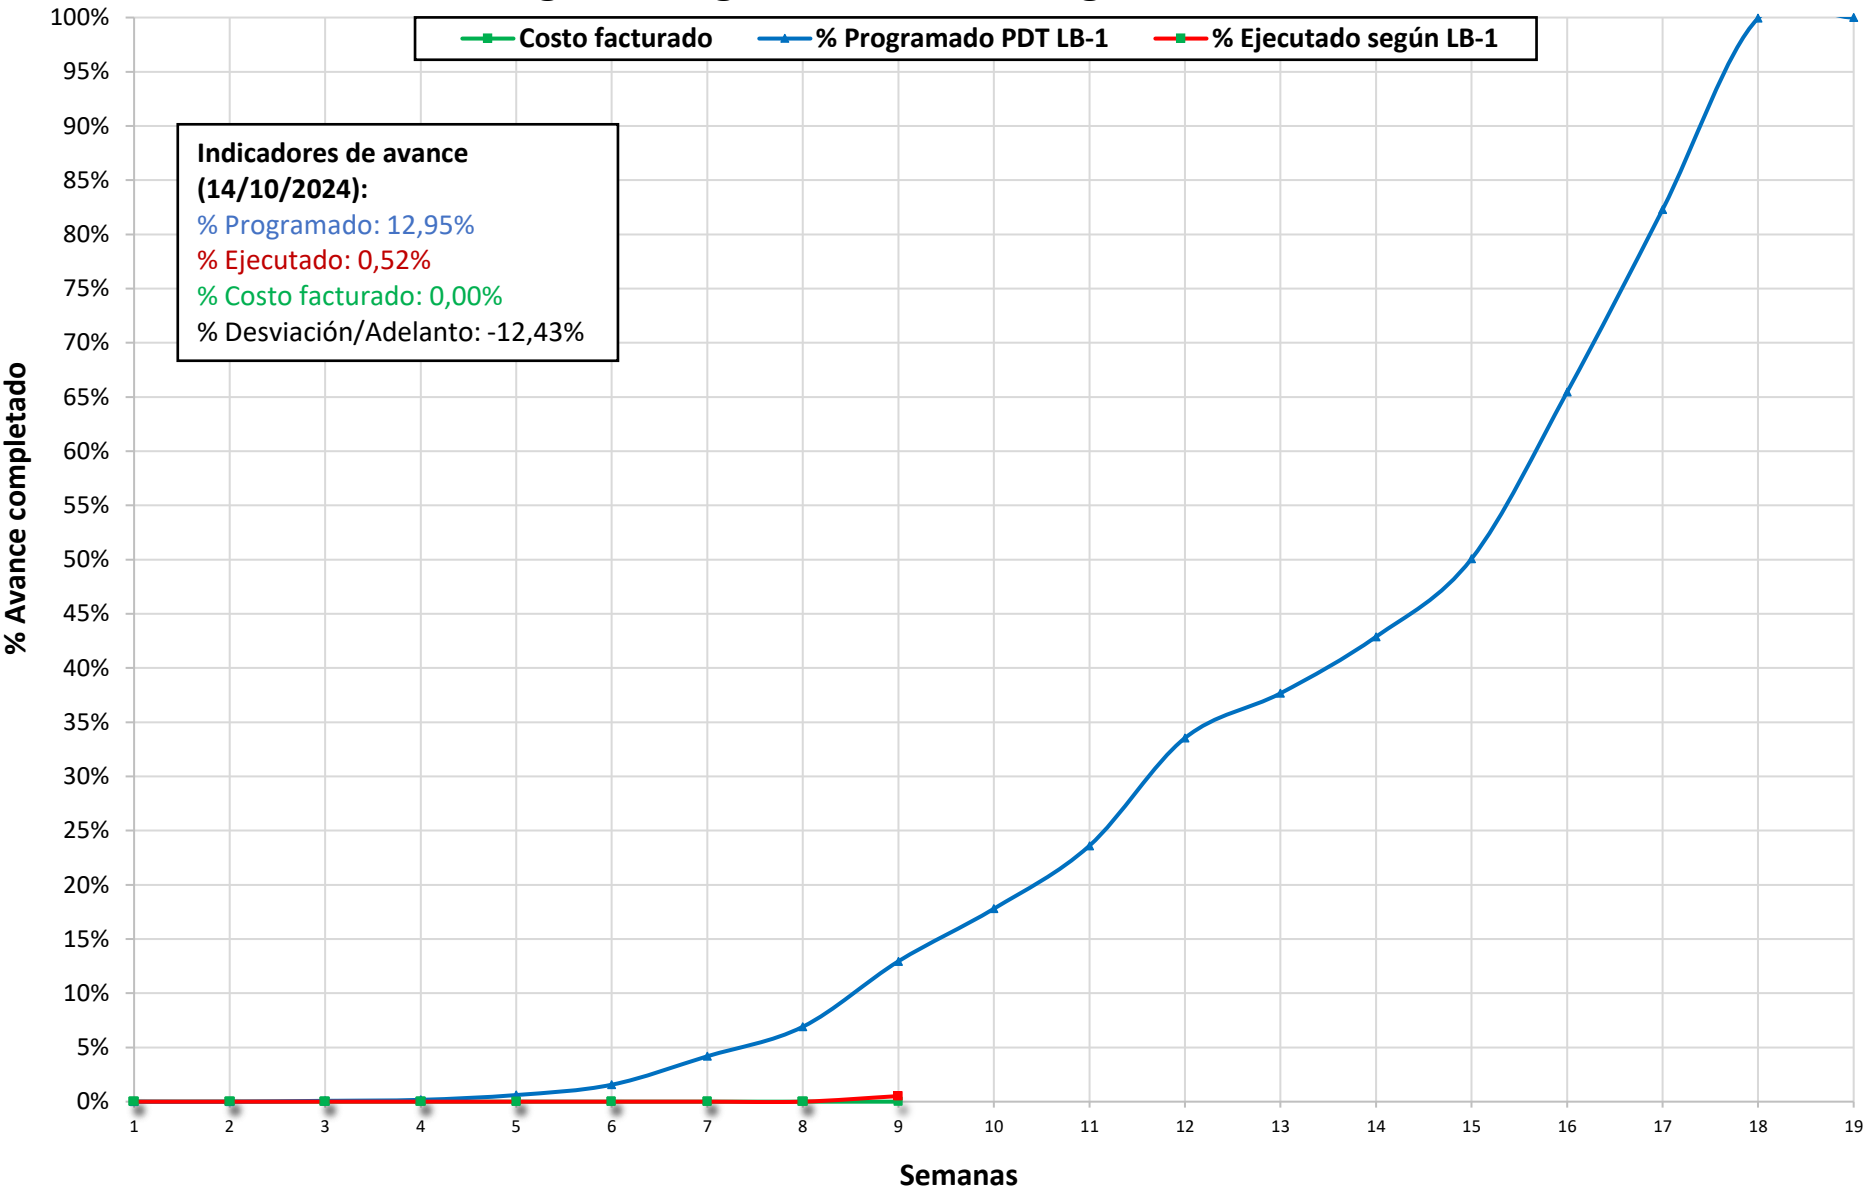


Curva S global según avance físico - Cronograma 23001138 H4 DE 2024

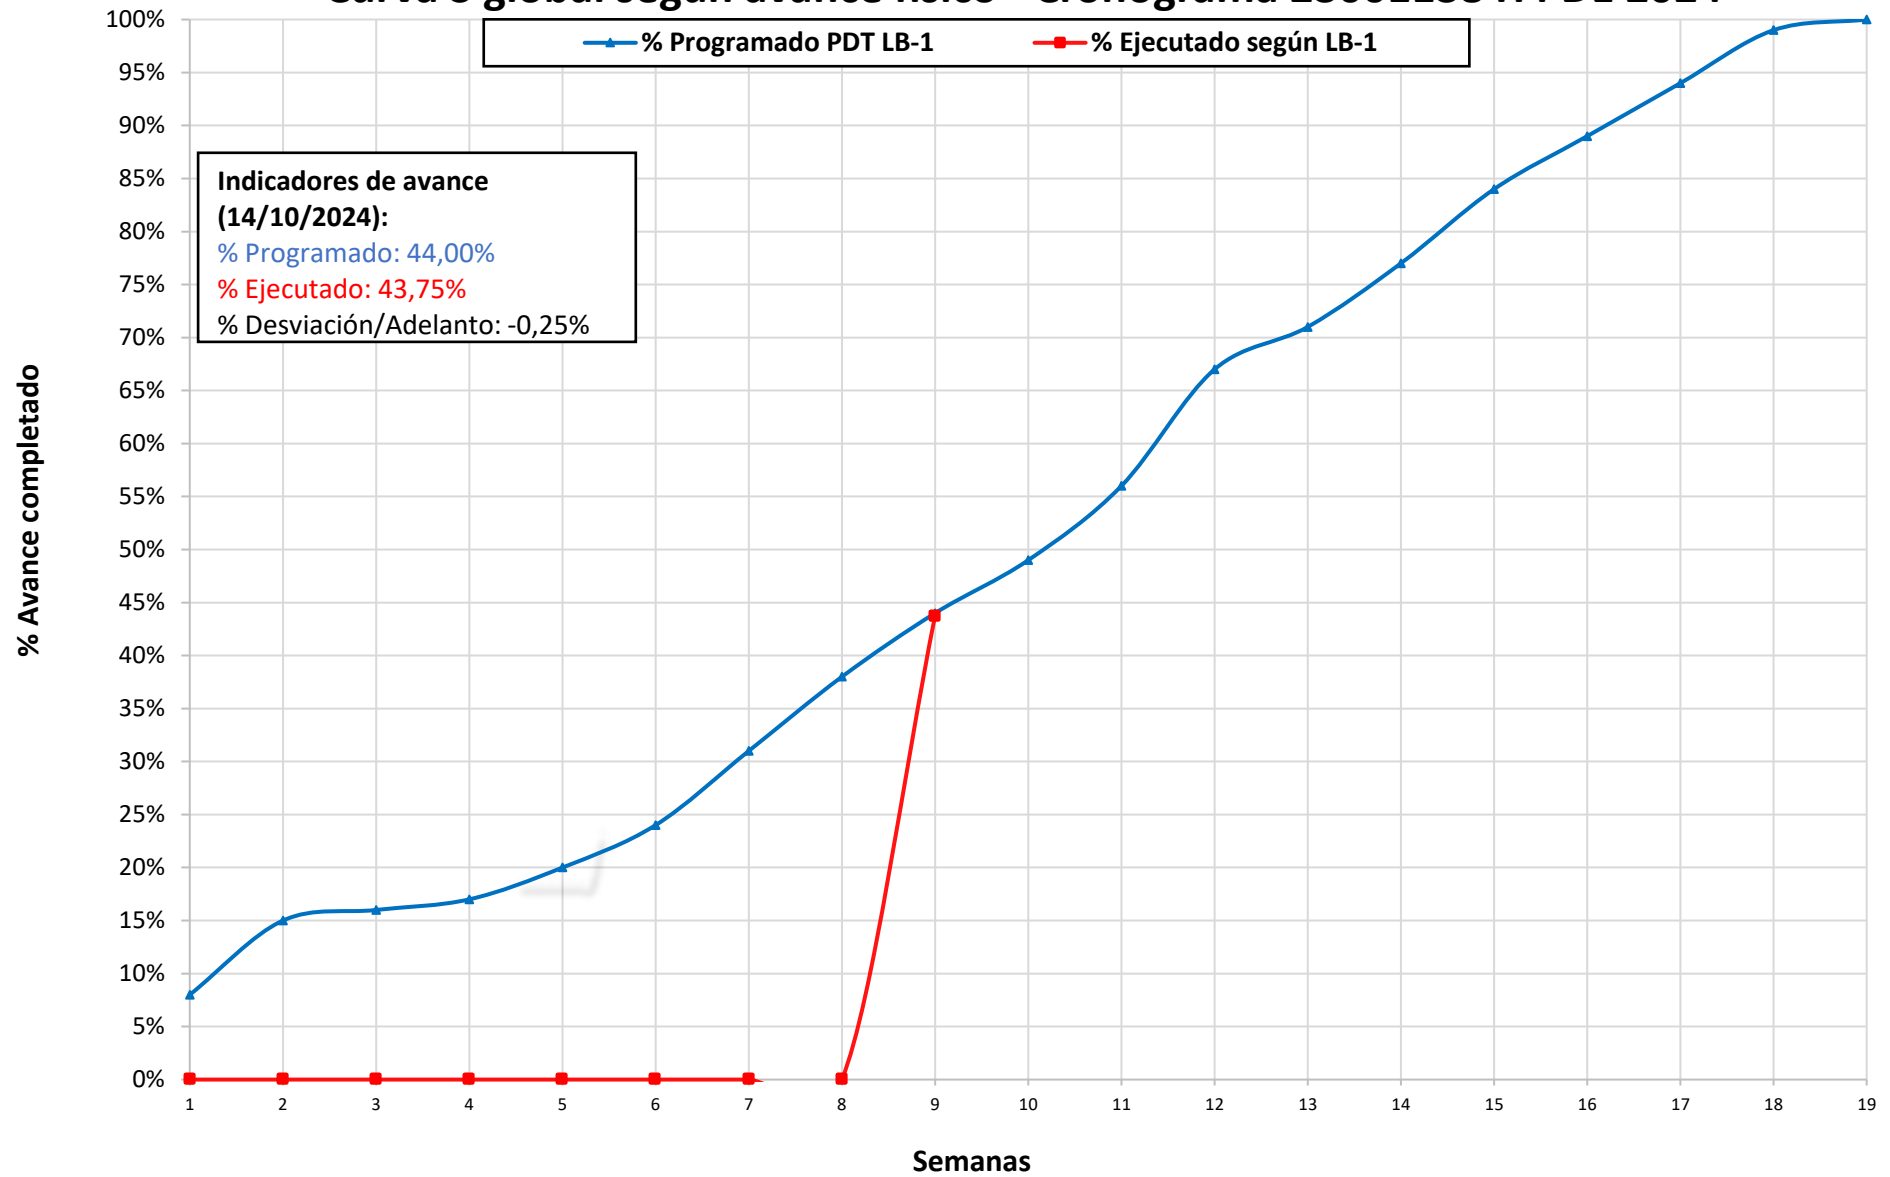

Informe del flujo de caja

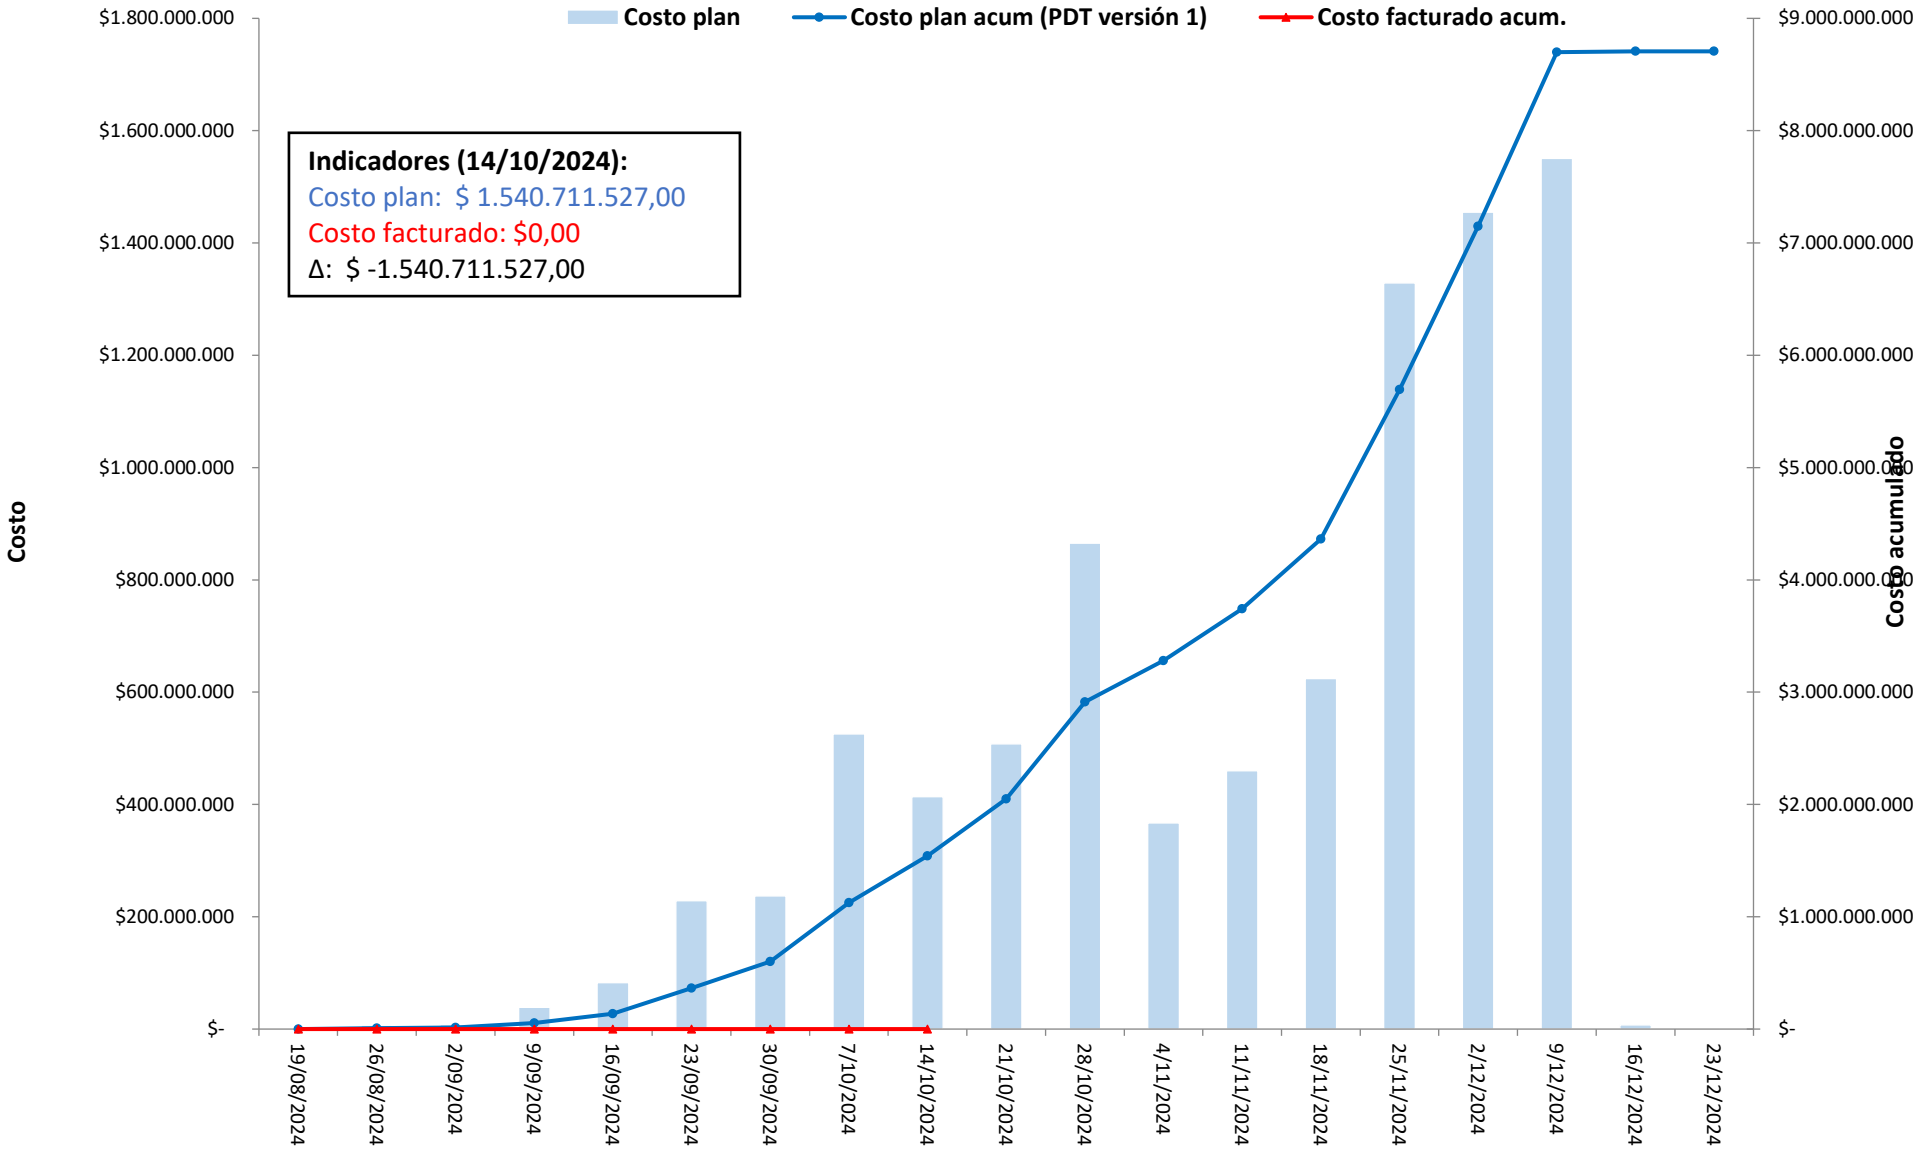

Seguimiento - Metodología Valor ganado

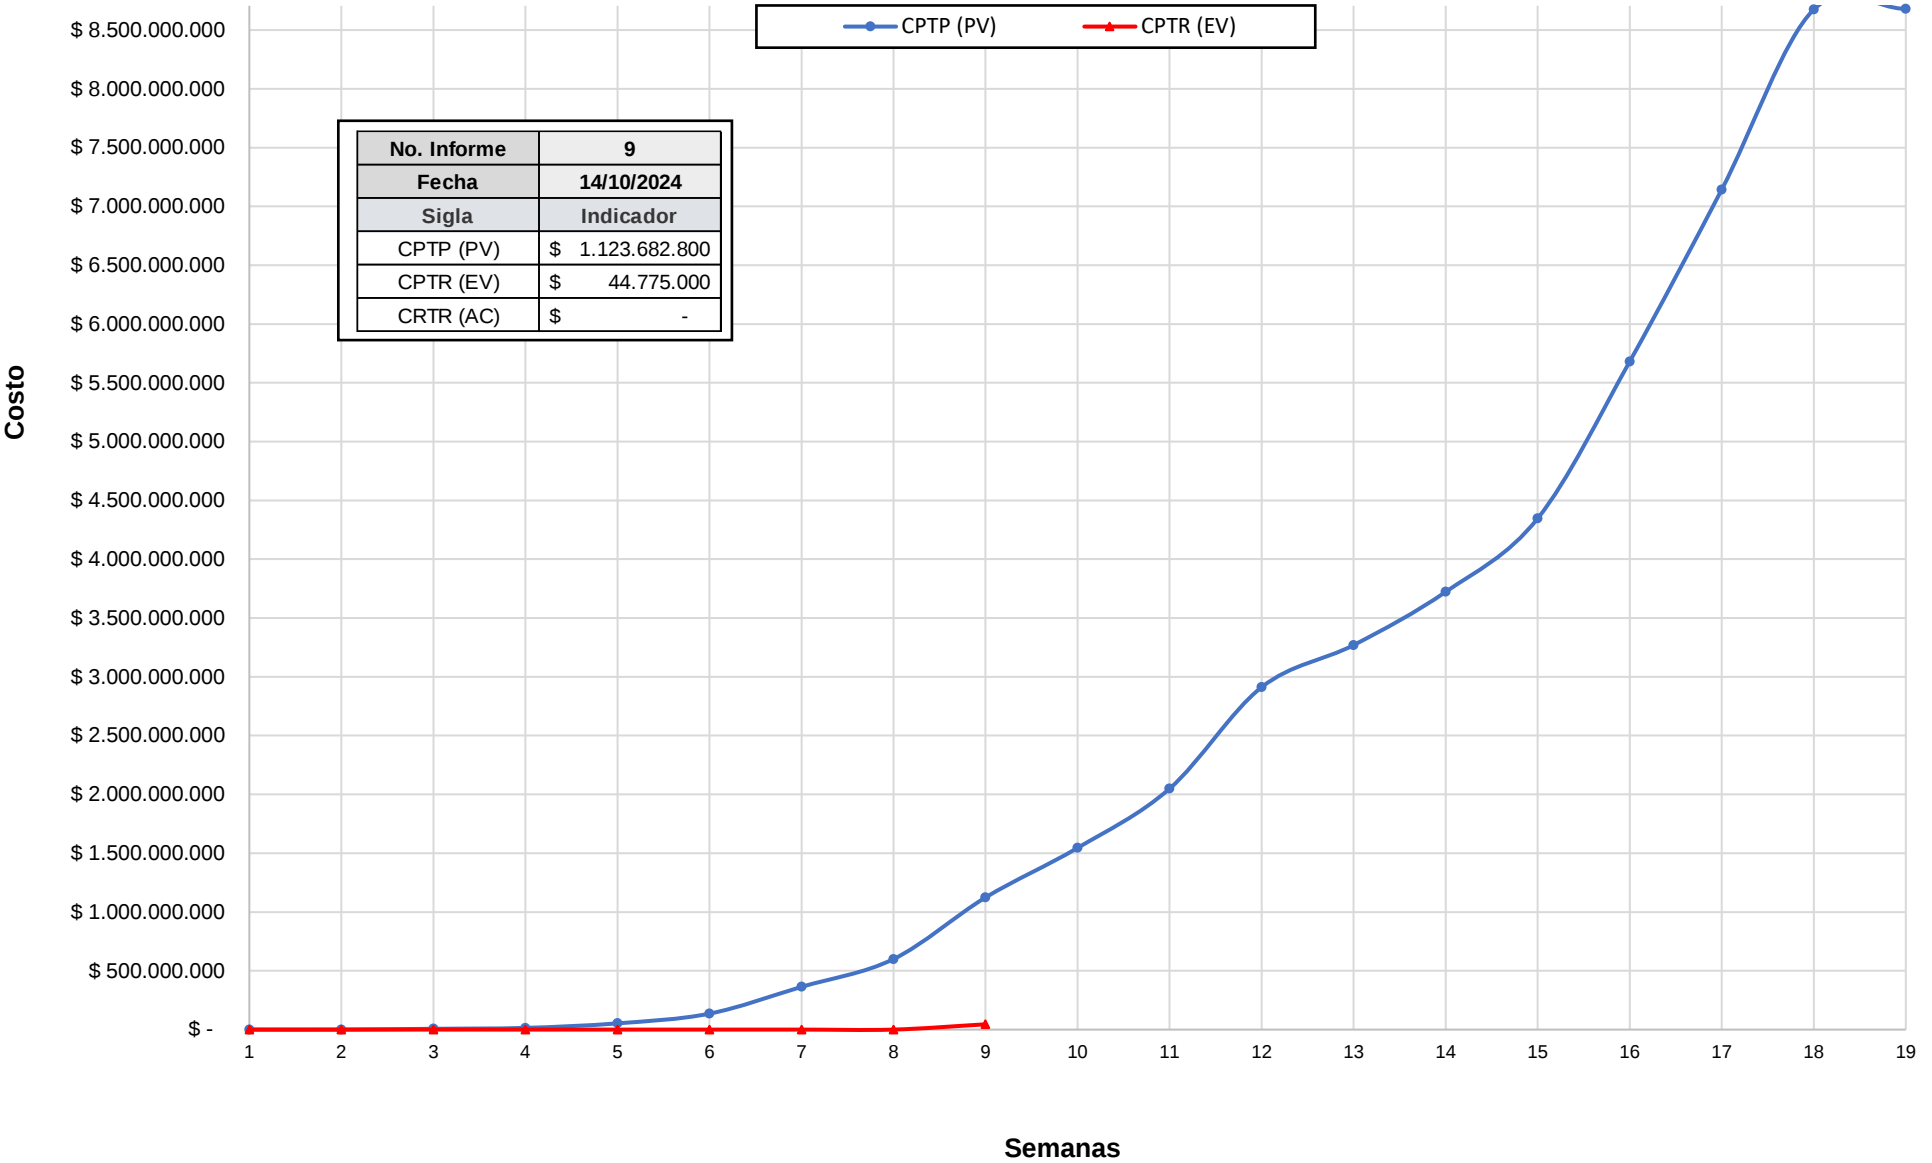

No. Informe	9
Fecha	14/10/2024
Sigla	Indicador
CPTP (PV)	\$ 1.123.682.800
CPTR (EV)	\$ 44.775.000
CRTR (AC)	\$ -



Transporte



AERONÁUTICA CIVIL[®]
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Comité Semanal No. 10

Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024
Aeronáutica Civil de Colombia





Objeto del Proyecto:

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

\$8.706.192.504

Orden del Día

- Verificación de Quórum.
- Seguimiento de los Compromisos comité anterior.
- Seguimiento y avance de la semana No. 9
- Aspectos técnicos y temas por tratar.
- Planes de acción.



Seguimiento de los compromisos.

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Remitir el Programa detallado de Trabajo. (PDT) ajustado.	CONSORCIO ALFA	10/10/2024
2	Revisión del acta de reunión extraordinaria No. 2	CONSORCIO ALFA Entidad Contratante. AEROCIVIL	11/10/2024
3	Remitir a la interventoría los documentos actualizados de la maquinaria en campo.	CONSORCIO ALFA	11/10/2024
4	Remitir el plan de inversión del anticipo ajustado	CONSORCIO ALFA	11/10/2024
5	Revisión de la aprobación de las pólizas actualizadas de acuerdo con el acta de inicio	Entidad Contratante. AEROCIVIL	11/10/2024
6	Remitir el Programa de Gerencia de proyecto	CONSORCIO ALFA	12/10/2024
7	Ajuste al informe – Plan de contingencia	CONSORCIO ALFA	12/10/2024
8	Remitir a la interventoría los documentos contractuales del área SST ajustado.	CONSORCIO ALFA	15/10/2024
9	Firmas del acta de comité técnico No. 6 y 8.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	15/10/2024
10	Firmas del acta de comité técnico No. 6, 7 y 8.	CONSORCIO ALFA	15/10/2024
11	Revisión y visto bueno del informe semanal No. 8 de interventoría.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	15/10/2024
12	Elaboración del acta de comité No. 9.	INGEOCIM S.A.S.	15/10/2024
13	Arte valla.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	Sin fecha establecida.



Datos Generales

CONTRATO DE OBRA No. 23001138 H4 DE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL DEL CONTRATO	
OBJETO CONTRATO OBRA	“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”
CONTRATO DE OBRA No.	23001138 H4 DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA NIT: 901.707.929-0
PLAZO INICIAL CONTRATO DE OBRA	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	Trece (13) Agosto de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE OBRA	Dieciséis (16) de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$8.706.192.504 INCLUYE AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001299 H3 DE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL DEL CONTRATO	
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA	“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	23001299 H3 DE 2024
CONTRATISTA	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. NIT. 800.155.100-6
PLAZO INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
FECHA INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Trece (13) Agosto de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Dieciséis (16) de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$684.322.873 INCLUIDO IVA



CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

Aeropuerto Antonio Nariño – Pasto.

Seguimiento y avance de la semana No. 9

- Mediante el comunicado T-003-2024-056-OFC de fecha 7 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta a los comunicados C-ALFA-023-2024 y C-ALFA-032-2024 - Remisión del Informe preliminar del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-057-OFC de fecha 7 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA las recomendaciones para la entrega y radicación de informes mensuales SST.
- Mediante el comunicado T-003-2024-058-OFC de fecha 8 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la respuesta al comunicado C-ALFA-025-2024 – Observaciones a los documentos contractuales del área SST.
- Mediante el comunicado T-003-2024-059-OFC de fecha 9 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-035-2024 - Remisión de las Hojas de vida aprobadas del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-060-OFC de fecha 10 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL la Reiteración de la recomendación de impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-061-OFC de fecha 10 de octubre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA el Traslado de Correo electrónico de la AEROCIVIL de la Aceptación del Plan de Trabajo (PT).
- Mediante el comunicado T-003-2024-062-OFC de fecha 11 de octubre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-037-2024, Solicitud de definición de áreas y longitudes a intervenir del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.

- **Fecha de inicio:** 13 de agosto de 2024
- **Fecha terminación:** 16 de diciembre de 2024


Control de la Programación Semanal:

PROGRAMADO		
<u>Valor programado</u>	\$ 523.948.425,00	
<u>Porcentaje programado</u>	6,04%	
EJECUTADO		
<u>Valor ejecutado</u>	\$ 44.775.000,00	
<u>Porcentaje ejecutado</u>	0,52%	
BALANCE		
		-\$ 479.173.425,00
		-5,52%

Control de la Programación Acumulada:

PROGRAMADO		
<u>Valor programado</u>	\$ 1.123.682.800,00	
<u>Porcentaje programado</u>	12,95%	
EJECUTADO		
<u>Valor ejecutado</u>	\$ 44.775.000,00	
<u>Porcentaje ejecutado</u>	0,52%	
BALANCE		
		-\$ 1.078.907.800,00
		-12,43%

Seguimiento y avance de la semana No. 9

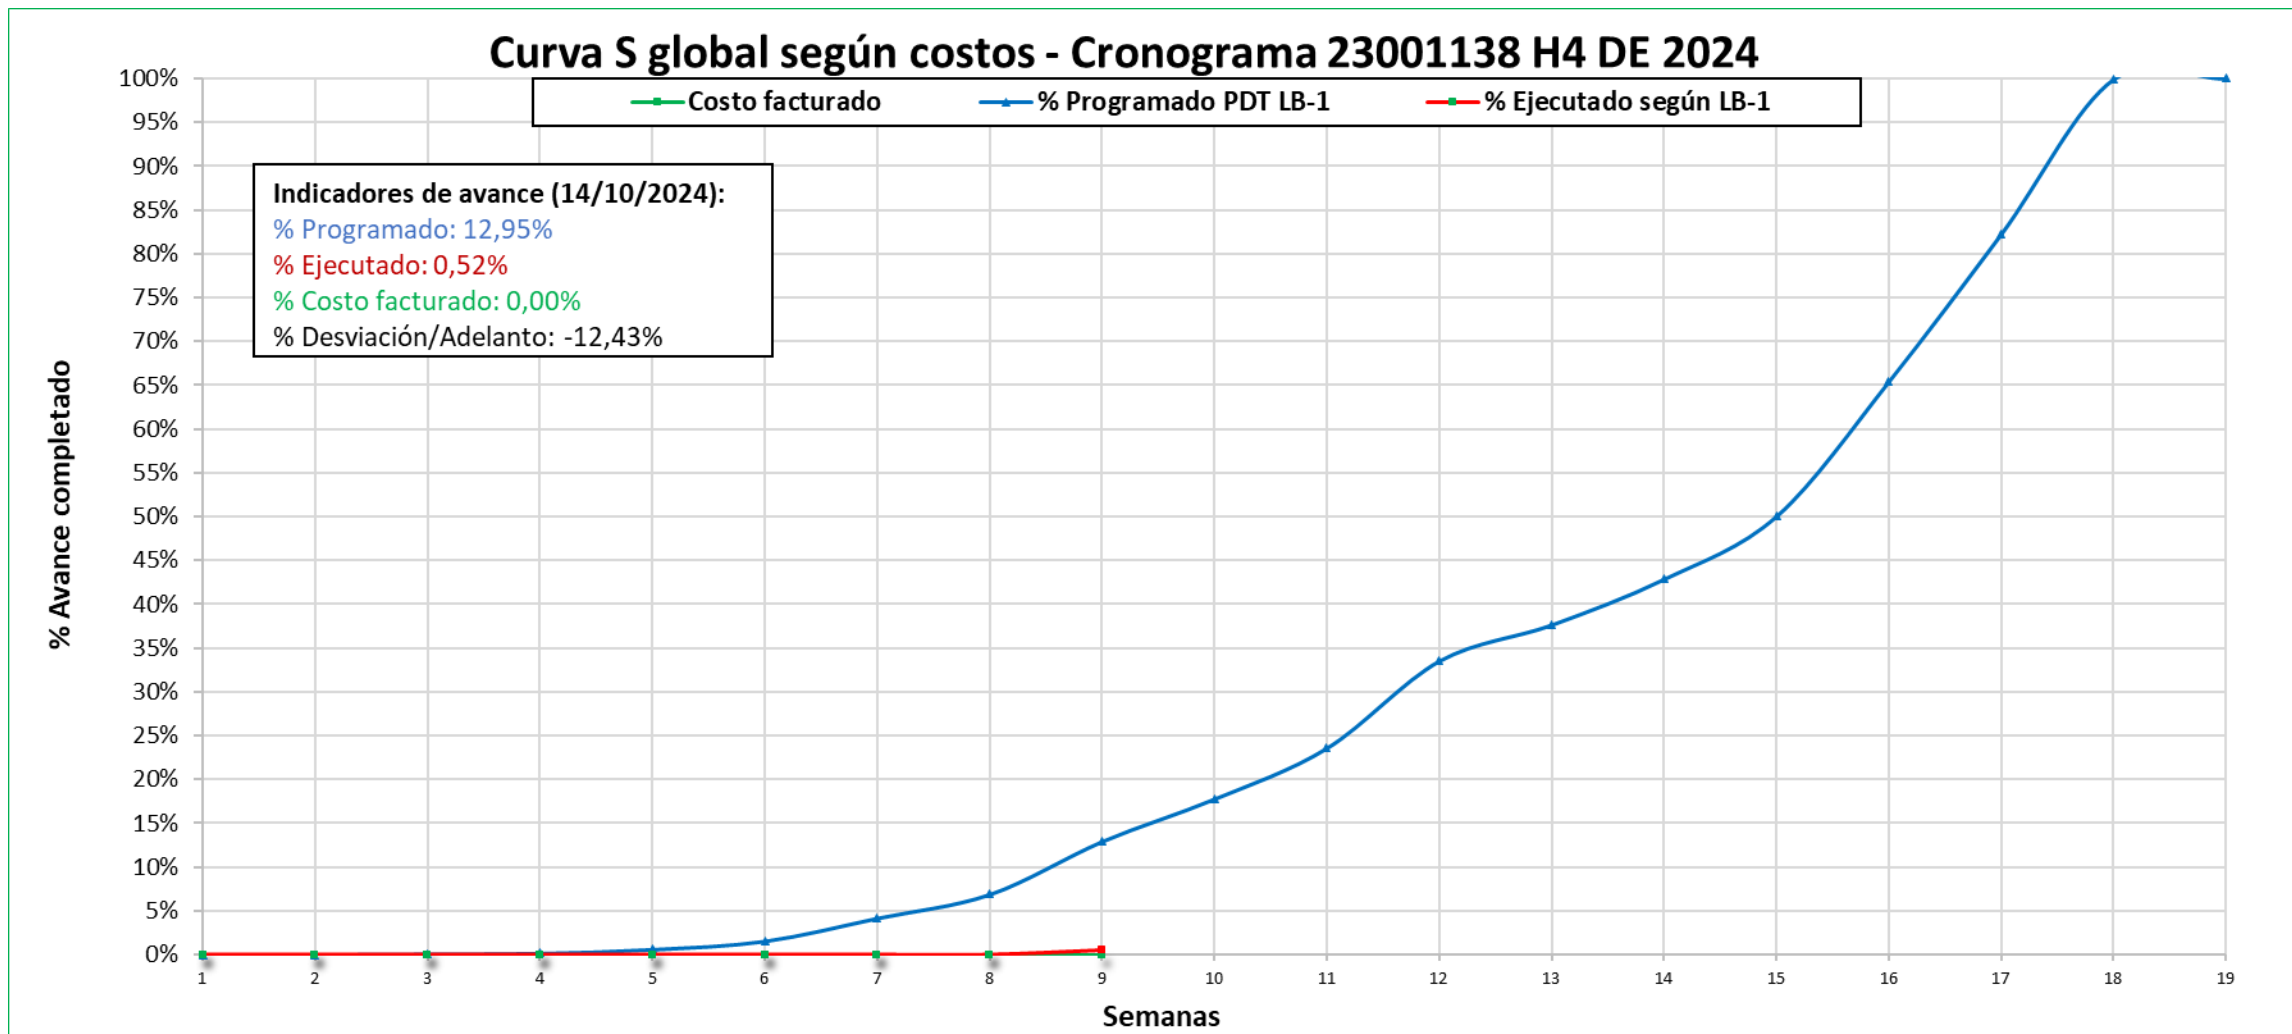


CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

Aeropuerto Antonio Nariño – Pasto.



Seguimiento y avance de la semana No. 9

- Avance en los Estudios y diseños de las franjas de seguridad.

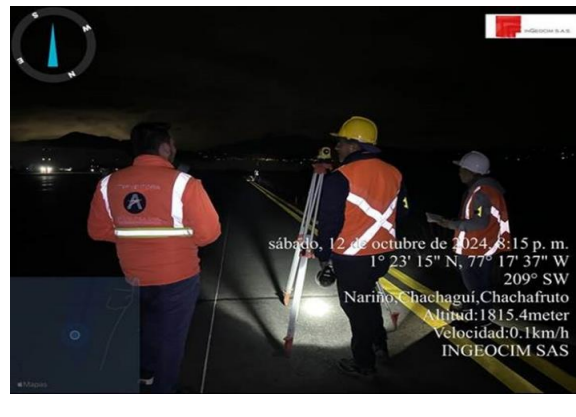

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024


“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

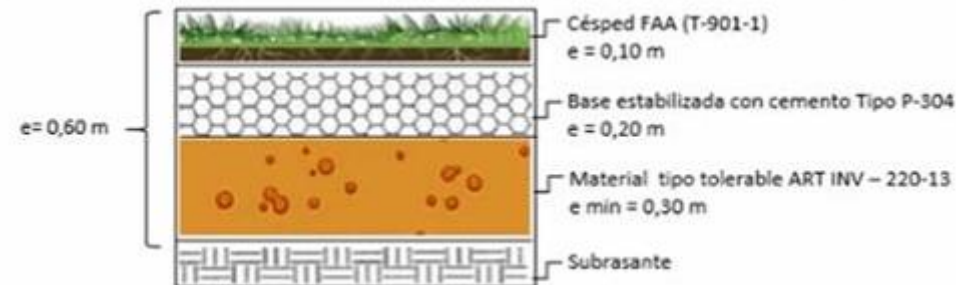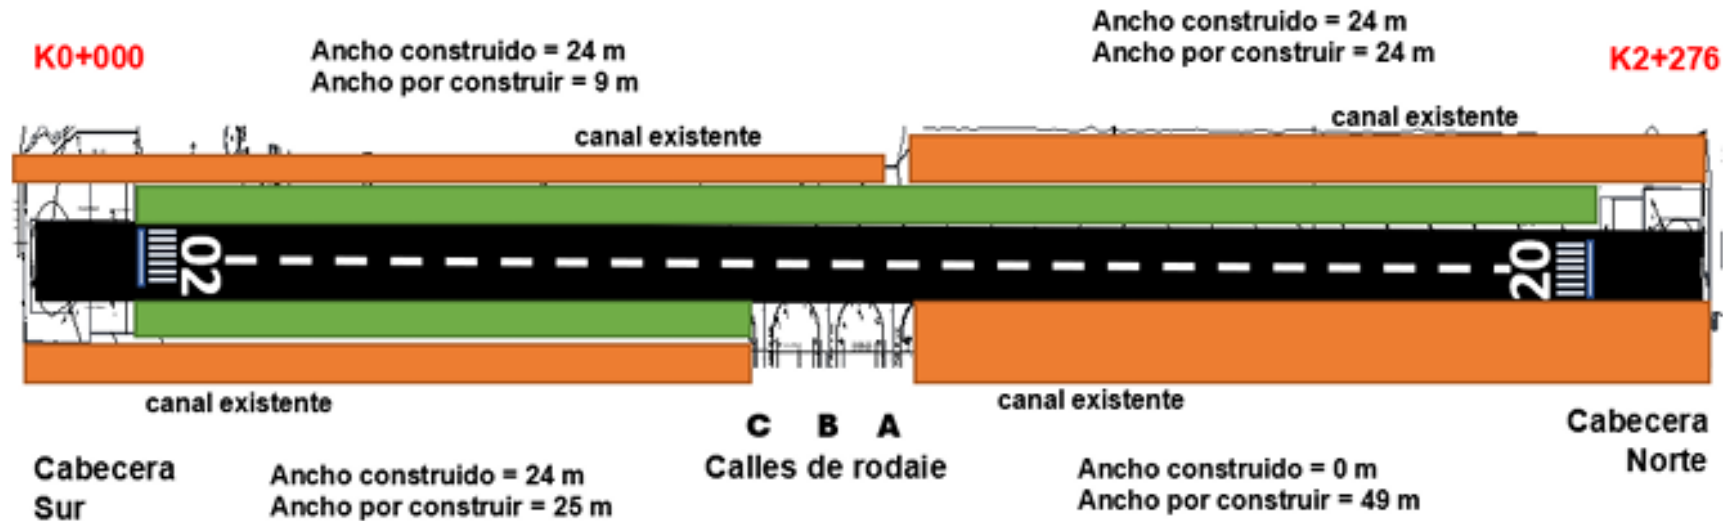

Temas por tratar.

- Solicitud de Definición de áreas y Longitudes a Intervenir, comunicado T-003-2024-062-OFC
- Documentos Faltantes del equipo mínimo requerido.
- Ajuste de las Pólizas Actualizadas de acuerdo con el acta de Inicio del Contrato de Obra.
- Programa detallado de Trabajo (PDT).
- Programa de Gerencia de Proyectos.
- Avance respecto al trámite del anticipo de obra.
- Arte de la valla.
- Revisión del acta del comité de fecha 9 de octubre, remitida por la interventoría el día 15 de octubre, para darle visto bueno y proceder con las firmas.



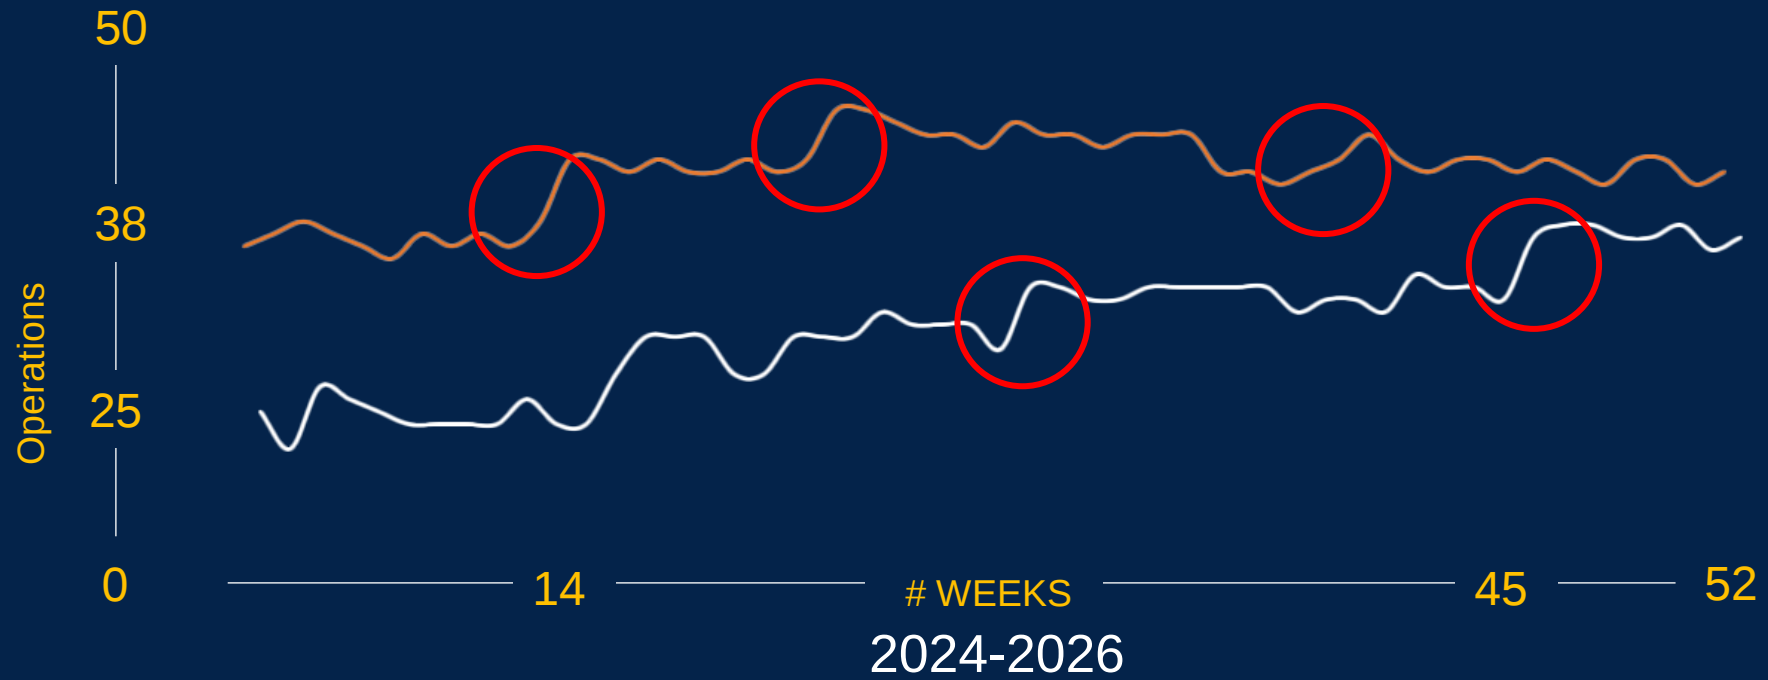

MUCHAS GRACIAS

