

	Contrato 2096 de 2022	 
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

**CONTRATO DE OBRA No. 2096 DE 2022 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA
ATACO -PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”**

**CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023**

**INTERVENTOR
CONSORCIO IC&CB**



INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA No 12

PERIODO: ABRIL DE 2023

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1	Localización	7
2.2	Inventario y estado inicial de la vía	8
2.3	Características técnicas del proyecto	10
2.4	Información General del contrato	14
2.5	Garantías	15
2.6	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	15
2.7	COMPONENTE AMBIENTAL	22
2.8	COMPONENTE SOCIAL:	26
2.9	COMPONENTE SST	29
	INDUCCION Y REINDUCCION.....	30
	CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30
	ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL	30
2.10	ÁREA DE CALIDAD	31
2.11	Relación de correspondencia generada entre contratista e interventor	31
2.11.1	Correspondencia enviada	31
2.11.2	Correspondencia Recibida	32
3	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	34

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

1 INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Departamento de Tolima con su autonomía y su correspondiente autoridad jurisdiccional para la programación y ejecución de proyectos que propendan por el progreso de las regiones y el sostenimiento básico de su población, De acuerdo con las necesidades de inversión en infraestructura con destino a la construcción, mejoramiento y mantenimiento vial y con el fin de atender la creciente demanda en cuanto a la movilización del transporte de carga y de pasajeros y para el desarrollo de las regiones como base de la generación de oportunidades de crecimiento económico y mejora en la calidad de vida para la población, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permita el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad, soberanía y economía.

Por lo anterior, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda los corredores de mayor movilidad, así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuya a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio nacional.

Por tanto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

Con el fin de atender las necesidades de las poblaciones de Ataco y Planadas, la Secretaría de Infraestructura y Hábitat ve la necesidad de “CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO -PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. Las actividades para ejecutar y el alcance del proyecto, está en realizar el mejoramiento de vía ATACO –PLANADAS teniendo un alcance total de 66,19 km con necesidades de intervención de la vía, (50,69 km con condiciones regulares de transitabilidad es decir un 67,9% con necesidades de intervención y atención de puntos críticos; 15,5 Km (20,8%) poseen condiciones malas de transitabilidad, es decir un requerimiento de construcción o reconstrucción completa de la estructura de pavimento, estabilización de taludes y obras hidráulicas). Y extractando de los Estudios y Diseños una Fase 1 de priorización de Mejoramiento de la carretera, de unos sectores del corredor

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

vial, los tramos que por sus condiciones de afectación de la infraestructura vial, condiciones sociales, de generación de empleo, de transitabilidad, de reactivación económica, son más relevantes e importantes para la población usuaria de esta vía y del Departamento; así las cosas, en el presente proyecto se presenta la intervención de las siguientes abscisas, dando un mayor alcance al proyecto inicial presentado a la Oficina de Planeación Departamental, FASE 1: K1+760 al K1+900, K5+800 al K8+700, K15+600 al K16+700, K21+800 al K25+300, K26+400 al K26+500, K27+250 al K27+300, K36+300 al K38+900 para una longitud total de 10,39 km, tomando como K0 el inicio de la vía en la salida del municipio de Planadas.

Por lo anterior, la administración Departamental con el objetivo de impulsar el desarrollo del territorio incluye dentro del Plan de Desarrollo "ELTOLIMA NOS UNE", en el programa "Infraestructura para el Desarrollo", Impactando la meta: CP2MP1 "60 km de infraestructura del transporte a cargo del departamento pavimentada y/o mejorada y/o rehabilitada", el proceso denominado "OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO -PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de SESENTAMIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000.000,00).

El presente proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental "El Tolima Nos Une" en los siguientes aspectos:

2020004730049 desarrollo de la Infraestructura vial que nos une a cargo del Departamento del Tolima.

Estrategia: "Mejoramiento de la Infraestructura y conectividad vial del Tolima

Programa: "Infraestructura para el Desarrollo" Meta de producto: Km de infraestructura del transporte a cargo del departamento pavimentada y/o mejorada y/o rehabilitada.

2021004730062: Mejoramiento de la Vía Ataco –Planadas departamento del Tolima.

LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA mediante la resolución No. 027 del 28 de febrero del 2022, previa licitación pública (obra pública) número LPO-2021 290 apertura mediante resolución No. 001 del 19 de enero del 2022, adjudicó a la firma CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 NIT: 901.571.347-8 derivándose de este proceso el contrato No. 2096 de 2022 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Por otra parte, mediante Resolución No. 2599 del 08 de septiembre del 2021, previo Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-097-2021 adjudicó al CONSOCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5 integrado por ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA con

	Contrato 2096 de 2022		 
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

NIT. 900.521.768-8 con una participación del 50% y CB INGENIEROS S.A.S con NIT. 860.509.943-7 con una participación del 50%, como resultado se derivó el contrato de Interventoría No. 1570 de 2021 cuyo objeto corresponde “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” Las labores de interventoría iniciaron el día 22 de octubre de 2021 de acuerdo con la autorización dada por el INVIAS con la comunicación SVR 59470 de esa fecha.

De acuerdo con el contrato 1570 de 2021 El contrato se amplió al 31 de julio del 2022. Las labores se empezaron a ejecutar desde el mes de mayo para las obras contempladas en Ataco – Planadas.

El presente informe contempla una relación detallada de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos técnicos y financieros presentados en la ejecución de los contratos de obra 2096 de 2022, comprendido entre el **01 de abril y el 30 de abril del 2023**, cubriendo las obligaciones contractuales adquiridas por la firma CONTRATISTA.

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El proyecto corresponde a la ejecución de una obra pública a través del Contrato 2096 de 2022 que tiene por objeto “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, suscrito entre la Gobernación del Departamento de Tolima y la firma Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023.

El proyecto tiene como objetivo fundamental mejorar la infraestructura vial existente para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de la movilidad y la seguridad para los usuarios de la vía. De manera similar, teniendo en cuenta la posible ocurrencia de eventos tales como incidentes, accidentes y emergencias asociadas a la operación del tráfico y a eventos naturales, que pueden afectar notablemente a los usuarios de la vía, se considera necesario ejecutar la atención a éstos ante las eventualidades que puedan presentarse en la carretera, en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial vigente. Así mismo, la prevención y atención de posibles emergencias, en conjunto con la implementación de mejoras en cuanto a los elementos de señalización y de Seguridad Vial existentes, se encuentran encaminadas a garantizar la comodidad, la seguridad, la operación y la debida atención a los usuarios de la infraestructura de la carretera, disponiendo oportunamente del personal suficiente e idóneo, capacidad logística y operativa para atender de inmediato cualquier eventualidad que se presente en el corredor, garantizando la transitabilidad en el mismo, con base en lo pactado entre las partes. En el alcance general del Contrato de Obra 2096 de 2022 se establece como obras prioritarias las siguientes intervenciones (fuente: anexo técnico 1 del proceso licitatorio):

“Las actividades para ejecutar están en realizar el mejoramiento de vía ATACO – PLANADAS, mediante la intervención prioritaria de las siguientes abscisas, FASE 1 sectores priorizados inicialmente: K1+760 al K1+900, K5+800 al K8+700, K15+600 al K16+700, K21+800 al K25+300, K26+400 al K26+500, K27+250 al K27+300, K36+300 al K38+900, tomando como K0 el inicio de la vía en la salida del municipio de Planadas”.

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

2.1 Localización

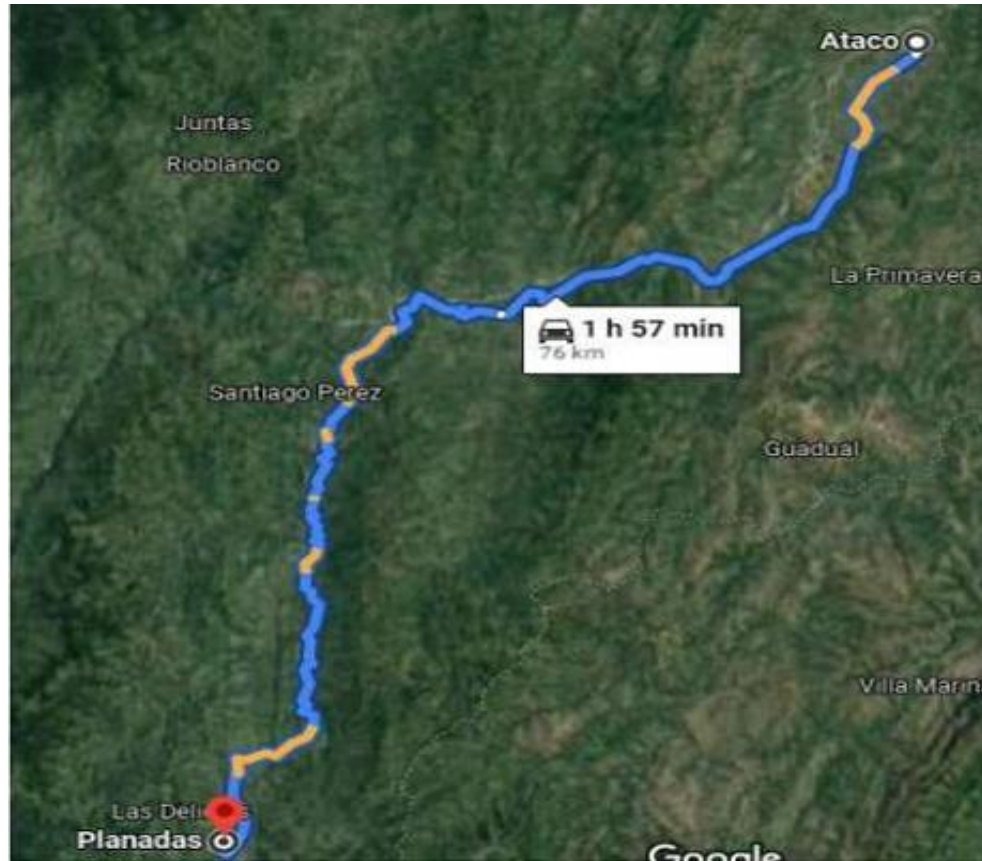



Esta carretera conecta a la capital del Tolima, Ibagué, con los municipios de Ataco y Planadas siendo esta su única vía de acceso, lo cual hace de este corredor de gran importancia. Igualmente esta carretera hace parte del Anillo vial Sur del Tolima, y su intervención implica mejores condiciones de transitabilidad de los usuarios de la vía en contextos de confort, menores costos de operación, generación de empleo, regiones más competitivas, dinamización de la economía, valorización de predios, y muy importante, el transporte de productos agrícolas y de conectividad con otras regiones; como también la construcción de un territorio uniforme y de igualdad de oportunidades con el acceso adecuado a la infraestructura vial.

 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Contrato 2096 de 2022		 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  El Tolima nos une
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

2.2 Inventario y estado inicial de la vía.

La vía de tercer orden que comunica los municipios de Ataco y Planadas al sur del departamento del Tolima, posee una longitud aproximada de 74,6 Km de los cuales 8,41Km poseen condiciones buenas de transitabilidad (11,3%); 50,69 km condiciones regulares de transitabilidad es decir un 67,9% con necesidades de intervención y atención de puntos críticos, los 15,5 Km (20,8%) restantes, poseen condiciones malas de transitabilidad, es decir un requerimiento de construcción o reconstrucción completa de la estructura de pavimento, estabilización de taludes y obras hidráulicas. Existen sectores que no han sido intervenidos y se encuentran en material de afirmado, en condiciones de transitabilidad bastante inadecuadas, susceptibles a los factores climáticos y a la afectación y erosión del Río Atá; igualmente existe tramos que requieren la construcción de muros de confinamiento que estabilicen la banca de la carretera.

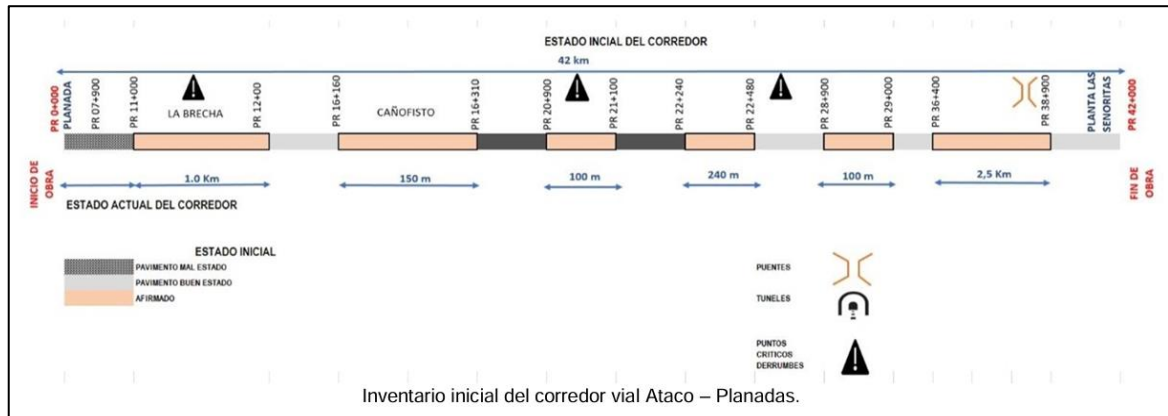

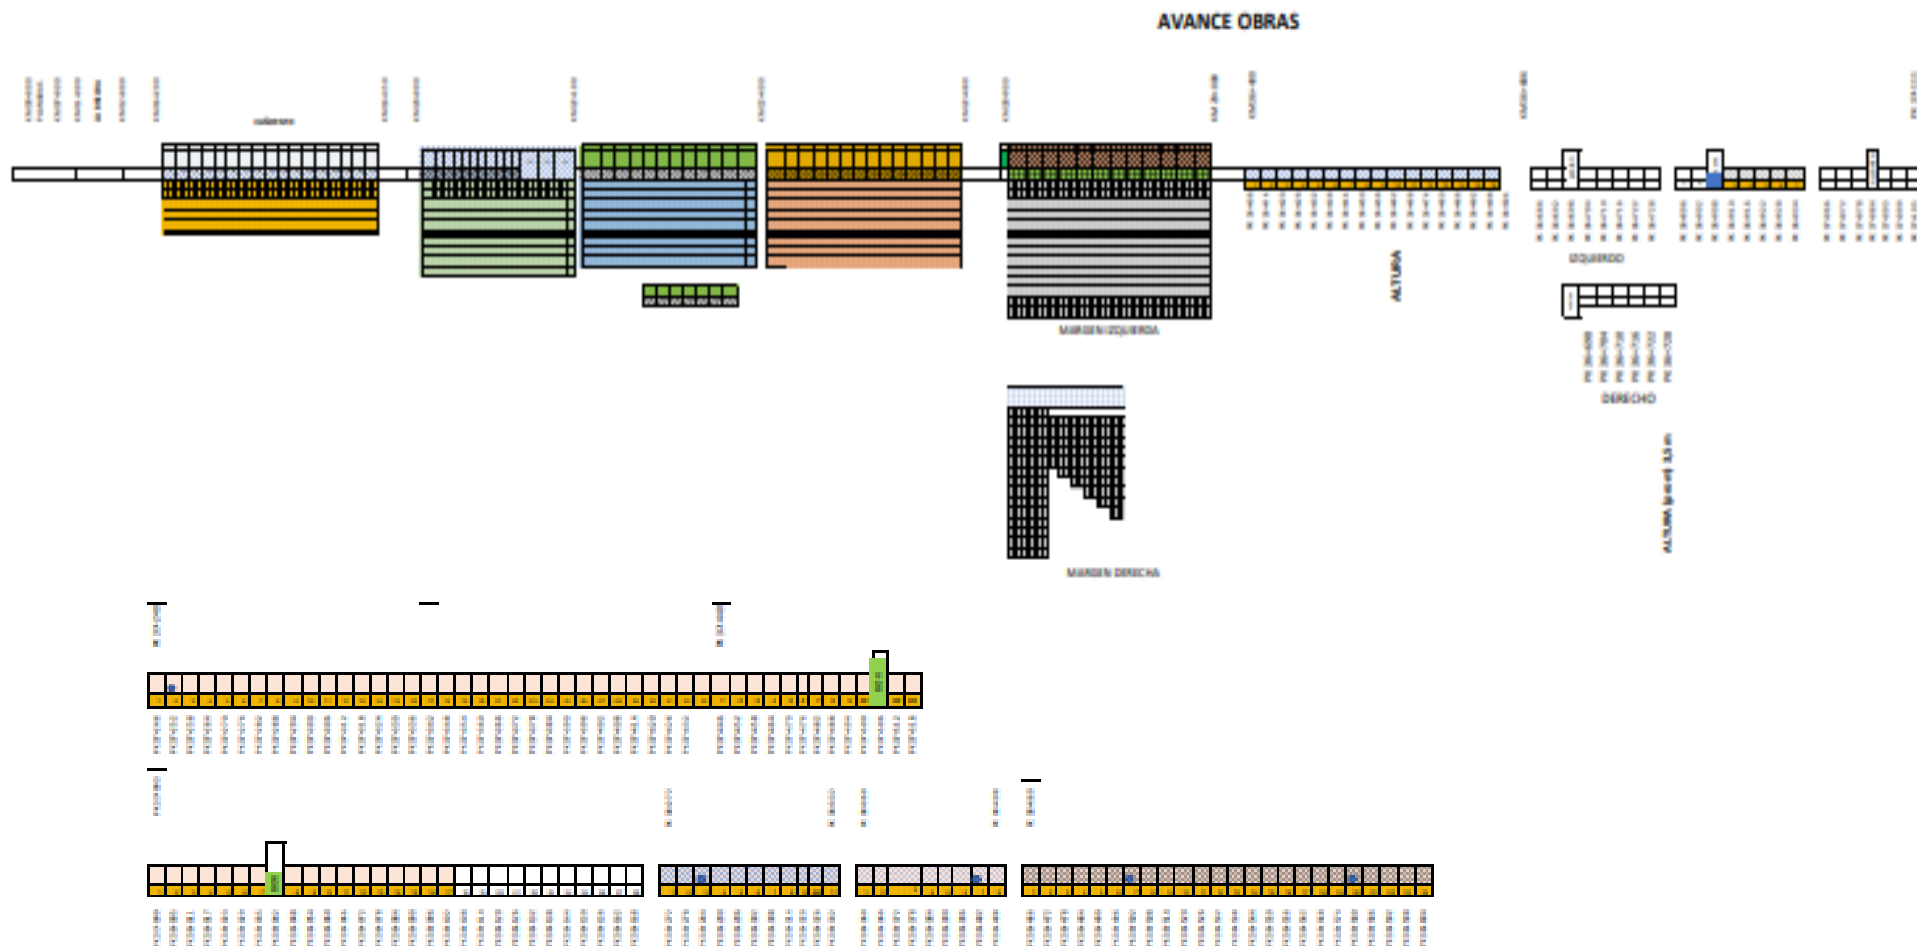

Inventario inicial del corredor vial Ataco – Planadas

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	


2.3 Características técnicas del proyecto

Entre los aspectos más importantes que definen las características técnicas del presente proyecto se encuentran realizar actividades de mejoramiento de vía ATACO –PLANADAS teniendo en cuenta las necesidades de intervención de la vía, teniendo en cuenta que 50,69 km poseen condiciones regulares de transitabilidad es decir un 67,9% con necesidades de intervención y atención de puntos críticos; 15,5 Km (20,8%) poseen condiciones malas de transitabilidad. En los estudios y diseños existentes del corredor vial los cuales hacen parte integral del anexo técnico, se encuentran consideraciones de mejoramiento de la carretera mediante la construcción de una nueva estructura de pavimento, obras de drenaje necesarias para un adecuado manejo de aguas tanto superficiales como subterráneas, y estructuras para estabilización y recuperación de la banca existente. De acuerdo con lo anterior se hace necesario realizar las revisiones, ajustes y/o actualizaciones y/o complementaciones a los estudios y diseños, por lo cual en el presupuesto oficial tiene esta actividad. Se debe realizar la reparación de las obras que se encuentran en regular estado, reparando las pocetas de entrada y salida, cambio de tubería según el caso, la 15 reposición de las obras de 36” que se encuentren en mal estado y el cambio de las obras en mal estado con diámetro de 24”, aumentando su capacidad, previa validación de su capacidad hidráulica. De igual manera deberá acometer los trabajos de mantenimiento de puentes existentes e instalación de barandas de seguridad donde son requeridos. Debe tenerse en cuenta en la programación de la ejecución de las obras, las condiciones climáticas propias de la región, pues los rendimientos para determinadas actividades y labores estarán sujetos al régimen de lluvias y de verano, respectivamente. Conservando la necesidad de intervención inmediata a la vía, se contempla proceder en los sectores críticos con obras que estipulen condiciones técnicas que además de mitigar riesgos y optimizar el funcionamiento de la vía, mejoren de manera radical las condiciones de inestabilidad que han sido perdurables en el tiempo a lo largo del tramo. Por tanto, los parámetros de diseño y parámetros geométricos del proyecto se regirán por lo establecido en los documentos contractuales del Contrato de Obra 2096 de 2022, la ejecución de todas las obras se realizará con base en lo establecido en las Normas de Ensayos para Materiales y en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, así como el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, Manual de Señalización. En estos mismos documentos contractuales, se establece que, para los casos no estipulados expresamente en las normas y especificaciones mencionadas, ni en las establecidas particularmente en los resultados de los estudios y diseños para las obras del proyecto, se aplicarán como normativas lo establecido en los

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

documentos técnicos y de carácter ambiental de las siguientes instituciones (según lo establecido por la Entidad Contratante):

- Manual de mantenimiento de carreteras 2016, volumen 1 y 2. Especificaciones generales de mantenimiento de carreteras. INVIAS.
- Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS.
- Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, mayo 8 de 2013. INVIAS.
- Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayos para Materiales de Carreteras, última actualización agosto 22 de 2018.
- Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997, y Decretos Reglamentarios, Modificación parcial del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. junio 5 de 2017.
- Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte. Actualizado en mayo 17 de 2017
- Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
- Manual de Dispositivos de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolución 0001885 de 2015, de junio 17 de 2015 y demás normas vigentes.
- Normatividad SST vigente (Decreto Único Reglamentario del sector Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto 1072 del 2015 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
- Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Subsector Vial. INVIAS. • Resolución 1375 de mayo 26 de 2014, por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras

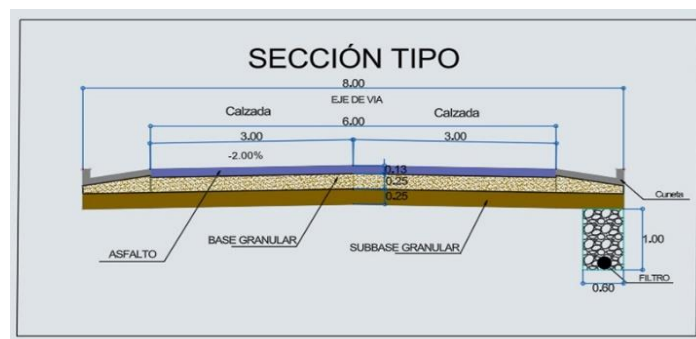

	Contrato 2096 de 2022	 
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO TÍPICA CON CBR		
MEZCLA ASFALTICA	MDC	0,13 Cm
BASE GRANULAR		0,25Cm
SUB BASE GRANULAR		0,25Cm


ESTA ESTRUCTURA ES DISEÑADA EN LOS SITIOS CRITICOS A
IMPLEMENTAR SOLUCIONES GEOGRAFICAS:

CBR	MDC. (Cm)	BG_B(Cm)	SBG_B(Cm)
10	13	25	25

Sección típica de pavimento –

RESUMEN (30 Abril)								
MURO	ABSCISA		MODULOS	VIGA CABEZAL	AVANCE			
	INICIO	FINAL			ZARPA	VASTAGO	VIGA CABEZAL	NEW JERSEY
CAÑOFISTO	PK16+158	PK16+312	17	N/A	100,00%	100,00%	N/A	41,18%
EL CONDOR	PK20+960	PK21+080	11	3	100,00%	100,00%	0,00%	N/A
MEDIOS 1	PK22+241	PK22+328	12	N/A	100,00%	100,00%	N/A	0,00%
MEDIOS 2	PK22+380	PK22+481	14	N/A	71,43%	71,43%	N/A	0,00%
EL HUNDIMIENTO	PK28+980	PK28+986	12	N/A	100,00%	100,00%	N/A	58,33%
EL HUNDIMIENTO	PK28+980	PK28+986	N/A	9	N/A	N/A	100,00%	N/A
TOTAL			66	12	21,21%	16,67%	75,00%	3,74%

RESUMEN (Mayo - 2023)					
MURO	ABSCISA		MODULOS	AVANCE	
	INICIO	FINAL		ZARPA	VASTAGO
1	PK36+408	PK36+510	16	100,00%	100,00%
2	PK36+685	PK36+728	6	0,00%	0,00%
3	PK36+896	PK36+935	6	71,43%	71,43%
4	PK37+065	PK37+111	6	0,00%	0,00%
5	PK37+240	PK37+433	33	100,00%	100,00%
6	PK37+440	PK37+518	12	100,00%	100,00%
7	PK37+990	PK38+167	28	60,71%	60,71%
8	PK38+272	PK38+338	11	100,00%	100,00%
9	PK38+360	PK38+408	8	100,00%	100,00%
10	PK38+460	PK38+604	24	100,00%	100,00%
TOTAL			150	66,56%	66,56%

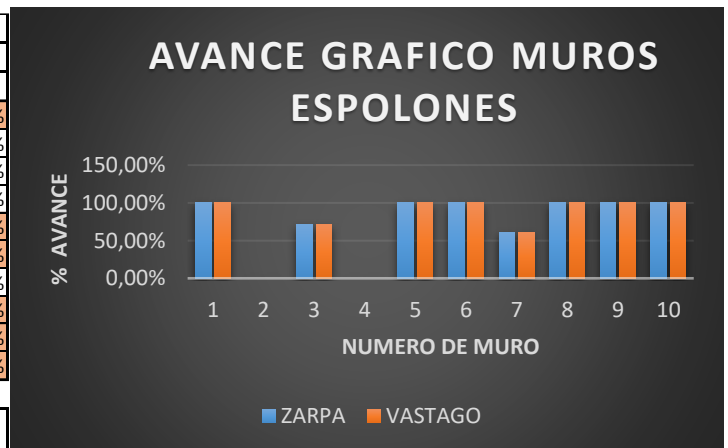

	Contrato 2096 de 2022	 
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

ODT	ESPOLONES						OBS
	PR	TIPO	ENCOLE	DESCOLE	TUBERIA		
1	PK 36+464						
2	PK 36+543						2X2
3	PK 35+592						
4	PK 36+694						AMPLIACION
5	PK 36+770						
6	PK 36+808						2X2
7	PK 36+976						
8	PK 37+084						2X2
9	PK 37+180						
10	PK 37+250						
11	PK 37+410						
12	PK 37+502						3.5X3.5
13	PK 37+584						
14	PK 37+652						
15	PK 37+715						
16	PK 37+800						
17	PK 37+867						
18	PK 38+038						2X2
19	PK 38+107						
20	PK 38+172						Cabecal desplazado por derrumbe
21	PK 38+230						
22	PK 38+288						
23	PK 38+400						
24	PK 38+503						
25	PK 38+576						
26	PK 38+656						
27	PK 38+760						
28	PK 38+855						NUEVO
29							

ODT's		%			
		INTERVENIDA	TUBERIA	ENCOLE	DESCOLE
	ALCANTARILLA 36"	77%	77%	77%	77%
	BOX	60%		40%	20%
	PONTON	50%		0%	50%

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

2.4 Información General del contrato

CONTRATO DE OBRA	
Proceso de Selección	LPO-2021-290
Contrato:	2096 de 2022
Fecha de suscripción	29 de Abril de 2022
Objeto:	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.
Contratista:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
Consortiado 1	INGENIERIA DE VÍAS S.A.S NIT. 800.186.228-2
Compromiso %	85%
Consortiado 2	EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. NIT. 830.132.938-0
Compromiso %	15%
Representante Legal	CARLOS FENANDO MÉNDEZ LEZAMA
Valor Inicial:	\$55.570.933.909 M/CTE, Incluido IVA
Valor Adicional 1	\$ 0
Valor total Contrato	\$ 55.570.933.909 M/CTE, Incluido IVA
Plazo Inicial:	9 meses
Fecha de inicio:	29 de abril 2022
Fecha de Terminación inicial:	23 de enero 2023
Prorroga 1:	31 de Marzo 2023
Prorroga 2:	31 de Julio 2023
Lugar	Ataco - Planadas
Numero de póliza	AA011462 / AA011463 Equidad Seguros.
Forma de pago	Actas parciales de obra

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

2.5 Garantías

A continuación, se relacionan las pólizas de cumplimiento cuyos amparos se detallan en la siguiente tabla:

Tomador	Consortio Vías y Equipos Tolima Sur 2023		
Número de Contrato	2096 del 2022		
Tipo de Póliza	Póliza de Cumplimiento		
Aseguradora	Equidad Seguros		
Número de póliza			
Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento, Multas y Cláusula Penal	20/01/2023	30/09/2023	\$ 5.557.093.390,90
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	20/01/2023	31/03/2026	\$ 11.114.186.781.80
Estabilidad y calidad de las obras	31/03/2023	31/03/2028	\$ 10.883.326.781.99
Calidad del servicio	31/03/2023	31/03/2028	\$346.290.000.02
Número de póliza	NB-100038146		
Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor Asegurado
Amparo Básico Predios, Labores y Operaciones	29/04/2022	31/03/2023	\$2,778,546,696.00

2.6 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el mes de Abril de 2023 el Contratista ha ejecutado las siguientes actividades representativas:

- **Derrumbes producto de las fuertes lluvias:** K5+800, K25+000, K34+000, K37+400

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	



	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

- **Recuperación y mejoramiento de la vía por pérdida de banca:** K1+800, K5+700, K22+400, K27+500, K29+900, K31+500
- **Instalación, conformación y compactación de material de sub-base para la estructura de pavimentos:** Durante el presente mes se inició la instalación de subbase en los sitios donde ya se encuentran terminadas las obras de estabilización y drenaje quedando hasta subrasante. Hasta la fecha ha instalado material de subbase en 2130 ml en las siguientes abscisas del sector “Los Espolones”



	Contrato 2096 de 2022		
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		



- **Excavación y construcción de filtro longitudinal (Instalación de piedra filtro, tubería perforada de 4" y geotextil):** K22+140 (en las dos márgenes de la vía), K22+400 (en las dos márgenes de la vía)

- **Humectación de la Vía:** K36+000 al K38+90

- **K16+200:** Construcción de alcantarilla ubicada en el módulo 16 del muro de contención

Vaciado de concreto en elevaciones corona (50 cm) de los módulos 1 al 17
Instalación y amarre de aceros en new jersey de todos los módulos del muro de contención.

- **K21+100:** Vaciado de concreto en elevaciones sobre viga cabezal 12, 13 y 14
Construcción de 7 módulos de muro de contención tipo H3 (cimentación superficial) en la margen derecha sin ninguna autorización de la interventoría.

	Contrato 2096 de 2022		 
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

K22+140: Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras en el muro tipo H3 en la margen derecha.

Excavación y construcción de filtro longitudinal (Instalación de piedra filtro, tubería perforada de 4" y geotextil)

Construcción de muro tipo H3 (8 módulos) en la margen derecha de la vía

Construcción de caja de encole de alcantarilla (margen izquierda)

Cajeo. Instalación, conformación y compactación de material (recebo) hasta nivel de subrasante.

- **K22+400:** Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras en los módulos 1, 2 y 3.

-

Cajeo. Instalación, conformación y compactación de material (recebo) hasta nivel de subrasante

Excavación y construcción de filtro longitudinal (Instalación de piedra filtro, tubería perforada de 4" y geotextil)

Construcción de pantalla de confinamiento en concreto ciclópeo entre los módulos 4 y 5.

- **K28+900:** Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras.

Instalación y amarre de aceros en new jersey (muro de contención)

Vaciado de concreto en new jersey de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5

Instalación de aceros y vaciado de concreto en estructura de descole (aletas) de box culvert (margen izquierda)

Excavación, fundida de solado, instalación de aceros y vaciado de concreto en paredes, placa superior e inferior de cuerpo de encole de box culvert

Excavación para caja de encole de box culvert

Excavación y vaciado de concreto para solado de limpieza (20 m) para construcción de canal recolector de aguas de escorrentía (margen derecha)

Construcción de dado en concreto ciclópeo para cierre y confinamiento de muro en la margen derecha. Módulo -1.

- **K36+700:** Ampliación de pontón. Margen derecha.

Demolición de aletas

Mejoramiento en concreto ciclópeo de piso de ampliación

Ampliación de paredes y placa superior e inferior de pontón

Construcción de dado aleta derecha en concreto ciclópeo para confinamiento de pontón

	Contrato 2096 de 2022		
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

Construcción de elevación aleta derecha sobre dado en concreto ciclópeo (guarda rueda).

- K36+890:** Excavación para la construcción del muro de contención módulo 7
Vaciado de concreto para solado de limpieza en el módulo 7
Liberación y vaciado de concreto en zarpa de muro de contención en el módulo 7
Liberación y vaciado de concreto en vástago de muro de contención del módulo 4, 5, 6 y 7
Excavación, fundida de solado, instalación de aceros y vaciado de concreto en paredes, placa superior en inferior de cuerpo de descole de box culvert (antes del módulo 3).



- K37+240:** Cajeo. Instalación, conformación y compactación de material (recebo) hasta nivel de subrasante
Instalación, conformación y compactación de subbase para estructura de pavimentos.
- K37+440:** Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras en los módulos 10, 11 y 12
Cajeo. Instalación, conformación y compactación de material (recebo) hasta nivel de subrasante del módulo 1 al módulo 8
Instalación, conformación y compactación de subbase para estructura de pavimentos del módulo 1 al módulo 8.

	Contrato 2096 de 2022		 
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

K37+502: Excavación para construcción de aleta izquierda de encole de Box Culvert (3,5 x 3,5).

Vaciado de concreto para solado de limpieza en aleta izquierda de encole de Box Culvert.

Instalación y amarre de aceros en Zarpa aleta y elevación aleta izquierda de encole de box culvert

Vaciado de concreto en Zarpa aleta y elevación aleta izquierda de encole de box culvert.

Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras en descole de box culvert.

- **K37+990:** Excavación de nuevos módulos (No Autorizados) hacia menores (módulos: -1, -2, -3, -4 y -5)

Fundida de solado de limpieza en los módulos (-1, -2, -3, -4 y -5)

Instalación y amarre de refuerzo en zarpas de los módulos (-1, -2, -3, -4 y -5).

Nota: La construcción de estos nuevos módulos hacia menores se inició sin la autorización de la interventoría.

- **K38+083:** Excavación y construcción de encole de Box Culvert 3 x 3

Instalación y amarre de aceros de refuerzo en encole de Box culvert ubicado en el módulo 8 del muro de contención 7

Vaciado de concreto en estructura de descole de box culvert margen izquierda.

Excavación, fundida de solado e instalación de aceros de refuerzo en la caja de encole de box culvert (margen izquierda).

- **K38+272:** Cajeo. Instalación, conformación y compactación de material (recebo) hasta nivel de subrasante.

Instalación, conformación y compactación de subbase para estructura de pavimentos.

- **K38+360:** Cajeo. Instalación, conformación y compactación de material (recebo) hasta nivel de subrasante

Instalación, conformación y compactación de subbase para estructura de pavimentos.

- **K38+480:** Cajeo. Instalación, conformación y compactación de material (recebo) hasta nivel de subrasante

Instalación, conformación y compactación de subbase para estructura de pavimentos.

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

2.7 COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de Abril, en los proyectos y programas del plan de adaptación de la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura subsector vial (PAGA); en el contrato de obra No. 2096 de 2022 “Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima”

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

Con el objetivo de garantizar la planificación, la ejecución y el cumplimiento de las actividades para el adecuado desarrollo del proceso constructivo del proyecto 2096 de 2022, el cual se ejecuta de la vía Ataco- Planadas en el Departamento del Tolima, se vincularon profesionales idóneos, con experiencia y capacidad de llevar a cabo el seguimiento y control de las actividades civiles y de los programas de gestión Ambiental y Social.

Proyecto 1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental.

El Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento y normal desarrollo de cada una de las actividades programadas en cuanto a la gestión Ambiental y Social, para lo cual conto con el apoyo del área civil para ejecutar el PAGA. Todas las actividades se desarrollaron bajo los lineamientos de la normatividad vigente en cuanto a la implementación de obras de infraestructura vial. En el siguiente cuadro se relaciona el grupo de profesionales, que permitieron con sus conocimientos y acciones la culminación exitosa de este sector:

Tabla 1. Conformación Grupo de gestión Ambiental (PAGA).

CARGO	NOMBRE
Director de Obra	Orlando Camargo Ruiz
Especialista Ambiental	Angie Ardila Franco
Profesional Especialista HSEQ	Clauded Guerrero
Residente Social	Lorena Paz

Desarrollo del Indicador (No. Profesionales contratados /No. profesionales propuestos) x 100 $CD = (4/4) \cdot 100 = 100\%$

Proyecto 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.

Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido en el PAGA, objetivo de concientizar y sensibilizar al personal de obra en diversos temas de interés para el proyecto, lo cual se encuentra relacionado en el siguiente cuadro:

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

Tabla 2. Relación de Capacitaciones y charlas área ambiental.

CHARLAS Y/O CAPACITACIONES				
TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES	INSTRUCTOR
Ciclo de vida de los materiales más representativos de la obra y sus impactos en cada etapa	21/04/2023	1 Hora	62	R. Ambiental

El registro de asistencia de las capacitaciones se relaciona en el anexo 15.

Desarrollo del Indicador (No. de capacitaciones impartidas/No. Total de capacitaciones proyectadas) X 100 CD = $(2/2) \cdot 100 = 100\%$
--

Proyecto 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales.

Teniendo en cuenta las características del proyecto y el espacio donde se ejecuta la obra, para este periodo se adelantaron los siguientes permisos:

Teniendo en cuenta las características del proyecto y el espacio donde se ejecuta la obra, para este periodo se adelantaron los siguientes permisos:

Tabla 3. Cumplimiento de Requisitos Legales para el Contrato 2096.

TIPO DE PERMISO	TRAZABILIDAD
Concesiones de Aguas	Para el desarrollo del proyecto se solicitaron tres concesiones de aguas ubicadas en el río Ata en los siguientes puntos de referencia 16+100, PR19+300 y PR36+000. Concesión K36+000 = Mediante la Resolución 836 de 19 de agosto de 2022, se otorgó una concesión de aguas superficiales para uso industrial con captación de 1.3 l/s. Concesiones Predio la Begonia (K16+100) = Mediante la Resolución 835 de 19 de agosto de 2022 se otorgó la concesión de aguas superficiales para uso industrial con captación de 1.3 l/s Concesión de Aguas El Condor (19+300) = mediante el acto administrativo Resolución 837 de 19 de agosto de 2022, se otorgó la concesión de aguas superficiales para uso industrial con captación de 1.3 l/s. Esta concesión de aguas es la que se está usando en la obra.

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

	A través del comunicado CSPLTO000190 radicado N° 48 de 19/01/2023 se informa a CORTOLIMA que la concesión de aguas superficial de uso industrial otorgada mediante la Res 835 de 2022 no se ha usado. A través del Radicado No 705 de 14/04/2023 CORTOLIMA autoriza el cambio de predio para sembrar los arboles de la compensación de la Res. 836 de 2023.
Ocupaciones de Cauce	Se proyecta la intervención de 11 obras hidráulicas, las cuales se hace necesario el permiso de ocupación de cauce, a la fecha se han radicado dos solicitudes de ocupación ante la autoridad ambiental; para este mes la corporación efectuó requerimientos específicos para la continuación de los tramites. Tres Ocupaciones de Cauce Espolones (Ataco) = Auto 6579 del 01 de agosto de 2022, Auto 7325 de 14 de septiembre de 2022. Ocupación de Cauce Cañofisto (Planadas) = Auto 6580 del 01 de agosto de 2022, Auto 7326 de 14 de septiembre de 2022 Cabe resaltar que estas ocupaciones se solicitaron en el marco de la calamidad pública decretada por la Gobernación del Tolima. Se solicitó ocupación de cauce del K21+100 radicado No 22935 del 6 de diciembre de 2022 para la construcción de Hydroblocs como medida de protección antisocavación. El pasado 20 de diciembre de 2022 se tuvo la visita de evaluación de la ocupación de cauce de K21+100. Se envió comunicado CSPLTO000191 radicado N° 916 de 18/01/2023 para solicitar el estado de trámite del permiso de ocupación de cauce del auto 7326 de 14 de septiembre de 2022. Se envió comunicado CSPLTO000192 radicado N° 1042 de 19/01/2023 para solicitar el estado de trámite del permiso de ocupación de cauce del auto 7325 de 14 de septiembre de 2022.
Zonas de RCD	Para el manejo de los RCDs se cuenta con dos zonas de depósito ubicadas en el PR 29+500 en el Corregimiento Santiago Pérez y en el PR6+100 en la vereda el Playón. Zona RCD Guamito (Santiago Pérez) = Auto 6319 de 29 de julio de 2022 en el cual se autoriza la disposición y almacenamiento de residuos de construcción y demolición. Zona de RCD (El Playón) = Auto 6647 de 4 de agosto de 2022 en el cual se autoriza la disposición y almacenamiento de residuos de construcción y demolición.

	Contrato 2096 de 2022		
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

	Zona RCD (Zanjones) se envió solicitud a través del comunicado CSPLTO000173 Rad. 23418 de 13 de diciembre de 2022 a CORTOLIMA para almacenamiento y disposición final de RCD en el predio Zanjones. Se envió comunicado CSM003799 Rad. No. 548 de 11/01/2023 para informar a CORTOLIMA que no se ha usado el predio del Playón. CORTOLIMA realizó visita el 11 de abril de 2023 en la zona de RCD (Zanjones) para la viabilidad del RCD. También se realizó visita de seguimiento el 11 de abril de 2023 del RCD el Guamito.
Aprovechamiento Forestal	PAF Ataco = Se autorizó el aprovechamiento de 1047 individuos arbóreos, mediante la Resolución 5704 de 23 de septiembre de 2022, Exp. 8675. PAF Planadas = se autorizó el aprovechamiento de 564 individuos arbóreos, mediante la Resolución 5740 de 23 de septiembre de 2022, Exp. 8674 El 24 de octubre 2022 a través del comunicado CSM003727 Rad. 20009 de 25 de noviembre de 2022 se solicitó cambio de la medida compensatoria. El pasado 18 de noviembre de 2022 se solicitó a CORTOLIMA mediante el comunicado CSM003757, un plazo de 6 meses más para la culminación del aprovechamiento forestal, debido que el contrato No. 2692 del 2022 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" aún no ha finalizado. PAF Planadas = Se otorgó el permiso para el aprovechamiento de 564 individuos arbóreos, mediante la Resolución 5740 de 26 de Septiembre de 2022. El 3 de noviembre de 2022 CORTOLIMA, notifico mediante AUTO 8771, que el Procurador Judicial II ambiental y agrario del Tolima, interpuso un recurso de reposición a la Resolución 5740 de 26 de septiembre, por tal razón y como se menciona en el artículo primero del auto adjunto la autoridad ambiental dejo sin efecto la constancia secretarial de ejecutoria de esta resolución, por tal razón el Consorcio NO podrá hacer uso de este permiso, es decir NO se podrán realizar labores de tala en este tramo hasta que CORTOLIMA resuelva el recurso interpuesto por el procurador. Se envió el comunicado CSM003757 Rad. No 21811 de 18/11/2022 para solicitar prórroga por 6 meses del permiso de aprovechamiento de la resolución 5704 de 23 de septiembre 2022, Exp. PAF-08675. Se envió comunicado CSM003800 Rad. No 582 de 12/01/2023 a CORTOLIMA para reiterar la solicitud de prórroga de 6 meses del permiso

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

	de aprovechamiento forestal de la resolución 5704 de 23 septiembre 2023 Exp. PAF-08675. El 24 de enero de 2022 CORTOLIMA realizó visita para ver la viabilidad de la prórroga por 6 meses del permiso de aprovechamiento forestal de la resolución 5704 de 23 de septiembre 2022, Exp. PAF-08675.
Poda	Se radicó el pasado 5 de diciembre de 2022 la solicitud ante CORTOLIMA para la poda del K0+000 al K19+200 en jurisdicción de municipio de Planadas, lo anterior debido al peligro de volcamiento y ramajes demasiado extensos que ponen en riesgo a los que transitan esta vía garantizando la seguridad de los usuarios de la vía. El pasado 16 de diciembre de 2022 se realizó la visita con CORTOLIMA y viabilizó la poda de los 804 árboles del inventario en un máximo del 20% de la copa de cada árbol. No requiere medida compensatoria.

Desarrollo del Indicador No. De Permisos requeridos / Número de permisos solicitados $CD = (9/13) * 100 = 69\%$

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

Proyecto 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción.

Medidas de Manejo de Materiales Pétreos. Para desarrollo del proyecto del contrato en ejecución, se requiere el empleo de material granular el cual es solicitado a los proveedores Agregados Tetuán S.A.S y Equipos y Triturados; con concesiones mineras IGV – 15431bajo licenciamiento ambiental la cual fue otorgada por Cortolima mediante Resolución 0285 del 25 de enero del 2011 y concesión minera IIR – 08391bajo licenciamiento ambiental cual fue otorgada por Cortolima mediante Resolución 0286 del 25 de enero del 2011 respectivamente; acuerdo al requerimiento de la obra, dicho material es trasladado desde el patio de almacenamiento de la Planta del proveedor hasta el frente de obra mediante vehículos tipo volquetas doble troque y/o sencillas.

En el siguiente cuadro se relaciona el material pétreo empleado en el periodo del 1 al 30 de abril de 2023.

2.8 COMPONENTE SOCIAL:

PROYECTO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Durante el presente periodo entre el 26 de marzo al 25 de abril del 2023, el contratista continúa con los dos puntos de Servicio al Usuario de la Vía-SAU- con sus respectivos pendones informativos en los que se Indica: nombre del contacto, dos líneas de atención

	Contrato 2096 de 2022		
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

número de teléfono 311-4284690, correo electrónico socialplanadas@gmail.com, horarios; los cuales están ubicados en: 1. Planta las Señoritas km 42+450: lunes-miércoles y viernes 8:00 am a 12 y de 2:00 pm a 4:00 pm y 2. Planta el Cóndor km 19+250: martes- jueves 8:00 am a 12 y de 2:00 pm y de 4:00 pm. Además, A sí mismo, se verificó los buzones satelitales de Alcaldías (Ataco y Planadas) y del corregimiento de Santiago Pérez en los que no se hallaron PQRS.

Sin embargo, con la implementación del sistema de atención a la comunidad presencial, para este periodo se recibió una (1) Manifestaciones Ciudadana No. seis (6) la cual está cerrada, la No. 4 y 5 ya se ha realizado las obras de estabilización lo cual corresponde como respuesta al peticionario representante de la veeduría ciudadana y/o comité de Participación Ciudadana. Por ende, está pendiente la firma de satisfacción del peticionario a quién se le ha contactado por llamadas y mensajes de WhatsApp respondiendo no estar en la región. En cuanto a la MC 2 (estado semi cerrada) el Consorcio a través de llamada telefónica tiene conocimiento que la Gobernación dará la respuesta al peticionario para el próximo periodo.

Por consiguiente, se concluye que a la fecha el proyecto ha recibido seis (6) MC. Las cuales se han atendido mediante actividades coherentes con la solicitud.

PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Durante el presente periodo, se realizó la siguiente actividad de información o divulgación.

- Carteleras de Información

Con el objetivo de que toda la comunidad en general pueda estar informada acerca del proceso constructivo se actualiza las dos carteleras de Información que se encuentran ubicadas en las Alcaldías Municipales del AI del proyecto. el día 20 abril del 2023 realizó esta actividad, donde se plasmó información del avance de obras del área técnica de los puntos de intervención, como lo son PR 16+200 caño fisto, PR 21+100 Cóndor, PR 22+100 y 22+400 los medios y PR 28+900 hundimiento, además de prevención para tener en cuenta del área SST, donde se mostró con imágenes y descripción el avance significativo que ha tenido el proceso constructivo en cada uno de los sectores mencionados.

- Cartas Personalizadas:

Se entregó en el periodo un (1) carta personalizada a la secretaria de Infraestructura Municipal de Planadas en donde se solicita información del señor Juan Sebastián Ballesteros.

	Contrato 2096 de 2022		
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto en donde se encuentra en el proceso constructivo, se realiza acta de seguimiento a la vivienda de la señora Rosa Elvira González que han tenido modificaciones en su estructura con el objetivo de realizar su verificación actual, con respecto a las actas de cierre no se han programado puesto que aún faltan actividades en todos los sectores para poder iniciar con esta actividad.

PROYECTO 4. DE RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.

En este proyecto el contratista informa que no se evidencia la presencia de actividades económicas que necesiten traslado para la recuperación del derecho de vía. Por consiguiente, durante el desarrollo del proyecto no se tendrá en cuenta esta actividad.

PROYECTO 5. DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

Teniendo en cuenta que el presidente del Comité de Participación y/o veeduría no se ha encontrado en la zona, se programa reunión y/o recorrido para el próximo periodo.

PROYECTO 6. DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo al 25 de Abril del 2023, la empresa Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, ha empleado un total de 112 personas, de las cuales el 63% (71 personas) corresponden a mano de obra calificada y el 37% (41 personas) corresponde a mano de obra no calificada. La cual se clasifica en la siguiente tabla:

Generación de empleo del 26 de marzo al 25 de abril del 2023 Contrato 2096 de 2022.				
Mano de obra Calificada		Mano de obra no calificada		Total, de empleo
Local	Externa	Local	Externa	
25	45	20	21	

Tabla1. Generación de empleo MONC y MOC foránea y local

Siendo el 40% de lo contractual se ha cumplido al 49% la contratación de mano de MONC del AI.

El día 21 de abril del presente año se capacitó al personal de obra en tema de Liderazgo con 62 asistentes, el anexo de las planillas de asistencia está adjuntas al informe ejecutivo ambiental.

Proyecto 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS

	Contrato 2096 de 2022		
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

El proyecto productivo se encuentra en proceso de ajuste de observaciones para posterior radicación ante la interventoría del proyecto, el cual está en un avance del 20% como también el proyecto de obras de participación comunitaria el cual está en proceso de verificación de parte de la interventoría tiene un avance del 40%.

Proyecto 8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL.

El proyecto cuenta, con la respuesta del ICANH No. 2022162000065851 que reza: “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO –PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, localizado en los municipios de Ataco y Planadas, departamento de Tolima, no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva.

Por otro lado, mediante oficio de Rdo. No. CSPLTO000142, se recibió la resolución número ST-1556 de 24Oct 2022 Consulta Previa. Medio por el cual responde el MINTERIOR que para el contrato 2096 del 15 de marzo de 2022 “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” no procede a la realización de consulta previa.

No obstante, teniendo en cuenta que a la interventoría ya se le radico el PAGA, a este se le adjuntó el documento “el plan de manejo de hallazgo arqueológicos” se ha realizado capacitación al personal de obra en la fecha 20 de agosto del 2022, de lo cual se generó la respectiva acta con la lista de asistencia, registros fotográficos.

De la misma forma para el periodo el día 18 de marzo del presente año, se realizó capacitación de hallazgos Arqueológicos con el personal del Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023.

2.9 COMPONENTE SST

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de marzo, las cuales son supervisadas con el objetivo que se realicen de forma segura para preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores.

- Corte y figuración del acero.
- Amarre de acero.
- fundida de zarpas y vástagos.
- Amarre de acero en el box Culvert.

	Contrato 2096 de 2022		 
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023		

- Encofrado y desencofrado del Box Culvert

ACTIVIDADES SST EN GENERAL:

Se realiza el diligenciamiento de permisos de trabajo y ATS

INDUCCION Y REINDUCCIÓN

La inducción del personal en la organización, son procesos sistemáticos que se realiza al ingreso del personal en el caso de la inducción, y a lo largo del vínculo laboral de los trabajadores con la organización, según las necesidades de entrenamiento.

Se realizaron las actividades correspondientes a inducción y reinducción del personal, algunas veces de forma individual y otras de forma colectiva, para iniciar las labores para las cuales fueron contratados y de esta forma garantizar que tienen el conocimiento y la responsabilidad para ejecutar un trabajo seguro.

Durante el periodo se dio cumplimiento al programa de inducciones y capacitaciones ya que en el mes de diciembre se realizó inducción a: **1 trabajadores.**

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La capacitación del personal en la organización, son procesos sistemáticos que se realiza a lo largo del vínculo laboral de los trabajadores con la organización, según las necesidades de entrenamiento.

Lo anterior está establecido en el Programa de Capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción SST (MS-GF-PG-02) y se ejecutan por persona directo de la compañía, la ARL o proveedores de acuerdo con el tipo de temas a tratar.

Se ejecuta capacitación sobre *Investigación de accidentes de trabajo, enfermedades laborales-resolución 1401/2007, reporte de accidentes de trabajo.*

ACTIVIDADES EN PROMOCION Y PREVENCION - CHARLAS DIARIAS DE SST

Las charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo realizadas al personal tienen como objeto informar y sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos en la realización de las actividades a ejecutar.

Fenómenos naturales

Uso adecuado de herramientas eléctricas

Objetos que caen en la vía (deslizamientos, rocas y arboles)

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Se realiza entrega de dotación al personal de ingreso y se garantiza la entrega de los elementos de protección al personal necesario para ejecutar las actividades de manera segura.

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL

En el periodo del mes de marzo de 2023 no se presentó accidentes laborales en el proyecto

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo se mantuvo la señalización adecuada y permanente en los frentes de obra, se instaló de manera que el tráfico vehicular que circula por el área no generara riesgos para las diferentes actividades relacionadas con los proyectos en ejecución.

2.10 ÁREA DE CALIDAD

Para el presente periodo se realizó el Seguimiento al Plan de Calidad del Contratista

- Realizando el seguimiento a los elementos tomados en el presente mes de Abril en presencia del personal de Contratista junto con la Interventoría los ensayos de resistencia a compresión de concreto a 28 días; quince (15) de las muestras de diferentes puntos se pudo evidenciar que las muestras no alcanzaron la resistencia de diseño (4000psi). Se programa para fallar los testigos a 56 días de edad.
- Seguimiento al Plan de Inspección y ensayo del contratista Siguiendo los lineamientos definidos para el Plan de Inspección y ensayo del contrato 2096 - 2022, se presenta el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual el contratista reporta ensayos realizados en el mes de Abril de 2023.

Se realizó a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, según los lineamientos del INVIAS, y haciendo verificación de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contrato. Se presentan Anexos del informe mensual de calidad.

2.11 Relación de correspondencia generada entre contratista e interventor.

2.11.1 Correspondencia enviada

Fecha	Numero de comunicado	Dirigido a	Asunto
1-abr-23	CSPLTO0002 72	Carlos Arturo Rivera	Respuesta C2-1570-OBR04-2023
10-abr-23	CSPLTO0002 74	Carlos Arturo Rivera	Informe de seguimiento Plan de calidad marzo de 2023
14-abr-23	CSPLTO0002 76	Carlos Arturo Rivera	Respuesta Oficio C2-1570-OBR037-2023
20-abr-23	CSPLTO0002 84	Carlos Arturo Rivera	Cambios necesarios en muros de contención

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

20-abr-23	CSPLTO0002 77	Carlos Arturo Rivera	Respuesta Oficio C2-1570-OBR040- 2023 Solicitud Martha Liliana Salazar
25-abr-23	CSPLTO0002 91	Carlos Arturo Rivera	Respuesta Oficio C2-1570-OBR043- 2023
25-abr-23	CSPLTO0002 90	Carlos Arturo Rivera	Entrega de Informe mensual SST. Mes Abril
25-abr-23	CSPLTO0002 89	Carlos Arturo Rivera	Informe mensual ambiental del mes de abril de 2023
26-abr-23	CSPLTO0002 93	Carlos Arturo Rivera	Respuesta Oficio C2-1570-OBR044- 2023
29-abr-23	CSPLTO0002 97	Carlos Arturo Rivera	Entrega de informe #12 gestion social

2.11.2 Correspondencia Recibida

Consecutivo	Dirigido a	Asunto	Fecha Envío
C2-1570- OBR032-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Solicitud entrega Informe de Calidad marzo 2023	8/04/2023
C2-1570- OBR033-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	envió informe especialista geotecnia según visita el jueves 30 de marzo por la ingeniera specialista en Geotecnia Alba Lucia Naranjo Corredor	11/04/2023
C2-1570- OBR034-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Solicitud entrega de resultados ensayos de materiales para pavimentos	11/04/2023
C2-1570- OBR035-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	respuesta a comunicado CSPLTO000237	11/04/2023
C2-1570- OBR036-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Aprobación de informes sociales del mes noviembre, diciembre, enero.	11/04/2023

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

C2-1570-0BR037-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Observaciones al Informe de Calidad marzo 2023	11/04/2023
C2-1570-0BR038-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Solicitud realización apiques y ensayos de laboratorio para la verificación de la subrasante	11/04/2023
C2-1570-0BR039-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Solicitud Mesa de trabajo Aprobación Diseños de Geotecnia	14/04/2023
C2-1570-0BR040-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Remisión oficio de la Martha Liliana Salazar Ladino	15/04/2023
C2-1570-0BR041-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Aprobación informe mensual ambiental de febrero 2023	18/04/2023
C2-1570-0BR042-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Solicitud Mesa de trabajo Aprobación Diseños de Geotecnia	18/04/2023
C2-1570-0BR043-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Listado de elementos que no desarrollaron la resistencia de diseño a 28 días y solicitud de programación para fallar testigos a 56 días	20/04/2023
C2-1570-0BR044-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	solicitud soporte en atención a la petición de la Sra. Martha Liliana Salazar Ladino	20/04/2023
C2-1570-0BR045-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Solicitud Mesa de trabajo Aprobación Diseños de Geotecnia	22/04/2023
C2-1570-0BR046-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS	Reunión ante el INVIAS	25/04/2023

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

	TOLIMA SUR 2023		
C2-1570- 0BR047-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Solicitud envió programación de actividades de obra diarias	25/04/2023
C2-1570- 0BR048-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	envió informe Estudio geotécnico para el diseño del sitio crítico K21+100 A K21+200 – Sector El Cóndor	25/04/2023
C2-1570- 0BR049-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	respuesta a comunicado CSPLTO000264	26/04/2023
C2-1570- 0BR050-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Solicitud cumplimiento actividad contractual: reunión de socialización de avance de obra	26/04/2023
C2-1570- 0BR051-2023	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	Aprobación cotización parques infantiles de madera	27/04/2023

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El programa de inversiones arroja resultados positivos, para el periodo del mes de abril de 2023 se tenía programado un acumulado de 88,06 % y se ha ejecutado el 99,58 % teniendo un adelanto en ejecución del 11,52 %

En el mes de abril se han presentado fuertes lluvia en los sectores de intervención de las actividades, el comportamiento del clima ha sido uno de los factores notables para el avance de las obras programadas en la zona, lo cual ha generado retrasos y reprocesos en programaciones de obra. Igualmente se presenta deterioro de la capa de rodadura en algunos sectores causando incremento en la inseguridad vial y genera que se tenga el cierre parcial para la reparación y activación de estas, activando el paso de los vehículos usuarios por la inestabilidad y falla de la estructura del pavimento en algunos lugares.

	Contrato 2096 de 2022	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
	INFORME TECNICO MENSUAL ABRIL DE 2023	

El area ambiental continúan realizando gestiones y acercamientos ante cortolima para la toma de decisiones de fondo tanto para los permisos de ocupación de cause como para las modificaciones de las medidas de compensación de aprovechamiento forestal.

Durante el presente periodo, se dio cumplimiento a los requerimientos formulados por la interventoría en lo referente a los aspectos ambientales y de seguridad, detectados en los recorridos de obra que se realizan para control, seguimiento y monitoreo .

Se continúa realizando seguimiento al plan de calidad con la toma de muestras y ensayos a los diferentes materiales utilizados para la realización de las actividades.

PRESENTADO POR	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
DIRECTOR DE OBRA	ORLANDO CAMARGO RUIZ
RESIDENTE DE OBRA	HECTOR DANILO ATARA
	JHON JAIRO MORALES GUZMAN
AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	TATIANA RAMOS VARGAS
RESIDENTE SST	LEIDY CATHERIN VARGAS
RESIDENTE SOCIAL	LORENA PAZ RIAÑO
RESIDENTE AMBIENTAL	JUAN DIEGO PALMA
RESIDENTE DE CALIDAD	JOHAN EDUARDO PEÑA
