

|                                          |                                                                                                           |          |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 | CONTRATO DE OBRA No. 2096-2022<br>“MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” | VERSIÓN  | 1          |
|                                          | INFORME DE GESTIÓN SOCIAL<br>Periodo comprendido entre el 26 enero al 25 febrero de 2025                  | Fecha    | 25/02/2025 |
|                                          |                                                                                                           | Hoja No. | 1 de 32    |



|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| ENTREGADO A:   | OFICINA INTERVENTORIA<br>CONSORCIO IC & CB |
| ENTREGADO POR: | Ing. Carlos Eduardo Motta                  |
|                | Director de obra                           |
|                | Dra. Carolina Bautista                     |
|                | Residente social                           |

## CONTENIDO

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| 2.    | OBJETIVOS.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 2.1   | Objetivo General. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  |
| 2.2   | Objetivos Específicos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  |
| 3.    | PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
| 3.1   | PROYECTO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  |
|       | Para la atención a la comunidad en general la empresa Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, continua con la oficina para la atención al usuario Punto S.A.U., la cual se ubica en el Predio Estambul PR 42+250 vereda las Señoritas con el horario de atención los días: lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm .....                                                                                                                                                                                                       | 6  |
|       | Por otro lado, para tener una mayor cobertura de atención a la comunidad se instaló un punto satélite en la Planta de Concreto el Cóndor PR 19+200 con un horario de atención los días martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm, de igual forma se cuenta con el canal de comunicación con la línea de atención al usuario (3107746768), y correo electrónico socialplanadas@gmail.com , donde la comunidad y los sectores más distantes del proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes ..... | 6  |
| ❖     | Buzones de sugerencias .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| 3.1.1 | Implementación de un sistema de atención a la comunidad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| 3.2   | PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 |
| ❖     | Realización de reuniones informativas.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 3.2.1 | Acciones de divulgación.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |
| 3.3   | PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
| 3.3.1 | Levantamiento de actas de vecindad de Inicio.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
| 3.3.2 | Levantamiento permiso de obra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
| 3.4   | PROYECTO 4. DE RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 |
| 3.5   | PROYECTO 5. DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 |
| 3.6   | PROYECTO 6. DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Anexo General .....                                                | 16 |
| Anexo 1. MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz.....                           | 17 |
| Anexo 2. MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta VECINDAD.....                    | 18 |
| Anexo 3. soportes relacionadas con manifestaciones ciudadanas..... | 19 |
| Anexo 4. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta.....                         | 20 |
| Anexo 5. Anexos por ficha o proyecto.....                          | 21 |
| Anexo 6. Otros.....                                                | 22 |

### **LISTADO DE TABLAS.**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Indicador Oficina de Atención al Usuario .....                      | 7  |
| Tabla 2. Buzones Satélites de Información .....                              | 8  |
| Tabla 3. Indicador Consolidación de PQRS del mes .....                       | 8  |
| Tabla 4. Indicador Manifestaciones Ciudadanas durante el periodo .....       | 10 |
| Tabla 5. Indicador Reuniones realizadas durante el periodo.....              | 10 |
| Tabla 6. Indicador Acciones de Divulgación .....                             | 11 |
| Tabla 7. Indicador Actas de Vecindad de inicio en el mes.....                | 12 |
| Tabla 8. Permisos de obra de arte en el mes .....                            | 12 |
| Tabla 9. Indicador Actas de Vecindad Levantadas .....                        | 12 |
| Tabla 10. Indicador Permisos de Obra.....                                    | 13 |
| Tabla 11. Indicador Comité de Participación .....                            | 16 |
| Tabla 12. Personal de Obra No Calificada de la Región.....                   | 17 |
| Tabla 13. Indicador Generación de Empleo .....                               | 21 |
| Tabla 14 Indicador Pro Productivos y/o Obras de Participación Comunitaria... | 22 |

## **1. INTRODUCCIÓN.**

El programa de adaptación a la guía Ambiental - PAGA es una herramienta básica e importante en el contexto del desarrollo de los proyectos lineales, en este caso las acciones propuestas para el mejoramiento de la vía y las condiciones sociales del sector en donde se ejecuta el proyecto; de este modo, el PAGA, propuso una serie de proyectos, y acciones a seguir puesto que con la ejecución de las actividades de obra existió la probabilidad de presentarse alteraciones sobre los componentes y elementos sociales; es por ello que se formularon acciones puntuales a seguir para prevenir, mitigar, corregir los impactos o efectos generados a partir de la ejecución del proyecto y así poder garantizar la sostenibilidad económica, financiera, social del mismo.

El proyecto en su desarrollo ha implicado la ejecución de obras de infraestructura de tipo ingenieril, colocación de base, sub-base y carpeta asfáltica. Así mismo, y paralelo a estos procesos la política del Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, propenderá por desarrollar el potencial humano a partir de las actividades propias de su trabajo para cumplir día a día con los objetivos propuestos en el contrato.

Mediante la presentación del PAGA, se iniciará las obras de Mantenimiento, por cuanto se requirió conocer las características sociales de la zona, el grado de intervención de los mismos las características del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica.

A continuación, se presenta el informe de las actividades que se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre el 26 enero al 25 febrero de 2025 en el área Social del contrato de obra 2096-2022 con el fin de dar cumplimiento a las fichas establecidas en el PAGA.

## **2. OBJETIVOS.**

### **2.1 Objetivo General.**

Realizar una descripción detallada de la gestión ejecutada del componente Social realizadas en el periodo del 26 enero al 25 febrero de 2025, en los proyectos y programas del plan de adaptación de la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura subsector vial (PAGA); en el contrato de obra No. 2096 de 2022 "Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima"

### **2.2 Objetivos Específicos.**

- ❖ Realizar un informe detallado de las actividades en materia de gestión social desarrolladas en el frente de obra, durante el periodo del 26 enero al 25 febrero de 2025.
- ❖ Relacionar la gestión realizada para los permisos con la comunidad del área de influencia
- ❖ Mencionar las actividades sociales realizadas en este periodo.

### 3. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

#### 3.1 PROYECTO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Para la atención a la comunidad en general la empresa Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, continua con la oficina para la atención al usuario Punto S.A.U., la cual se ubica en el Predio Estambul PR 42+250 vereda las Señoritas con el horario de atención los días: lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm.

Por otro lado, para tener una mayor cobertura de atención a la comunidad se instaló un punto satélite en la Planta de Concreto el Cóndor PR 19+200 con un horario de atención los días martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm, de igual forma se cuenta con el canal de comunicación con la línea de atención al usuario (3107746768), y correo electrónico [socialplanadas@gmail.com](mailto:socialplanadas@gmail.com), donde la comunidad y los sectores más distantes del proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes.



Fotografía 1. Punto S.A.U. PR 42+250  
Vereda las Señoritas



Fotografía 2. Punto Satélite PR 19+200  
Vereda el Cóndor

#### ❖ Buzones de sugerencias:

- ❖ Durante el periodo se realizó la verificación de los buzones satélites ubicados en las Alcaldías Municipales de Ataco y Planadas Tolima como en el corregimiento de Santiago Pérez, con el objetivo de que las comunidades distantes que no se puedan acercar al punto de atención al usuario SAU, puedan tener una respuesta clara y oportuna a sus inquietudes con respecto al proyecto que se desarrolla, dicha verificación fue realizada los siguientes días:

- Alcaldía de Ataco: Las visitas de verificación de buzones se realizaron los días 07,14 y 21

- Alcaldía de Planadas: Las visitas de verificación de buzones se realizaron los días 28 enero y 07 febrero de 2025

- Santiago Pérez: Las visitas de verificación de buzones se realizó 10 febrero de 2025


Durante los recorridos en los buzones satelitales de Ataco y Santiago perez no se recibieron PQRS.



Fotografía 3. Verificación Buzón  
Alcaldía Municipal de Planadas



Fotografía 4. Verificación Buzón  
Alcaldía Municipal de Ataco

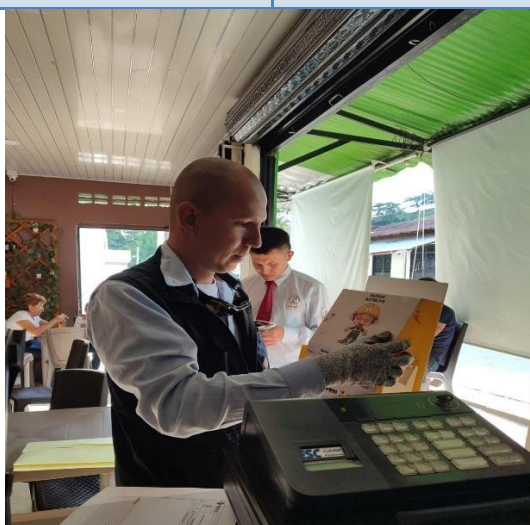

Fotografía 5. Verificación Buzón Tienda del Café- Corregimiento Santiago Pérez

**Anexo 2:** Verificación y consolidado de buzones.

- **Indicadores de Gestión:**

**Tabla 1** Indicador Oficina de Atención al Usuario

| INDICADOR | FORMULA                                                                                                                                      | CUMPLIMIENTO |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | $\frac{\text{No de Oficina de Atención al Usuario en funcionamiento}}{\text{No de Oficina de Atención al usuario programado}} \times 100 \%$ | =100%        |

**Tabla 2** Indicador Buzones Satélites de Información.

| INDICADOR | FORMULA                                                                                   | CUMPLIMIENTO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | $\frac{\text{No Buzones en funcionamiento}}{\text{No Buzones programados}} \times 100 \%$ | =100%        |

### 3.1.1 Implementación de un sistema de atención a la comunidad

Durante el presente periodo se realizo la siguiente gestión

**Tabla 3.** Consolidación de PQRS del mes.

| Periodo del 26 enero al 25 febrero de 2025 |            |                         |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                         |         |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No                                         | FECHA      | NOMBRE PETICIONARIO     | DIRECCIÓN | MUNICIPIO/VEREDA/BARRIO | QUEJA O SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TELÉFONO   | RESPUESTA                                                                                                                                                                               | ESTADO  |
| 20                                         | 21/08/2024 | Jey Fredy Mendez Mendez | N/A       | ATACO                   | el día 13/08/2024 el peticionario remite al consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 petición relacionada con un corral de encierro de ganado que se encontraba al inicio de las actividades de obra del contrato 2096 del 2022 y tuvo que ser retirado, por tal motivo solicita al consorcio la reposición del mismo | 3105191767 | El peticionario el día 05/12/2024 remite cotización al consorcio vías y equipos tolina sur por un valor de \$4.525.000 por los siguientes materiales: 37 postes de madera y 180 teleras | ABIERTA |

|           |                    |                                |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|-----------|--------------------|--------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>21</b> | 17/09/2024         | Luis<br>Fernand<br>o<br>Bermud | 37+<br>200 | ATACO | el día 17/09/2024 el<br>peticionario remite al<br>consorcio vías y equipos<br>Tolima sur vía correo<br>electrónico solicitud de<br>terminación de canal<br>disipador debido a que se<br>está presentando una<br>afectación a su finca<br>construido por el consorcio<br>en el PR 37+200 en el<br>marco de ejecución del                                                                                                                                                                                                                                                      | 3168342222 | se realizarán las actividades de<br>concreto ciclope de 4,30 x 1,30<br>espesor de 0.25 mts, Y se<br>proyecta iniciar con esta<br>actividad la primera semana de<br>febrero de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABIERTA |
| <b>22</b> | 25/1<br>1/20<br>24 | Amira<br>Morales<br>Guzman     | N/A        | N/A   | El día 25/11/2024 la<br>peticionaria remite al<br>consorcio vías y equipos<br>tolima sur derecho de<br>petición solicitando el<br>pago de alquiler del<br>vehículo marca kia<br>sportage de placas ipr 536<br>el cual le servia de<br>transporte al ingeniero jhon<br>jairo morales                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3124714833 | El día 08/01/2025 Mediante<br>comunicado CSPLO000718 se<br>informa a la peticionaria que<br>debido a circunstancias internas<br>de flujo de caja menor, el<br>consorcio requiere un plazo<br>adicional para completar el<br>proceso de liquidación, el<br>consorcio vías y equipos Tolima<br>sur espera resolver esta situación<br>en el menor tiempo posible y se<br>mantendrá informada de<br>cualquier avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ABIERTA |
| <b>24</b> | 28/1<br>1/20<br>24 | Miguel<br>Hermos<br>a Ruiz     | N/A        | N/A   | EL día 28/11/2024 el<br>peticionario remite al<br>consorcio vías y equipos<br>tolima sur solicitud de pago<br>por \$11.620.000 pesos, por<br>concepto de honorarios<br>desde el 18/07/2024 al<br>09/11/2024 con un contrato<br>acordado por \$5.100.000<br>mensual bajo la dirección<br>del subcontratista angeles<br>calificadas s.a.s mit<br>901582075 - 1 (indica 1<br>alquiler de vehículo tipo<br>furgon incluido con servicio<br>de conductor, aporte de<br>consorcio del 50% de<br>combustible, de<br>\$18.870.000 hha recibido un<br>pago parcial de<br>\$7.250.000) | 3114781699 | El día 29/11/2024 el consorcio<br>vías y equipos tolma sur remite<br>solicitud al subcontratista<br>angeles calificadas con el fin de<br>dar pronta respuesta y solución<br>a la solicitud. el día 21 /12/2024<br>mediante comunicado c2-1570-<br>obr242-2024 la interventoria<br>solicita al consorcio vías y<br>equipos tolma sur soportes en<br>atención al dereco de petición.<br>El día 25/01/2025 por parte de la<br>coordinación jurídica del<br>consorcio vías y equipos tolma<br>sur se informa que el<br>subcontratista angeles<br>calificadas es quien debe de<br>dar respuesta. Por tal motivo se<br>procederá a remitir la solicitud al<br>contratista. El día 20 febrero de<br>2025 se realiza el pago por<br>\$7.490.000 por parte del<br>consorcio vías y equipos tolma<br>sur, atendida a satisfacción la<br>PQRS se da por cerrada y se<br>anexa paz y salvo | CERRADA |

|           |            |                               |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------|------------|-------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>25</b> | 28/11/2024 | Arnulfo Olaya Castañeda       | N/A | N/A | el día 28/11/2024 el petitionerio remite solicitud al consorcio vias y equipos tolima sur por medio del cual solicita el pago de salarios y liquidación desde el día 08/07/2024 al 07/09/2024 \$3.200.000 más liquidación y prestaciones sociales                                                                                                             | 3112551414 | El día 25/01/2025 por parte de la coordinación jurídica del consorcio vias y equipos tolima sur se informa que el subcontratista ángeles calificadas es quien debe de dar respuesta. Por tal motivo se procederá a remitir la solicitud al contratista. El día 27/02/2025 Se realiza el pago correspondiente a \$3.200.000 por parte del consorcio vias y equipos tolima sur, una vez atendida a satisfacción la PQRS se da por cerrada y se anexa paz y salvo                                                                                                                                                                                                            | CERRADA |
| <b>26</b> | 19/12/2024 | ANANIAS HORTA                 | N/A | N/A | El día 19/12/02024 durante las actividades de revisión de buzones el consorcio vias y equipos tolima sur recepciono solicitud por medio del cual el petitionerio manifiesta que personal vinculado a la empresa angeles calificadas le adeuda dinero y solicita se realice el pago oportuno (\$5.8.95,600)                                                    | 3143305949 | El día 25/01/2025 por parte de la coordinación jurídica del consorcio vias y equipos tolima sur se informa que el subcontratista ángeles calificadas es quien debe de dar respuesta. Por tal motivo se procederá a remitir la solicitud al contratista. El día 20/02/2025 se realiza pago por \$5.895.600 por parte del consorcio vias y equipos tolima sur, una vezatendida a satisfacción la PQRS se por cerrada y se anexa paz y salvo                                                                                                                                                                                                                                 | CERRADA |
| <b>27</b> | 01/01/2025 | JUAN PABLO SOSA ESQUIVEL      | N/A | N/A | El petitionerio remite solicitud al consorcio vias y equipos tolima sur en calidad de propietario y arrendador de los equipos de construcción referenciados (anexo) solicitando formalmente el pago inmediato de las cuentas de cobro generadas por el alquiler de equipos de construcción a la empresa Angeles Calificadas identificada con el NIT 901582075 | 3006564150 | El día 16/01/2025 El petitionerio remite nuevamente derecho de petición manifestando que desde el mes de septiembre de 2024 angeles calificadas como subcontratista del consorcio alquilo equipos de su propiedad para las obras ejecutadas por el cto2096 de 2022, debido a que a la feca no se a recibido el pago, la deuda asciende a \$31.292.680 hasta el 31/01/2025. en este contexto solicita al consorcio el pago inmediato del monto adeudado conforme a lo estipulado en las cuentas de cobro. Por parte del consorcio se remite derecho de petición al la empresa Angeles Calificadas. El día 10/02/2025 se informa fecha de pago para el día 06 marzo de 2025 | ABIERTA |
| <b>28</b> | 09/01/2025 | JOSE BERSAID MENDOZA GONZALEZ | N/A | N/A | El día 09/01/2025 el petitionerio remite al consorcio derecho de petición solicitando el pago de los honorarios adeudados por \$1.052.000 correspondientes al periodo durante el cual trabajo con la empresa Angeles calificadas S.A.S                                                                                                                        | 3124842051 | El consorcio vias y equipos tolima sur remite derecho de petición a Angeles Calificadas con el fin de dar respuesta oportuna al petitionerio. El día 10/02/2025 se informa fecha de pago para el día 06 marzo de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ABIERTA |

|           |            |                          |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-----------|------------|--------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>29</b> | 25/01/2025 | JENRY ALVAREZ LASSO      | N/A       | N/A     | El día 25/01/2025 el peticionario remite al consorcio solicitud de pago de los honorarios adeudados por un valor de \$4.150.000 por el tiempo que fue contratado el alquiler de un vehículo tipo turbo y su contratación como conductor para la empresa de angeles calificadas, en el periodo del 08/11/2024 al 20/12/2024                                      | 3183187973 | El consorcio vias y equipos tolíma sur remite derecho de petición a Angeles Calificadas con el fin de dar respuesta oportuna al peticionario                                                                                       | ABIERTA |
| <b>30</b> | 25/01/2025 | JUAN ROJAS DUARTE        | Dos aguas | 36+ 694 | el peticionario manifiesta verbalmente reclamo, solicitando solución en la obra que se hizo en la vereda dos aguas (pr 36+694), debido a que se esta perjudicando a su predio ya que recibe las aguas de la vía en su predio llevandose la tierra hacia la quebrada                                                                                             | 3102665336 | se informa que para la primera semana del mes de febrero de 2025, las actividades que realizaran son: 1. conformar material acopiado cerca al canal de drenaje 2. ciclopeo debajo del canal de drenaje para el manejo de las aguas | ABIERTA |
| <b>31</b> | 5/02/2025  | William Cabrera sanchez  | N/A       | N/A     | El día 04 febrero de 2025 por remisión de la personería de planadas se da apertura a derecho de petición del peticionario manifestando que fue contratado para desarrollar la labor de ayudante de construcción para laborar en la brecha, manifiesta que se le adeuda \$1.929.800 por el periodo trabajado entre el 07 noviembre al 20 diciembre               | 3204940389 |                                                                                                                                                                                                                                    | ABIERTA |
| <b>32</b> | 5/02/2025  | Yumlei ner Vargas romero | N/A       | N/A     | El día 04 febrero de 2025 por remisión de la personería de planadas se da apertura a derecho de petición del peticionario manifestando que fue contratado por Angeles calificadas para suministrar el servicio de venta de carnes para alimentar al personal que laboraba en la brecha, así mismo, presto el servicio de arrendamiento de finca para hospedaje. |            |                                                                                                                                                                                                                                    | ABIERTA |

|    |            |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                       |         |
|----|------------|---------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33 | 31/01/2025 | Yair Paloma Aviles  | N/A | N/A | El día 31/01/2025 por medio de la personería municipal de planadas peticionario remite derecho de petición al consorcio manifestando el pago pendiente de su salario adeudado durante el periodo en el que trabajo en el sector "la brecha"       | 3169461500 | El día 20/02/2025 Por parte del consorcio vías y equipos tolima sur 2023 se realiza el pago correspondiente acordado por el peticionario y representante de angeles calificadas. Se anexa paz y salvo | CERRADA |
| 34 | 25/01/2025 | Luis Horacio Repizo | N/A | N/A | El día 25/01/2025 el peticionario remite al consorcio vías y equipos tolima sur solicitando el pago de \$56.156.490 correspondiente a trabajos realizados en el sector de la brecha para el subcontratista angeles calificadas                    | 3164918538 | El consorcio vías y equipos tolima sur 2023 realiza verificación del valor adeudado por angeles calificadas, y se informa al peticionario sobre fecha de pago para el 06 marzo de 2025                | ABIERTA |
| 35 | 30/01/2025 | Edwin Garzon Olaya  | N/A | N/A | El día 30/01/2025 el peticionario remite al consorcio vías y equipos tolima sur solicitud de reclamación por no pago de honorarios correspondientes a la suma de \$2.200.000 adeudados por la empresa angeles calificadas                         | 3133491466 | Se realiza verificación del valor adeudado por angeles calificadas y se informa al peticionario fecha tentativa de pago para el 06 marzo de 2025                                                      | ABIERTA |
| 36 | 31/01/2025 | Carlos Andrade      | N/A | N/A | El día 31/01/2025 por medio de la personería de planadas peticionario remite al consorcio petición por medio del cual solicita el pago de salarios adeudados por el concepto de venta de mezcladora de cemento por un valor restante de \$700.000 | 3105516284 | Se realiza verificación del valor adeudado por angeles calificadas y se informa al peticionario fecha tentativa de pago para el 06 marzo de 2025                                                      | ABIERTA |

|    |            |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                          |         |
|----|------------|---------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 37 | 11/02/2025 | Diosan Reinoso Soto | N/A | N/A | El día 11/02/2025 petionario por medio de la interventoria remite al consorcio vías y equipos tolima sur solicitud de cancelación de factura por un valor de \$1.461.000 correspondiente a la venta de viveres en el establecimiento fruver DYD planadas solicitados por el señor James Mosquera trabajador de angeles calificadas | 3134840822 | Se remite solicitud al área encargada para dar respuesta | ABIERTA |
|----|------------|---------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|

- Indicadores de Gestión:**

**Tabla 4** Indicador Manifestaciones Ciudadanas durante el periodo.

| INDICADOR | FORMULA                      |                    | CUMPLIMIENTO |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------|
|           | No. PQRS atendidos en el mes | $37 \times 100 \%$ | = 100%       |
|           | No. Total, PQRS recibidos    | 37                 |              |

**Anexo 4:** consolidado de Manifestaciones ciudadanas

### 3.2 PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

#### ❖ Realización de reuniones informativas

Durante el periodo informado no se realizaron reuniones con la comunidad

#### Indicadores de gestión:

**Tabla 5** Indicador Reuniones realizadas durante el periodo.

| INDICADOR | FORMULA                      |                   | CUMPLIMIENTO |
|-----------|------------------------------|-------------------|--------------|
|           | No. de reuniones realizadas  | $0 \times 100 \%$ | =0%          |
|           | No. de reuniones programadas | 0                 |              |

#### 3.2.1 Acciones de divulgación.

#### Elaboración y distribución de Piezas de Comunicación

Siguiendo con el desarrollo del proyecto se ejecutaron las siguientes actividades de información o divulgación:

- **Carteleras de Información**

Durante el presente periodo se realizó la actualización de las carteleras informativas ubicadas en la Alcaldía de Planadas y en la Alcaldía de Ataco, informando las labores de obra adelantadas por el Consorcio vías y equipos Tolima Sur 2023.

| Nº | MUNICIPIO | DIRECCIÓN          | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Planadas  | Alcaldía Municipal | NO FUE POSIBLE DURANTE EL PERIODO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTELERA                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Ataco     | Alcaldía Municipal | LA CARTELERA INFORMATIVA FUE RETIRADA POR FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA SIN INFORMAR AL ÁREA SOCIAL DEL CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR, NO OBSTANTE, YA SE ESTÁN REALIZANDO LAS RESPECTIVAS GESTIONES PARA RECUPERAR LA CARTELERA Y REUBICARLA NUEVAMENTE |

- **Indicadores de gestión:**

**Tabla 6** Indicador Acciones de Divulgación

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|-----------|---------|--------------|
|-----------|---------|--------------|

|  |                                                                                                           |               |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|  | No de Acciones de divulgación ejecutadas en el mes<br>No. de Acciones de divulgación Requeridas en el mes | 1* 100 %<br>1 | = 100% |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|

### 3.3 PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

#### 3.3.1 Levantamiento de actas de vecindad de Inicio

En el PAGA o Matriz inicialmente se relacionaron 32 actas las cuales se han levantado 14 coherentes con las necesidades del proyecto.

**Tabla 7** Acta de Vecindad de Inicio

| N° Acta | PROPIETARIOS | IDENTIFICACION | FECHA DE LEVANTAMIENTO | VEREDA y KM |
|---------|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| N/A     | N/A          | N/A            | N/A                    | N/A         |

**Anexo: 3** consolidado y acta de cierre

#### 3.3.2 Levantamiento permiso de obra

**Tabla 8** Permiso de obra de arte del mes

| N°  | PROPIETARIOS | FECHA DE LEVANTAMIENTO | VEREDA | TIPO DE PERMISO | COMPROMISO |
|-----|--------------|------------------------|--------|-----------------|------------|
| N/A | N/A          | N/A                    | N/A    | N/A             | N/A        |

**Ver Anexo 13.** Consolidado Permiso de obra, permiso de obra.

- Indicador de gestión**

**Tabla 9** Indicador Actas de Vecindad Levantadas.

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|-----------|---------|--------------|
|-----------|---------|--------------|

|  |                                                                                                         |       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | No de Actas De Vecindad Levantadas 14 * 100 %<br>No de Actas De Vecindad requeridas para el proyecto 32 | = 44% |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Indicador Actas de Vecindad de cierre

| INDICADOR | FORMULA                                                                                             | CUMPLIMIENTO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | No de Actas De Vecindad Levantadas 14 * 100 %<br>No de Actas De Vecindad cerradas en el proyecto 12 | = 86%        |

**Tabla 10** Indicador Permisos de Obra

| INDICADOR | FORMULA                                                                                               | CUMPLIMIENTO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | No. De Permisos de obra levantadas/ 20 * 100 %<br>No. Permisos de obra requeridas para el proyecto 20 | = 100%       |

**Anexo 3:** consolidado de actas de vecindad

### 3.4 PROYECTO 4. DE RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.

En los recorridos realizados para el levantamiento de información de la línea base del presente documento no se identificó ni evidencio la presencia de actividades económicas informales que ameriten procesos de traslado por la recuperación del derecho de vía. Por lo anterior este proyecto no aplicaría; sin embargo, se informa que una vez iniciadas las obras, en el momento en que se encuentren eventos nuevos dentro del derecho de vía, se levantará un censo y registro de los mismos; se realizara una coordinación interinstitucional para informar la situación y se logren tomar las acciones correspondientes.

### 3.5 PROYECTO 5. DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

Durante el presente periodo se realizo la reunión con la veeduría del contrato el ía 13 febrero de 2025, se abordaron los siguientes temas:

1. Se informa el inicio de elaboración de drenes horizontales en el muro 1 a muro 4, entre muro 7 y 8 se esta haciendo la construcción de alcantarilla, las alcantarillas existentes están colmatadas, cualquier información que requieran del contrato 2096 de 2022 lo encuentran en el SECOP II, la señalización vertical se instalo de acuerdo

con lo establecido en el diseño de señalización, de las OPC se encuentra pendiente la I.E cañofisto.

2. Se contó con la asistencia de 7 participantes
3. Próximo encuentro: 26 febrero de 2025, recorrido de obra

**Anexo 2:** Consolidado de Comité de participación Comunitaria y/o veeduría ciudadana.

**Tabla 11** Indicador Comité de Participación

| INDICADOR | FORMULA                                                                            |                   | CUMPLIMIENTO |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|           | No. De Reuniones realizadas con el CPC/<br>No. De Reuniones programadas con el CPC | $1 * 100 \%$<br>1 | =100 %       |

### 3.6 PROYECTO 6. DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

Durante el desarrollo del proyecto en el presente periodo el Consorcio vías y equipos Tolima Sur ha contratado 24 personas para mano de obra no calificada y calificada de la región.

A continuación, se relaciona el personal de mano de obra no calificada y calificada que ha sido contratado para la ejecución de las actividades de obra:

**Tabla 12.** Personal de Obra NO Calificada y Calificada de la Región

| CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 |                                    |                |                                 |             |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| Nº                                       | NOMBRE                             | IDENTIFICACIÓN | CARGO                           | PROCEDENCIA |
| 1                                        | JERLEY RIOBO USECHE                | 1108831993     | OPERADOR DE CARGADOR            | ATACO       |
| 2                                        | ROSMERY GUTIERREZ LUNA             | 20959168       | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | ATACO       |
| 4                                        | MILTON JOVANNY GALINDO MUÑOZ       | 5828309        | OPERADOR PLANTA CONCRETO        | ATACO       |
| 5                                        | CESAR CAMACHO CAVIEDES             | 1106778217     | OPERADOR DE MOTONIVELADORA      | PLANADAS    |
| 7                                        | EMMANUEL GALEANO LOZANO CUBILLOS   | 1000805218     | CONDUCTOR DE MIXER              | ATACO       |
| 8                                        | MAURICIO BEDOYA LUNA               | 1110458064     | OPERADOR RETROCARGADOR          | PLANADAS    |
| 9                                        | YILMAR SEBASTIAN DELGADO HERNANDEZ | 1005996888     | OFICIOS VARIOS                  | ATACO       |
| 10                                       | ARLEY RODRIGUEZ SUAREZ             | 93445702       | OFICIOS VARIOS                  | ATACO       |

**Contrato de obra 2096-2022 Ataco-Planadas Tolima**

|    |                               |            |                         |          |
|----|-------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 11 | EDWIN ANDRES QUINTERO TOVAR   | 1108828041 | OFICIOS VARIOS          | ATACO    |
| 12 | DANIEL FELIPE GUARNIZO OSPINA | 1110506075 | ALMACENISTA             | ATACO    |
| 13 | HERNAN DE JESUS MONTOYA RIOS  | 98641930   | OPERADOR TRITURADORA    | ATACO    |
| 14 | JAIR YAGUARA                  | 93478355   | OFICIOS VARIOS          | ATACO    |
| 15 | JUAN JOSE ROMERO LOPEZ        | 5789953    | OFICIOS VARIOS          | ATACO    |
| 16 | JOSE MEDARDO QUINTERO         | 1030587034 | OFICIOS VARIOS          | ATACO    |
| 17 | ANDRES FELIPE GOMEZ           | 1075276493 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA  | ATACO    |
| 18 | BRAYAN MORENO                 | 1106786632 | OPERADOR DE CARGADOR    | ATACO    |
| 19 | EDISON PEÑA TIQUE             | 1005996996 | CONDUCTOR DE VOLQUETA   | ATACO    |
| 20 | MILTON GUTIERREZ              | 1109410406 | CONDUCTOR DE VOLQUETA   | ATACO    |
| 21 | GABRIEL TAPIA                 | 1109415012 | AUXILIAR DE LABORATORIO | ATACO    |
| 22 | EDUARDO HUMBERTO CHARRY       | 1110536217 | OFICIOS VARIOS          | PLANADAS |
| 23 | EIVER STIVEN ARROYO           | 1109413341 | OFICIOS VARIOS          | PLANADAS |
| 24 | JHON FREDY ORTIZ              | 1005996304 | OFICIOS VARIOS          | PLANADAS |
| 25 | JHON EDICSON RINCON           | 1007721163 | OFICIOS VARIOS          | PLANADAS |

| HERNANDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES |                                |                |                   |            |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Nº                                | NOMBRE                         | IDENTIFICACIÓN | CARGO             | RESIDENCIA |
| 1                                 | HAIVER SANCHEZ AVILEZ          | 14192086       | AYUDANTE PRACTICO | VDA CONDOR |
| 2                                 | ROBINSON JAVIER CULMA MOYA     | 1108829419     | AYUDANTE PRACTICO | EL CONDOR  |
| 3                                 | EDINSON LAGUNA DUCUARA         | 5855160        | MAESTRO           | PLANADAS   |
| 4                                 | CARLOS JULIO MENDEZ QUITORA    | 1072366899     | AYUDANTE          | ATACO      |
| 5                                 | ESLEIDER MONTIEL PRADA         | 1005995911     | AYUDANTE PRACTICO | VDA DORADA |
| 6                                 | EUDER SECUNDINO ARANDA PENAGOS | 14252422       | OFICIOS VARIOS    | CUNDAY     |
| 7                                 | OSNAIVE JOSE DIAZ              | 1069489988     | OFICIOS VARIOS    | CHAPARRAL  |
| 8                                 | YENIFER ALEXA SANCHEZ ROJAS    | 11105868361    | SST               | ATACO      |
| 9                                 | YERSON YAMIL BETANCOURT        | 14013391       | OFICIOS VARIOS    | PLANADAS   |
| 10                                | HECTOR ALONSO PEREA            | 11938051       | OFICIOS VARIOS    | PLANADAS   |
| 11                                | DANNY LORENA POLANIA           | 1005995363     | AUXILIAR VIAL     | ATACO      |
| 12                                | JHON FREDDY AREVALO            | 1070730325     | MAESTRO           | PANDI      |
| 13                                | MAURICIO OLEA BURGOS           | 1003343037     | OFICIOS VARIOS    | MEDELLIN   |

|    |                |            |                |          |
|----|----------------|------------|----------------|----------|
| 14 | JHONIER OVIEDO | 1006027739 | OFICIOS VARIOS | BRUSELAS |
|----|----------------|------------|----------------|----------|

| CONSTRUCCIONES SOBRE LA ROCA |                                    |                |                            |                       |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Nº                           | NOMBRE                             | IDENTIFICACIÓN | CARGO                      | RESIDENCIA            |
| 1                            | JHONATAN ARLEY TAMBO               | 105522855      | MAESTRO                    | BOYACA                |
| 2                            | SADY DANIEL BELTRAN                | 1072744306     | OFICIOS VARIOS             | CAPARAPI CUNDINAMARCA |
| 3                            | DANNY MILENA SERRANO               | 36195377       | AUXILIAR VIAL              | CONDOR                |
| 4                            | ERIKA JULIETH HENAO BALLESTEROS    | 1007790189     | SST                        | GAITANIA              |
| 5                            | WLADIMIR JOSE GARCIA               | 5991546        | CONDUCTOR Y OFICIOS VARIOS | VENEZUELA             |
| 6                            | CARLOS FRANCISCO RIVAS GOMEZ       | 18396550       | OFICIOS VARIOS             | MEDELLIN              |
| 7                            | DANNY LORENA POLANIA SERRANO       | 1005995363     | AUXILIAR VIAL              | CONDOR                |
| 8                            | OSCAR FERNANDO ANGARITA CRISTANCHO | 13993399       | OFICIOS VARIOS             | CAJAMARCA             |
| 9                            | ANGEL GABRIEL RINCON RAMOS         | 1.007.063.687  | OFICIOS VARIOS             | PLANADAS              |
| 10                           | MARCOS TOVAR ORTIZ                 | 14191004       | OFICIOS VARIOS             | ATACO                 |

- Indicadores de gestión:

**Tabla 13.** Indicador Generación de Empleo

| OBRA<br><br>CONTRATO 2096-2022     | GENERACIÓN DE EMPLEO                     |         |              |                            |         |              |                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|---------|--------------|------------------|
|                                    | CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 |         |              |                            |         |              |                  |
|                                    | MANO DE OBRA CALIFICADA                  |         |              | MANO DE OBRA NO CALIFICADA |         |              | Total,<br>Empleo |
|                                    | Local                                    | Externa | Sub<br>Total | Local                      | Externa | Sub<br>total |                  |
| Del 26 enero al 25 febrero de 2025 | 15                                       | 16      | 31           | 23                         | 6       | 29           | 60               |

| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de Indicador:       | Personal del AID                              |
| Indicador de calificación: | No. Mano de Obra No Calificada Local X 100    |
|                            | No. Mano de Obra No Calificada en el Proyecto |
|                            | 23 / 29 X 100 = 79%                           |

Siendo el 40% lo contractual durante el presente periodo laboró el 77% de la región de mano de obra no calificada.

**Anexo 2:** se adjunta planilla de generación de empleo

El día 10 febrero de 2025 se realizó la capacitación en inteligencia y manejo de emociones

**Anexo 13:** Acta y planilla de asistencia.

### **Proyecto 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O (OPC) OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PGS-6.7-24).**

Teniendo en cuenta reunión definitiva del 26 de abril del año en curso con la interventoría, el contratista y la gestión social de la Subdirección de Sostenibilidad- INVIAS, el proyecto productivo no fue aprobado para el presente contrato a razón de falta de tiempo y metodología de sostenibilidad.

### **OBRAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**

Teniendo en cuenta reunión del 26 de abril del 2023 con la participación del contratista, interventoría y gestión social de la subdirección de sostenibilidad, este proyecto queda con dos actividades:

1. Instalación de parques infantiles de madera en tres instituciones educativas del área de influencia las cuales por medio de oficio No. El día 14 de agosto se recibe de la interventoría oficio no. C2-1570-0BR096-2023 de la interventoría fueron aprobadas con las respectivas cotizaciones.
2. De acuerdo con dicha reunión del 26 de abril, que, por definición de la no aprobación del proyecto productivo, se robusteció las obras de participación comunitaria. Por consiguiente, se presentó a la interventoría con oficio de radicado No. CSPLT0000330 el nuevo documento de OPC en el que se relaciona una segunda actividad llamada "mejoras locativas" en cada una de las instituciones educativas beneficiarias de los parques infantiles, de lo cual la interventoría mediante oficio de radicado No. C2-1570-0BR102-2023, remite su aprobación.

**Dicho lo anterior se informa lo siguiente:**

Durante el periodo reportado se tienen finalizadas las actividades de mejoras locativas en la Institución Educativa las Señoritas y en la Institución Educativa el Condor, actualmente se están ejecutando actividades en la Institución Educativa de Caño fisto. Se lleva un porcentaje de avance del 67% en la ejecución de las mejoras locativas.

Las actividades de mejoras locativas en el Institución Educativa de cañofisto se realizarán y terminarán en la semana del 10 al 14 marzo de 2025.

**Tabla 14** Indicador Proyectos Productivos y Obras de Participación Comunitaria

| INDICADOR | FORMULA                                                                                                                                        | CUMPLIMIENTO |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | $\frac{\text{Nº de obras de participación comunitarias ejecutados 1/}}{\text{Nº de obras de participación comunitarias aprobados 2}} * 100 \%$ | = 50%        |
|           |                                                                                                                                                |              |

**Proyecto 8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL (PGS-6.8-25)**

Conforme la normativa aplicable, es nuestra responsabilidad proteger el Patrimonio Arqueológico y los Bienes de Interés Cultural y Religioso de la Nación ubicados en el área de Influencia del Proyecto (AI); atendiendo el decreto No. 138 de 2019, Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, el programa de manejo de arqueología deberá ser implementado por los Proyectos que requieran Licencia Ambiental, por lo que para el presente Proyecto no aplicaría.

Igualmente, las obras a ejecutar se realizarán sobre la vía ya existente, es decir, que el entorno del corredor ya ha sido intervenido previamente, y no se proyecta ampliación o apertura de nuevos tramos; sin embargo, para este proyecto se realizó la consulta.

Dicho lo anterior, el proyecto cuenta con la respuesta del ICANH No. 2022162000065851 que reza: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", localizado en los municipios de Ataco y Planadas, departamento de Tolima, no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva.

Por otro lado, mediante oficio de rdo No. CSPLTO000142, se recibió la resolución número ST-1556 de 24Oct 2022 Consulta Previa. Medio por el cual responde el MINTERIOR que para el contrato 2096 del 15 de marzo de 2022 "CONTRATAR EL

**Contrato de obra 2096-2022 Ataco-Planadas Tolima**

MEJORAMIENTO DE VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" no procede a la realización de consulta previa.

No obstante, teniendo en cuenta que a la interventoría ya se le radico el PAGA, a este se le adjuntó el documento "el plan de manejo de hallazgo arqueológicos" se ha realizado capacitación al personal de obra en la fecha 20 de agosto del 2022 y 18 de marzo del presente año.

## **Anexo**

# **MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto**

## **Anexo 1**

# **Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos**

## **Anexo 2**

**Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3**  
**Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales**  
**con sus respectivos anexos. Los cuales, también**  
**hace parte del informe ejecutivo del presente**  
**periodo**

## **Anexo 2.7**

# **Consolidado Reuniones Comité de Participación Comunitarias**

## **Anexo 3**

### **Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad**

## **Anexo 4**

### **Formatos y soportes relacionados con manifestaciones ciudadanas**

## **Anexo 5**

### **Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social y soportes**

**No aplica para el presente periodo**

## **Anexo 6**

# **Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto y soportes**

## **Anexo 7**

# **Copia de formatos y soportes en uso del Instructivo para la Gestión Sociopredial MASPS-MN1-IN-4.**

**No aplica para el proyecto**

## **Anexo 8**

**Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto entregado mensualmente por el Contratista y formatos de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados semestralmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el componente social.**

## **Anexo 9**

### **Anexos por ficha o proyecto no incluidos antes**

## **Anexo 10**

**Copia de actos administrativos generados  
durante la ejecución del proyecto.**

**No aplica**

## **Anexo 11**

### **Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoría.**

## **Anexo 12**

**Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión, de todo comité que incluya al componente social.**

## **Anexo 13**

### **Otros : Consolidado Permisos de Obra Capacitación Social**
