



7. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

7.1 Limpieza de las obras de drenaje.

Se deben realizar las labores de limpieza general, estas labores consideran la recolección y retiro de basuras y desechos, el retiro de obstáculo, animales muertos, remoción de elementos invasores

7.2 La rocería de las zonas laterales.

Esta actividad consiste en el trabajo de eliminación selectiva de vegetación existente en las zonas laterales de la vía, además considera la limpieza de residuos vegetales, que en la mayoría de los casos se manifiesta en maleza o especies invasoras, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos y así garantizar que las obras no se van a deteriorar por presencia de vegetación. La disposición de estos debe realizarse en sitios aprobados.



8. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

Uno de los principales atributos de las placas huellas es reducir los costos en construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento tradicional. Sin embargo, es necesario efectuar las operaciones de mantenimiento con el fin de inspeccionar y mantener un adecuado estado del pavimento.

8.1 Inspección visual.

Se recomienda realizar inspección visual del mejoramiento realizado de forma periódica, con el fin de identificar la condición de la vía y hallar patologías existentes. En todo caso de presentarse alguna patología, se debe consultar un técnico especializado.

8.2 Reparaciones superficiales del concreto.

Los deterioros superficiales menores (descamados, desportilladuras, etc.) se podrán realizar mediante la demarcación del área a reparar, se hará remoción del concreto deteriorado, Limpieza de la superficie, reparación de las juntas y aplicación de un puente de adherencia, colocación, terminación y curado del material de relleno. y sellado de las juntas. La selección de materiales debe ser adelantado por un profesional. Sin carácter limitante, se pueden mencionar los morteros y concretos convencionales y los morteros a base de resinas sintéticas



9. PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

9.1 Mantenimientos rutinarios

Tabla 1 Mantenimientos rutinarios

OPERACIÓN	FRECUENCIA
Rocería de las zonas laterales	Por lo menos dos veces al año, se sugiere en periodos diferente a la temporada de lluvias que o cada vez que la inspección de como resultado que se debe realizar limpieza.

Fuente: AASING S.A.S

9.2 Mantenimientos periódicos

Tabla 2 Mantenimientos periódicos

OPERACIÓN	FRECUENCIA
Inspección visual	Periodicidad superior a un año.
Reparaciones superficiales del concreto	Periodicidad superior a un año o cada vez que se presenten.

Fuente: AASING S.A.S



10. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RECOMENDADAS

A continuación, se describe de manera detallada cómo debe estructurarse y diligenciarse la bitácora de mantenimiento, entendida como el documento o registro oficial en el que se consignan todas las actividades de inspección y mantenimiento realizadas sobre las estructuras de placa huella:

10.1 Propósito de la bitácora de mantenimiento

- Registrar de manera sistemática todas las actividades de inspección y mantenimiento, incluyendo fechas, responsables, acciones tomadas y observaciones relevantes.
- Proveer trazabilidad y evidencia documental de las acciones correctivas o preventivas efectuadas, así como de las condiciones en que se encuentra la obra en cada inspección.
- Facilitar la toma de decisiones en caso de requerir intervenciones adicionales, reforzamientos o reparaciones mayores.
- Garantizar la continuidad y coherencia de los trabajos de mantenimiento a lo largo del tiempo, permitiendo que futuras administraciones o equipos técnicos accedan al historial completo de la obra.

10.2 Frecuencia de diligenciamiento

Se recomienda actualizar la bitácora:

- Cada vez que se realice una inspección de rutina.
- Después de eventos de lluvias intensas, sismos o cualquier fenómeno que pueda comprometer la estabilidad de la estructura.
- Al efectuar una inspección detallada.
- Durante y después de cada actividad de mantenimiento, ya sea correctiva o preventiva.

10.3 Contenido mínimo recomendado

A continuación, se listan los campos o secciones que deben incluirse en cada registro de la bitácora. Para una mejor organización, se sugiere el uso de tablas o formatos prediseñados:

- Fecha y hora:

Registrar el día, mes, año y la hora de inicio y fin de la actividad o inspección.



- Nombre de la obra o sección intervenida:
Identificar claramente la sección de la estructura donde se realizó la actividad.
- Equipo responsable / Nombre de los inspectores o técnicos:
Indicar quién o quiénes llevaron a cabo la inspección o el mantenimiento.
- Descripción de la actividad:
Detalle la acción ejecutada:
 - Inspección visual.
 - Retiro de escombros.
 - Reposición de piedras.
 - Ajuste de la malla metálica.
 - Revisión de la subbase, etc.
 - Mencionar si se utilizaron herramientas o equipos especiales.
- Observaciones y hallazgos:
Registrar cualquier anomalía o condición relevante encontrada, como fisuras, deformaciones, corrosión de elementos metálicos, asentamientos, pérdida de material, etc.
Anotar signos de humedad o filtraciones que puedan requerir atención.
Mencionar el estado general de la estructura (bueno, regular, crítico).
- Acciones correctivas o preventivas realizadas:
Describir de manera específica qué se hizo para corregir o prevenir el problema observado.
- Materiales utilizados (si aplica):
Enumerar los insumos o materiales empleados, indicando cantidades ejecutadas para cada una de las actividades de mantenimiento realizadas.
- Recomendaciones / acciones futuras:
Registrar sugerencias o necesidades detectadas para un mantenimiento posterior, así como la fecha tentativa para la próxima inspección.
- Registro fotográfico de la bitácora:
El registro fotográfico de la bitácora es un elemento fundamental en el reporte de seguimiento y control al mantenimiento de la obra, debido a que aporta evidencia indiscutible del estado de la estructura en un momento específico de tiempo.

Por lo anterior, se recomienda que el o los formatos de registro fotográfico contengan al menos información técnica tal como fecha y hora, localización y orientación y descripción breve o comentario de la fotografía que destaque aspectos críticos, anomalías o avances en el mantenimiento.

Adicionalmente, la calidad de las imágenes es fundamental para garantizar la visibilidad de detalles importantes como grietas, fisuras, corrosión en la malla o signos de asentamientos, por lo tanto, se recomienda tomar fotografías desde distintos ángulos y perspectivas para cubrir





de manera completa cada sección del gavión. Esto incluye tomas generales y acercamientos específicos en áreas críticas.

Así mismo, como parte integral de la bitácora, para el registro fotográfico realizado en cada inspección o mantenimiento, se recomienda establecer un protocolo fotográfico que defina los puntos clave a documentar en cada inspección, asegurando la consistencia en el registro a lo largo del tiempo.

10.4 Conservación y archivo de la bitácora

Se recomienda mantener la bitácora en un lugar accesible para el personal autorizado y, preferiblemente, contar con una copia de respaldo en formato digital.





11. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. Personal calificado:

El mantenimiento debe ser realizado por personal con experiencia en obras civiles y construcción y/o mantenimiento de placa huellas, adicionalmente, como se ha mencionado en el presente manual, cada una de las intervenciones que se vayan a ejecutar por parte del personal deben contar con previa aprobación por parte de la entidad contratante, así como que se debe contar con el acompañamiento y supervisión de un profesional especialista en el área con el propósito de garantizar un buen mantenimiento de la obra.

2. Equipo de protección personal (EPP)

Se requiere que el personal que realizará los mantenimientos use casco, guantes, botas de seguridad, arnés, chaleco reflectivo, gafas de protección.

Adicionalmente, se recomienda capacitar al personal que intervendrá en las actividades de mantenimiento, sobre el uso adecuado y la necesidad de la implementación de dichos elementos de protección personal, así como el actuar en caso de presentarse una contingencia durante la ejecución del mantenimiento.

3. Delimitación y señalización del área de trabajo:

Cuando se realicen trabajos de mantenimiento, se deben instalar señales de precaución y, de ser necesario, desvíos provisionales. Lo anterior incluye, establecer un perímetro de seguridad claro alrededor del muro.

4. Monitoreo de condiciones climáticas:

Evitar trabajos de mantenimiento en días de lluvia intensa o cuando existan alertas de deslizamientos en la zona.

En este apartado, es imperante recordar que se desarrollaran actividades de un riesgo medio-alto, toda vez que las actividades de mantenimiento se ejecutaran en un muro de contención, el cual colinda con una quebrada, por lo que es de vital importancia previo a la realización de cualquier intervención, realizar un monitoreo de las condiciones climáticas y en caso de presentarse lluvias intensas que generen inestabilidad en el caudal de la quebrada, considerar suspender las actividades.



12. RECOMENDACIONES GENERALES

12.1 Técnicas

- Realizar la ejecución de todas las actividades de mantenimiento, y ante cualquier inquietud que se presente consultar con la entidad contratante (Municipio de La Vega)
- Se solicita no realizar actividades invasivas y no invasivas con el fin de proteger la integridad de las obras civiles realizadas.
- Realizar revisión periódica, identificando patología, daño o suciedad; presente en la estructura vial, con el fin de diagnosticarlas y solucionarlas tempranamente.
- Se recomienda que cada vez que se vaya a realizar una actividad de mantenimiento, se haga con el acompañamiento de un experto en el área, para garantizar la buena ejecución de este.
- Es importante que el municipio genere bitácora e informes de mantenimiento con su correspondiente registro fotográfico.
- Es indispensable que no se realicen reparaciones ni intervenciones a lo largo de las zonas de intervención sin autorización del contratista, ya que durante el periodo de garantía no se podrán realizar actividades por parte de terceros. De lo contrario no se dispondrá de las garantías correspondientes.
- Es importante que el municipio realice la señalización horizontal y vertical de control de velocidad y capacidad (peso) de los vehículos para que el tránsito que se cuenta en la zona no supere el permitido por el diseño de placa huella teniendo en cuenta que es una vía de tercer orden.
- En caso de presentarse condiciones de flujo de agua o humedades adyacentes a las placas huellas construidas, el municipio deberá gestionar de manera inmediata la instalación de filtros o sistemas pertinentes para conservar y garantizar la estabilidad de las obras, esto teniendo en cuenta que presupuestalmente no se contempló la instalación y ejecución de dichas actividades.





12.2 SG-SST

- Los operarios o trabajadores se deberán encontrar en perfecto estado físico y mental, para la realización de cada una de las actividades de mantenimiento.
- El personal debe portar en todo momento la dotación que se le haya entregado y la cual lo identifique como trabajadores.
- El uso y conservación de los EPP deben ser obligatorios para la totalidad del tiempo que dure la actividad.

12.3 ADMINISTRATIVAS

- Se recomienda al municipio, vigilar el uso adecuado de las obras civiles realizadas, especialmente que no se depositen materiales y obstáculos en las obras de drenaje.
- Realizar y radicar evidencias físicas de cada uno de los mantenimientos realizados.



13. CONCLUSIONES

- Es importante realizar un control de los periodos en los cuales se realiza mantenimientos y evidenciar el estado de la vía.
- Es primordial realizar cada uno de los mantenimientos expuestos en este manual, para garantizar la calidad y de las obras de mejoramiento realizadas.
- En las ocasiones que se vaya a realizar o a proceder con algún mantenimiento, se debe tener la certeza y la validación de un experto en el área que se va a intervenir, con el fin de ejecutarlo debidamente.
- Cada vez que se desee modificar alguna de las estructuras, se deberá acudir a un profesional en el tema, con el fin de garantizar la calidad de las obras civiles realizadas.
- Todos los materiales extraídos o sobrantes deberán ser recogidos, cargados y transportados a sitios autorizados de vertimiento, donde se dispondrán de la forma exigida por la autoridad ambiental correspondiente.
- El municipio deberá garantizar los mantenimientos descritos en este documento, igualmente deberán consignarse en bitácora e informes con su respectivo registro fotográfico, adicionalmente el municipio se encargará de realizar los trámites pertinentes para garantizar la señalización de las vías ejecutadas de tal manera se reduzca la velocidad de tráfico y no se permita la circulación de vehículos de carga pesada sobre las mismas.
- El municipio dentro de las revisiones periódicas verificara que no se presenten condiciones de humedades y/o infiltraciones de agua a las zonas de ejecución de placa huella, dado el caso que se presente, el municipio garantizara la implementación y ejecución inmediata de filtros u otros sistemas para velar por la estabilidad de las obras generadas en pro de extender la vida útil de las vías terciarias disponibles.





14. BIBLIOGRAFÍA

- INVIAS. (2015). *Guía de diseño de pavimentos con placa huella*. Obtenido de Instituto Nacional de Vías:
<https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6644-guia-de-disenoo-de-pavimentos-con-placa-huella/file>
- INVIAS. (2015). *Instituto Nacional de Vías*. Obtenido de Guía de diseño de pavimentos con placa-huella:
<https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6644-guia-de-disenoo-de-pavimentos-con-placa-huella/file>
- SENA. (s.f.). *Formación complementaria, prevención y construcción de obras de arte para vías*. Obtenido de MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PARA VÍAS: <http://files.construccion-de-edificaciones.webnode.com.co/200000172-5bdeb5cd84/MANTENIMIENTO%20DE%20OBRAS%20DE%20DRENAJE%20PARA%20VIAS.pdf>



	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se da inicio al comité de obra No. 1 de seguimiento y control en presencia del Ing. Dayron Alexis Celis capo a la supervisión del Municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto Chaz director de obra de proyectos de Ingeniería, Diseños, Construcciones y consultorías SAS (IASING SAS) en calidad de interventoría de Agroambiental. Interventoría y obras civiles SAS en su calidad de interventoría.

1) Se establecen los medios de comunicación oficiales por parte del controlista de obra e interventoría, junto con la supervisión.

2) Se socializa por parte de la interventoría la revisión anal y entrega de la documentación inicial solicitada para el controlista de obra como hoja de vida de los profesionales, programa de obra, Análisis de precios unitarios, certificaciones de disponibilidad de maquinaria y PNT para el control de obra No 161 - 2025.

3) Se socializa cuales serán los alcances reales para cada uno de los convenios ICCU 717, 742, 802 y 904.

4) Por parte del controlista de obra informa que ya se realizó el trasiego de varillas de acero para la viga del Chupal en los sectores el puente y curvaditas; a su vez, informan que ya se tiene personal de obra trabajando en el corte y figuredo de acero para las parrillas de los carriles, viguetas y anclajes.

5) Por parte de la supervisión del municipio comunican que se debe ir revisando el tramo de vía de la vega Minas sector la herradura para ejecutar este tramo adicional, ya que, la comunidad del sector ha solicitado a la administración municipal el arreglo de la vía en este sector para mejorar las condiciones de accesibilidad.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega registro Fotográfico semanal para la Supervisión	18/06/2025	Contratista-Interventoría
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

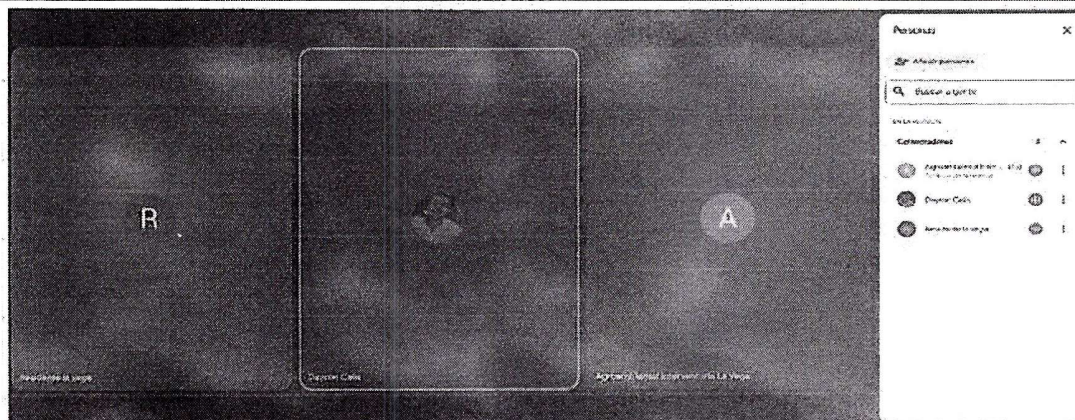
PARTICIPANTES		
Nombre	Darwin Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de planeación	
Correo electrónico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202592370	
Nombre	Laura Rocio Galindo Cordero	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoras y Obras Civiles	Laura Galindo
Correo electrónico	agroambiental.interventoras@gmail.com	
Teléfono	3223812342	
Nombre	Firdy Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoras y Obras Civiles	
Correo electrónico	agroambiental.interventoras@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Rindo	Firma
En representacion de	AASTING SAS	3050c.
Correo electrónico	aasting.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo electrónico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que Intervienen.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:05 am del 18 de junio de 2025 inicia el comité virtual de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia del Ing. Alexis Celis, apoyo a la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS



1.) Lectura de compromisos del acta de comité No. 01

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 167-2025, se leen los compromisos del acta de comité No. 01 donde el Ing. Alexis Celis pregunta sobre el cumplimiento de la creación y entrega del archivo de registro fotográfico semanal de las actividades hechas en cada convenio referente al presente contrato, a lo que el Ing. Juan Carlos informa que se viene trabajando en la actualización de la información de la semana pasada, en tanto se tenga completado el cargue total de la información se le compartirá a la supervisión.

2.) Socialización del avance en la solicitud de las vallas informativas

El Ing. Juan Carlos Pinto pregunta al Ing. Alexis Celis sobre el estado de la solicitud hecha por el municipio al ICCU para el diseño de la Valla Informativa de cada uno de los convenios en referencia del presente contrato, a lo que el Ing. Alexis Celis informa que para el contrato C-OBRA No. 167-2025 ya se realizó la solicitud al ICCU para los Convenios No. 717 y No. 802. También informa que esta solicitud ya fue atendida por parte del ICCU y se esta a la espera del envío por parte del ICCU para hacer entrega al contratista e interventoría para que se haga seguimiento a la correcta instalación de estas vallas en cada uno de los tramos del contrato de obra No. 167-2025

De igual forma, el Ing. Alexis Celis informa que no se ha hecho la solicitud al ICCU para los Convenios No. 742-2025 (Sector Laguna 2) y No. 904-2025 (Sector El Milagro) ya que en estos sectores no se ha hecho la conformación de la vía dado que, según informa el Ing. Juan Carlos Pinto no se puede realizar el cierre de estos dos tramos porque son las zonas de acceso de la Vereda Chupal hacia los dos tramos que están en ejecución que son Sector El Puente y Sector Cascadas.

Por lo tanto, hasta que no se haga la conformación de la vía no se puede enviar el registro fotográfico solicitado por el ICCU para el diseño de la valla Informativa del convenio. Por lo que se está a la espera de que el contratista de obra avance con el suministro de material hacia los dos tramos activos para poder cerrar el paso en esta zona y hacer la conformación de la vía.

3.) Socialización del avance de actividades

La Ing. Laura Galindo, solicita al Ing. Juan Carlos Pinto informe sobre los avances en las actividades de obra que se llevan hasta la fecha del presente comité, a lo que el Ing. Juan Carlos informa que para el Convenio 717-2024, Vereda Chupal Sector El Puente, se viene trabajando en el amarre y figurado del acero para poder iniciar la siguiente semana con las excavaciones necesarias y la instalación de formaleta para iniciar con la fundida de los carriles. También que ya se hizo el trasiego y acopio de 200 Bultos de cemento hasta el sitio para iniciar con estas actividades.

También informa el Ing. Juan Carlos Pinto, que para el Convenio No. 802-2024 Vereda El Chupal Sector Cascadas, se continua trabajando en el corte, amarre y figurado de acero para las parrillas de los carriles y refuerzo de cunetas. A su vez, ya se realizó el trasiego de formaleta, 180 bultos de cemento y se llevó ya un viaje de piedra rajón para su acopio.

1542

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

4.) Socialización de posible adición de tramos

El Ing. Alexis Celis menciona que de acuerdo con las solicitudes hechas por la comunidad del sector, es necesario ir evaluando una posible adición al contrato en referencia para ejecutar la construcción de un tramo de vía en la vereda Guarumal Sector El Jardín y la vereda Minas Sector La Herradura.

5.) Revisión de Documentos Iniciales Aportados por Contratista de Obra

El Ing. Alexis Celis comunica que ya fue recibida y revisada la información inicial solicitada por la interventoría así como el aval de la misma, sin embargo, en dicha revisión resalta que dentro de las obligaciones específicas del contrato de obra, solicitar la entrega del PAPSO y protocolos de Bioseguridad, a lo que el Ing. Juan Carlos Pinto responde que esta información ya no tiene validez ya que en la resolución 2624 de 2024 "Por la cual se deroga la resolución 676 de 2020 "Por lo cual se establece el sistema de información para el reporte y seguimiento de las personas afectadas por COVID-19 modificada por la resolución 992 de 2020"

Siendo las 9:44 am del 18 de junio de 2025 se da por finalizada el comité de seguimiento y control No. 02 para el contrato de obra C-OBRA-167-2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Próximo Comité de Seguimiento y Control de Obra No. 03	25/06/2025	Interventoría - Supervisión - Contratista de
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR	
El Ing. Alexis Celis menciona que se hace necesario evaluar los tramos anteriormente para adicionar al contrato.	

ANEXOS	

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaría de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocío Galindo Castro	Firma Laura Galindo.
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223092392	
Nombre	Fredy Alexander Martínez	Firma 
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma 
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo electrónico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. de

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:02 a.m se inicia el comité de seguimiento y control No. 03 para el contrato de obra No. 03) 167-2025 en presencia de la Arg. Laura Ortiz, secretaria de Planeación e Infraestructura, el Ing. Juan Carlos Pinto, director de Obra y la Ing. Laura Galindo, Residente de Interventoría.

1.) Socialización Subsanciones SG-SST Obra

La Ing. Laura Galindo informa que ya fueron recibidos las subsanciones del contratista de obra al SG-SST y que a su vez, esta interventoría realizó el aval y traslado de esta información a la supervisión para su revisión y aprobación.

2.) Socialización Solicitud Vallas Informativas

La Arg. Laura Ortiz informa que ya se recibió el diseño de las vallas informativas para los convenios ICCU No. 717-2024 y No. 802-2024, sin embargo, las dimensiones de las vallas informativas enviadas por el ICCU son de 5 m de ancho por 3 m de alto, por lo que el Ing. Juan Carlos Pinto comunica que de acuerdo con la circular No. 017 de 2025 del ICCU las dimensiones de las vallas son de 2 m de ancho por 1.5 m de alto teniendo en cuenta que la inversión tanto por convenio, como del contrato, no supera los 500 SMMLV, por lo tanto la Arg. Laura Ortiz solicitará la modificación al ICCU.

3.) Ejecución de las actividades

El contratista informa para el convenio ICCU 717-2024 de la Vda. Chopal, sector el Puente ya se finalizó con el corte, fijado y armado de acero; se viene trabajando en el suministro de arena de río y Grava para que a finales de esta semana se inicie con la fundición de carriles en concreto.




 ROAMBIENTAL <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Actualizar el registro fotografico con las actividades ejecutadas.	02/07/25	Contratista
2	Modificaciones y/o adaptaciones a las dimensiones de las vallas informativas.	02/07/25	Supervisión
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

 AGROAMBIENTAL <small>AGROAMBIENTAL INTERVEGAS</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Viviana Ortiz	 Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	 Firma Laura Galindo
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	 Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	 Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo electrónico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo electrónico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

 AGROAMBIENTAL <small>AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA

☒

OBRA

☐


ACTA No. 04	FECHA: 09/07/2025
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-167-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CHUPAL CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR EL PUENTE SEGÚN CONVENIO ICCU 717 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TABACAL CON LA VEREDA CHUPAL SECTOR LAGUNA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 742 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR CASCADAS SEGÚN CONVENIO ICCU 802 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR EL MILAGRO SEGÚN CONVENIO ICCU 904 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA".	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Ajuda registro fotografico	02/07/2025		Contratista
2	Modificaciones y/o aclaraciones valores informativos.	02/07/2025		Supervisión
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

<p>1) Ejecución actividades obra</p> <p>2) valores informativos.</p> <p>3) Solicitudes Adición</p> <p>4) proposiciones y varios.</p> <p>Señalo las 10:40 a.m del 09 de julio de 2025 se reúnen supervisión, contratista de obra e interventoría para el comité No 04.</p> <p>1) Ejecución actividades obra.</p> <p>Ing. Juan Carlos Pineda director obra informa que en</p>

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Cuanto a convenio 717, se está en actividades de fundado de concretos.

En el convenio 742 se informa que debido a condiciones de entrega de materiales ya se podría dar inicio en la semana del 14 de julio de 2025.

En el convenio 802 de 2024 ya se está fundiendo concretos.

En el convenio 904 de 2024 se informa que debido a condiciones de entrega de materiales ya se podría dar inicio en la semana del 14 de julio de 2025.

2) Valor informativo

Ing. Laura Ortiz Supervisión, informa que aún se está pendiente de la revisión por parte del ICCU de los valores de los convenios 717 y 802. Se está pendiente de la entrega del registro fotográfico para los convenios 742 y 904.

3) Socialización Solicitudes Adición

Ing. Juan Carlos Prieto director obra informa que realizará entrega de documentos hoy 9 julio 2025.

Ing. Laura Galindo interviniente, informa que realizará la revisión y el trámite correspondiente una vez reciba la información.

4) proposiciones y varios.

Ing. Laura Ortiz supervisión, solicita se realice entrega de certificado de no



ACTA COMITÉ TÉCNICO

CÓDIGO: PI-IN-F04

VERSIÓN: 01

SEGUIMIENTO DE CONTRATO

VIGENCIA: 01-mar-14

Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

aplicabilidad de protocolo de Bioseguridad


Además solicita se realice entrega de registro
fotográfico de implementación del P&T, señalización





 ROAMBIENTAL <small>ORGANISMO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD AMBIENTAL</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PT-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega solicitud adición	09/07/2025	Contratista
2	Entrega certificado protocolo Dioseguridad	09/07/2025	Contratista
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Viviana Ortiz	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	planeacion@lavega.cundinamarca.gov.co	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocío Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.intervavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.intervavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo electrónico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA ☒


OBRA ☐

ACTA No. 05	FECHA: 16/07/2025
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-167-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CHUPAL CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR EL PUENTE SEGÚN CONVENIO ICCU 717 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TABACAL CON LA VEREDA CHUPAL SECTOR LAGUNA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 742 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR CASCADAS SEGÚN CONVENIO ICCU 802 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR EL MILAGRO SEGÚN CONVENIO ICCU 904 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega Documentos Solicitud Adición	09/07/2025	16/07/2025	Contratista
2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	16/07/2025	N/A	Contratista
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
2) Socialización Ejecución Obra
3) Adición Contrato
4) Proposiciones y Varios
Se da inicio a comité de obra del 16 de julio de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha el contratista de obra ha realizado entrega de los compromisos pactados
Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha tan solo tiene pendiente la entrega del certificado en cuanto al protocolo de bioseguridad
2) Socialización Ejecución Obra
Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera
Convenio 717

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

Se está en ejecución de placahuella, donde se tiene un avance de 21 ml de placahuella mas la rampa de acceso, se espera continuar con el ritmo de ejecución de obra, se proyecta ejecución de actividades un mes más

Convenio 742

No se han podido ejecutar actividades de obra debido a condiciones de logística con otras obras de la zona

Conveni 802

Se tienen 33 ml completos de placahuella más rampa de acceso, además se ha avanzado en 30 metros más de solo centros y sobreanchos en concreto ciclopeo

Conveni 904

Se informa que se están desarrollando actividades de figurado corte y amarrado de acero

3) Adición Contrato

Ing. Juan Carlos Pinto Chaves de contratista de obra informa que a la fecha realizó entrega de los documentos correspondientes


Ing. Laura Galindo de interventoría informa que efectivamente una vez recibida la información en cuanto a la adición, se realizó el aval correspondiente, por lo que a la fecha se encuentra radicado en la entidad contratante, radicado del 16 de julio de 2025

Supervisión Arq. Laura Ortiz Informa que en el entendido del recibo de la información el día de hoy, se realizará la revisión correspondiente

4) Propositiones y Varios

Se aclara por parte de supervisión que se realizará la revisión de los valores que se incluyan dentro de las vallas informativas para la presentación de este documento y proceder a la instalación de este por parte del contratista de obra



ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité Obra 23 Julio 2025	23/07/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR	

ANEXOS	

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Ortiz	Firma
En representación de	Sec. Planeación e infraestructura	
Correo electrónico	Planeacion@la.vega@andina.marca	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocío Galindo	Firma
En representación de	Agroambiental	
Correo electrónico	agroambiental.la.vega@gmail.com	

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-01-P01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01 mar 14
		Pág. 3º

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA ☒

OBRA ☐

ACTA No. 06		FECHA: 23/07/2025
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.	
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-167-2025		
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CHUPAL CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR EL PUENTE SEGÚN CONVENIO ICCU 717 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TABACAL CON LA VEREDA CHUPAL SECTOR LAGUNA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 742 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR CASCADAS SEGÚN CONVENIO ICCU 802 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR EL MILAGRO SEGÚN CONVENIO ICCU 904 – 2024 Y OTRAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA”.		
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA		

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité Obra 23 Julio 2025	23/07/2025	23/07/2025	Contratista
2				
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
2) Socialización Ejecución Obra
3) Adición Contrato
4) Propositiones y Varios
Se da inicio a comité de obra del 16 de julio de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha el contratista de obra ha realizado entrega de los compromisos pactados
Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha tan solo tiene pendiente la entrega del certificado en cuanto al protocolo de bioseguridad
2) Socialización Ejecución Obra
Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera
Convenio 717

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PT-4M-F01
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ... de ...

Se informa que a la fecha se han realizado 42 ml en su totalidad, se buscará la forma de reforzar el personal de obra para la ejecución de actividades

Convenio 742

No se han podido ejecutar actividades de obra debido a condiciones de logística con otras obras de la zona

Conveni 802

Se informa que a la fecha se cuenta con un 90% de ejecución, se está en fundida de sobreanchos y bordillos, por lo que se espera que el día lunes 28 de julio se pueda realizar la entrega de la placahuella

Conveni 904

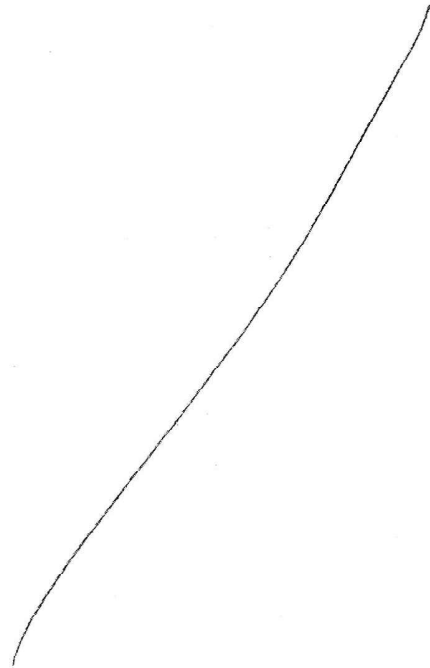
Se está iniciando actividades de fundida de placahuellas el día de hoy 23 de julio de 2025


3) Adición Contrato

Ingeniero Alexis Celis de supervisión informa que se realizará la revisión en cuanto a la inclusión de ítems no previstos y efectuara la consulta correspondiente ante la oficina de contratación para el trámite pertinente

4) Propositiones y Varios

Se solicita por parte de supervisión Ing. Alexis Celis de supervisión que se debe realizar seguimiento a diseño de mezcla y la toma de muestras respectivas para los concretos de las placahuellas



	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PE-IB-004
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. 1 de 1

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité Obra 30 Julio 2025	30/07/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	Entrega Placahuella Convenio 802	28/07/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
3	/		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

 AGROAMBIENTAL <small>AGROAMBIENTAL</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PT-10004
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01/01/11
			Pág. 1 de 1

PARTICIPANTES		
Nombre	Datron Alexis Celis Triana	Firma
En representación de	Soc. planeación e Infraestructura	
Correo electrónico	ingenieria.dact la vega@gmail.com	
Teléfono	3202632390	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representación de	Agroambiental	
Correo electrónico	agroambiental.intelavega@gmail.com	
Teléfono	3 2238 92392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representación de	Agroambiental	
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representación de	Aasing SAS	
Correo electrónico	ciasing.phlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

 ROAMBIENTAL <small>INTERMEDIARIOS AMBIENTALES</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ____ de ____

No se han podido ejecutar actividades de obra debido a condiciones de logística con otras obras de la zona

Conveni 802

Se informa que se entregó el día 24 de julio de 2025

Conveni 904

Se informa que a la fecha se tienen 54 ml de centros, carriles, sobreanchos ejecutados

3) Adición Contrato

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis de supervisión que ya se revisó la información en cuanto a la solicitud de adición del contrato de obra No. 167 de 2025, donde se manifiesta lo siguiente:

- 1) Se debe realizar un ajuste de presentación de la adición a los formatos oficiales de la alcaldía municipal
- 2) Se debe realizar una revisión y ajuste a las actividades y sectores a contemplar en la adición
- 3) Se encuentra pendiente revisión presupuestal por parte del municipio para la adición del contrato
- 4) Se solicitan los APU's de los ítems no previstos presentados

4) Propositiones y Varios

Se solicita por parte de Ing. Alexis Celis Supervisión que se vinculen las actas de comité de seguimiento y control al drive que se tiene de consulta por parte de contratista de obra e interventoría

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis Supervisión que se recibió el documento correspondiente a la no aplicación del protocolo de bioseguridad, sin embargo aclara que este documento debe ser entregado en físico, revisado y avalado por parte de la interventoría, este documento en físico para que repose en el expediente del contrato

Se solicita por parte de Ing. Alexis Celis Supervisión que se programe una visita de seguimiento a los sectores para recibo de actividades de obra del convenio 717, además de visita de seguimiento a los otros sectores el día martes 05 de agosto de 2025


 ROAMBIENTAL <small>INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité Obra 06 Agosto 2025	06/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	Entrega Placahuella Convenio 717	05/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
3	Entrega Documentos En Fisico Protocolo Bioseguridad	06/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

 AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. __ de __

PARTICIPANTES			
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana		Firma
En representacion de	Secretaría de Planeación e Infraestructura - La Vega		
Correo electrónico	ingenieriadaclavega@gmail.com		
Teléfono	3202532390		
Nombre	Laura Rocío Galindo Castro		Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS		
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com		
Teléfono	3223892392		
Nombre	Fredy Alexander Martínez		Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS		
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com		
Teléfono			
Nombre	Juan Carlos Pinto		Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra		
Correo electrónico	aasing.phlavega25@gmail.com		
Teléfono			
Nombre			Firma
En representacion de			
Correo electrónico			
Teléfono			
Nombre			Firma
En representacion de			
Correo electrónico			
Teléfono			
Nombre			Firma
En representacion de			
Correo electrónico			
Teléfono			

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORIA ☒


OBRA ☐

ACTA No. 08	FECHA: 06/08/2025
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-167-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CHUPAL CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR EL PUENTE SEGÚN CONVENIO ICCU 717 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TABACAL CON LA VEREDA CHUPAL SECTOR LAGUNA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 742 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR CASCADAS SEGÚN CONVENIO ICCU 802 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR EL MILAGRO SEGÚN CONVENIO ICCU 904 – 2024 Y OTRAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA".	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité Obra 06 Agosto 2025	06/08/2025	06/08/2025	Contratista Supervisión Interventoria
2	Entrega Placahuella Convenio 717	05/08/2025	08/08/2025	Contratista Supervisión Interventoria
3	Entrega Documentos En Físico Protocolo Bioseguridad	06/08/2025	06/08/2025	Interventoria
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos 2) Socialización Ejecución Obra 3) Adición Contrato 4) Propositiones y Varios Se da inicio a comité de obra del 06 de agosto de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal 1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha el contratista de obra ha realizado entrega de los compromisos pactados Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se realizó entrega de la placahuella en el convenio pendiente 2) Socialización Ejecución Obra Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera Convenio 717 Se informa que se finalizaron actividades, quedando pendiente la visita de recibo, la cual se informa por parte de supervisión Ing. Alexis Celis, que el día 08 de agosto de 2025 se realizará dicha visita

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Convenio 742

No se han podido ejecutar actividades de obra debido a condiciones de logística con otras obras de la zona

Convenio 904

Se informa que de avance respecto al ultimo comité del 30 de julio de 2025, se informa que a la fecha se tienen 27 ml de centros, carriles, sobreanchos ejecutados adicionales, se informa además sobre las condiciones de un sobreancho en el convenio debido a las actividades que se han ejecutado a la fecha

Se informa por parte de supervisión Ing. Alexis Celis que respecto al tema del sobreancho evidenciado en obra, se solicita se presenten las condiciones de balance de mayores y menores para verificar los alcances correspondientes en este convenio

3) Adición Contrato

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que el día viernes 01 de agosto de 2025 se realizó entrega del documento correspondiente.

A la fecha se informa por parte de Ing. Alexis Celis supervisión que se encuentra en revisión

4) Proposiciones y Varios**VALLAS INFORMATIVAS**

Ingeniero Alexis Celis informa que: En cuanto a convenio 717, ya se entregó la valla, en cuanto a la convenio 802 se entregó la valla; Se encuentra pendiente la respuesta por parte del ICCU de la valla del convenio 904; A la fecha no se ha podido dar inicio al convenio 742, por lo que no se ha realizado solicitud de valla


	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ____ de ____



ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité Obra 13 Agosto 2025	13/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	Visita Entrega Placahuella Convenio 717	08/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
3	Entrega Documentos En Físico Protocolo Bioseguridad	06/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
4	Revisión Adición Contrato	09/08/2025	Supervisión
5	/		
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1568

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ____ de ____

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	ingenieriadacllavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo electrónico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo electrónico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSION: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORIA

☒

OBRA

☐

ACTA No. 09	FECHA: 13/08/2025
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-167-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CHUPAL CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR EL PUENTE SEGÚN CONVENIO ICCU 717 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TABACAL CON LA VEREDA CHUPAL SECTOR LAGUNA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 742 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR CASCADAS SEGÚN CONVENIO ICCU 802 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL SECTOR EL MILAGRO SEGÚN CONVENIO ICCU 904 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA".	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité Obra 13 Agosto 2025	13/08/2025	13/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	Visita Entrega Placahuella Convenio 717	08/08/2025	08/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
3	Entrega Documentos En Fisico Protocolo Bioseguridad	06/08/2025	11/08/2025	Contratista Obra Supervisión
4	Revisión Adición Contrato	09/08/2025	10/08/2025	Supervisión
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Socialización Ejecución Obra

3) Adición Contrato

4) Propositiones y Varios

Se da inicio a comité de obra del 13 de agosto de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha el contratista de obra ha realizado entrega de los compromisos pactados

Se informa por parte de supervisión Ing. Alexis Cells que respecto a la visita se realizó verificación de la longitud de la placahuella construida, contemplando sobreanchos

2) Socialización Ejecución Obra

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera

 ROMASIENTAL RODOLFO MARTÍNEZ SANTANA	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Convenio 742

No se han podido ejecutar actividades de obra debido a condiciones de logística con otras obras de la zona

Convenio 904

Se informa que a la fecha se tienen 95,5 ml construidos, además de los sobreanchos correspondientes, el día sábado 16 de agosto se deberá realizar suspensión de actividades de acuerdo con procesos constructivos, considerando la necesidad de dar paso de vehículos para dar las resistencias correspondientes en los módulos de placahuella intervenidos

Se informa por parte de supervisión Ing. Alexis Celis que respecto al tema del sobreancho evidenciado en obra, se solicita se presenten las condiciones de balance de mayores y menores para verificar los alcances correspondientes en este convenio

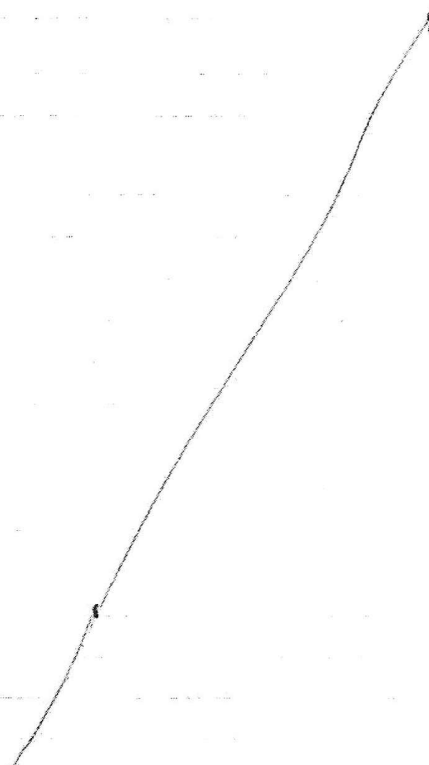
3) Adición Contrato

Se informa por parte de Ing. Alexis celis que el día 10 de agosto de 2025 se realizaron las observaciones pertinentes Ing. Juan carlos pinto contratista de obra informa que se está en revisión y subsanación de observaciones

4) Propositiones y Varios

VALLAS INFORMATIVAS

Ingeniero Alexis Celis informa que: Se encuentra pendiente la respuesta por parte del ICCU de la valla del convenio 904; A la fecha no se ha podido dar inicio al convenio 742, por lo que no se ha realizado solicitud de valla





	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité Obra 20 Agosto 2025	20/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	Visita Convenio 904	15/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
3	/		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR
/

ANEXOS
/

 AGROAMBIENTAL <small>AGROAMBIENTAL INTERVENCIÓN Y OBRAS CIVILES SAS</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaría de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	ingenieriaclaivega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocío Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambientalinterventoria@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martínez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambientalinterventoria@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo electrónico	aaasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 10:20 am del 20 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martínez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervisión de los contratos.

1. Lectura del acta anterior

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 167-2025, se informa por parte de Ing. Laura Galindo de interventoría que en relación a los temas tratados en el comité anterior y en relación a los compromisos pactados se cumplieron los siguientes: siguiente comité de control
La visita del convenio 904 entre las 3 partes se reprograma por agenda.

2. Desarrollo de actividades constructivas

Convenio 717-2024

Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1 el cual incluye los recursos del convenio y los recursos de adición los cuales son del Municipio.

Convenio 742-2024

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que inicio con la ejecución de las actividades en el convenio tales como suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi., sin embargo las otras actividades constructivas según programación no se inician aun, ya que por las condiciones logísticas del contrato, señalando que el inicio de concretos esta sujeto a la terminación del frente del convenio 904-2025, sin embargo dado que ya se suscribió el modificatorio No,1 se están adelantando las gestiones para realizar las actividades de conformación, localización y replanteo e instalación de subbase.

- La interventoría informa que con base a la ejecución de las actividades constructivas se tiene un avance en relación a los recursos del convenio y los recursos de adición aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 12%

En relación a la valla informativa se requiere del Rf de la maquinaria para realizar la solicitud del modelo ante el ICCU

Convenio 802-2024

Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1 el cual incluye los recursos del convenio y los recursos de adición los cuales son del Municipio.

Convenio 904-2024

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecución de las actividades en el convenio tales como suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi., conformación, localización y replanteo e instalación de subbase, concretos etc,

- La interventoría informa que con base a la ejecución de las actividades constructivas se tiene un avance en relación a los recursos del convenio y los recursos de adición aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 56%

En relación a la valla informativa esta pendiente que el ICCU realice el envío del respectivo modelo.

Adición frente Vereda La Libertad Sector El Jardín

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se inicio con la ejecución de las actividades en el frente de adición Vereda La Libertad Sector El Jardín de suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi, fundición de cunetas, fundición de ciclopeos 2000 psi, fundición de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformación de calzada, localización y replanteo, instalación de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.

- La interventoría informa que con base a la ejecución de las actividades constructivas de las obras en Vereda La Libertad Sector El Jardín Oscuro se tiene un avance del 54%, esto con base a la suscripción del modificatorio el día 16 de agosto de 2025.


Adición frente Vereda Minas Sector La Herradura



 ROAMBIENTAL <small>ROAMBIENTAL</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Siguiente comité de seguimiento	27/08/2025	Todas las partes
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS


	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representación de	Secretaría de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	ingenieria@celavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representación de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	Laura Galindo
Correo electrónico	agroambiental.interventoria@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representación de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interventoria@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representación de	AASING SAS - Contratista de Obras	Jerp
Correo electrónico	aasing.philavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
Siendo las 10:10 am del 27 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martínez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.	
1. Lectura del acta anterior	
Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 167-2025, se informa por parte de Ing. Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados se cumplieron los siguientes: siguiente comite de control	
2. Desarrollo de actividades constructivas	
Convenio 717-2024	
Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificadorio No,1 el cual incluye los recursos del convenio y los recursos de adicion los cuales son del Municipio.	
Convenio 742-2024	
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto se culmino con la ejecucion de las actividades en el convenio tales como suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi., s se estan adelantando las gestiones para realizar las actividades de conformacion, localizacion y replanteo e instalacion de subbase y de esta forma iniciar la instalacion de formaleta para la fundicion de concretos	
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificadorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 26%	
En relacion a la valla informativa se requiere del Rf de la maquinaria para realiza la solicitud del modelo ante el ICCU	
Convenio 802-2024	
Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificadorio No,1 el cual incluye los recursos del convenio y los recursos de adicion los cuales son del Municipio.	
Convenio 904-2024	
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecucion de las actividades en el convenio tales como suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi., conformacion, localizacion y replanteo e instalacion de subbase, concretos etc,	
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificadorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 100%	
En relacion a la valla informativa el ICCU realizo el envio del modelo, para lo cual el contratista debera realizar las gestiones pertinentes para realizar su Instalacion	

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

Adicion frente Vereda La Libertad Sector El Jardín

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se inicio con la ejecucion de las actividades en el frente de adicon Vereda La Libertad Sector El Jardín de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda La Libertad Sector El Jardín Oscuro se tiene un avance del 54%, esto con base a la suscripcion del modificadorio el día 16 de agosto de 2025.

Adicion frente Vereda Minas Sector La Herradura

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se inicio con la ejecucion de las actividades en el frente de adicon Vereda Minas Sector La Herradura con el suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, el contratista de obra manifiesta que se encuentra en el inicio actividades de conformacion de calzada, localizacion y replanteo e instalacion de subbase granular, y se se cuenta con todo el material para realizar la fundicion de concretos de acuerdo a las actividades aprobadas en el modificadorio No.1

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro se tiene un avance del 26%, esto con base a la suscripcion del modificadorio el día 16 de agosto de 2025.

3. Acta parcial No.1

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que conforme a los avances de obra realizara la presentacion del acta parcial No.1 el día hoy a la interventoria con base a las cantidades ya verificadas en campo por las dos partes.


- La interventoria señala que en caso de que la documentacion se encuentre completa conforme a lo ya solicitado se realizara tramite a la supervision del proyecto.


 AMBIENTAL <small>INSTITUTO NACIONAL DE</small>	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento	3/09/2025	Todas las partes
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaría de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	ingenieriadelavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rodó Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	Laura Galindo
Correo electrónico	agroambiental.interventoria@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martínez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interventoria@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	Jerp
Correo electrónico	aasing.phloveson25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-01-2025
			Pág. __ de __

Adición frente Vereda La Libertad Sector El Jardín

Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificadorio No,1, para lo cual esta ejecucion ya fue reconocida en el acta parcial No,1 presentada por el contratista de obra, avalada por la interventoria y aprobada por la entidad contratante.

Adición frente Vereda Minas Sector La Herradura


- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se inicio las actividades de conformacion de calzada, localizacion y replanteo e instalacion de subbase granular, y se se cuenta con todo el material para realizar la fundicion de concretos de acuerdo a las actividades aprobadas en el modificadorio No,1

- La interventoria informa que con base a la ejecuion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro se continua con un avance del 26%, esto con base a la suscripcion del modificadorio el dia 16 de agosto de 2025.



3. Acta parcial No.1

- Se informa por parte de la interventoria que una vez se recibió la cuenta de cobro No,1 presentada por el contratista de obra esta contaba con la informacion solicitada y las cantidades correspondien a las ejecutadas en campo, para lo cual se dio el respectivo eval y tramite al Municipio.

- La supervision del proyecto indica que una vez recibida la cuenta, revisada y aprobada se procedio con el respectivo tramite de pago, quedando el reporte y trazabilidad en el expediente del contrato.



	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-F04
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaría de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	ingenieria@actilavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambientalintervega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambientalintervega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo electrónico	aasing.ohlevaga25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ____ de ____

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:32 am del 10 de septiembre de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martínez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervisión de los contratos.

1. Lectura del acta anterior

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 167-2025, se informa por parte de Ing. Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados se cumplieron los siguientes: siguiente comité de control

2. Desarrollo de actividades constructivas**Convenio 742-2024**

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto se estan adelantando las gestiones para realizar las actividades de conformacion, localizacion y replanteo e instalacion de subbase y de esta forma iniciar la instalacion de formaleta para la fundicion de concretos, así mismo manifiesta que teniendo en cuenta que el inicio de las actividades esta supeditado a la terminacion de otro de placa huella en ejecucion, estas actividades se estarian iniciando el día 17 de septiembre de 2025.

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene continua con avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificadorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 26%

En relacion a la valla informativa aun no se cuenta con el registro fotografico de la maquinaria para realiza la solicitud del modelo ante el ICCU

Convenio 904-2024

En relacion a la valla informativa el ICCU realizo el cnvio del modelo, para lo cual el contratista esta en las gestiones pertinentes para realizar su instalacion, manifiesta que ya cuenta con la valla para su instalacion.

Adicion frente Vereda Minas Sector La Herradura

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que ya se finalizaron las actividades de conformacion de calzada, localizacion y replanteo e instalacion de subbase granular, y se se cuenta con todo el material para realizar la fundicion de concretos de acuerdo a las actividades aprobadas en el modificadorio No,1, para lo cual se iniciara la instalacion de formaleta para iniciar con las actividades de concreto.

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Guarumai Bajo Sector El Moro se continua con un avance del 53%.

Actas parciales

- Se solicita al contratista de obra que en caso de presentar una cuenta de cobro se realice la presentacion de esta a la interventoria para su revision y posterior traslado a la supervision, para lo cual se solicita que esto se haga con un tiempo de tal forma que se pueda hacer su revision a detalle.

1590



 AMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ____ de ____

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento	17/09/2025	Todas las partes
2	Instalación de video informativa conve: TCCU 904-2024	10/09/2023	Contrato
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO		CÓDIGO: PI-IN-504
			VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO		VIGENCIA: 01-mar-14
			Pág. ___ de ___

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representación de	Secretaría de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo electrónico	ingenierodactilevega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representación de	Agroambiental Intervenoría y Obras Civiles S.A.	Laura Galindo. 
Correo electrónico	agroambientalintervenor@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martínez	Firma
En representación de	Agroambiental Intervenoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambientalintervenor@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representación de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo electrónico	aasing.philevega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.



PROYECTOS DE INGENIERIA - DISEÑOS.
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S



PLANOS RECORD

199



305 3678028



aasing.phlavega25@gmail.com

FECHA

Octubre de 2023

1593

4 854 650

2 116 150

MUNICIPIO DE LA VEGA



ALCALDÍA DE
LAVEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA LA VEREDA EL CHUPAL
CON LA VEREDA HOYA GRANDE
SECTOR EL PUENTE DEL MUNICIPIO
DE LA VEGA CUNDINAMARCA,
SEGÚN CONVENIO ICCU 717 - 2024
CONTRATO DE OBRA 167-2025

Localizacion:

**VEREDA HOYA GRANDE
SECTOR EL PUENTE**

2 116 100

Contratista

1594

**MUNICIPIO DE
LA VEGA**



ALCALDÍA DE
LAVEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE LA VEGA
CUNDINAMARCA**

Producto

VIA QUE COMUNICA LA VEREDA
TABACAL CON LA VEREDA CHUPAL
SECTOR LAGUNA 2 DEL MUNICIPIO
DE LA VEGA CUNDINAMARCA,
SEGÚN CONVENIO ICCU - 742 - 2024

CONTRATO DE OBRA 167-2025

Localizacion:

**VEREDA CHUPAL SECTOR
LAGUNA 2**

Contratista

1595

MUNICIPIO DE LA VEGA



ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE LA VEGA
CUNDINAMARCA**

Producto

VIA QUE COMUNICA LA VEREDA
CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL
SECTOR CASCADAS DEL MUNICIPIO
DE LA VEGA CUNDINAMARCA,
SEGÚN CONVENIO 802 - 2024

CONTRATO DE OBRA 167-2025

Localizacion:

**VEREDA CACAGUAL
SECTOR CASCADAS**

Contratista

2 115 7375

4 853

MUNICIPIO DE LA VEGA



ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA LA VEREDA CHUPAL CON
LA VEREDA CACAGUAL SECTOR EL
MILAGRO DEL MUNICIPIO DE LA
VEGA CUNDINAMARCA, SEGÚN
CONVENIO 904 - 2024

CONTRATO DE OBRA 167-2025

Localizacion:

**VEREDA CACAGUAL
SECTOR EL MILAGRO**

2 115 300

1597

MUNICIPIO DE LA VEGA



ALCALDÍA DE
LAVEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA LA VEREDA LA LIBERTAD
SECTOR EL JARDIN DEL MUNICIPIO
DE LA VEGA CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA 167-2025

Localizacion:

**VEREDA LA LIBERTAD
SECTOR EL JARDIN**

2106600 N

8552240 E

MUNICIPIO DE LA VEGA



ALCALDÍA DE
LA VEGA

CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA LA VEREDA MINAS
SECTOR LA HERRADURA DEL
MUNICIPIO DE LA VEGA
CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA 167-2025

Localizacion:

**VEREDA MINAS
SECTOR LA HERRADURA**
