

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Nombre del contratista	ACRUX ARQUITECTURA	No. de identificación	901.530.586-6
Contrato No.	2025-0105		
Objeto del Contrato	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.		
Periodo que reporta	AGOSTO 10 A SEPTIEMBRE 08 DE 2025	Fecha del informe	08-09-2025
Nombre del supervisor	ING BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO	Cargo del supervisor	SUPERVISOR PROYECTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Obligación	Descripción de la Actividad Realizada	Producto Evidencia
1. Constituir y allegar a FONDECÚN las garantías requeridas dentro del primer (1) día hábil siguientes a la suscripción del contrato	<i>Se remitieron las pólizas del contrato a fondecún</i>	SE ANEXARON EN EL INFORME DEL ACTA 1
2. Suscribir el acta de inicio dentro del primer (1) día hábil siguiente a la legalización del contrato.	<i>Se suscribió acta de inicio de obra</i>	SE ANEXARON EN EL INFORME DEL ACTA 1
3. Tener la disponibilidad de los profesionales requeridos de acuerdo a las etapas en que se desarrolle el contrato y acorde a la programación de suministro y/o cronograma de actividades, presentada por el contratista	<i>Personal disponible en obra</i>	SE ANEXARON EN EL INFORME DEL ACTA 1
4. Responder Requerimientos de suministro de repuestos en un tiempo máximo de 24 horas.	<i>Se dio respuesta a los requerimientos hechos</i>	No Aplica
5. Contar con un enlace permanente en las instalaciones en la sede	<i>Se presenta lista del personal de enlace permanente</i>	SE ANEXARON EN EL INFORME DEL ACTA 1

donde realizará cada una de las fases previstas para la ejecución de este contrato.		
6. Disponer de la capacidad operativa, técnica y logística y de los recursos propios necesarios que permitan el desarrollo eficiente para la ejecución del objeto del contrato.	<i>Se dispone del personal y elementos para la adecuada ejecución de los trabajos</i>	ANEXO 1
7. Entregar la ficha de recibo de elementos en donde se especifique la ubicación, cantidad modelo y seria de cada equipo de aire acondicionado y de los demás elementos suministrados.	<i>Se hizo entrega de materiales de demolición a la gobernación propietaria del inmueble.</i>	SE ANEXO EN EL INFORME DEL ACTA 2
8. Abstenerse de dejar sustancias o materiales sobrantes de los equipos y enseres suministrados, de igual manera, no contaminar los ambientes de trabajo en la institución, el suelo o los cuerpos de agua existentes.	<i>Se hace aseo permanente de la obra</i>	ANEXO 2
9. Utilizar elementos amigables con el medio ambiente.	<i>Se han utilizado solo elementos requeridos en el contrato (cubierta upvc)</i>	SE ENTREGO FICHA TECNICA EN EL INFORME DEL ACTA 1
10. Participar y apoyar a FONDECÚN en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato	<i>Se han atendido los requerimientos de fondecún</i>	SE PRESENTON EVIDENCIA EN EL INFORME 3
11. Presentar los siguientes entregables documentales en: a. Informe descriptivo de reconocimiento y	<i>Se presento registro fotográfico inicial, Afiliaciones del personal a la ARL Antecedentes del personal en obra</i>	SE ANEXARON EN EL INFORME DEL ACTA 1

diagnóstico de las áreas a intervenir con registro fotográfico el cual debe incluir, inventario de equipos con sus especificaciones, diagnóstico de verificación, funcionamiento y estado de los mismos.

b. Hoja de ruta o plan de trabajo que incluya tareas, recursos y tiempos para el desarrollo del objeto.

c. Balances presupuestales.

d. Programación detallada de entrega de equipos y elementos a suministrar contratados, elaborada teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas (diagrama de Gantt), sujeta en todo caso al plazo de ejecución del objeto contractual que corre a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

e. Certificado antecedentes judiciales del personal a ingresar y que será empleado por el contratista.

Actas de Vecindad

<p>f. Relación del personal a ingresar con sus respectivas afiliaciones a EPS, Fondo de Pensiones, ARL y Caja de Compensación, de acuerdo a la programación de actividades.</p> <p>g. Certificado de trabajo seguro en alturas si lo requiere por la actividad a desarrollar dentro de la obra.</p>		
<p>12. Realizar informe eléctrico, croquis y la relación (inventarios) de las instalaciones eléctricas, preinstalaciones y equipos de aire acondicionado de Gerencia Departamental Colegiada de Guainía ubicada en la Calle 15 No. 7-33, piso 1 de la ciudad de Inírida</p>	<p><i>Se realizo croquis de ubicación equipos</i></p>	<p><i>SE ANEXO EN EL INFORME DEL ACTA 2</i></p>
<p>13. Elaborar y presentar una programación detallada de la obra, un organigrama y la metodología de trabajo acorde con el tiempo de ejecución, indicando la duración, precedencia y secuencia lógica del desarrollo de cada uno de los frentes de trabajo y el consolidado del contrato, teniendo en cuenta los procedimientos de construcción y todas las</p>	<p><i>Se presento cronograma de obra</i></p>	<p><i>SE ANEXO EN EL INFORME DE LAS ACTAS 1 Y 2</i></p>

demás actividades requeridas para la correcta ejecución contractual		
14. El contratista, una vez se realice el desmonte de las condensadoras asignadas responderá por los daños que se presenten a los mismos por realizar malas maniobras, los deberá acopiar en un espacio seguro y de cuidado autorizado por la Gerencia Departamental Colegiada de Guainía	<i>Se desmontaron los aires y se encuentran en lugar seguro, bajo responsabilidad del contratista.</i>	SE ANEXO EN EL INFORME DEL ACTA 2
15. Ejecutar las obras civiles, eléctricas, captación de gases y desmonte con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.	<i>Se están adelantando las obras contratadas (instalación puertas, canaleta, bandeja porta cable, pintura, cable, salidas para lamparas)</i>	ANEXO 3
16. Realizar delimitaciones en todos los espacios a intervenir para no involucrar la seguridad de funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Guainía en las áreas de trabajo	<i>Se llevo a cabo cerramiento en polisombara</i>	SE ANEXO EN INFORME DE ACTA 1
17. Verificar el correcto funcionamiento del nuevo sistema eléctrico para garantizar el buen	<i>Se remitió diseño eléctrico para revisión por lo tanto no se ha ejecutado nada de la parte eléctrica</i>	No Aplica

funcionamiento del sistema de Aire Acondicionado a instalar.		
18. Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuenten con los Elementos de Dotación y Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. Nota: En caso de deterioro, daño o pérdida deberán contemplarse los protocolos correspondientes para la reposición, sin afectar la ejecución del contrato.	Se hizo entrega de EPP a los obreros	SE ANEXO FORMATO DE ENTREGA EN EL INFORME DEL ACTA 1
19. Presentar informes parciales de ejecución, suministro o fabricación de equipos y elementos a suministrar a la supervisión del contrato para su revisión y aval dando cumplimiento a las especificaciones técnicas que hacen parte del presente estudio previo, y posterior entrega a FONDECÚN, cuyo contenido debe corresponder a la programación presentada por el contratista y aprobada por la supervisión del contrato	No Aplica	No aplica
20. Participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean	SE HA ASISITIDO A TODAS LAS REUNIONES PROGRAMADAS	SE PRESENTO EN EL INFORME ACTA 3

convocados y/o en la oficina central de la Contraloría General de la República ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. de manera presencial y/o virtual.		
21. Responder a los requerimientos de suministro que realice FONDECÚN, así como a las condiciones definidas en las especificaciones técnicas del proyecto.	<i>SOLICITARON INFORMACION SOBRE SUMINISTRO DE BANDEJA PORTA CABLE, CANALETA METALICA Y PUERTAS</i>	SE ENTREGO EN EL INFORME DEL ACTA 3
22. Cumplir a cabalidad el cronograma de entrega de los equipos y elementos a suministrar durante la ejecución del contrato.	<i>SE PRESENTA ATRAZO POR EL DISEÑO ELECTRICO</i>	
23. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato sin perjuicio de las revisiones excepcionales que se hagan por parte de la Supervisión	<i>NO SE HAN MODIFICADO PRECIOS</i>	NO APLICA
24. Garantizar durante el suministro de los equipos y demás elementos, la señalización y la seguridad en la sede de la Gerencia Departamental Colegiada de Guainía. Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres	<i>NO SE HAN ENTREGADO EQUIPOS A LA GERENCIA</i>	

líneas y con soportes tubulares.		
25. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervisión del contrato, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa por errores al momento de suministrar los equipos y demás elementos, según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.	NO SE HA PRESENTADO NINGUNA SITUACION DEFECTUOSA	
26. Presentar todos los informes parciales o finales descritos en este documento, de conformidad con las características, periodicidad y condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	SE HAN ENTREGADO INFOMRES	
27. Suministrar para la ejecución del proyecto, el personal necesario para la logística, entrega y almacenamiento de las actividades que así lo ameritan, este debe ser personal idóneo y suficiente (capacitado y experto) el contratista deberá suministrar el transporte, las comunicaciones, los equipos con la capacidad y características tecnológicas necesarias, la maquinaria, herramientas, materiales e insumos de acuerdo a las fechas previstas en la programación detallada de la	SE HAN LLEVADO A OBRA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCION	ANEXO 4

obra aprobada, en todos cada uno de los frentes de trabajo y en cada una de las áreas intervenidas que considere necesarios para el cumplimiento contractual.		
28. Informar oportuna y continuamente a la supervisión del contrato, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato (se generarán actas de manera semanal), así mismo, suministrar a la supervisión del contrato oportunamente toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, así, como permitir el asesoramiento de las entidades relacionadas con el proyecto y acatar y aplicar de manera diligente las observaciones las recomendaciones y las directrices que seas impartidas por estas	INFORMES SEMANALES	ANEXO 5
29. Elaborar y presentar ante la supervisión del contrato las actas e informes de avance semanal, mensual, final y de liquidación.	SE HAN PRESENTADO 3 ACTAS PARCIALES	ANEXO 6
30. Deberá instalar sellos de seguridad en los componentes, puertas y accesorios del equipo y accesorios suministrados y/o intervenidos.	UNA VEZ INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO SE COLOCARAN LOS SELLOS	
31. Realizar un registro fotográfico de los suministros de equipos y demás elementos, dejando constancia mediante un	ENTREGA DE LUMINARIAS, CABLES, MATERIALES ELECTRICOS	ANEXO 7

acta de entrega de dichos equipos ya instalados en la obra. Informar a la supervisión sobre la llegada de los suministros para que se realice el debido recibido en el lugar de la obra.		
--	--	--

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.

ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros)



ACRUX ARQUITECTURA SAS
NIT: 901.530.586-6

ANEXO 1

Contrato 097055462

Documento N901501626

Empresa ACRUX ARQUITECTURA SAS

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C1148142735	SILVA DAGAMA ALBERTO	M	0000000004 - ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	3 - PUERTO INIRIDA	6.96	INIRIDA	25-07-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C19002374	ROA GAITAN ARCADIO	M	0000000004 - ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	3 - PUERTO INIRIDA	6.96	INIRIDA	25-07-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C80262389	VELASQUEZ VELASQUEZ CARLOS	M	0000000004 - ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	3 - PUERTO INIRIDA	6.96	INIRIDA	12-03-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1077973154	JORDAN MUÑOZ JOHN ALEXANDER	M	0000000002 - OFICINA	1 - SEDE ÚNICA	0.522	VILLETA	22-04-2024	DEP	01 - DEPENDIENTE
X5901778	OLIVERO ZAMBRANO JORGE LUIS	M	0000000006 - GUACAMAYAS	1 - SEDE ÚNICA	6.96	VILLETA	03-06-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C19016297	GAITAN GAITAN JOSE	M	0000000004 - ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	3 - PUERTO INIRIDA	6.96	INIRIDA	25-07-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C19002358	RAMIREZ SAENZ MISAEL	M	0000000004 - ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	3 - PUERTO INIRIDA	6.96	INIRIDA	12-03-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1077975146	PACHON MORENO OMAR	M	0000000006 - GUACAMAYAS	1 - SEDE ÚNICA	6.96	VILLETA	03-06-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C19001971	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO	M	0000000004 - ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	3 - PUERTO INIRIDA	6.96	INIRIDA	25-07-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
C80283941	GUTIERREZ BRAND VICTOR ALFONSO	M	0000000005 - OFICINA VILLETA	4 - OFICINA	6.96	VILLETA	29-05-2025	DEP	01 - DEPENDIENTE
Total trabajadores		10							
Total coberturas		10							

ANEXO 2

ASEO SITIOS INTERVENIDOS



ANEXO 3



INSTALACION PUERTAS METALICAS




APLICACIÓN PINTURA VINILO



INSTALACION CANALETA



INSTALACION BANDEJA PORTA CABLE

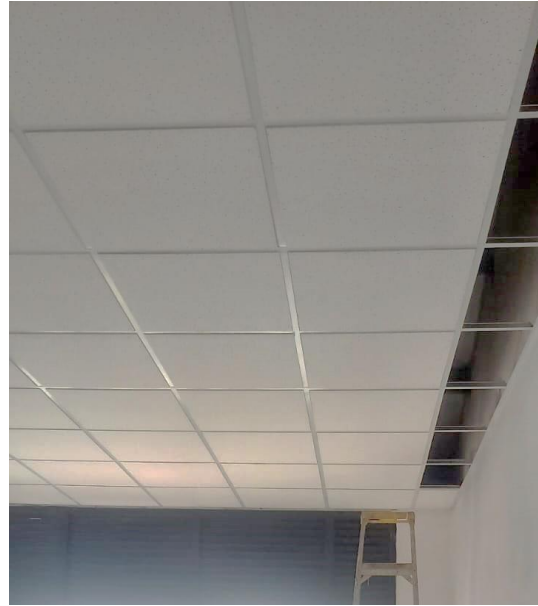

INSTALACION CIELORASO EN FIBRA MINERAL



INSTALACION CABLE TRENSADO



INSTALACION CERAMICA DE PISO



DESMONTE ACOMETIDAS ELECTRICAS



INSTALACION CERAMICA DE PISO BAÑOS Y COCINA



CANALIZACION E INSTALACION DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS

ANEXO 4

MATERIALES EN OBRA





V



ANEXO 5

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CODIGO: EGAP-FR-008 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO	

FECHA	18/08/2025	PERIODO No.	DEL	11/08/2025	AL	17/08/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL						
OBJETO DEL CONTRATO	. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA					
CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S			CONTRATO DE _____ <Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>			
CONTRATO No.:	2025-0105		CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	11-03-205		FECHA DE INICIACIÓN:			
**SUSPENSIÓN:			**SUSPENSIÓN:			
**PRÓRROGA:			**PRÓRROGA:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/09/2025		FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	180		PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	160,00	EQUIVALE AL 88,9%	PLAZO TRANSCURRIDO:			
VALOR INICIAL :	\$ 850.643.849,08		VALOR INICIAL :			
VALOR ADICION(ES):	\$ -		VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 850.643.849,08		VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	\$ 294.910.984,71		VALOR PAGADO:			
VALOR POR PAGAR:	\$ 555.732.864,37		VALOR POR PAGAR:			
SUPERVISOR:	ING BRAYAN ROJAS OCAMPO		INTERVENTOR:			


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	PRELIMINARES	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
1	Hito 1 DEMOLICION BALDOSA Y/O ESMALTADO DE PISO, INCLUYE RETIRO	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	Hito 2 DEMOLICION ENCHAPE MURO, INCLUYE RETIRO	20/04/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	Hito 3 DEMOLICION PAÑETE, CARGUE MANUAL Y RETIRO	6/05/2025	4/05/2025	2
4	Hito 4 DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO	7/04/2025	20/03/2025	18
5	Hito 5 DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE RETIRO	9/04/2025	9/04/2025	0
6	Hito 6 DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	16/06/2025	12/04/2025	65
7	Hito 7 DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOSICION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOSICION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).	16/06/2025	4/05/2025	43
	Hito 8 DESMONTE TOMA ELECTRICA NORMAL O REGULADA MAS TUBERIA CAJAS Y CABLE	24/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 9 Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt	24/06/2025	12/04/2025	73
	Hito 10 Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 11 Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro	2/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 12 Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	15/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 13 Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 14 Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y/o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 15 Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	6/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 16 Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm	30/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 17 Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)	10/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 18 Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	6
	Hito 19 Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	6
	Hito 20 Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).	13/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 21 Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.	30/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 22 Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)	18/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 23 Suministro e instalación red de distribución de agua fría potable d= 1/2" pvc presion	23/06/2025	17/06/2025	
	Hito 24 Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	EN EJECUCION
	Hito 25 Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega	3/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 26 Sumi istro De Bandeja Portacables Tipo Malla Con Accesorios.	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 27 Suministro de Canaleta Metálica 12X5 Cms Con Divison, Tapa Y Troqueles	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 28 Suministro carpinteria metalica	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 29 Instalacion carpinteria metalica	2/09/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 30 Pintura vinilo tipo 1 vinilo para muros	3/09/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 31 Instalacion bandeja portacable	20/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 32 Instalacion canaleta	20/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 33 Suministro elemementos de iluminacion	28/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION

	(Hito n) ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	11/09/2025	12/04/2025	152
Plazo del proyecto en días		180		0
*** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 741.980.625,42	87,23%	-29,157%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 493.954.928,00	58,07%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

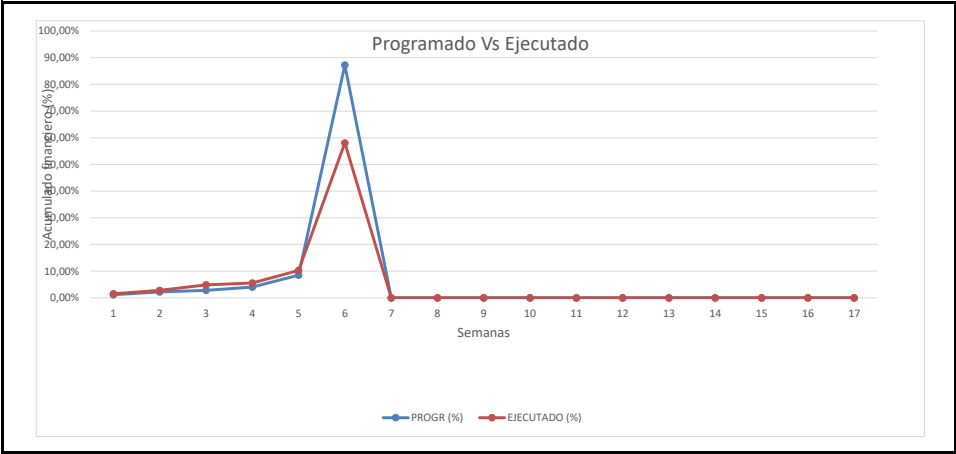

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	1,14%	1,512%
2	2,20%	2,788%
3	2,81%	4,840%
4	4,02%	5,541%
5	8,48%	10,270%
6	87,23%	58,068%
7	0,00%	0,000%
8	0,00%	0,000%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
No aplica aun en el periodo.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
SE REQUIERE CON URGENCIA LA REVISION DEL DISEÑO ELECTRICO PARA PODER ADELANTAR ACTIVIDADES QUES ES IMPOSIBLE LLEVARLAS A CABO HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO, NO SE PUEDE TAMPOCO PRESENTAR UN BALANCE REAL HASTA NO DETERMINAR EL COSTO DE LA PARTE ELECTRICA
HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO ELECTRICO, UNA VEZ INSTALADA LA CUBIERTA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO, INSTALACION DE CIELORASO Y PISO LO QUE PODRIA OCASIONAR UN ATRAZO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
A LA FECHA NO SE HA APROBADO EL DISEÑO ELECTRICO, POR CONSIGUIENTE SE SIGUE AUMENTANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DEBIDO AL FUERTE INVIERNO Y A LAS INUNDACIONES PRESENTADAS NO FUE POSIBLE EL DESCARGUE DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN PUERTO

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Informar a la CGR-DIBS sobre el inconveniente presentados durante la ejecucion de los trabajos	FONDECUN	

6. COMENTARIOS
SE ESTAN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CERAMICA DE PISO E INSTALACION DE CUBIERTA, PINTURA VENTANAS, INSTALACION GUARDAESCOBA Y PISOS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



APLICACIÓN VINILO



INSTALACION PUERTAS



PASAMURO PARA BANDEJA



INSTALACION BANDEJA PORTACABLE

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA O CONTRATISTA)

NOMBRE: NELSON FORTUO ORTIZ

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR Ing BRAYAN ROJAS OCAMPO

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CODIGO: EGAP-FR-008 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO	

FECHA	18/08/2025	PERIODO No.	DEL	11/08/2025	AL	17/08/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL						
OBJETO DEL CONTRATO	. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA					
CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACURX ARQUITECTURA S.A.S		CONTRATO DE _____ <Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>				
CONTRATO No.:	2025-0105	CONTRATO No.:				
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL:				
FECHA DE INICIACIÓN:	11-03-205	FECHA DE INICIACIÓN:				
**SUSPENSIÓN:		**SUSPENSIÓN:				
**PRÓRROGA:		**PRÓRROGA:				
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/09/2025	FECHA DE TERMINACIÓN:				
PLAZO ACTUALIZADO:	180	PLAZO ACTUALIZADO:				
PLAZO TRANSCURRIDO:	167,00 EQUIVALE AL 92,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:				
VALOR INICIAL :	\$ 850.643.849,08	VALOR INICIAL :				
VALOR ADICION(ES):	\$ -	VALOR ADICION(ES):				
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 850.643.849,08	VALOR ACTUALIZADO:				
VALOR PAGADO:	\$ 294.910.984,71	VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	\$ 555.732.864,37	VALOR POR PAGAR:				
SUPERVISOR:	ING BRAYAN ROJAS OCAMPO	INTERVENTOR:				


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	PRELIMINARES	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
1	Hito 1 DEMOLICION BALDOSA Y/O ESMALTADO DE PISO, INCLUYE RETIRO	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	Hito 2 DEMOLICION ENCHAPE MURO, INCLUYE RETIRO	20/04/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	Hito 3 DEMOLICION PAÑETE, CARGUE MANUAL Y RETIRO	6/05/2025	4/05/2025	2
4	Hito 4 DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO	7/04/2025	20/03/2025	18
5	Hito 5 DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE RETIRO	9/04/2025	9/04/2025	0
6	Hito 6 DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	16/06/2025	12/04/2025	65
7	Hito 7 DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOSICION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOSICION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).	16/06/2025	4/05/2025	43
	Hito 8 DESMONTE TOMA ELECTRICA NORMAL O REGULADA MAS TUBERIA CAJAS Y CABLE	24/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 9 Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt	24/06/2025	12/04/2025	73
	Hito 10 Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 11 Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro	2/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 12 Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	15/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 13 Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 14 Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y/o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 15 Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	6/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 16 Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm	30/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 17 Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)	10/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 18 Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	6
	Hito 19 Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	6
	Hito 20 Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).	13/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 21 Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.	30/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 22 Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)	18/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 23 Suministro e instalación red de distribución de agua fría potable d= 1/2" pvc presion	23/06/2025	17/06/2025	
	Hito 24 Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	EN EJECUCION
	Hito 25 Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega	3/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 26 Sumi istro De Bandeja Portacables Tipo Malla Con Accesorios.	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 27 Suministro de Canaleta Metálica 12X5 Cms Con Divison, Tapa Y Troqueles	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 28 Suministro carpinteria metalics	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 29 Instalacion carpintería metalica	2/09/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 30 Pintura vinilo tipo 1 vinilo para muros	3/09/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 31 Instalacion bandeja portacable	20/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 32 Instalacion canaleta	20/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 33 Suministro elemementos de iluminacion	28/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION

	(Hito n) ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	11/09/2025	12/04/2025	152
Plazo del proyecto en días		180		0
*** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 756.300.625,42	88,91%	-26,576%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 530.233.828,00	62,33%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

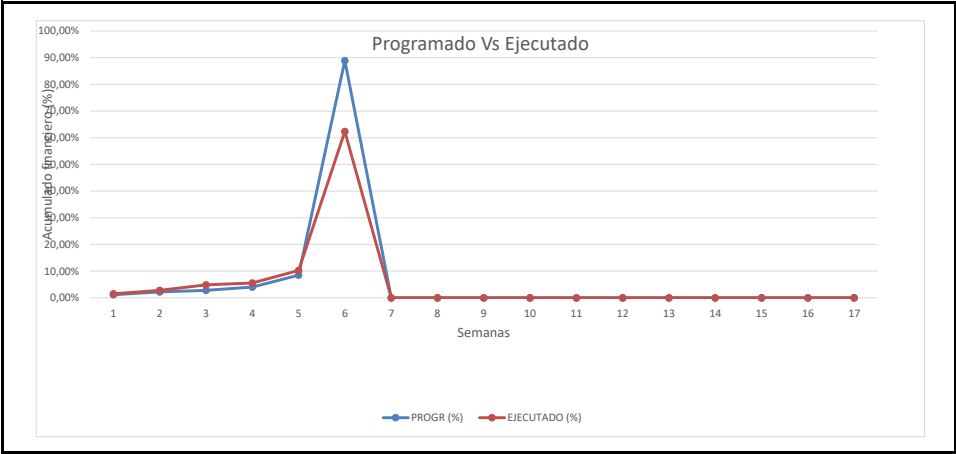

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	1,14%	1,512%
2	2,20%	2,788%
3	2,81%	4,840%
4	4,02%	5,541%
5	8,48%	10,270%
6	88,91%	62,333%
7	0,00%	0,000%
8	0,00%	0,000%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
DE ACUERDO AL DISEÑO ELECTRICO ES NECESARIA LA INCLUSION DE ÍTEMS NO PREVISTOS, Y UNA ADICION EN VA,OR DEL CONTRATO PARA PODER CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
SE REQUIERE CON URGENCIA LA REVISION DEL DISEÑO ELECTRICO PARA PODER ADELANTAR ACTIVIDADES QUES ES IMPOSIBLE LLEVARLAS A CABO HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO, NO SE PUEDE TAMPOCO PRESENTAR UN BALANCE REAL HASTA NO DETERMINAR EL COSTO DE LA PARTE ELECTRICA
HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO ELECTRICO, UNA VEZ INSTALADA LA CUBIERTA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO, INSTALACION DE CIELORASO Y PISO LO QUE PODRIA OCASIONAR UN ATRAZO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
A LA FECHA NO SE HA APROBADO EL DISEÑO ELECTRICO, POR CONSIGUIENTE SE SIGUE AUMENTANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DEBIDO AL FUERTE INVIERNO Y A LAS INUNDACIONES PRESENTADAS NO FUE POSIBLE EL DESCARGUE DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN PUERTO
SE PRESENTO ATRASO EN LA INSTALACION DE LA BANDEJA PORTACABLE POR QUE ESTABA CONTEMPLADO COLOCARLA COLGADA CON VARILLA ROSCADA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA Y EN LA VISITA LA ING NANCY DE CGR EXIGIO QUE FUERA CON MENSULAS ANCLADAS A LA PARED

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Informar a la CGR-DIBS sobre el inconveniente presentado para el ingreso del personal a obra	FONDECUN	
se debe informar a la CGR la necesidad de la adición en valor y tiempo	FONDECUN	

6. COMENTARIOS
SE ESTAN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE APLICACION DEVINILO, INSTALACION BANDEJA PORTA CABLE Y CANALETA METALICA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



APLICACIÓN VINILO



INSTALACION BANDEJA PORTACABLE



INSTALACION CANALETA METALICA



FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA O CONTRATISTA)

NOMBRE: NELSON ARTURO ORTIZ

Bryan Rojas

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR Ing BRAYAN ROJAS OCAMPO

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CODIGO: EGAP-FR-008 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO	


FECHA	1/09/2025	PERIODO No.	DEL	25/08/2025	AL	31/08/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL						
OBJETO DEL CONTRATO	. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA					
CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S			CONTRATO DE _____ <Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>			
CONTRATO No.:	2025-0105		CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	11-03-205		FECHA DE INICIACIÓN:			
**SUSPENSIÓN:			**SUSPENSIÓN:			
**PRÓRROGA:			**PRÓRROGA:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/09/2025		FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	180		PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	174,00	EQUIVALE AL 96,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:			
VALOR INICIAL :	\$ 850.643.849,08		VALOR INICIAL :			
VALOR ADICION(ES):	\$ -		VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 850.643.849,08		VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	\$ 294.910.984,71		VALOR PAGADO:			
VALOR POR PAGAR:	\$ 555.732.864,37		VALOR POR PAGAR:			
SUPERVISOR:	ING BRAYAN ROJAS OCAMPO		INTERVENTOR:			

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	PRELIMINARES	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
1	Hito 1 DEMOLICION BALDOSA Y/O ESMALTADO DE PISO, INCLUYE RETIRO	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	Hito 2 DEMOLICION ENCHAPE MURO, INCLUYE RETIRO	20/04/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	Hito 3 DEMOLICION PAÑETE, CARGUE MANUAL Y RETIRO	6/05/2025	4/05/2025	2
4	Hito 4 DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO	7/04/2025	20/03/2025	18
5	Hito 5 DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LVIANA INCLUYE RETIRO	9/04/2025	9/04/2025	0
6	Hito 6 DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	16/06/2025	12/04/2025	65
7	Hito 7 DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOSICION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOSICION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).	16/06/2025	4/05/2025	43
	Hito 8 DESMONTE TOMA ELECTRICA NORMAL O REGULADA MAS TUBERIA CAJAS Y CABLE	24/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 9 Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt	24/06/2025	12/04/2025	73
	Hito 10 Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 11 Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro	2/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 12 Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	15/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 13 Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 14 Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y/o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 15 Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	6/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 16 Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm	30/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 17 Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)	10/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 18 Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	6
	Hito 19 Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	6
	Hito 20 Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).	13/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 21 Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.	30/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 22 Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)	18/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 23 Suministro e instalación red de distribución de agua fria potable d= 1/2" pvc presion	23/06/2025	17/06/2025	
	Hito 24 Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	EN EJECUCION
	Hito 25 Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega	3/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 26 Sumi istro De Bandeja Portacables Tipo Malla Con Accesorios.	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 27 Suministro de Canaleta Metálica 12X5 Cms Con Divison, Tapa Y Troqueles	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 28 Suministro carpinteria metalics	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 29 Instalacion carpintería metalica	2/09/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 30 Pintura vinilo tipo 1 vinilo para muros	3/09/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 31 Instalacion bandeja portacable	20/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 32 Instalacion canaleta	20/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 33 Suministro elemementos de iluminacion	28/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION

(Hito n) ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		11/09/2025	12/04/2025	152
Plazo del proyecto en días		180		0
*** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.				
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 802.300.625,42	94,32%	-29,814%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 548.689.828,00	64,50%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

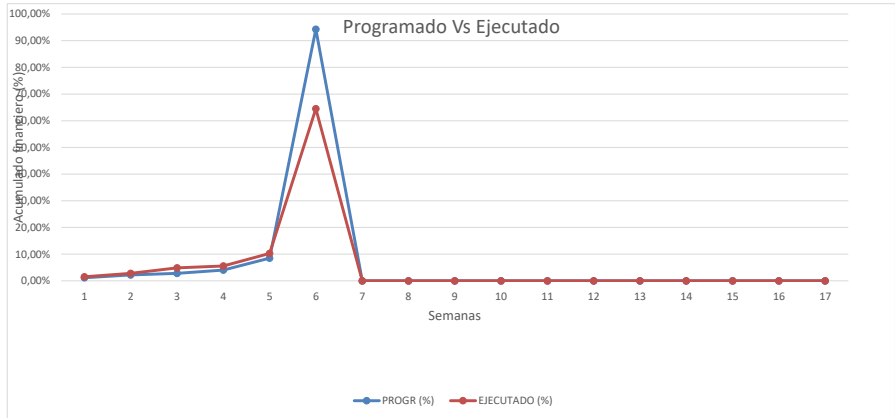

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	1,14%	1,512%
2	2,20%	2,788%
3	2,81%	4,840%
4	4,02%	5,541%
5	8,48%	10,270%
6	94,32%	64,503%
7	0,00%	0,000%
8	0,00%	0,000%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS Y PARA PODER CUMLLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y NO DEJAR LA OBRA INCONCLUSA SE REQUIERE DE UNA ADICION EN DINERO Y EN PLAZO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

SE REQUIERE CON URGENCIA LA REVISION DEL DISEÑO ELECTRICO PARA PODER ADELANTAR ACTIVIDADES QUES ES IMPOSIBLE LLEVARLAS A CABO HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO, NO SE PUEDE TAMPOCO PRESENTAR UN BALANCE REAL HASTA NO DETERMINAR EL COSTO DE LA PARTE ELECTRICA
HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO ELECTRICO, UNA VEZ INSTALADA LA CUBIERTA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO, INSTALACION DE CIELORASO Y PISO LO QUE PODRIA OCASIONAR UN ATRAZO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
A LA FECHA NO SE HA APROBADO EL DISEÑO ELECTRICO, POR CONSIGUIENTE SE SIGUE AUMENTANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DEBIDO AL FUERTE INVIERNO Y A LAS INUNDACIONES PRESENTADAS NO FUE POSIBLE EL DESCARGUE DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN PUERTO
SE PRESENTO ATRASO EN LA INSTALACION DE LA BANDEJA PORTACABLE POR QUE ESTABA CONTEMPLADO COLOCARLA COLGADA CON VARILLA ROSCADA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA Y EN LA VISITA LA ING NANCY DE CGR EXIGIO QUE FUERA CON MENSULAS ANCLADAS A LA PARED

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Informar a la CGR-DIBS sobre el inconvenientes presentados para el descargue de materiels por la inundacion	FONDECUN	

6. COMENTARIOS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



AFINADO DE PISO
OFIC SISTEMAS



CERAMICA DE PISO
OFIC SISTEMAS



APLICACION VINILO



CERAMICA DE PISO
ENTRADA PRINCIPAL

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA O CONTRATISTA)

NOMBRE: NELSON ARTURO ORTIZ

* VObO SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR Ing BRAYAN ROJAS OCAÑO

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CODIGO: EGAP-FR-008 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO	


FECHA	1/09/2025	PERIODO No.	DEL	25/08/2025	AL	31/08/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL						
OBJETO DEL CONTRATO	. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA					
CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACURX ARQUITECTURA S.A.S			CONTRATO DE _____ <Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>			
CONTRATO No.:	2025-0105		CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	11-03-205		FECHA DE INICIACIÓN:			
**SUSPENSIÓN:			**SUSPENSIÓN:			
**PRÓRROGA:			**PRÓRROGA:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/09/2025		FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	180		PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	174,00	EQUIVALE AL 96,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:			
VALOR INICIAL :	\$ 850.643.849,08		VALOR INICIAL :			
VALOR ADICION(ES):	\$ -		VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 850.643.849,08		VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	\$ 294.910.984,71		VALOR PAGADO:			
VALOR POR PAGAR:	\$ 555.732.864,37		VALOR POR PAGAR:			
SUPERVISOR:	ING BRAYAN ROJAS OCAMPO		INTERVENTOR:			

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	PRELIMINARES	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
1	Hito 1 DEMOLICION BALDOSA Y/O ESMALTADO DE PISO, INCLUYE RETIRO	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	Hito 2 DEMOLICION ENCHAPE MURO, INCLUYE RETIRO	20/04/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	Hito 3 DEMOLICION PAÑETE, CARGUE MANUAL Y RETIRO	6/05/2025	4/05/2025	2
4	Hito 4 DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO	7/04/2025	20/03/2025	18
5	Hito 5 DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE RETIRO	9/04/2025	9/04/2025	0
6	Hito 6 DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	16/06/2025	12/04/2025	65
7	Hito 7 DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOSICION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOSICION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).	16/06/2025	4/05/2025	43
	Hito 8 DESMONTE TOMA ELECTRICA NORMAL O REGULADA MAS TUBERIA CAJAS Y CABLE	24/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 9 Desmonte de canaleta Metálica de 2,44 mt	24/06/2025	12/04/2025	73
	Hito 10 Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 11 Desmonte marcos y puerta metálicas y de madera incluye retiro	2/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 12 Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	15/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 13 Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 14 Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y/o metálica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 15 Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	6/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 16 Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm	30/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 17 Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)	10/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 18 Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	6
	Hito 19 Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	6
	Hito 20 Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).	13/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 21 Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.	30/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 22 Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)	18/07/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 23 Suministro e instalación red de distribución de agua fría potable d= 1/2" pvc presion	23/06/2025	17/06/2025	
	Hito 24 Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)	23/06/2025	17/06/2025	EN EJECUCION
	Hito 25 Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega	3/08/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 26 Sumi istro De Bandeja Portacables Tipo Malla Con Accesorios.	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 27 Suministro de Canaleta Metálica 12X5 Cms Con Divison, Tapa Y Troqueles	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 28 Suministro carpinteria metálicas	27/07/2025	6/08/2025	-10
	Hito 29 Instalacion carpintería metálica	2/09/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 30 Pintura vinilo tipo 1 vinilo para muros	3/09/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION

*** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

SE REQUIERE CON URGENCIA LA REVISION DE DISEÑO ELECTRICO PARA PODER ADELANTAR ACTIVIDADES QUES ES IMPOSIBLE LLEVARLAS A CABO HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO, NO SE PUEDE TAMPOCO PRESENTAR UN BALANCE REAL HASTA NO DETERMINAR EL COSTO DE LA PARTE ELECTRICA
HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO ELECTRICO, UNA VEZ INSTALADA LA CUBIERTA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO, INSTALACION DE CIELORASO Y PISO LO QUE PODRIA OCASIONAR UN ATRASO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
A LA FECHA NO SE HA APROBADO EL DISEÑO ELECTRICO, POR CONSIGUIENTE SE SIGUE AUMENTANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DEBIDO AL FUERTE INVIERNO Y A LAS INUNDACIONES PRESENTADAS NO FUE POSIBLE EL DESCARGUE DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN PUERTO

SE PRESENTO ATRASO EN LA INSTALACION DE LA BANDEJA PORTACABLE POR QUE ESTABA CONTEMPLADO COLOCARLA COLGADA CON VARILLA ROSCADA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA Y EN LA VISITA LA ING NANCY DE CGR EXIGIO QUE FUERA CON MENSULAS ANCLADAS A LA PARED

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

6. COMENTARIOS

SE ESTAN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE APLICACION DEVINILO, INSTALACION BANDEJA PORTA CABLE CANALETA METALICA, INSTALACION CIELORASO, CABLE TRENSADO LUMINARIAS, SALIDAS ELECTRICAS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



INSTALACION CIELORASO Y LUMINARIAS 120X30



SALIDAS ELECTRICAS LUMINARIAS




DESMONTE TABLERO ELECTRICO



INSTALACION CABLE TRENSADO



DESMONTE ACOMETIDA



DESMONTE TUBERIA T CABLEADO



DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA O CONTRATISTA)

NOMBRE: NELSON ARTURO ORTIZ

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR Ing BRAYAN ROJAS OCAMPO

ANEXO 6

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04		
												Versión: 01		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023		
ACTA No.	1													
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 –0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S						CONTRATO No.			2025-0105				
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN)													
CONTRATISTA :	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S.													
INTERVENTOR:														
SUPERVISOR FONDECÚN:	Ing BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO													
PERIODO A PAGAR:	DEL 11 MARZO AL 30 MAYO DE 2025													
En <u>INIRIDA</u> , a los TREINTA (30) días del mes de <u>Mayo</u> del año <u>2025</u> , se reunieron <u>NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA</u> , Representante Legal de ACRUX ARQUITECTURA SAS Contratista y el Ing <u>BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPÓ</u> , SUPERVISOR, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:														
ITEM		DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO Y/O ACTA DE MAYORES Y MENORES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.		PRELIMINARES												
1.1		Demolicion baldosa y/o esmaltado de piso, incluye retiro	M2	459,93	\$ 28.050,00	\$ 12.901.036,50	0,00	273,970	273,97	\$ -	\$ 7.684.858,50	\$ 7.684.858,50	185,96	\$ 5.216.178,00
1.2		Demolicion enchape muro, incluye retiro	M2	59,62	\$ 28.050,00	\$ 1.672.341,00	0,00	52,270	52,27	\$ -	\$ 1.466.173,50	\$ 1.466.173,50	7,35	\$ 206.167,50
1.3		Demolicion pañete, cargue manual y retiro	M2	101,87	\$ 19.870,00	\$ 2.024.156,90	0,00	98,150	98,15	\$ -	\$ 1.950.240,50	\$ 1.950.240,50	3,72	\$ 73.916,40
1.4		Demolicion muro, incluye retiro	M2	3,46	\$ 74.840,00	\$ 258.946,40	0,00	3,460	3,46	\$ -	\$ 258.946,40	\$ 258.946,40	0,00	\$ -
1.5		Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc	M2	350,89	\$ 27.430,00	\$ 9.624.912,70	0,00	324,290	324,29	\$ -	\$ 8.895.274,70	\$ 8.895.274,70	26,60	\$ 729.638,00
1.6		Desmonte cielo raso en lamina liviana incluye retiro	M2	211,21	\$ 10.360,00	\$ 2.188.135,60	0,00	170,390	170,39	\$ -	\$ 1.765.240,40	\$ 1.765.240,40	40,82	\$ 422.895,20
1.7		Desmonte estructura cubierta arquitectonica incluye retiro	M2	50	\$ 29.180,00	\$ 1.459.000,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 1.459.000,00
1.8		Desmonte aparato sanitario incluye retiro	UND	4,00	\$ 56.890,00	\$ 227.560,00	0,00	4,000	4,00	\$ -	\$ 227.560,00	\$ 227.560,00	0,00	\$ -
1.9		Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro	UND	26,00	\$ 57.070,00	\$ 1.483.820,00	0,00	20,000	20,00	\$ -	\$ 1.141.400,00	\$ 1.141.400,00	\$ 6,00	\$ 342.420,00
2		CUBIERTA												
2.1		Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	350,89	\$ 170.645,00	\$ 59.877.624,05	0,00	324,290	\$ 324,29	\$ -	\$ 55.338.467,05	\$ 55.338.467,05	\$ 26,60	\$ 4.539.157,00
2.2		Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y /o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .	M2	350,89	\$ 48.540,00	\$ 17.032.200,60	0,00	324,290	\$ 324,29	\$ -	\$ 15.741.036,60	\$ 15.741.036,60	\$ 26,60	\$ 1.291.164,00
2.3		Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	M	70,62	\$ 52.450,00	\$ 3.704.019,00	0,00	32,700	\$ 32,70	\$ -	\$ 1.715.115,00	\$ 1.715.115,00	\$ 37,92	\$ 1.988.904,00
2.4		Caballette UPVC 0.6x0.94m 2mm para teja termoacustica color blanco	M	17,00	\$ 80.450,00	\$ 1.367.650,00	0,00	0,000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 17,00	\$ 1.367.650,00
2.5		Suministro e instalación canal de aguas lluvias lámina galvanizada calibre 22 desarrollo .60 cm incluye tapas, soportes, anclajes y tornillos de instalación, Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	M	59,08	\$ 177.340,00	\$ 10.477.247,20	0,00	0,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,08	\$ 10.477.247,20
2.6		Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación)	M	36,00	\$ 71.975,00	\$ 2.591.100,00	0,00	0,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,00	\$ 2.591.100,00
3		APARATOS SANITARIOS												
3.1		Suministro e instalación sanitario institucional tipo corona o similar	UND	3,00	\$ 872.250,00	\$ 2.616.750,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 2.616.750,00
3.2		Suministro e instalacion de lavamanos institucional de colgar incluye griferia y accesorios	UND	3,00	\$ 1.027.980,00	\$ 3.083.940,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 3.083.940,00
3.3		Suministro e instalación de dispensador de jabón en acero inoxidable de pared	UND	4,00	\$ 265.090,00	\$ 1.060.360,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 1.060.360,00

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04	
													Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023	
3,4		Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable de pared	UND	4,00	\$ 345.097,00	\$ 1.380.388,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 1.380.388,00
4		CARPINTERIA METALICA INSTALACION E												
4,1		Instalación puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,93x2, 50	UND	1,00	\$ 402.720,00	\$ 402.720,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 402.720,00
4,2		Instalación puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X2,50	UND	6,00	\$ 398.428,00	\$ 2.390.568,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,00	\$ 2.390.568,00
4,3		Instalación puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,74X2,50	UND	2,00	\$ 405.270,00	\$ 810.540,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 810.540,00
4,4		Instalación puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 0,83X2,67	UND	1,00	\$ 402.099,00	\$ 402.099,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 402.099,00
4,5		Instalación puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior ,85X2,50.	UND	1,00	\$ 378.510,00	\$ 378.510,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 378.510,00
4,6		Instalación puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,70X2,50	UND	1,00	\$ 412.065,00	\$ 412.065,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 412.065,00
4,7		Instalación puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermería, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,50	UND	4,00	\$ 362.400,00	\$ 1.449.600,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 1.449.600,00
4,8		Instalación puerta baño mujeres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,78X2,50	UND	1,00	\$ 425.740,00	\$ 425.740,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 425.740,00
4,9		Instalación puerta baño auxiliar en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,58X2,50	UND	1,00	\$ 297.360,00	\$ 297.360,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 297.360,00
4,10		Instalación puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87X3,20	UND	1,00	\$ 482.145,00	\$ 482.145,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 482.145,00
4,11		Instalación puerta archivo central en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87x2,50	UND	1,00	\$ 304.905,00	\$ 304.905,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 304.905,00
4,12		Instalación puerta vigilancia fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 1X3,20	UND	1,00	\$ 574.105,00	\$ 574.105,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 574.105,00
4,13		Instalación puerta grupo coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior.,90X2,50	UND	1,00	\$ 407.775,00	\$ 407.775,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 407.775,00
4,14		Instalación puerta secretaria en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,37	UND	1,00	\$ 330.920,00	\$ 330.920,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 330.920,00
4,15		Instalación puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X3,20	UND	1,00	\$ 489.666,00	\$ 489.666,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 489.666,00
4,16		Instalación puerta planta eléctrica en lamina coll rolled calibre 18, con un fijo en persiana metálica y en la parte superior.,1.50X2,50	UND	1,00	\$ 564.805,00	\$ 564.805,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 564.805,00

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04	
													Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023	
4,17		Instalación divisiones en lamina cold rolled calibre 18 entamborada incluye marco y pasador	M2	3,56	\$ 337.150,00	\$ 1.200.254,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,56	\$ 1.200.254,00
5		OBRA CIVIL Y ENCHAPES												
5,1		Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	M2	201,23	\$ 57.184,00	\$ 11.507.136,32	0,00	148,550	\$ 148,55	\$ -	\$ 8.494.683,20	\$ 8.494.683,20	\$ 52,68	\$ 3.012.453,12
5,2		Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega	M2	445,88	\$ 179.050,00	\$ 79.834.814,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445,88	\$ 79.834.814,00
5,3		Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega	M	457,98	\$ 44.153,00	\$ 20.221.190,94	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,98	\$ 20.221.190,94
5,4		Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm	M2	459,93	\$ 90.070,00	\$ 41.425.895,10	0,00	324,290	\$ 324,29	\$ -	\$ 29.208.800,30	\$ 29.208.800,30	\$ 135,64	\$ 12.217.094,80
5,5		Suministro e instalacion de salpicadero de cocineta en ceramica blanca de seccion 0, 25m x 0,43m para pared. (Instalacion horizontal)	M2	2,50	\$ 153.525,00	\$ 383.812,50	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,50	\$ 383.812,50
5,6		Placa de contrapiso e = 0.10 m, 20.7 mpa (3000	M2	5,00	\$ 176.895,00	\$ 884.475,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ 884.475,00
5,7		Corte de piso en concreto	M	8,94	\$ 15.970,00	\$ 142.771,80	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,94	\$ 142.771,80
5,8		Excavación manual en material común, incluye retiro	M3	1,00	\$ 130.175,00	\$ 130.175,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 130.175,00
5,9		Suministro e instalacion de ceramica para piso baño de seccion 0,30mx0,60m trafico pesado o alto incluye pega	M2	14,05	\$ 169.530,00	\$ 2.381.896,50	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,05	\$ 2.381.896,50
5,10		Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)	UND	25,00	\$ 39.140,00	\$ 978.500,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,00	\$ 978.500,00
6		PINTURA												
6,1		Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)	M2	149,59	\$ 36.495,00	\$ 5.459.287,05	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149,59	\$ 5.459.287,05
6,2		Pintura vinilo tipo 1 para muro y techos interno	M2	1.536,01	\$ 27.770,00	\$ 42.654.997,70	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.536,01	\$ 42.654.997,70
6,3		Pintura esmalte sobre ventanas	M2	67,94	\$ 16.740,00	\$ 1.137.315,60	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,94	\$ 1.137.315,60
7		VIDRIO												
7,1		Suministro e instalacion vidrio crudo traslucido 4	M2	5,00	\$ 258.010,00	\$ 1.290.050,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ 1.290.050,00
8		CIELO RASO												
8,1		Suministro e instalacion de cielo raso en aluminio y placa de fibra mineral 0.60m x 0.60m x 14mm	M2	211,21	\$ 169.520,00	\$ 35.804.319,20	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,21	\$ 35.804.319,20
9		MUROS LIVIANOS												
9,1		Suministro e instalacion de muro drywall doble cara, base 9 incluye pintura, encintado, masillado	M2	6,44	\$ 353.845,00	\$ 2.278.761,80	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,44	\$ 2.278.761,80
10		HIDROSANITARIO												
10,1		Suministro e instalación red de distribución de agua fría potable d= 1/2" pvc presion	M	4,47	\$ 11.960,00	\$ 53.461,20	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,47	\$ 53.461,20
10,2		Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)	UND	6,00	\$ 274.605,00	\$ 1.647.630,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,00	\$ 1.647.630,00
10,3		Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	UND	3,00	\$ 634.955,00	\$ 1.904.865,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 1.904.865,00
10,4		Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	UND	3,00	\$ 403.730,00	\$ 1.211.190,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 1.211.190,00
11		ASEO			\$ -									
11,1		Lavado, limpieza y desinfección de tanque subterráneo	GL	1,00	\$ 877.600,00	\$ 877.600,00	0,00	1,000	\$ 1,00	\$ -	\$ 877.600,00	\$ 877.600,00	\$ -	\$ -
11,2		Lavado, limpieza y desinfección de tanque elevado	GL	1,00	\$ 1.243.280,00	\$ 1.243.280,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.243.280,00
11,3		Mantenimiento, lavado, limpieza y sondeo de cajas sanitarias y aguas lluvias existentes incluye retiro de material	GL	1,00	\$ 1.082.670,00	\$ 1.082.670,00	0,00	1,000	\$ 1,00	\$ -	\$ 1.082.670,00	\$ 1.082.670,00	\$ -	\$ -
11,4		Aseo general y trasiego de mobiliario y equipos existente dentro del inmueble.	JORNAL	60,00	\$ 111.020,00	\$ 6.661.200,00	0,00	20,000	\$ 20,00	\$ -	\$ 2.220.400,00	\$ 2.220.400,00	\$ 40,00	\$ 4.440.800,00
12		EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO Y VENTILACION												
12,1		DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	UND	5	\$ 834.605,00	\$ 4.173.025,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ 4.173.025,00

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código:	EGAP-FR-04
													Versión:	01
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia:	02 de enero de 2023
12,2		DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOSICION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOSICION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).	UND	5	\$ 821.650,00	\$ 4.108.250,00	0,00	5,000	\$ 5,00	\$ -	\$ 4.108.250,00	\$ 4.108.250,00	\$ -	\$ -
12,3		INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 0,75 TR- 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	1	\$ 684.460,00	\$ 684.460,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 684.460,00
12,4		INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR- 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	5	\$ 684.460,00	\$ 3.422.300,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ 3.422.300,00
12,5		INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	UND	2	\$ 174.185,00	\$ 348.370,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 348.370,00
13		TUBERIA DE REFRIGERACION												
13,1		SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/4"Y AISLAMIENTO TUBERIA DE REFRIGERACION 1/4" X 1/2" ESPESOR INCLUYE ACCESORIOS, GASES DE SOLDADURA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTERIA	M	68	\$ 73.565,00	\$ 5.002.420,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,00	\$ 5.002.420,00
13,2		SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/2"Y AISLAMIENTO TUBERIA DE REFRIGERACION 1/2" X 1/2" ESPESOR INCLUYE ACCESORIOS GASES DE SOLDADURA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTERIA	M	68	\$ 82.780,00	\$ 5.629.040,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,00	\$ 5.629.040,00
13,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE (INCLUYE TUBERÍA PVC, ACCESORIOS Y RUBATEX)	M	68	\$ 31.890,00	\$ 2.168.520,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,00	\$ 2.168.520,00
13,4		Ajuste de Refrigerante R-410A	KG	18	\$ 65.180,00	\$ 1.173.240,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,00	\$ 1.173.240,00
13,5		Planimetría, dossier de montaje y manual de mantenimientoARRANQUE, AJUSTE Y BALANCEO DEL SISTEMA DE A.A.	UND	1	\$ 3.643.270,00	\$ 3.643.270,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 3.643.270,00
14		PRESUPUESTO OBRA ELECTRICA											\$ -	\$ -
14,1		Suministros E Instalación Salida Luminaria	UN	13	\$ 165.420,00	\$ 2.150.460,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,00	\$ 2.150.460,00
14,2		Suministros E Instalación Salida Luminaria	UN	32	\$ 165.420,00	\$ 5.293.440,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,00	\$ 5.293.440,00
14,3		Suministros E Instalación Salida Luminaria De	UN	16	\$ 165.420,00	\$ 2.646.720,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,00	\$ 2.646.720,00
14,4		Suministro e Instalación Salida Luminaria De	UN	3	\$ 122.780,00	\$ 368.340,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 368.340,00
14,5		Instalación Luminaria Tipo Panel Led 18W	UN	13	\$ 15.220,00	\$ 197.860,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,00	\$ 197.860,00
14,6		Instalación De Luminaria Panel Led De 60X60	UN	32	\$ 15.220,00	\$ 487.040,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,00	\$ 487.040,00
14,7		Instalación De Luminaria De Lineal Led 120	UN	16	\$ 15.220,00	\$ 243.520,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,00	\$ 243.520,00
14,8		Instalación De Luminaria De Emergencia	UN	3	\$ 15.220,00	\$ 45.660,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 45.660,00
14,9		Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Monofásica Con Polo A Tierra. 15A	UN	52	\$ 41.050,00	\$ 2.134.600,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,00	\$ 2.134.600,00
14,10		Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Monofásica Regulada	UN	49	\$ 54.880,00	\$ 2.689.120,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,00	\$ 2.689.120,00
14,11		Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Gfci Con Polo A Tierra	UN	2	\$ 105.970,00	\$ 211.940,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 211.940,00
14,12		Suministros E Instalación Interruptor Sencillo	UN	28	\$ 74.020,00	\$ 2.072.560,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,00	\$ 2.072.560,00
14,13		Instalacion De Bandeja Portacables Tipo Malla Con Accesorios.	M	85	\$ 33.260,00	\$ 2.827.100,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,00	\$ 2.827.100,00
14,14		Instalación De Canaleta Metálica 12X5 Cms Con Divison, Tapa Y Troqueles	M	150	\$ 33.260,00	\$ 4.989.000,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,00	\$ 4.989.000,00
14,15		Instalación Tablero Trifásico 225A, 18 Ctos. Twc Tipo Pesado Con Espacio Para Totalizador, Certificado	UN	2	\$ 45.480,00	\$ 90.960,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 90.960,00
14,16		Instalación Interruptor Termo Magnético Tipo Enchufable 1X20A, 10Ka.	UN	36	\$ 13.058,00	\$ 470.088,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,00	\$ 470.088,00
14,17		Instalación de Interruptor Breaker Industrial De 3X70	UN	2	\$ 57.880,00	\$ 115.760,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 115.760,00
14,18		Suministro E Instalación De Cable Trenzado Procables O Similar 3X12 Cobre Ls-Zhfr	M	500	\$ 26.280,00	\$ 13.140.000,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,00	\$ 13.140.000,00

<div><div>FONDECUN FONDO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALABANZAGA</div></div>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04	
													Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023	
14,19		Presentación Documentación Entrega De Adecuación Realizada: Memorias De Calculo, Diagrama Unifilar General Actualizado De La Instalación Eléctrica, Cuadros De Carga, Planimetría De Distribución De Tomas Normales Regulada Instalados, Planimetría Nuevas Rutas De Canalizaciones Principales Y De Circuitos, Planimetría De Aires Acondicionados, Planos Récord. Entrega De Documento De Certificaciones De Cableado Estructurado De Puntos De Voz Y Datos Y Demás Información Necesaria Para Entrega Del Informe Final. Planos (Cableado, Tubería, Canaletas, Bandeja Portacables) Y Demás Información Necesaria Como Informe Detallado De La Certificación De Todos Los Puntos. Se Debe Entregar Declaración De Cumplimiento De Responsabilidad Retie Del Diseñador Y Del Constructor.	GL	1	\$ 4.515.220,00	\$ 4.515.220,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 4.515.220,00
14,20		Certificacion retie	UN	1	\$ 5.023.865,00	\$ 5.023.865,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 5.023.865,00
15		TRANSFOMADOR Y ACOMETIDAS												
15,1		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x6+1x6+8T Cobre LS-ZHFR Planta electrica a transferencia automatica	M	15	\$ 75.720,00	\$ 1.135.800,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 1.135.800,00
15,2		Suministro e instalación de acometida eléctrica para bomba de agua potable 3x10+12T Cobre LS-ZHFR	M	30	\$ 21.615,00	\$ 648.450,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 648.450,00
15,3		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x4+1x4+6T Cobre LS-ZHFR celda de medida a transferencia automatica	M	30	\$ 88.710,00	\$ 2.661.300,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 2.661.300,00
15,4		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x6+1x6+8T Cobre LS-ZHFR transferencia automatica a tablero de circuitos	M	30	\$ 75.720,00	\$ 2.271.600,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 2.271.600,00
16		RED DE VOZ Y DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO												
16,1		Suministro E Instalación De Cable S/FTP 24 Awg (Cmr) Lshf Cat 6A	M	900	\$ 19.395,00	\$ 17.455.500,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900,00	\$ 17.455.500,00
16,2		Suministro, Instalación, Certificación Y Marquillado De Punto De Voz Y/O Datos En Puestos De Trabajo, Con Sus Respectivos Conectores Y Jack Rj45 Cat 6A Blindados, Face Plate Y Demás Accesorios, Con Conexión A Patchpanel Y Switch.	UN	50	\$ 61.865,00	\$ 3.093.250,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,00	\$ 3.093.250,00
16,3		Mantenimiento y organización de cableado de rack de comunicaciones existente	GL	1	\$ 379.720,00	\$ 379.720,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 379.720,00
17		OTROS											\$ -	\$ -
17,1		Desmorte de toma eléctrica Normal o Regulada mas tubería, cajas y cable	UN	30	\$ 23.570,00	\$ 707.100,00	0,00	15,000	\$ 15,00	\$ -	\$ 353.550,00	\$ 353.550,00	\$ 15,00	\$ 353.550,00
17,2		Desmorte de luminarias existentes mas tubería, cajas y cable	UN	50	\$ 23.570,00	\$ 1.178.500,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,00	\$ 1.178.500,00
17,3		Desmorte de puntos de datos mas cable UTP mas tubería, cajas y cable	UN	30	\$ 36.540,00	\$ 1.096.200,00	0,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 1.096.200,00
17,4		Desmorte de canaleta Metalica de 2,44 mt	UN	30	\$ 62.480,00	\$ 1.874.400,00	0,00	30,000	\$ 30,00	\$ -	\$ 1.874.400,00	\$ 1.874.400,00	\$ -	\$ -
17,5		Desmorte de tablero eléctrico hasta 12 circuitos existente	UN	3	\$ 275.480,00	\$ 826.440,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 826.440,00
17,6		Revisión y mantenimiento de bomba de agua del tanque elevado	UN	1	\$ 291.080,00	\$ 291.080,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 291.080,00
17,7		Desmorte de tubería eléctrica con cableado	UN	50	\$ 62.480,00	\$ 3.124.000,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,00	\$ 3.124.000,00
17,8		Desmorte acometida eléctrica	M	50	\$ 62.480,00	\$ 3.124.000,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,00	\$ 3.124.000,00

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO										Código: EGAP-FR-04	
												Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										Vigencia: 02 de enero de 2023	
17,9		<p>Diagnostico y Mantenimiento de planta eléctrica existente, cambio de aceite, refrigerante, Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas de planta antes de efectuar el mantenimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de datos del moto-generador. • Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de alta temperatura, bajo nivel de agua del radiador, largo arranque y baja presión de aceite. • Revisión y limpieza general del motor de arranque (marcha), cargador de baterías y sistema de control de arranque. • Revisión del sistema eléctrico, de control y medición. • Sustitución de filtros de aire, aceite y combustible (si lo requiere). • Revisión del sistema de calefacción del motor. • Revisión y limpieza general del motor y generador. • Suministro, drenado y reposición de niveles de anticongelante (si lo requiere), aceite lubricante y filtros cada 6 mes, cada 250h o 10h dependiendo del equipo (lo primero que ocurra). • Comprobación de niveles de combustible (Diesel), anticongelante y electrolito. 	GL	1	\$ 2.895.480,00	\$ 2.895.480,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 2.895.480,00
17,10		Revisión y Mantenimiento de UPS existente	UN	1	\$ 1.545.480,00	\$ 1.545.480,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.545.480,00
17,11		Desmonte de transferencia automatica red normal y planta electrica	UN	1	\$ 1.245.480,00	\$ 1.245.480,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.245.480,00
17,12		Montaje de transferencia electrica trifasica de 30 kVA, para una tension de trabajo de 208/120V, conmutado con 2 contactores <red planta> con interruptores automaticos, tablero de control y barrajes de conexiones para fases, neutro y linea a tierra.	UN	1	\$ 612.535,00	\$ 612.535,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 612.535,00
18		SUMINISTRO DE EQUIPOS A.A.			\$ -	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18,1		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 0.75 TR- 220V/-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	1	\$ 2.908.600,00	\$ 2.908.600,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 2.908.600,00
18,2		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR- 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	5	\$ 3.139.000,00	\$ 15.695.000,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ 15.695.000,00
18,3		SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	Und	2	\$ 660.000,00	\$ 1.320.000,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 1.320.000,00
19		SUMINISTRO EQUIPOS E INSUMOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS											
19,1		SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 18W	UND	13	\$ 65.750,00	\$ 854.750,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,00	\$ 854.750,00
19,2		SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60	UND	30	\$ 138.550,00	\$ 4.156.500,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 4.156.500,00
19,3		SUMINISTRO DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM	UND	15	\$ 107.350,00	\$ 1.610.250,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 1.610.250,00
19,4		SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	UND	3	\$ 193.280,00	\$ 579.840,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 579.840,00
19,5		SUMINISTRO DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON DIVISION Y ACCESORIOS.	ML	85	\$ 97.000,00	\$ 8.245.000,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,00	\$ 8.245.000,00
19,6		SUMINISTRO DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	ML	150	\$ 48.400,00	\$ 7.260.000,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,00	\$ 7.260.000,00
19,7		SUMINISTROS DE TABLERO TRIFÁSICO 225A, 18 CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CERTIFICADO	UN	2	\$ 541.000,00	\$ 1.082.000,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 1.082.000,00
19,8		SUMINISTROS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A, 10KA.	UN	36	\$ 19.000,00	\$ 684.000,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,00	\$ 684.000,00

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04	
													Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023	
19,9		SUMINISTRO DE INTERRUPTOR BREAKER INDUSTRIAL DE 3X70	UN	2	\$ 317.900,00	\$ 635.800,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 635.800,00
19,10		Suministro De Patchcord Para Puesto De Trabajo 2 Metro Con Suministro E Instalación Cat 6A Y Marquillado	UN	50	\$ 38.895,00	\$ 1.944.750,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,00	\$ 1.944.750,00
19,11		Suministro De Patchcord 1.5 Metros Para Conexiones Entre Switch Y Patchpanel Con Suministro E Instalación De Jack RJ45 Cat 6A Blindado Y Marquillado	UN	50	\$ 56.865,00	\$ 2.843.250,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,00	\$ 2.843.250,00
19,12		SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 30KVA INCLUYE (GABINETE METALICO, MODULO TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, 2 CONTACTORES (RED Y PLANTA), SELECTORES (MAN-OFF-AUTO ; RED-PLANTA), INDICADORES LED DE FUNCIONAMIENTO O FALLA, BREAKERS, BARRAJES DE CONEXIÓN L1-L2-L3, BARRAJE DE CONEXION NEUTRO Y TIERRA, ACRILICO DE PROTECCION BARRAJES, MARQUILLADO DE TABLERO.)	UN	1	\$ 5.042.015,00	\$ 5.042.015,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 5.042.015,00
20		SUMINISTRO DE INSUMOS CARPINTERIA METALICA												
20,1		Suministro puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, .93x2, 50	UND	1,00	\$ 1.219.585,00	\$ 1.219.585,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.219.585,00
20,2		Suministro puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, .88X2,50	UND	6,00	\$ 1.136.660,00	\$ 6.819.960,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,00	\$ 6.819.960,00
20,3		Suministro puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior, .74X2,50	UND	2,00	\$ 885.590,00	\$ 1.771.180,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 1.771.180,00
20,4		Suministro puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, 0,83X2,67	UND	1,00	\$ 1.144.220,00	\$ 1.144.220,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.144.220,00
20,5		Suministro puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, .85X2,50	UND	1,00	\$ 1.104.240,00	\$ 1.104.240,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.104.240,00
20,6		Suministro puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior, .70X2,50	UND	1,00	\$ 841.140,00	\$ 841.140,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 841.140,00
20,7		Suministro puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermería, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, .80X2,50	UND	4,00	\$ 1.033.135,00	\$ 4.132.540,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 4.132.540,00
20,8		Suministro puerta baño mujeres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior, .78X2,50	UND	1,00	\$ 934.905,00	\$ 934.905,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 934.905,00
20,9		Suministro puerta baño auxiliar en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior, .58X2,50	UND	1,00	\$ 714.400,00	\$ 714.400,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 714.400,00
20,10		Suministro puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, .87X3,20	UND	1,00	\$ 1.460.435,00	\$ 1.460.435,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.460.435,00
20,11		Suministro puerta archivo central en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, .87X2,50	UND	1,00	\$ 1.212.735,00	\$ 1.212.735,00	0,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.212.735,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Nota 1:

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado cliente (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas.

Avaló - Supervisor FONDECÚN: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte de FONDECUN.

<div><div>FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA</div></div>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO										Código: EGAP-FR-04			
												Versión: 01			
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										Vigencia: 02 de enero de 2023			
ACTA No.		2													
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 -0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S						CONTRATO No.		2025-0105					
OBJETO:		REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN													
CONTRATISTA :		ACRUX ARQUITECTURA S.A.S.													
INTERVENIOR:															
SUPERVISOR FONDECÚN:		Ing BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO													
PERIODO A PAGAR:		DEL 30 DE MAYO AL 07 JULIO DE 2025													
En ____INIRIDA____, a los SIETE (07) días del mes de ____Julio____ del año ____2025____, se reunieron <u>NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA</u> , Representante Legal de ACRUX ARQUITECTURA SAS Contratista y el Ing <u>BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPÓ</u> , SUPERVISOR, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:															
ÍTEM		DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO Y/O ACTA DE MAYORES Y MENORES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
1.		PRELIMINARES													
1,1		Demolicion baldosa y/o esmaltado de piso, incluye retiro	M2	459,93	\$ 28.050,00	\$ 12.901.036,50	273,97		273,97	\$ 7.684.858,50	\$ -	\$ 7.684.858,50	185,96	\$ 5.216.178,00	
1,2		Demolicion enchape muro, incluye retiro	M2	59,62	\$ 28.050,00	\$ 1.672.341,00	52,27		52,27	\$ 1.466.173,50	\$ -	\$ 1.466.173,50	7,35	\$ 206.167,50	
1,3		Demolicion pañete, cargue manual y retiro	M2	101,87	\$ 19.870,00	\$ 2.024.156,90	98,15		98,15	\$ 1.950.240,50	\$ -	\$ 1.950.240,50	3,72	\$ 73.916,40	
1,4		Demolicion muro, incluye retiro	M2	3,46	\$ 74.840,00	\$ 258.946,40	3,46		3,46	\$ 258.946,40	\$ -	\$ 258.946,40	0,00	\$ -	
1,5		Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc	M2	350,89	\$ 27.430,00	\$ 9.624.912,70	324,29		324,29	\$ 8.895.274,70	\$ -	\$ 8.895.274,70	26,60	\$ 729.638,00	
1,6		Desmonte cielo raso en lamina liviana incluye retiro	M2	211,21	\$ 10.360,00	\$ 2.188.135,60	170,39		170,39	\$ 1.765.240,40	\$ -	\$ 1.765.240,40	40,82	\$ 422.895,20	
1,7		Desmonte estructura cubierta arquitectonica incluye retiro	M2	50	\$ 29.180,00	\$ 1.459.000,00			0,00	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 1.459.000,00	
1,8		Desmonte aparato sanitario incluye retiro	UND	4,00	\$ 56.890,00	\$ 227.560,00	4,00		4,00	\$ 227.560,00	\$ -	\$ 227.560,00	0,00	\$ -	
1,9		Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro	UND	26,00	\$ 57.070,00	\$ 1.483.820,00	20,00		20,00	\$ 1.141.400,00	\$ -	\$ 1.141.400,00	6,00	\$ 342.420,00	
2		CUBIERTA													
2,1		Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	350,89	\$ 170.645,00	\$ 59.877.624,05	324,29		\$ 324,29	\$55.338.467,05	\$ -	\$ 55.338.467,05	26,60	\$ 4.539.157,00	
2,2		Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y /o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .	M2	350,89	\$ 48.540,00	\$ 17.032.200,60	324,29		\$ 324,29	\$15.741.036,60	\$ -	\$ 15.741.036,60	26,60	\$ 1.291.164,00	
2,3		Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	M	70,62	\$ 52.450,00	\$ 3.704.019,00	32,70		\$ 32,70	\$ 1.715.115,00	\$ -	\$ 1.715.115,00	37,92	\$ 1.988.904,00	
2,4		Caballote UPVC 0.6x0.94m 2mm para teja termoacustica color blanco	M	17,00	\$ 80.450,00	\$ 1.367.650,00	0,00		\$ -		\$ -	\$ -	17,00	\$ 1.367.650,00	
2,5		Suministro e instalación canal de aguas lluvias lámina galvanizada calibre 22 desarrollo ,60 cm incluye tapas, soportes, anclajes y tornillos de instalación, Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	M	59,08	\$ 177.340,00	\$ 10.477.247,20	0,00	36,000	\$ 36,00	\$ -	\$ 6.384.240,00	\$ 6.384.240,00	23,08	\$ 4.093.007,20	
2,6		Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).	M	36,00	\$ 71.975,00	\$ 2.591.100,00	0,00	32,000	\$ 32,00	\$ -	\$ 2.303.200,00	\$ 2.303.200,00	4,00	\$ 287.900,00	
3		APARATOS SANITARIOS											0,00		
3,1		Suministro e instalación sanitario institucional tipo corona o similar	UND	3,00	\$ 872.250,00	\$ 2.616.750,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 2.616.750,00	
3,2		Suministro e instalacion de lavamanos institucional de colgar incluye griferia y accesorios	UND	3,00	\$ 1.027.980,00	\$ 3.083.940,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 3.083.940,00	
3,3		Suministro e instalación de dispensador de jabón en acero inoxidable de pared	UND	4,00	\$ 265.090,00	\$ 1.060.360,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.060.360,00	
3,4		Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable de pared	UND	4,00	\$ 345.097,00	\$ 1.380.388,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.380.388,00	

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código:	EGAP-FR-04
													Versión:	01
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia:	02 de enero de 2023
4		CARPINTERIA METALICA INSTALACION E											0,00	
4,1		Instalación puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .93x2,50	UND	1,00	\$ 402.720,00	\$ 402.720,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 402.720,00
4,2		Instalación puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .88X2,50	UND	6,00	\$ 398.428,00	\$ 2.390.568,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 2.390.568,00
4,3		Instalación puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. .74X2,50	UND	2,00	\$ 405.270,00	\$ 810.540,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 810.540,00
4,4		Instalación puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 0,83X2,67	UND	1,00	\$ 402.099,00	\$ 402.099,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 402.099,00
4,5		Instalación puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .85X2,50.	UND	1,00	\$ 378.510,00	\$ 378.510,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 378.510,00
4,6		Instalación puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. .70X2,50	UND	1,00	\$ 412.065,00	\$ 412.065,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 412.065,00
4,7		Instalación puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermería, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .80X2,50	UND	4,00	\$ 362.400,00	\$ 1.449.600,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.449.600,00
4,8		Instalación puerta baño mujeres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. .78X2,50	UND	1,00	\$ 425.740,00	\$ 425.740,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 425.740,00
4,9		Instalación puerta baño auxiliar en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. .58X2,50	UND	1,00	\$ 297.360,00	\$ 297.360,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 297.360,00
4,10		Instalación puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .87X3,20	UND	1,00	\$ 482.145,00	\$ 482.145,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 482.145,00
4,11		Instalación puerta archivo central en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .87x2,50	UND	1,00	\$ 304.905,00	\$ 304.905,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 304.905,00
4,12		Instalación puerta vigilancia fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 1X3,20	UND	1,00	\$ 574.105,00	\$ 574.105,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 574.105,00
4,13		Instalación puerta grupo coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .90X2,50	UND	1,00	\$ 407.775,00	\$ 407.775,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 407.775,00
4,14		Instalación puerta secretaria en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .80X2,37	UND	1,00	\$ 330.920,00	\$ 330.920,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 330.920,00
4,15		Instalación puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. .88X3,20	UND	1,00	\$ 489.666,00	\$ 489.666,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 489.666,00
4,16		Instalación puerta planta eléctrica en lamina coll rolled calibre 18, con un fijo en persiana metálica y en la parte superior. .1,50X2,50	UND	1,00	\$ 564.805,00	\$ 564.805,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 564.805,00
4,17		Instalación divisiones en lamina cold rolled calibre 18 entamborada incluye marco y pasador	M2	3,56	\$ 337.150,00	\$ 1.200.254,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,56	\$ 1.200.254,00

<div><div>FONDECUN FUNDACIÓN NACIONAL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</div></div>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO												Código: EGAP-FR-04	
														Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL												Vigencia: 02 de enero de 2023	
5		OBRA CIVIL Y ENCHAPES												0,00	
5,1		Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	M2	201,23	\$ 57.184,00	\$ 11.507.136,32	148,55		\$ 148,55	\$ 8.494.683,20	\$ -	\$ 8.494.683,20	52,68	\$ 3.012.453,12	
5,2		Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.	M2	445,88	\$ 179.050,00	\$ 79.834.814,00	137,38	\$ 137,38	\$ -	\$ 24.597.889,00	\$ 24.597.889,00	308,50	\$ 55.236.925,00		
5,3		Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega	M	457,98	\$ 44.153,00	\$ 20.221.190,94	132,30	\$ 132,30	\$ -	\$ 5.841.441,90	\$ 5.841.441,90	325,68	\$ 14.379.749,04		
5,4		Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm	M2	459,93	\$ 90.070,00	\$ 41.425.895,10	324,29	80,00	\$ 404,29	\$29.208.800,30	\$ 7.205.600,00	\$ 36.414.400,30	55,64	\$ 5.011.494,80	
5,5		Suministro e instalacion de salpicadero de cocineta en ceramica blanca de seccion 0,25m x 0,43m para pared. (Instalacion horizontal)	M2	2,50	\$ 153.525,00	\$ 383.812,50			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,50	\$ 383.812,50	
5,6		Placa de contrapiso e = 0.10 m, 20.7 mpa	M2	5,00	\$ 176.895,00	\$ 884.475,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 884.475,00	
5,7		Corte de piso en concreto	M	8,94	\$ 15.970,00	\$ 142.771,80			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8,94	\$ 142.771,80	
5,8		Excavación manual en material común, incluye retiro	M3	1,00	\$ 130.175,00	\$ 130.175,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 130.175,00	
5,9		Suministro e instalacion de ceramica para piso baño de seccion 0,30mx0,60m trafico pesado o alto incluye pega.	M2	14,05	\$ 169.530,00	\$ 2.381.896,50			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14,05	\$ 2.381.896,50	
5,10		Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)	UND	25,00	\$ 39.140,00	\$ 978.500,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	25,00	\$ 978.500,00	
6		PINTURA													
6,1		Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)	M2	149,59	\$ 36.495,00	\$ 5.459.287,05	39,22	\$ 39,22	\$ -	\$ 1.431.479,88	\$ 1.431.479,88	110,37	\$ 4.027.953,15		
6,2		Pintura vinilo tipo 1 para muro y techos	M2	1.536,01	\$ 27.770,00	\$ 42.654.997,70			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.536,01	\$ 42.654.997,70	
6,3		Pintura esmalte sobre ventanas	M2	67,94	\$ 16.740,00	\$ 1.137.315,60			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	67,94	\$ 1.137.315,60	
7		VIDRIO											0,00		
7,1		Suministro e instalacion vidrio crudo traslucido	M2	5,00	\$ 258.010,00	\$ 1.290.050,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 1.290.050,00	
8		CIELO RASO													
8,1		Suministro e instalacion de cielo raso en aluminio y placa de fibra mineral 0.60m x 0.60m x 14mm	M2	211,21	\$ 169.520,00	\$ 35.804.319,20			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	211,21	\$ 35.804.319,20	
9		MUROS LIVIANOS											0,00		
9,1		Suministro e instalacion de muro drywall doble cara, base 9 incluye pintura, encintado, masillado	M2	6,44	\$ 353.845,00	\$ 2.278.761,80			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,44	\$ 2.278.761,80	
10		HIDROSANITARIO											0,00		
10,1		Suministro e instalación red de distribución de agua fría potable d= 1/2" pvc presion	M	4,47	\$ 11.960,00	\$ 53.461,20			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,47	\$ 53.461,20	
10,2		Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)	UND	6,00	\$ 274.605,00	\$ 1.647.630,00	6,000	\$ 6,00	\$ -	\$ 1.647.630,00	\$ 1.647.630,00	0,00	\$ -		
10,3		Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	UND	3,00	\$ 634.955,00	\$ 1.904.865,00	3,000	\$ 3,00	\$ -	\$ 1.904.865,00	\$ 1.904.865,00	0,00	\$ -		
10,4		Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	UND	3,00	\$ 403.730,00	\$ 1.211.190,00	2,000	\$ 2,00	\$ -	\$ 807.460,00	\$ 807.460,00	1,00	\$ 403.730,00		
11		ASEO				\$ -							0,00		
11,1		Lavado, limpieza y desinfección de tanque subterráneo	GL	1,00	\$ 877.600,00	\$ 877.600,00	1,00	\$ 1,00	\$ 877.600,00	\$ -	\$ 877.600,00	0,00	\$ -		
11,2		Lavado, limpieza y desinfección de tanque elevado.	GL	1,00	\$ 1.243.280,00	\$ 1.243.280,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.243.280,00	
11,3		Mantenimiento, lavado, limpieza y sondeo de cajas sanitarias y aguas lluvias existentes incluye retiro de material	GL	1,00	\$ 1.082.670,00	\$ 1.082.670,00	1,00	\$ 1,00	\$ 1.082.670,00	\$ -	\$ 1.082.670,00	0,00	\$ -		
11,4		Aseo general y trasiego de mobiliario y equipos existente dentro del inmueble.	JORNAL	60,00	\$ 111.020,00	\$ 6.661.200,00	20,00	\$ 20,00	\$ 2.220.400,00	\$ -	\$ 2.220.400,00	40,00	\$ 4.440.800,00		
12		EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO Y VENTILACION													
12,1		DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	UND	5	\$ 834.605,00	\$ 4.173.025,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 4.173.025,00	
12,2		DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOSICION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOSICION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).	UND	5	\$ 821.650,00	\$ 4.108.250,00	5,00	\$ 5,00	\$ 4.108.250,00	\$ -	\$ 4.108.250,00	0,00	\$ -		

<div><div>FONDECUN</div><div>PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</div></div>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO										Código: EGAP-FR-04	
												Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										Vigencia: 02 de enero de 2023	
12,3	INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 0,75 TR- 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	1	\$ 684.460,00	\$ 684.460,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 684.460,00
12,4	INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR- 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	5	\$ 684.460,00	\$ 3.422.300,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 3.422.300,00
12,5	INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	UND	2	\$ 174.185,00	\$ 348.370,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 348.370,00
13	TUBERIA DE REFRIGERACION											0,00	
13,1	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/4"Y AISLAMIENTO TUBERIA DE REFRIGERACIÓN 1/4" X 1/2" ESPESOR INCLUYE ACCESORIOS, GASES DE SOLDADURA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTERIA	M	68	\$ 73.565,00	\$ 5.002.420,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	68,00	\$ 5.002.420,00
13,2	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/2"Y AISLAMIENTO TUBERIA DE REFRIGERACIÓN 1/2" X 1/2" ESPESOR INCLUYE ACCESORIOS GASES DE SOLDADURA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTERIA	M	68	\$ 82.780,00	\$ 5.629.040,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	68,00	\$ 5.629.040,00
13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE (INCLUYE TUBERIA PVC, ACCESORIOS Y RUBATEX)	M	68	\$ 31.890,00	\$ 2.168.520,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	68,00	\$ 2.168.520,00
13,4	Ajuste de Refrigerante R-410A	KG	18	\$ 65.180,00	\$ 1.173.240,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18,00	\$ 1.173.240,00
13,5	Planimetria, dossier de montage y manual de mantenimientoARRANQUE, AJUSTE Y BALANCEO DEL SISTEMA DE A.A.	UND	1	\$ 3.643.270,00	\$ 3.643.270,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 3.643.270,00
14	PRESUPUESTO OBRA ELECTRICA												
14,1	Suministros E Instalación Salida Luminaria	UN	13	\$ 165.420,00	\$ 2.150.460,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 2.150.460,00
14,2	Suministros E Instalación Salida Luminaria	UN	32	\$ 165.420,00	\$ 5.293.440,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 5.293.440,00
14,3	Suministros E Instalación Salida Luminaria De 120 Cm	UN	16	\$ 165.420,00	\$ 2.646.720,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	16,00	\$ 2.646.720,00
14,4	Suministro e Instalación Salida Luminaria De Emergencia	UN	3	\$ 122.780,00	\$ 368.340,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 368.340,00
14,5	Instalación Luminaria Tipo Panel Led 18W	UN	13	\$ 15.220,00	\$ 197.860,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 197.860,00
14,6	Instalación De Luminaria Panel Led De 60X60	UN	32	\$ 15.220,00	\$ 487.040,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 487.040,00
14,7	Instalación De Luminaria De Lineal Led 120	UN	16	\$ 15.220,00	\$ 243.520,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	16,00	\$ 243.520,00
14,8	Instalación De Luminaria De Emergencia	UN	3	\$ 15.220,00	\$ 45.660,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 45.660,00
14,9	Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Monofásica Con Polo A Tierra, 15A.	UN	52	\$ 41.050,00	\$ 2.134.600,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	52,00	\$ 2.134.600,00
14,10	Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Monofásica Regulada	UN	49	\$ 54.880,00	\$ 2.689.120,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	49,00	\$ 2.689.120,00
14,11	Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Gfci Con Polo A Tierra	UN	2	\$ 105.970,00	\$ 211.940,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 211.940,00
14,12	Suministros E Instalación Interruptor Sencillo	UN	28	\$ 74.020,00	\$ 2.072.560,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28,00	\$ 2.072.560,00
14,13	Instalación De Bandeja Portacables Tipo Malla Con Accesorios.	M	85	\$ 33.260,00	\$ 2.827.100,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	85,00	\$ 2.827.100,00
14,14	Instalación De Canaleta Metálica 12X5 Cms Con Divison, Tapa Y Troqueles	M	150	\$ 33.260,00	\$ 4.989.000,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	150,00	\$ 4.989.000,00
14,15	Instalación Tablero Trifásico 225A, 18 Ctos. Twc Tipo Pesado Con Espacio Para Totalizador, Certificado	UN	2	\$ 45.480,00	\$ 90.960,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 90.960,00
14,16	Instalación Interruptor Termo Magnético Tipo Enchufable 1X20A, 10Ka.	UN	36	\$ 13.058,00	\$ 470.088,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	36,00	\$ 470.088,00
14,17	Instalación de Interruptor Breaker Industrial De 3X70	UN	2	\$ 57.880,00	\$ 115.760,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 115.760,00
14,18	Suministro E Instalación De Cable Trenzado Procables O Similar 3X12 Cobre Ls-Zhfr	M	500	\$ 26.280,00	\$ 13.140.000,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500,00	\$ 13.140.000,00

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO										Código: EGAP-FR-04		
												Versión: 01		
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										Vigencia: 02 de enero de 2023		
14,19		Presentación Documentación Entrega De Adecuación Realizada: Memorias De Calculo, Diagrama Unifilar General Actualizado De La Instalación Eléctrica, Cuadros De Carga, Planimetría De Distribución De Tomas Normales Regulada Instalados, Planimetría Nuevas Rutas De Canalizaciones Principales Y De Circuitos, Planimetría De Aires Acondicionados, Planos Récord. Entrega De Documento De Certificaciones De Cableado Estructurado De Puntos De Voz Y Datos Y Demás Información Necesaria Para Entrega Del Informe Final. Planos (Cableado, Tubería, Canaletas, Bandeja Portacables) Y Demás Información Necesaria Como Informe Detallado De La Certificación De Todos Los Puntos. Se Debe Entregar Declaración De Cumplimiento De Responsabilidad Retie Del Diseñador Y Del Constructor.	GL	1	\$ 4.515.220,00	\$ 4.515.220,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 4.515.220,00
14,20		Certificacion retie	UN	1	\$ 5.023.865,00	\$ 5.023.865,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 5.023.865,00
15		TRANSFORMADOR Y ACOMETIDAS											0,00	
15,1		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x6+1x6+8T Cobre LS-ZHFR Planta electrica a transferencia automatica	M	15	\$ 75.720,00	\$ 1.135.800,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,00	\$ 1.135.800,00
15,2		Suministro e instalación de acometida eléctrica para bomba de agua potable 3x10+12T Cobre LS-ZHFR	M	30	\$ 21.615,00	\$ 648.450,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 648.450,00
15,3		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x4+1x4+6T Cobre LS-ZHFR celda de medida a transferencia automatica	M	30	\$ 88.710,00	\$ 2.661.300,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 2.661.300,00
15,4		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x6+1x6+8T Cobre LS-ZHFR transferencia automatica a tablero de circuitos	M	30	\$ 75.720,00	\$ 2.271.600,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 2.271.600,00
16		RED DE VOZ Y DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO											0,00	
16,1		Suministro E Instalación De Cable S/FTP 24 Awg (Cmr) Lshf Cat 6A	M	900	\$ 19.395,00	\$ 17.455.500,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	900,00	\$ 17.455.500,00
16,2		Suministro, Instalación, Certificación Y Marquillado De Punto De Voz Y/O Datos En Puestos De Trabajo, Con Sus Respectivos Conectores Y Jack Rj45 Cat 6A Blindados, Face Plate Y Demás Accesorios, Con Conexión A Patchpanel Y Switch.	UN	50	\$ 61.865,00	\$ 3.093.250,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 3.093.250,00
16,3		Mantenimiento y organización de cableado de rack de comunicaciones existente	GL	1	\$ 379.720,00	\$ 379.720,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 379.720,00
17		OTROS												
17,1		Desmonte de toma eléctrica Normal o Regulada mas tubería, cajas y cable	UN	30	\$ 23.570,00	\$ 707.100,00	15,00		\$ 15,00	\$ 353.550,00	\$ -	\$ 353.550,00	15,00	\$ 353.550,00
17,2		Desmonte de luminarias existentes mas tubería, cajas y cable	UN	50	\$ 23.570,00	\$ 1.178.500,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 1.178.500,00
17,3		Desmonte de puntos de datos mas cable UTP mas tubería, cajas y cable	UN	30	\$ 36.540,00	\$ 1.096.200,00				\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 1.096.200,00
17,4		Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt	UN	30	\$ 62.480,00	\$ 1.874.400,00	30,00		\$ 30,00	\$ 1.874.400,00	\$ -	\$ 1.874.400,00	0,00	\$ -
17,5		Desmonte de tablero eléctrico hasta 12 circuitos existente	UN	3	\$ 275.480,00	\$ 826.440,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 826.440,00
17,6		Revisión y mantenimiento de bomba de agua del tanque elevado	UN	1	\$ 291.080,00	\$ 291.080,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 291.080,00
17,7		Desmonte de tubería eléctrica con cableado	UN	50	\$ 62.480,00	\$ 3.124.000,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 3.124.000,00
17,8		Desmonte acometida eléctrica	M	50	\$ 62.480,00	\$ 3.124.000,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 3.124.000,00

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO										Código:	EGAP-FR-04
												Versión:	01
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										Vigencia:	02 de enero de 2023
17,9		Diagnostico y Mantenimiento de planta eléctrica existente, cambio de aceite, refrigerante, Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas de planta antes de efectuar el mantenimiento. • Registro de datos del moto-generador. • Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de alta temperatura, bajo nivel de agua del radiador, largo arranque y baja presión de aceite. • Revisión y limpieza general del motor de arranque (marcha), cargador de baterías y sistema de control de arranque. • Revisión del sistema eléctrico, de control y medición. • Sustitución de filtros de aire, aceite y combustible (si lo requiere). • Revisión del sistema de calefacción del motor. • Revisión y limpieza general del motor y generador. • Suministro, drenado y reposición de niveles de anticongelante (si lo requiere), aceite lubricante y filtros cada 6 mes, cada 250h o 10h dependiendo del equipo (lo primero que ocurra). • Comprobación de niveles de combustible	GL	1	\$ 2.895.480,00	\$ 2.895.480,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.895.480,00
17,10		Revisión y Mantenimiento de UPS existente	UN	1	\$ 1.545.480,00	\$ 1.545.480,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.545.480,00
17,11		Desmonte de transferencia automatica red normal y planta electrica	UN	1	\$ 1.245.480,00	\$ 1.245.480,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.245.480,00
17,12		Montaje de transferencia electrica trifasica de 30 kVA, para una tension de trabajo de 208/120V, conmutado con 2 contactores <red planta> con interruptores automaticos, tablero de control y barrajes de conexiones para fases, neutro y linea a tierra.	UN	1	\$ 612.535,00	\$ 612.535,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 612.535,00
18		SUMINISTRO DE EQUIPOS A.A.			\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
18,1		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 0,75 TR- 220V/-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	1	\$ 2.908.600,00	\$ 2.908.600,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.908.600,00
18,2		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR- 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	5	\$ 3.139.000,00	\$ 15.695.000,00	5,000	\$ 5,00	\$ -	\$ 15.695.000,00	\$ 15.695.000,00	0,00	\$ -
18,3		SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	Und	2	\$ 660.000,00	\$ 1.320.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.320.000,00
19		SUMINISTRO EQUIPOS E INSUMOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS											
19,1		SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 18W	UND	13	\$ 65.750,00	\$ 854.750,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 854.750,00
19,2		SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60	UND	30	\$ 138.550,00	\$ 4.156.500,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 4.156.500,00
19,3		SUMINISTRO DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM	UND	15	\$ 107.350,00	\$ 1.610.250,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,00	\$ 1.610.250,00
19,4		SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	UND	3	\$ 193.280,00	\$ 579.840,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 579.840,00
19,5		SUMINISTRO DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON DIVISION Y ACCESORIOS.	ML	85	\$ 97.000,00	\$ 8.245.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	85,00	\$ 8.245.000,00
19,6		SUMINISTRO DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	ML	150	\$ 48.400,00	\$ 7.260.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	150,00	\$ 7.260.000,00
19,7		SUMINISTROS DE TABLERO TRIFÁSICO 225A, 18 CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CERTIFICADO	UN	2	\$ 541.000,00	\$ 1.082.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.082.000,00
19,8		SUMINISTROS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A, 10KA.	UN	36	\$ 19.000,00	\$ 684.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	36,00	\$ 684.000,00
19,9		SUMINISTRO DE INTERRUPTOR BREAKER INDUSTRIAL DE 3X70	UN	2	\$ 317.900,00	\$ 635.800,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 635.800,00

		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04	
													Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023	
19,10		Suministro De Patchcord Para Puesto De Trabajo 2 Metro Con Suministro E Instalación Cat 6A Y Marquillado	UN	50	\$ 38.895,00	\$ 1.944.750,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 1.944.750,00
19,11		Suministro De Patchcord 1.5 Metros Para Conexiones Entre Switch Y Patchpanel Con Suministro E Instalación De Jack Rj45 Cat 6A Blindado Y Marquillado	UN	50	\$ 56.865,00	\$ 2.843.250,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 2.843.250,00
19,12		SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 30KVA INCLUYE (GABINETE METALICO, MODULO TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, 2 CONTACTORES (RED Y PLANTA), SELECTORES (MAN-OFF-AUTO ; RED-PLANTA), INDICADORES LED DE FUNCIONAMIENTO O FALLA, BREAKERS, BARRAJES DE CONEXIÓN L1-L2-L3, BARRAJE DE CONEXION NEUTRO Y TIERRA, ACRILICO DE PROTECCION BARRAJES, MARQUILLADO DE TABLERO.)	UN	1	\$ 5.042.015,00	\$ 5.042.015,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 5.042.015,00
20		SUMINISTRO DE INSUMOS CARPINTERIA METALICA												
20,1		Suministro puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,93x2,50	UND	1,00	\$ 1.219.585,00	\$ 1.219.585,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.219.585,00
20,2		Suministro puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88x2,50	UND	6,00	\$ 1.136.660,00	\$ 6.819.960,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 6.819.960,00
20,3		Suministro puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,74x2,50	UND	2,00	\$ 885.590,00	\$ 1.771.180,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.771.180,00
20,4		Suministro puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 0,83x2,67	UND	1,00	\$ 1.144.220,00	\$ 1.144.220,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.144.220,00
20,5		Suministro puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior ,85x2,50.	UND	1,00	\$ 1.104.240,00	\$ 1.104.240,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.104.240,00
20,6		Suministro puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,70x2,50	UND	1,00	\$ 841.140,00	\$ 841.140,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 841.140,00
20,7		Suministro puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermería, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80x2,50	UND	4,00	\$ 1.033.135,00	\$ 4.132.540,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 4.132.540,00
20,8		Suministro puerta baño mujeres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,78x2,50	UND	1,00	\$ 934.905,00	\$ 934.905,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 934.905,00
20,9		Suministro puerta baño auxiliar en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,58x2,50	UND	1,00	\$ 714.400,00	\$ 714.400,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 714.400,00
20,10		Suministro puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87x3,20	UND	1,00	\$ 1.460.435,00	\$ 1.460.435,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.460.435,00
20,11		Suministro puerta archivo central en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87x2,50	UND	1,00	\$ 1.212.735,00	\$ 1.212.735,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.212.735,00
20,12		Suministro puerta vigilancia fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 1x3,20	UND	1,00	\$ 1.656.565,00	\$ 1.656.565,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.656.565,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

20,13		Suministro puerta grupo coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior.,90X2,50	UND	1,00	\$ 1.162.200,00	\$ 1.162.200,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.162.200,00
20,14		Suministro puerta secretaria en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,37	UND	1,00	\$ 992.040,00	\$ 992.040,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 992.040,00
20,15		Suministro puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X3,20	UND	1,00	\$ 1.475.245,00	\$ 1.475.245,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.475.245,00
20,16		Suministro puerta planta eléctrica en lamina coll rolled calibre 18, con un fijo en persiana metálica y en la parte superior.,1,50X2,50	UND	1,00	\$ 1.670.610,00	\$ 1.670.610,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.670.610,00
20,17		Suministro divisiones en lamina cold rolled calibre 18 entamborada incluye marco y pasador	M2	3,56	\$ 329.735,00	\$ 1.173.856,60			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,56	\$ 1.173.856,60

		pasé
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		

ITEM NO PREVISTOS

1.						\$	-	\$	-	0.00			0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	-
2.						\$	-	\$	-	0.00			0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	-
3.						\$	-	\$	-	0.00			0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	-

VALOR TOTAL ITEM NO PREVISTOS			
-------------------------------	--	--	--

VALOR TOTAL PRELIMINAR PREVISTOS																		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA						\$	533.784.722,66			\$	144.404.666,15	\$	52.123.805,78	\$	196.528.471,93	\$	337.256.396,71	
		ADMINISTRACIÓN	33,44%			\$	178.497.611,26			\$	48.288.920,36	\$	17.430.200,65	\$	65.719.121,01	\$	112.778.539,06	
		IMPREVISTOS	3,63%			\$	19.376.385,43			\$	5.241.889,38	\$	1.892.094,15	\$	7.133.983,53	\$	12.242.407,20	
		UTILIDAD	2,93%			\$	15.639.892,37			\$	4.231.056,72	\$	1.527.227,51	\$	5.758.284,23	\$	9.881.612,42	
		IVA 16% SOBRE UTILIDAD	19%			\$	2.971.579,55			\$	803.900,78	\$	290.173,23	\$	1.094.074,00	\$	1.877.506,36	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$	216.485.468,62			\$	58.565.767,24	\$	21.139.695,54	\$	79.705.462,77	\$	136.780.965,04	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						\$	750.270.191,28			\$	202.970.433,39	\$	73.263.501,32	\$	276.233.934,70	\$	474.036.461,75	
		SUB TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO DE EQUIPOS A.A., ELECTRICOS E INSUMOS				\$	84.347.611,60					\$	15.695.000,00	\$	15.695.000,00	\$	68.652.611,60	
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%			\$	16.026.046,20					\$	2.982.050,00	\$	2.982.050,00	\$	13.043.996,20
		COSTO TOTAL					\$	100.373.657,80					\$	18.677.050,00	\$	18.677.050,00	\$	81.696.607,80
		TOTAL PROYECTO					\$	850.643.849,08					\$	91.940.551,32	\$	294.910.984,70	\$	555.733.069,55

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	850.643.849,08
V/R ADICIONES:	
V/R TOTAL CONTRATO:	850.643.849,08

V/R ANTICIPO: _____
% ANTICIPO : _____
% RETEGARANTIA : _____

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	(1)			0%	\$ -	0.00	0.00	\$	850 643 849.08	0.00%
	PAGO ACTA PARCIAL No. 1		202 970 433.39	24%	\$ -	0.00	0.000	202 970 433.39	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
				0%	\$ -	0.00	0.000	0.00	\$ 647 673 415.69	24.00%
	TOTAL		202 970 433.39	\$ 0.24	\$ -	0.00	0.000	202 970 433.39	\$ 647 673 415.69	

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorias: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 10 DE 2025

CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP. LEGAL ACRUY ARQUITECTURA SAS

Aprobó

Firma:

Nombre: ING BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO
ING. SUPERVISOR DEL PROYECTO FONDECUN

Nota 1:

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en la que la misma se encuentre.

Avaló - Designado cliente (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas.

Avaló - Supervisor FONDECÚN: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte de FONDECÚN.

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04		
												Versión: 01		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023		
ACTA No.	3													
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 –0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S						CONTRATO No. 2025-0105							
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN)													
CONTRATISTA :	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S.													
INTERVENIOR:														
SUPERVISOR FONDECÚN:	Ing BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO													
PERIODO A PAGAR:	DEL 8 DE JULIO AL 08 AGOSTO DE 2025													
En <u>INIRIDA</u> , a los OCHO (08) días del mes de <u>Agosto</u> del año <u>2025</u> se reunieron <u>NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA</u> , Representante Legal de ACRUX ARQUITECTURA SAS Contratista y el Ing <u>BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPÓ</u> , SUPERVISOR, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:														
ÍTEM		DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO Y/O ACTA DE MAYORES Y MENORES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.		PRELIMINARES												
1.1		Demolicion baldosa y/o esmaltado de piso, incluye retiro	M2	459,93	\$ 28.050,00	\$ 12.901.036,50	273,97		273,97	\$ 7.684.858,50	\$ -	\$ 7.684.858,50	185,96	\$ 5.216.178,00
1.2		Demolicion enchape muro, incluye retiro	M2	59,62	\$ 28.050,00	\$ 1.672.341,00	52,27		52,27	\$ 1.466.173,50	\$ -	\$ 1.466.173,50	7,35	\$ 206.167,50
1.3		Demolicion pañete, cargue manual y retiro	M2	101,87	\$ 19.870,00	\$ 2.024.156,90	98,15		98,15	\$ 1.950.240,50	\$ -	\$ 1.950.240,50	3,72	\$ 73.916,40
1.4		Demolicion muro, incluye retiro	M2	3,46	\$ 74.840,00	\$ 258.946,40	3,46		3,46	\$ 258.946,40	\$ -	\$ 258.946,40	0,00	\$ -
1.5		Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc	M2	350,89	\$ 27.430,00	\$ 9.624.912,70	324,29		324,29	\$ 8.895.274,70	\$ -	\$ 8.895.274,70	26,60	\$ 729.638,00
1.6		Desmonte cielo raso en lamina liviana incluye retiro	M2	211,21	\$ 10.360,00	\$ 2.188.135,60	170,39		170,39	\$ 1.765.240,40	\$ -	\$ 1.765.240,40	40,82	\$ 422.895,20
1.7		Desmonte estructura cubierta arquitectonica incluye retiro	M2	50	\$ 29.180,00	\$ 1.459.000,00	0,00	50,00	50,00	\$ -	\$ 1.459.000,00	\$ 1.459.000,00	0,00	\$ -
1.8		Desmonte aparato sanitario incluye retiro	UND	4,00	\$ 56.890,00	\$ 227.560,00	4,00		4,00	\$ 227.560,00	\$ -	\$ 227.560,00	0,00	\$ -
1.9		Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro	UND	26,00	\$ 57.070,00	\$ 1.483.820,00	20,00		20,00	\$ 1.141.400,00	\$ -	\$ 1.141.400,00	6,00	\$ 342.420,00
2		CUBIERTA												
2.1		Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	350,89	\$ 170.645,00	\$ 59.877.624,05	324,29	22,88	347,17	\$ 55.338.467,05	\$ 3.904.357,60	\$ 59.242.824,65	3,72	\$ 634.799,40
2.2		Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y /o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .	M2	350,89	\$ 48.540,00	\$ 17.032.200,60	324,29	22,88	347,17	\$ 15.741.036,60	\$ 1.110.595,20	\$ 16.851.631,80	3,72	\$ 180.568,80
2.3		Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	M	70,62	\$ 52.450,00	\$ 3.704.019,00	32,70		32,70	\$ 1.715.115,00	\$ -	\$ 1.715.115,00	37,92	\$ 1.988.904,00
2.4		Caballette UPVC 0.6x0.94m 2mm para teja termoacustica color blanco	M	17,00	\$ 80.450,00	\$ 1.367.650,00	0,00	12,000	12,00	\$ -	\$ 965.400,00	\$ 965.400,00	5,00	\$ 402.250,00
2.5		Suministro e instalación canal de aguas lluvias lámina galvanizada calibre 22 desarrollo ,60 cm incluye tapas, soportes, anclajes y tornillos de instalación, Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	M	59,08	\$ 177.340,00	\$ 10.477.247,20	36,00	23,060	59,06	\$ 6.384.240,00	\$ 4.089.460,40	\$ 10.473.700,40	0,02	\$ 3.546,80
2.6		Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).	M	36,00	\$ 71.975,00	\$ 2.591.100,00	32,00		32,00	\$ 2.303.200,00	\$ -	\$ 2.303.200,00	4,00	\$ 287.900,00
3		APARATOS SANITARIOS											0,00	
3.1		Suministro e instalación sanitario institucional tipo corona o similar	UND	3,00	\$ 872.250,00	\$ 2.616.750,00	0,00	3,000	3,00	\$ -	\$ 2.616.750,00	\$ 2.616.750,00	0,00	\$ -
3.2		Suministro e instalacion de lavamanos institucional de colgar incluye griferia y accesorios	UND	3,00	\$ 1.027.980,00	\$ 3.083.940,00	0,00	3,000	3,00	\$ -	\$ 3.083.940,00	\$ 3.083.940,00	0,00	\$ -
3.3		Suministro e instalación de dispensador de jabón en acero inoxidable de pared	UND	4,00	\$ 265.090,00	\$ 1.060.360,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.060.360,00
3.4		Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable de pared	UND	4,00	\$ 345.097,00	\$ 1.380.388,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.380.388,00
4		CARPINTERIA METALICA INSTALACION E											0,00	

<div><div>FONDECÚN FONDO DE GARANTÍA DE PROYECTOS DE LUJANBARÍA</div></div>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO												Código: EGAP-FR-04	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL												Versión: 01	
														Vigencia: 02 de enero de 2023	
4,1		Instalación puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,93x2, 50	UND	1,00	\$ 402.720,00	\$ 402.720,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 402.720,00	
4,2		Instalación puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X2,50	UND	6,00	\$ 398.428,00	\$ 2.390.568,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 2.390.568,00	
4,3		Instalación puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,74X2,50	UND	2,00	\$ 405.270,00	\$ 810.540,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 810.540,00	
4,4		Instalación puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 0,83X2,67	UND	1,00	\$ 402.099,00	\$ 402.099,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 402.099,00	
4,5		Instalación puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior ,85X2,50.	UND	1,00	\$ 378.510,00	\$ 378.510,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 378.510,00	
4,6		Instalación puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,70X2,50	UND	1,00	\$ 412.065,00	\$ 412.065,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 412.065,00	
4,7		Instalación puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermería, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,50	UND	4,00	\$ 362.400,00	\$ 1.449.600,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.449.600,00	
4,8		Instalación puerta baño mujeres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,78X2,50	UND	1,00	\$ 425.740,00	\$ 425.740,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 425.740,00	
4,9		Instalación puerta baño auxiliar en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,58X2,50	UND	1,00	\$ 297.360,00	\$ 297.360,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 297.360,00	
4,10		Instalación puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87X3,20	UND	1,00	\$ 482.145,00	\$ 482.145,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 482.145,00	
4,11		Instalación puerta archivo central en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87x2,50	UND	1,00	\$ 304.905,00	\$ 304.905,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 304.905,00	
4,12		Instalación puerta vigilancia fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 1X3,20	UND	1,00	\$ 574.105,00	\$ 574.105,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 574.105,00	
4,13		Instalación puerta grupo coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,90X2,50	UND	1,00	\$ 407.775,00	\$ 407.775,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 407.775,00	
4,14		Instalación puerta secretaria en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,37	UND	1,00	\$ 330.920,00	\$ 330.920,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 330.920,00	
4,15		Instalación puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X3,20	UND	1,00	\$ 489.666,00	\$ 489.666,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 489.666,00	
4,16		Instalación puerta planta eléctrica en lamina coll rolled calibre 18, con un fijo en persiana metálica y en la parte superior. ,1,50X2,50	UND	1,00	\$ 564.805,00	\$ 564.805,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 564.805,00	
4,17		Instalación divisiones en lamina cold rolled calibre 18 entamborada incluye marco y pasador	M2	3,56	\$ 337.150,00	\$ 1.200.254,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,56	\$ 1.200.254,00	
5		OBRA CIVIL Y ENCHAPES											0,00		

<div><div>FONDECUN</div><div>FONDO DE CARBOLLOJE</div><div>PROYECTO DE CARABAMBIA</div></div>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO												Código: EGAP-FR-04	
														Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL												Vigencia: 02 de enero de 2023	
5,1		Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	M2	201,23	\$ 57.184,00	\$ 11.507.136,32	148,55	52,27	200,82	\$ 8.494.683,20	\$ 2.989.007,68	\$ 11.483.690,88	0,41	\$ 23.445,44	
5,2		Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.	M2	445,88	\$ 179.050,00	\$ 79.834.814,00	137,38	128,80	266,18	\$ 24.597.889,00	\$ 23.061.640,00	\$ 47.659.529,00	179,70	\$ 32.175.285,00	
5,3		Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega	M	457,98	\$ 44.153,00	\$ 20.221.190,94	132,30	94,70	227,00	\$ 5.841.441,90	\$ 4.181.289,10	\$ 10.022.731,00	230,98	\$ 10.198.459,94	
5,4		Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm	M2	459,93	\$ 90.070,00	\$ 41.425.895,10	404,29		404,29	\$ 36.414.400,30	\$ -	\$ 36.414.400,30	55,64	\$ 5.011.494,80	
5,5		Suministro e instalacion de salpicadero de cocineta en ceramica blanca de seccion 0, 25m x 0,43m para pared. (Instalacion horizontal)	M2	2,50	\$ 153.525,00	\$ 383.812,50	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,50	\$ 383.812,50	
5,6		Placa de contrapiso e = 0.10 m, 20,7 mpa (3000 psi)	M2	5,00	\$ 176.895,00	\$ 884.475,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 884.475,00	
5,7		Corte de piso en concreto	M	8,94	\$ 15.970,00	\$ 142.771,80	0,00	8,000	8,00	\$ -	\$ 127.760,00	\$ 127.760,00	0,94	\$ 15.011,80	
5,8		Excavación manual en material común, incluye retiro	M3	1,00	\$ 130.175,00	\$ 130.175,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 130.175,00	
5,9		Suministro e instalacion de ceramica para piso baño de seccion 0,30mx0,60m trafico pesado o alto incluye pega.	M2	14,05	\$ 169.530,00	\$ 2.381.896,50	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	14,05	\$ 2.381.896,50	
5,10		Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)	UND	25,00	\$ 39.140,00	\$ 978.500,00	0,00	10,000	10,00	\$ -	\$ 391.400,00	\$ 391.400,00	15,00	\$ 587.100,00	
6		PINTURA													
6,1		Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)	M2	149,59	\$ 36.495,00	\$ 5.459.287,05	39,22		39,22	\$ 1.431.479,88	\$ -	\$ 1.431.479,88	110,37	\$ 4.027.953,15	
6,2		Pintura vinilo tipo 1 para muro y techos interno (3	M2	1.536,01	\$ 27.770,00	\$ 42.654.997,70	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1.536,01	\$ 42.654.997,70	
6,3		Pintura esmalte sobre ventanas	M2	67,94	\$ 16.740,00	\$ 1.137.315,60	0,00	43,52	43,52	\$ -	\$ 728.524,80	\$ 728.524,80	24,42	\$ 408.790,80	
7		VIDRIO											0,00		
7,1		Suministro e instalacion vidrio crudo traslucido 4 mm	M2	5,00	\$ 258.010,00	\$ 1.290.050,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 1.290.050,00	
8		CIELO RASO													
8,1		Suministro e instalacion de cielo raso en aluminio y placa de fibra mineral 0.60m x 0.60m x 14mm	M2	211,21	\$ 169.520,00	\$ 35.804.319,20	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	211,21	\$ 35.804.319,20	
9		MUROS LIVIANOS											0,00		
9,1		Suministro e instalacion de muro drywall doble cara, base 9 incluye pintura, encintado, masillado	M2	6,44	\$ 353.845,00	\$ 2.278.761,80	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,44	\$ 2.278.761,80	
10		HIDROSANITARIO											0,00		
10,1		Suministro e instalación red de distribución de agua fria potable d= 1/2" pvc presion	M	4,47	\$ 11.960,00	\$ 53.461,20	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,47	\$ 53.461,20	
10,2		Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)	UND	6,00	\$ 274.605,00	\$ 1.647.630,00	6,00		6,00	\$ 1.647.630,00	\$ -	\$ 1.647.630,00	0,00	\$ -	
10,3		Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	UND	3,00	\$ 634.955,00	\$ 1.904.865,00	3,00		3,00	\$ 1.904.865,00	\$ -	\$ 1.904.865,00	0,00	\$ -	
10,4		Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	UND	3,00	\$ 403.730,00	\$ 1.211.190,00	2,00		2,00	\$ 807.460,00	\$ -	\$ 807.460,00	1,00	\$ 403.730,00	
11		ASEO				\$ -							0,00		
11,1		Lavado, limpieza y desinfección de tanque subterráneo	GL	1,00	\$ 877.600,00	\$ 877.600,00	1,00		1,00	\$ 877.600,00	\$ -	\$ 877.600,00	0,00	\$ -	
11,2		Lavado, limpieza y desinfección de tanque elevado.	GL	1,00	\$ 1.243.280,00	\$ 1.243.280,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.243.280,00	
11,3		Mantenimiento, lavado, limpieza y sondeo de cajas sanitarias y aguas lluvias existentes incluye retiro de material	GL	1,00	\$ 1.082.670,00	\$ 1.082.670,00	1,00		1,00	\$ 1.082.670,00	\$ -	\$ 1.082.670,00	0,00	\$ -	
11,4		Aseo general y trasiego de mobiliario y equipos existente dentro del inmueble.	JORNAL	60,00	\$ 111.020,00	\$ 6.661.200,00	20,00	20,000	40,00	\$ 2.220.400,00	\$ 2.220.400,00	\$ 4.440.800,00	20,00	\$ 2.220.400,00	
12		EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO Y VENTILACION													
12,1		DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	UND	5	\$ 834.605,00	\$ 4.173.025,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 4.173.025,00	

 FONDECÚN <small>FONDO DE INICIACIÓN DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA</small>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código:	EGAP-FR-04
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Versión:	01
													Vigencia:	02 de enero de 2023
12,2		DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOSICION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERACION R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOSICION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).	UND	5	\$ 821.650,00	\$ 4.108.250,00	5,00		5,00	\$ 4.108.250,00	\$ -	4.108.250,00	0,00	\$ -
12,3		INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 0,75 TR 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	1	\$ 684.460,00	\$ 684.460,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 684.460,00
12,4		INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	5	\$ 684.460,00	\$ 3.422.300,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 3.422.300,00
12,5		INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	UND	2	\$ 174.185,00	\$ 348.370,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 348.370,00
13		TUBERIA DE REFRIGERACION											0,00	
13,1		SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/4"Y AISLAMIENTO TUBERIA DE REFRIGERACION 1/4" X 1/2" ESPESOR INCLUYE ACCESORIOS, GASES DE SOLDADURA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTERIA	M	68	\$ 73.565,00	\$ 5.002.420,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	68,00	\$ 5.002.420,00
13,2		SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/2"Y AISLAMIENTO TUBERIA DE REFRIGERACION 1/2" X 1/2" ESPESOR INCLUYE ACCESORIOS GASES DE SOLDADURA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTERIA	M	68	\$ 82.780,00	\$ 5.629.040,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	68,00	\$ 5.629.040,00
13,3		SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE (INCLUYE TUBERIA PVC, ACCESORIOS Y RUBATEX)	M	68	\$ 31.890,00	\$ 2.168.520,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	68,00	\$ 2.168.520,00
13,4		Ajuste de Refrigerante R-410A	KG	18	\$ 65.180,00	\$ 1.173.240,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	18,00	\$ 1.173.240,00
13,5		Planimetria, dossier de montaje y manual de mantenimientoARRANQUE, AJUSTE Y BALANCEO DEL SISTEMA DE A.A.	UND	1	\$ 3.643.270,00	\$ 3.643.270,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 3.643.270,00
14		PRESUPUESTO OBRA ELECTRICA												
14,1		Suministros E Instalacion Salida Luminaria Panel Led	UN	13	\$ 165.420,00	\$ 2.150.460,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 2.150.460,00
14,2		Suministros E Instalacion Salida Luminaria Panel	UN	32	\$ 165.420,00	\$ 5.293.440,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 5.293.440,00
14,3		Suministros E Instalación Salida Luminaria De 120 Cm	UN	16	\$ 165.420,00	\$ 2.646.720,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	16,00	\$ 2.646.720,00
14,4		Suministro e Instalación Salida Luminaria De Emergencia	UN	3	\$ 122.780,00	\$ 368.340,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 368.340,00
14,5		Instalación Luminaria Tipo Panel Led 18W	UN	13	\$ 15.220,00	\$ 197.860,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 197.860,00
14,6		Instalación De Luminaria Panel Led De 60X60	UN	32	\$ 15.220,00	\$ 487.040,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 487.040,00
14,7		Instalación De Luminaria De Lineal Led 120 Cm	UN	16	\$ 15.220,00	\$ 243.520,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	16,00	\$ 243.520,00
14,8		Instalación De Luminaria De Emergencia	UN	3	\$ 15.220,00	\$ 45.660,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 45.660,00
14,9		Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Monofásica Con Polo A Tierra, 15A.	UN	52	\$ 41.050,00	\$ 2.134.600,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	52,00	\$ 2.134.600,00
14,10		Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Monofásica Regulada	UN	49	\$ 54.880,00	\$ 2.689.120,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	49,00	\$ 2.689.120,00
14,11		Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Gfci Con Polo A Tierra	UN	2	\$ 105.970,00	\$ 211.940,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 211.940,00
14,12		Suministros E Instalación Interruptor Sencillo	UN	28	\$ 74.020,00	\$ 2.072.560,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	28,00	\$ 2.072.560,00
14,13		Instalacion De Bandeja Portacables Tipo Malla Con Accesorios.	M	85	\$ 33.260,00	\$ 2.827.100,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	85,00	\$ 2.827.100,00
14,14		Instalación De Canaleta Metálica 12X5 Cms Con Divison, Tapa Y Troqueles	M	150	\$ 33.260,00	\$ 4.989.000,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	150,00	\$ 4.989.000,00
14,15		Instalación Tablero Trifásico 225A, 18 Ctos. Twc Tipo Pesado Con Espacio Para Totalizador, Certificado	UN	2	\$ 45.480,00	\$ 90.960,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 90.960,00
14,16		Instalación Interruptor Termo Magnético Tipo Enchufable 1X20A, 10Ka.	UN	36	\$ 13.058,00	\$ 470.088,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	36,00	\$ 470.088,00
14,17		Instalación de Interruptor Breaker Industrial De 3X70	UN	2	\$ 57.880,00	\$ 115.760,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 115.760,00
14,18		Suministro E Instalación De Cable Trenzado Procables O Similar 3X12 Cobre Ls-Zhfr	M	500	\$ 26.280,00	\$ 13.140.000,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	500,00	\$ 13.140.000,00

<div><div>FONDECÚN</div><div>FONDO DE DESARROLLO</div><div>PROYECTOS DE INICIATIVA</div></div>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04	
													Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023	
14,19		Presentación Documentación Entrega De Adecuación Realizada: Memorias De Calculo, Diagrama Unifilar General Actualizado De La Instalación Eléctrica, Cuadros De Carga, Planimetría De Distribución De Tomas Normales Regulada Instalados, Planimetría Nuevas Rutas De Canalizaciones Principales Y De Circuitos, Planimetría De Aires Acondicionados, Planos Récord. Entrega De Documento De Certificaciones De Cableado Estructurado De Puntos De Voz Y Datos Y Demás Información Necesaria Para Entrega Del Informe Final. Planos (Cableado, Tubería, Canaletas, Bandeja Portacables) Y Demás Información Necesaria Como Informe Detallado De La Certificación De Todos Los Puntos. Se Debe Entregar Declaración De Cumplimiento De Responsabilidad Retie Del Diseñador Y Del Constructor.	GL	1	\$ 4.515.220,00	\$ 4.515.220,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 4.515.220,00
14,20		Certificacion retie	UN	1	\$ 5.023.865,00	\$ 5.023.865,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 5.023.865,00
15		TRANSFOMADOR Y ACOMETIDAS											0,00	
15,1		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x6+1x6+8T Cobre LS-ZHFR Planta electrica a transferencia automatica	M	15	\$ 75.720,00	\$ 1.135.800,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	15,00	\$ 1.135.800,00
15,2		Suministro e instalación de acometida eléctrica para bomba de agua potable 3x10+12T Cobre LS-ZHFR	M	30	\$ 21.615,00	\$ 648.450,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 648.450,00
15,3		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x4+1x4+6T Cobre LS-ZHFR celda de medida a transferencia automatica	M	30	\$ 88.710,00	\$ 2.661.300,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 2.661.300,00
15,4		Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x6+1x6+8T Cobre LS-ZHFR transferencia automatica a tablero de circuitos	M	30	\$ 75.720,00	\$ 2.271.600,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 2.271.600,00
16		RED DE VOZ Y DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO											0,00	
16,1		Suministro E Instalación De Cable S/FTP 24 Awg (Cmr) Lshf Cat 6A	M	900	\$ 19.395,00	\$ 17.455.500,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	900,00	\$ 17.455.500,00
16,2		Suministro, Instalación, Certificación Y Marquillado De Punto De Voz Y/O Datos En Puestos De Trabajo, Con Sus Respectivos Conectores Y Jack RJ45 Cat 6A Blindados, Face Plate Y Demás Accesorios, Con Conexión A Patchpanel Y Switch.	UN	50	\$ 61.865,00	\$ 3.093.250,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 3.093.250,00
16,3		Mantenimiento y organización de cableado de rack de comunicaciones existente	GL	1	\$ 379.720,00	\$ 379.720,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 379.720,00
17		OTROS												
17,1		Desmonte de toma eléctrica Normal o Regulada mas tubería, cajas y cable	UN	30	\$ 23.570,00	\$ 707.100,00	15,00		15,00	\$ 353.550,00	\$ -	\$ 353.550,00	15,00	\$ 353.550,00
17,2		Desmonte de luminarias existentes mas tubería, cajas y cable	UN	50	\$ 23.570,00	\$ 1.178.500,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 1.178.500,00
17,3		Desmonte de puntos de datos mas cable UTP mas tubería, cajas y cable	UN	30	\$ 36.540,00	\$ 1.096.200,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 1.096.200,00
17,4		Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt	UN	30	\$ 62.480,00	\$ 1.874.400,00	30,00		30,00	\$ 1.874.400,00	\$ -	\$ 1.874.400,00	0,00	\$ -
17,5		Desmonte de tablero eléctrico hasta 12 circuitos existente	UN	3	\$ 275.480,00	\$ 826.440,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 826.440,00
17,6		Revisión y mantenimiento de bomba de agua del tanque elevado	UN	1	\$ 291.080,00	\$ 291.080,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 291.080,00
17,7		Desmonte de tubería eléctrica con cableado	UN	50	\$ 62.480,00	\$ 3.124.000,00	0,00	30,000	30,00	\$ -	\$ 1.874.400,00	\$ 1.874.400,00	20,00	\$ 1.249.600,00
17,8		Desmonte acometida eléctrica	M	50	\$ 62.480,00	\$ 3.124.000,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 3.124.000,00

 FONDECÚN <small>FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</small> <small>PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</small>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO										Código: EGAP-FR-04	
												Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										Vigencia: 02 de enero de 2023	
17,9		Diagnostico y Mantenimiento de planta eléctrica existente, cambio de aceite, refrigerante, Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas de planta antes de efectuar el mantenimiento. • Registro de datos del moto-generador. • Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de alta temperatura, bajo nivel de agua del radiador, largo arranque y baja presión de aceite. • Revisión y limpieza general del motor de arranque (marcha), cargador de baterías y sistema de control de arranque. • Revisión del sistema eléctrico, de control y medición. • Sustitución de filtros de aire, aceite y combustible (si lo requiere). • Revisión del sistema de calefacción del motor. • Revisión y limpieza general del motor y generador. • Suministro, drenado y reposición de niveles de anticongelante (si lo requiere), aceite lubricante y filtros cada 6 mes, cada 250h o 10h dependiendo del equipo (lo primero que ocurra). • Comprobación de niveles de combustible (Diesel), anticongelante y electrolito. • Pruebas de operación. • Exploración del sistema moto-generador: manual y automático, en vacío y con carga. • Entrega de constancia de servicio realizado.	GL	1	\$ 2.895.480,00	\$ 2.895.480,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.895.480,00
17,10		Revisión y Mantenimiento de UPS existente	UN	1	\$ 1.545.480,00	\$ 1.545.480,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.545.480,00
17,11		Desmonte de transferencia automatica red normal y planta electrica	UN	1	\$ 1.245.480,00	\$ 1.245.480,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.245.480,00
17,12		Montaje de transferencia electrica trifasica de 30 kVA, para una tension de trabajo de 208/120V, conmutado con 2 contactores <red planta> con interruptores automaticos, tablero de control y barrajes de conexiones para fases, neutro y linea a tierra.	UN	1	\$ 612.535,00	\$ 612.535,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 612.535,00
18		SUMINISTRO DE EQUIPOS A.A.				\$ -	0,00		\$ -	\$ -	\$ -		
18,1		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 0,75 TR- 220V/-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	1	\$ 2.908.600,00	\$ 2.908.600,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.908.600,00
18,2		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR- 220V/INVERTER-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	5	\$ 3.139.000,00	\$ 15.695.000,00	5,00	5,00	\$ 15.695.000,00	\$ -	\$ 15.695.000,00	0,00	\$ -
18,3		SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	Und	2	\$ 660.000,00	\$ 1.320.000,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.320.000,00
19		SUMINISTRO EQUIPOS E INSUMOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS											
19,1		SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 18W	UND	13	\$ 65.750,00	\$ 854.750,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 854.750,00
19,2		SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60	UND	30	\$ 138.550,00	\$ 4.156.500,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 4.156.500,00
19,3		SUMINISTRO DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM	UND	15	\$ 107.350,00	\$ 1.610.250,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	15,00	\$ 1.610.250,00
19,4		SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	UND	3	\$ 193.280,00	\$ 579.840,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 579.840,00
19,5		SUMINISTRO DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON DIVISION Y ACCESORIOS.	ML	85	\$ 97.000,00	\$ 8.245.000,00	0,00	70,000	\$ -	\$ 6.790.000,00	\$ 6.790.000,00	15,00	\$ 1.455.000,00
19,6		SUMINISTRO DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	ML	150	\$ 48.400,00	\$ 7.260.000,00	0,00	150,000	\$ -	\$ 7.260.000,00	\$ 7.260.000,00	0,00	\$ -
19,7		SUMINISTROS DE TABLERO TRIFÁSICO 225A, 18 CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CERTIFICADO	UN	2	\$ 541.000,00	\$ 1.082.000,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.082.000,00
19,8		SUMINISTROS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A, 10KA.	UN	36	\$ 19.000,00	\$ 684.000,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	36,00	\$ 684.000,00
19,9		SUMINISTRO DE INTERRUPTOR BREAKER INDUSTRIAL DE 3X70	UN	2	\$ 317.900,00	\$ 635.800,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 635.800,00
19,10		Suministro De Patchcord Para Puesto De Trabajo 2 Metro Con Suministro E Instalación Cat 6A Y Marquillado	UN	50	\$ 38.895,00	\$ 1.944.750,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 1.944.750,00

 FONDECÚN <small>FUNDACIÓN DE DESARROLLO LOCAL</small> <small>PROYECTOS DE CUNDINAMARCA</small>		PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO											Código: EGAP-FR-04	
													Versión: 01	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											Vigencia: 02 de enero de 2023	
19,11		Suministro De Patchcord 1.5 Metros Para Conexiones Entre Switch Y Patchpanel Con Suministro E Instalación De Jack RJ45 Cat 6A Blindado Y Marquillado	UN	50	\$ 56.865,00	\$ 2.843.250,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	50,00	\$ 2.843.250,00
19,12		SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 30KVA INCLUYE (GABINETE METALICO, MODULO TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, 2 CONTACTORES (RED Y PLANTA), SELECTORES (MAN-OFF-AUTO ; RED-PLANTA), INDICADORES LED DE FUNCIONAMIENTO O FALLA, BREAKERS, BARRAJES DE CONEXIÓN L1-L2-L3, BARRAJE DE CONEXION NEUTRO Y TIERRA, ACRILICO DE PROTECCION BARRAJES, MARQUILLADO DE TABLERO)	UN	1	\$ 5.042.015,00	\$ 5.042.015,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 5.042.015,00
20		SUMINISTRO DE INSUMOS CARPINTERIA METALICA												
20,1		Suministro puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,93x2,50	UND	1,00	\$ 1.219.585,00	\$ 1.219.585,00	0,00	1,000	1,00	\$ -	\$ 1.219.585,00	\$ 1.219.585,00	0,00	\$ -
20,2		Suministro puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88x2,50	UND	6,00	\$ 1.136.660,00	\$ 6.819.960,00	0,00	4,000	4,00	\$ -	\$ 4.546.640,00	\$ 4.546.640,00	2,00	\$ 2.273.320,00
20,3		Suministro puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,74x2,50	UND	2,00	\$ 885.590,00	\$ 1.771.180,00	0,00	2,000	2,00	\$ -	\$ 1.771.180,00	\$ 1.771.180,00	0,00	\$ -
20,4		Suministro puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 0,83x2,67	UND	1,00	\$ 1.144.220,00	\$ 1.144.220,00	0,00	1,000	1,00	\$ -	\$ 1.144.220,00	\$ 1.144.220,00	0,00	\$ -
20,5		Suministro puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior ,85x2,50.	UND	1,00	\$ 1.104.240,00	\$ 1.104.240,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.104.240,00
20,6		Suministro puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,70x2,50	UND	1,00	\$ 841.140,00	\$ 841.140,00	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 841.140,00
20,7		Suministro puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermería, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80x2,50	UND	4,00	\$ 1.033.135,00	\$ 4.132.540,00	0,00	2,000	2,00	\$ -	\$ 2.066.270,00	\$ 2.066.270,00	2,00	\$ 2.066.270,00
20,8		Suministro puerta baño mujeres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,78x2,50	UND	1,00	\$ 934.905,00	\$ 934.905,00	0,00	1,000	1,00	\$ -	\$ 934.905,00	\$ 934.905,00	0,00	\$ -
20,9		Suministro puerta baño auxiliar en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,58x2,50	UND	1,00	\$ 714.400,00	\$ 714.400,00	0,00	1,000	1,00	\$ -	\$ 714.400,00	\$ 714.400,00	0,00	\$ -
20,10		Suministro puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87x3,20	UND	1,00	\$ 1.460.435,00	\$ 1.460.435,00	0,00	1,000	1,00	\$ -	\$ 1.460.435,00	\$ 1.460.435,00	0,00	\$ -
20,11		Suministro puerta archivo central en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87x2,50	UND	1,00	\$ 1.212.735,00	\$ 1.212.735,00	0,00	1,000	1,00	\$ -	\$ 1.212.735,00	\$ 1.212.735,00	0,00	\$ -
20,12		Suministro puerta vigilancia fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 1x3,20	UND	1,00	\$ 1.656.565,00	\$ 1.656.565,00	0,00	1,000	1,00	\$ -	\$ 1.656.565,00	\$ 1.656.565,00	0,00	\$ -
20,13		Suministro puerta grupo coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior.,90x2,50	UND	1,00	\$ 1.162.200,00	\$ 1.162.200,00	0,00	1,000	1,00	\$ -	\$ 1.162.200,00	\$ 1.162.200,00	0,00	\$ -

ANEXO 7

MATERIALES EN OBRA

