

		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 07 FINAL		Código: FO-GD-02-018	
				Versión: 27	
				Fecha de Modificación: 20/11/2021	
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		FECHA ACTA	
				martes, 09 de diciembre de 2025	
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		SECOP: LP-SI-024-2023 (ID:CO1.PCCNTR.0640146)		Número Radicado Interno del Contrato: 18092024-1275	
Número de identificación del contratista - NIT		901.866.571-9		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	
CONTRATISTA		CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 810.002.434-0 (PARTICIPACION: 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION: 25%)			
CONTRATO CEDIDO A:		N/A			
CODIGO VIA		N/A		NOMBRE DE LA VIA N/A	
Actividad Económica		4290		Tipo de Contrato OBRA PUBLICA	
Objeto del Contrato:		ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- ENMARcado EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CLADAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)			
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo	
\$ 1.421.240.244,00		N/A		\$ 284.248.049,00	
APORTANTES		%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	
Aporte Departamento:		100%	\$ 1.421.240.244	PÚBLICA	
Aporte Convenio No					
Aporte Convenio No					
N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	
4500026149	\$ 230.378.663,00	\$ 0,00	\$ 230.378.663,0	6 - 0384	
VALOR ACTA	\$ 230.378.663,00	\$ -	\$ 230.378.663,0		
Duración Contrato: DESDE ACTA DE INICIO HASTA DICIEMBRE 31 DE 2025		Fecha de Inicio		OCTUBRE 03 DE 2024	
		Fecha de Terminación de ejecución		DICIEMBRE 31 DE 2024	
		Prorroga 01		DESDE ENERO 01 A FEBRERO 15 DE 2025	
		Suspension 01		TRES MESES, DESDE ENERO 14 HASTA ABRIL 13 DE 2025	
		Prorroga a suspension 01		DESDE ABRIL 14 HASTA QUE SE SUPEREN LAS CAUSAS DE SUSPENSION	
		Reinicio 01		JUNIO 18 HASTA AGOSTO 19 DE 2025	
		Prorroga 02		DESDE AGOSTO 20 HASTA SEPTIEMBRE 14 DE 2025	
		Prorroga 03		DESDE SEPTIEMBRE 15 HASTA NOV 22 DE 2025	
		Prorroga 04		DESDE NOV 22 HASTA DICIEMBRE 31 DE 2025	
RESUMEN DEL CONTRATO					
Valor del Contrato:		\$ 1.421.240.244		Valor del Anticipo:	
Adición del Contrato:				\$ 284.248.049,00	
Valor Acta Nro. 1	\$ 98.040.706,00	Amortización Acta 1		\$ 19.608.141,00	
Valor Acta Nro. 2	\$ 236.806.808,00	Amortización Acta 2		\$ 105.654.690,00	
Valor Acta Nro. 3	\$ 46.527.553,00	Amortización Acta 3		\$ 9.305.512,00	
Valor Acta Nro. 4	\$ 123.145.469,00	Amortización Acta 4		\$ 24.629.094,00	
Valor Acta Nro. 5	\$ 267.159.206,00	Amortización Acta 5		\$ 53.430.710,00	
Valor Acta Nro. 6	\$ 419.177.082,00	Amortización Acta 5		\$ 71.519.902,00	
Valor Acta Nro. 7	\$ 230.378.663,00	Amortización Acta 5		\$ 0,00	
Saldo del Contrato:	\$ 4.747,00	Saldo por Amortizar:		\$ 0,00	
Sumas iguales	\$ 1.421.240.244,00	Sumas iguales		\$ 284.248.049,00	\$ 284.248.049,00
OBSERVACION:					
Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Colizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social					

Firma:

Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del Gasto

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

Supervisor contrato

Firma

Nombre JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

Interventor

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO LR
NIT 901.866.571-9
Calle 64 A 21 50 Of1305
Tel: (606) 8987097
Manizales - Colombia
lrambientalsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CSLR 7

Señores	Departamento de Caldas		
NIT	890.801.052-1	Teléfono	(606) 8982444
Dirección	Cr 21 entre Calles 22 y 23 Palacio Amarillo	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 10:26
Expedición	09/12/2025, 11:12
Vencimiento	09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato N°16092024-1275 Objeto Atención de puntos de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo regional indígena - CRIDEC - (Enmarcado en el programa Colombia Rural), en el departamento de Caldas, municipio de Riosucio, de la comunidad indígena: SAN LORENZO (Lote 3).	1.00	177,214,356.15
2	Administración del 25%	1.00	44,303,589.04
3	Utilidad del 5%	1.00	8,860,717.81

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Doscientos treinta millones trescientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por \$ 230,378,663.00

Observaciones:

Acta Final N°07

Favor efectuar el pago a nombre de CONSORCIO LR, cuenta N°086100227999 Ahorros Davivienda Oficina El Cable

Sucursal -Manizales.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084713342 aprobado en 20241204 prefijo CSLR desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de Ingeniería civil Tarifa \$ por mil
CUFE: ca41efee23dbe022e65be745e6f4e01e444c3fd142de0cf1cf9556cad358f322e12e71715170f9233257827b079075

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit B30848145-8. Nombre Software: Sigo Hub. Firma electrónica ver en el XML.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 09/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO LR** con NIT **901.866.571-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 086100227999

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

HERNÁN CAÑAS ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.446.625 de Marmato - Caldas, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO LR, identificado con NIT 901.866.571-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Manizales, a los 09 días del mes de diciembre del año 2025.


HERNAN CAÑAS ORTIZ
C.C 4.446.625
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LR

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141150113089



(415)7707212489984(8020) 000014115011308 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 8 6 6 5 7 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO LR

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

41. Dirección principal

CL 64 A 21 50 TO EMPRESARIAL PORTAL DEL CABLE OF 13/05

42. Correo electrónico

lrambientalsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono

3 1 0 4 3 9 1 7 9 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 4 0 8 1 3

7 1 1 2

2 0 2 4 0 8 1 3

1

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Párrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1825 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Es espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141150113089

(415)7707212489984(8020) 000014115011308 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 1 8 6 6 5 7 1

9

Impuestos y Aduanas de Manizales

13. Sufijo electrónico

0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y rescatados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

9 9

72. Número

73. Fecha

2 0 2 4 0 8 1 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 4 0 8 1 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 7

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 4 0 8 1 3

81. Hasta

2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

2

3

4

5

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 14-07-2025 11:27:39AM

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141150113089



(415)7707212489984(8020) 000014115011308 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 8 6 6 5 7 1 9

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Maricao

13. Buzón electrónico

Representación

99. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 8 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 4 4 4 6 6 2 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido CAÑAS	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre HERNAN	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
99. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 8 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 0 2 3 3 3 2 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido RIOS	105. Segundo apellido CARVAJAL	106. Primer nombre HERNAN	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
99. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
99. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
99. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141150113089



[415]7707212489984(8020) 000014115011308 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

9 0 1 8 6 6 5 7 1 9

14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 1 0 0 0 2 4 3 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116.9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social L.R. AMBIENTAL S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 7 5 / 2 0 2 4 0 8 1 3	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	112. Número de identificación 1 0 2 3 3 3 2 3	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	116.9
115. Primer apellido RIOS	116. Segundo apellido CARVAJAL	117. Primer nombre HERNAN	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 / 2 0 2 4 0 8 1 3	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141187489455

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 1 0 0 0 2 4 3 4 0

6. DV 0

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales

74. Buzón electrónico

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica

25. Tipo de documento 1

26. Número de identificación

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social L.R. AMBIENTAL S.A.S.

36. Nombre comercial L.R. AMBIENTAL S.A.S.

37. Logo

38. País COLOMBIA

39. Departamento Caldas

40. Ciudad/Municipio Manizales

41. Dirección principal CL 64 A 21 50 ED TORRE EMPRESARIAL PORTAL DEL CABLE OF- 1305

42. Correo electrónico lrambientaisas@gmail.com

43. Código postal 1 7 0 0 0 2

44. Teléfono 1 3 1 0 4 1 5 2 8 6 4

45. Teléfono 2 3 1 0 4 3 9 1 7 9 6

46. Código 4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad 1 9 9 7 1 1 1 1

48. Código 7 1 2 2

49. Fecha inicio actividad 1 9 9 7 1 1 1 1

50. Código 4 1 1 2 7 1 1 1

51. Código

52. Número establecimientos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

54. Código

55. Forma

56. Tipo

57. Modo

58. CPC

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios 0

984. Nombre CAÑAS ORTIZ HERNAN

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 5 Hoja 2

4. Número de formulario

141187489455



(415)770721248998416020 000014118748945 5

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 1 0 0 0 2 4 3 4 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

13. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas

1 2

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades e institutos de carácter público de orden nacional, departamental, municipal y subcentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento

1. Constitución

2. Reforma

Composición del Capital

71. Clase

0 4

72. Número

0 0 0

73. Fecha

1 9 9 7, 1 1, 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 7, 1 1, 1 1

77. No. Matricula mercantil

7 7 2 7 9

78. Departamento

1 7

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

0 1

0 0 2

2 0 0 4, 0 6, 0 4

0 3

2 0 0 4, 0 6, 0 7

4 8 (5 5 7)

1 7

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

1 9 9 7, 1 1, 1 0

81. Hasta

2 0 1 7, 1 1, 1 0

Entidad de vigilancia y control

86. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

8 0

2 0 1 5, 0 1, 0 1

2

3

4

5

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

95. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 5 Hoja 3

4. Número de formulario

141187489455



(415)7707212489984(8020) 000014118748945 5

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales

8 1 0 0 0 2 4 3 4 | 0

14. Buzón electrónico

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 3 | 0 1 2 | 2

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

101. Número de identificación

4 4 4 6 8 2 5

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

CAÑAS

105. Segundo apellido

ORTIZ

106. Primer nombre

HERNAN

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 5 | 0 3 1 7 |

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

101. Número de identificación

2 4 3 3 2 8 8 2

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

MARIN

105. Segundo apellido

URIBE

106. Primer nombre

BIVIANA

107. Otros nombres

MARIA

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 4 de 5 Hoja 4

4. Número de formulario

141187489455



(415)7707212469984(8020) 0000141187489455

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Maritimos

8 1 0 0 0 2 4 3 4 0

7. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento
Cédula de Ciudadanía 1 3
112. Número de identificación
4 4 4 6 6 2 5
113. DV
COLOMBIA
114. Nacionalidad
1 6 9

115. Primer apellido
CAÑAS
116. Segundo apellido
ORTIZ
117. Primer nombre
HERNAN
118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio
121. % Participación
122. Fecha de ingreso
12 0 1 3 0 1 1 6
123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
112. Número de identificación
113. DV
114. Nacionalidad

115. Primer apellido
116. Segundo apellido
117. Primer nombre
118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio
121. % Participación
122. Fecha de ingreso
123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
112. Número de identificación
113. DV
114. Nacionalidad

115. Primer apellido
116. Segundo apellido
117. Primer nombre
118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio
121. % Participación
122. Fecha de ingreso
123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
112. Número de identificación
113. DV
114. Nacionalidad

115. Primer apellido
116. Segundo apellido
117. Primer nombre
118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio
121. % Participación
122. Fecha de ingreso
123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
112. Número de identificación
113. DV
114. Nacionalidad

115. Primer apellido
116. Segundo apellido
117. Primer nombre
118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio
121. % Participación
122. Fecha de ingreso
123. Fecha de retiro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 5 de 5 Hoja 5

4. Número de formulario

141187489455



(415)7707212489984(8020) 0000141187489455

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 0 0 0 2 4 3 4 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

13. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 2 5 1 0 0 1 9 8	126. DV 1 1	127. Número de tarjeta profesional 6 2 5 7 1 T
128. Primer apellido HERNANDEZ	129. Segundo apellido BURBANO	130. Primer nombre SANDRA	131. Otros nombres LINES
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 3 1 9			
136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 2 5 9 1 6 8	150. DV 8	151. Número de tarjeta profesional 1 0 3 8 7 0 T
152. Primer apellido OCAMPO	153. Segundo apellido TRUJILLO	154. Primer nombre JORGE	155. Otros nombres DORIAN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 3 0 1 2 2			

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141149704578



(415)7707212489984(8020) 000014114970457 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0 2 3 3 3 2 3 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 2 3 3 3 2 3

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Caldas

1 7

30. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

31. Primer apellido

RIOS

32. Segundo apellido

CARVAJAL

33. Primer nombre

HERNAN

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Signo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

41. Dirección principal

BRR VILLA PILAR CEL 12 N 3 AP ESPECIAL 03

42. Correo electrónico hemanrioscarvajal@gmail.com

43. Código postal 1 7 0 0 0 1

44. Teléfono 1

6 0 6 8 7 3 1 8 3 3

45. Teléfono 2

3 1 4 8 1 2 6 6 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 8 0 7 3 0

48. Código

4 2 2 0

Actividad secundaria

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 8 0 7 3 0

Otras actividades

50. Código

1 2

4 2 1 0 7 1 1 2

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Fotos:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIOS CARVAJAL HERNAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	FECHA PAGO	PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
05 1933333	0	HERMANOS CARRANZA	1	0	2025-11-01	ONCA	420	Normal	
MUNIDEP		DIRECCION	TELÉFONO						
10-1		CELULA 12 MUNICIPIO 3 APTO ESPECIAL 03	8728141						
HERMANOS CARRANZA@gmail.com									\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2025-11	2025-11	663990478	2025-11-01	10005 LOS CORRIJOS	10005	10005	178.000	0	Banco Occidente

FECHA LIQUIDACION	FECHA PAGO	ESTADO PLANILLA
2025-11-01	2025-11-01	Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA									
PERIODO	PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2025-11	2025-11	2025-11	663990478	2025-11-01	10005 LOS CORRIJOS	10005	10005	178.000	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	FECHA PAGO	PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
05 1933333	0	HERMANOS CARRANZA	1	0	2025-11-01	ONCA	420	Normal	
MUNIDEP		DIRECCION	TELÉFONO						
10-1		CELULA 12 MUNICIPIO 3 APTO ESPECIAL 03	8728141						
HERMANOS CARRANZA@gmail.com									\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2025-11	2025-11	663990478	2025-11-01	10005 LOS CORRIJOS	10005	10005	178.000	0	Banco Occidente

FECHA LIQUIDACION	FECHA PAGO	ESTADO PLANILLA
2025-11-01	2025-11-01	Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA									
PERIODO	PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2025-11	2025-11	2025-11	663990478	2025-11-01	10005 LOS CORRIJOS	10005	10005	178.000	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	APLICACION	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERES X MORA	SALDO E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS/Administradoras: I	EP5037	800159284	2	1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA F.P.S. S.A.	EP5037	800159284	2	1	178.000	0	0	0	178.000
Gran Total					178.000	0	0	0	178.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SINAE e ICBF	
NIT 901846371	9	CONSORCIO LR	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 84 A 11 50	MANIZALES-CALDAS	887749	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1141308667	949501424	E	2025/11/20	2025/11/20		0	\$8,405,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					13	\$3,533,600	\$0	\$0	\$3,533,600
COLTODOS		231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
POIVENIR		230301	800,774,808	8	8	\$2,394,600	\$0	\$0	\$2,394,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$2,266,200	\$0	\$0	\$2,266,200
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	17	\$2,266,200	\$0	\$0	\$2,266,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$1,303,000	\$0	\$0	\$1,303,000
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	17	\$1,303,000	\$0	\$0	\$1,303,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					17	\$1,303,000	\$0	\$0	\$1,303,000
EPS SURA (ANTES SURSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000
NUEVA EPS S.		EPS037	900,156,264	2	6	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	5	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000
TOTAL					17	\$8,405,800	\$0	\$0	\$8,405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dir	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 81002414	0	UR AMBIENTAL SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CALLE 64 A 21 65	MANIZALES-CAJALIA	8902266	%

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2025-10	2025-11	191527948		694691772		2025/11/11	2025/11/11	\$1,710,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO		NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS								
No.	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
SUCURSAL ADMINISTRATIVA (7 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (7 Afiliados)																													
Ciudad: MANIZALES Destino: CALDAS (7 Afiliados)																													
1	CC	105187149	ALAYE RAMIREZ																										\$1,710,600
			MANIZALES																										\$1,710,600
2	CC	4446633	CARAS GRILL																										\$1,710,600
			MANIZALES																										\$1,710,600
3	CC	2414132	CARAS GRILL																										\$1,710,600
			MANIZALES																										\$1,710,600
4	CC	100065218	MANIZALES																										\$1,710,600
			MANIZALES																										\$1,710,600
5	CC	105187149	MANIZALES																										\$1,710,600
			MANIZALES																										\$1,710,600
6	CC	105187149	MANIZALES																										\$1,710,600
			MANIZALES																										\$1,710,600
7	CC	105187149	MANIZALES																										\$1,710,600
			MANIZALES																										\$1,710,600
Total		Afiliados (7)												\$1,710,600			\$1,710,600			\$1,710,600			\$1,710,600			\$1,710,600			\$1,710,600



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Dirección

Ciudad-Departamento

Teléfono

Exonerado SEM e ICBF

Si

NIT 81002434

0

LA AMBIENTAL SAS

8 - MENOS DE 200 COTIZANTES

ADMINISTRATIVA

CALLE 64 A 21 65

MANTALES-CAJALIA

8002264

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Pago

Planilla

Planilla

Limite

Fecha

Pago

Dias Mora

Valor

2025-10

192537946

949497772

9

2025/11/11

2025/11/31

2

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO

NIT

DW

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

447 (ADMINISTRADORAS: 4)

231001

800,227,940

6

1

\$1,611,400

\$2,200

\$1,613,600

COLPENSIONES

25-14

960,336,004

7

1

\$227,800

\$300

\$228,100

PORVENIR

230301

800,224,808

8

2

\$6,15,800

\$900

\$278,100

PROTECCION

230201

800,729,739

0

1

\$480,000

\$700

\$676,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

14-4

860,007,183

9

7

\$974,100

\$1,300

\$480,700

COLPATRIA AEP

CCF

890,806,490

5

7

\$560,000

\$800

\$975,400

CONFAMILIARES

CCF11

890,806,490

5

7

\$560,000

\$800

\$975,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 3)

EPS SURTA (ANTES SUSALUD)

EPS010

800,088,702

2

3

\$234,000

\$300

\$560,800

SALUD TOTAL

EPS002

800,130,907

4

3

\$214,000

\$300

\$560,800

SANITAS

EPS005

800,251,410

6

1

\$112,000

\$200

\$234,300

TOTAL

7

\$3,705,500

\$5,100

\$112,200

\$3,710,600

 GOBIERNO DE CALDAS		ACTA NRO SIETE (07) FINAL AL CONTRATO DE OBRA NRO.18092024-1275 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro.18092024-1275	
Secretaría:		INFRAESTRUCTURA	
Fecha acta:		09 DICIEMBRE DE 2025	
Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	18092024-1275		
No. Pedido en SAP:	4500026149	Acto Administrativo:	N/A
NIT o RUT:	901.888.571-9		
Contratista:	CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 816.902.434-0 (PARTICIPACION: 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION: 25%)		
Representante Legal:	HERNAN CAÑAS CRTIZ		
Valor del Contrato (\$):	S 1.421.240.244,00	Aporte Departamento:	S 1.421.240.244,00
Valor Adición:	S 0,00	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto del contrato	ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC- ENMARCAO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDÍGENA SAN LORENZO (LOTE 3)		
Disponibilidad presupuesta	3500943950	FONDO	2 - 0364
Duración del contrato (Plazo):	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 03 DE 2024	Fecha de terminación:	DICIEMBRE 31 DE 2024
Modificador 01 (prorroga de plazo)	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2025		
Modificador 02 (prorroga de plazo)	HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Modificador 03 (prorroga de plazo)	HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Modificador 04 (prorroga de plazo)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA		
Interventor Externo	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VIUNIT.	VITOTAL
				OBRAS DE DRENAJE				
1	500.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	0,00	37.852,00	0,00
2	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	0,00	104.454,00	0,00
3	630.1.3.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0,00	871.982,00	0,00
4	630.1.4.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0,00	963.054,30	0,00
5	630.1.6			CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0,00	638.640,00	0,00
6	640.1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0,00	7.561,00	0,00
7	663.1.2			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE D=4"	ML	0,00	35.732,00	0,00
8	663.1			TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORVA NTC-5055 DE DIÁMETRO 500 mm	ML	0,00	1.935.330,00	0,00
9	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO-2500 O SIMILAR	M2	0,00	12.220,00	0,00
10	610.2p			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON AFIRMAO (analizado en preparación de la superficie base del relleno)	M3	0,00	209.613,00	0,00
11	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	0,00	226.230,00	0,00
12	642.2.1P			JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	ML	0,00	77.936,00	0,00
13	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	0,00	252.253,00	0,00
14	670.5			DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	M3	0,00	603.524,00	0,00
15	600.2P			REJILLAS DE 30 CM	ML	0,00	23.530,00	0,00
				OBRAS DE ESTABILIZACIÓN				
16	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	0,00	37.852,00	0,00
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	0,00	104.454,00	0,00
18	630.1.3.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	18,00	871.982,00	15.695.876,00
19	630.1.6			CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0,00	638.640,00	0,00
20	640.1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2.219,76	7.561,00	16.763.609,00
21	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION CREE MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	0,00	12.220,00	0,00
22	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	0,00	226.230,00	0,00
23	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	0,00	3.148.166,00	0,00
24	623.1P			ANCLAJE TIPO pasivo D=4", Varilla 1"	ML	12,00	252.562,00	3.030.744,00
25	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	1,00	252.253,00	252.253,00
26	663.1.3			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE D=3"	ML	0,00	32.315,00	0,00
27	630.3.3P			DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CLASE C	M3	2,18	1.185.185,00	2.562.166,00
28	810.1P			ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN CON ABONOS VERDES	M2	0,00	17.232,00	0,00
29	810.2P			BARRERAS VIVAS	ML	0,00	3.915,00	0,00
30	810.3P			ESTAQUILLADO DE MADERA BLANDA	UND	0,00	3.812,00	0,00

MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O RUTINARIO							
31	311.10		AFIRMADO	M3	0.00	203.164,00	0,00
32	310.1		CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	1.659,00	0,00
REVISION Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE							
33	1P		Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0.00	41.000.000,00	0,00
			Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0.00	13.828.195,00	0,00
			Valor IVA 19% (Ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños (19%))	GL	0.00	7.790.000,00	0,00
NO PREVISTOS PACTADOS							
34	NP.1		DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2		2.308,00	0,00
35	NP.2		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3		179.103,00	0,00
36	NP.3		REPALO MANUAL	M3		11.582,00	0,00
37	NP.4		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM		17.856,00	0,00
38	NP.5		AUXILIARES DE TRANSPORTE	DIA		298.433,00	0,00
39	NP.6		ELABORACION PMT	UND.		1.950.000,00	0,00
40	NP.7		ANCLAJE TIPO ACTIVO C=4", TORONES=1/2"	UND.		710.626,00	0,00
SUBTOTAL EJECUTADO							\$ 38.324.444

MAYORES CANTIDADES DE OBRA (OBRAS DE ESTABILIZACION)

ITEM			DESCRIPCION	UND.	CANT.	VIUNITARIO	VTOTAL
29	574.2		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	159,00	252.269,00	40.105.227,00
40	NP.7		ANCLAJE TIPO ACTIVO C=4", TORONES=1/2"	ML	214,00	710.626,00	151.945.852,00
SUBTOTAL EJECUTADO							\$ 192.054.219,00

OBRA NO PREVISTA

ITEM			DESCRIPCION	UND.	CANT.	VIUNITARIO	VTOTAL
SUBTOTAL EJECUTADO							\$ 0,00

Valor Acta PARCIAL		TOTAL	X	\$230.375.693,00
Amortización Anticipo				\$0,00
Valor Ordenación del Gasto:				\$230.375.693,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato:		1.421.240.244,00
Valor adicional:		
Valor Acta No. 1:	58.040.706,00	
Valor Acta No. 2:	236.806.808,00	
Valor Acta No. 3:	48.527.563,00	
Valor Acta No. 4:	123.145.469,00	
Valor Acta No. 5:	287.159.205,00	
Valor Acta No. 6:	419.177.082,00	
Valor Acta No. 7:	230.375.693,00	
Saldo del contrato	4.747,00	
Sumas iguales	1.421.235.497,00	1.421.240.244,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		264.248.049,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	19.608.141,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	109.054.690,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	9.305.512,00	
Amortización del Anticipo Acta 4:	24.629.094,00	
Amortización del Anticipo Acta 5:	53.439.710,00	
Amortización del Anticipo Acta 6:	71.619.902,00	
Amortización del Anticipo Acta 7:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas iguales:	264.248.049,00	264.248.049,00

SE HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO LR CALDAS conformado por LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 810.052.434-6 (participación: 75%) y por HERNAN RIOS CARVAJAL, con NIT 10.233.323-0 (participación: 25%) representado por HERNAN CAÑAS GUTIERZ, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 628 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO LR
Contratista

Firma
JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato

Firma
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Interventor



GOBIERNO DE
CALDAS

ACTA MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA AL
ACTA NRO SIETE (07) FINAL AL CONTRATO DE OBRA NRO.18092024-1275
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro.18092024-1275

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta: 09 DICIEMBRE DE 2025

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	18092024-1275	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500026148		
NIT o RUT:	901.866.571-9		
Contratista:	CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 810.002.434-0 (PARTICIPACION: 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION: 25%)		
Representante Legal:	HERNAN CAÑAS ORTIZ		
Valor del Contrato (\$):	\$ 1.421.240.244,00	Aporte Departamento:	\$ 1.421.240.244,00
Valor Adición:	\$ 0,00	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto del contrato	ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA + CRIDEC- ENMARcado EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)		
Disponibilidad presupuestal	3500043950	FONDO	2 - 0384
Duración del contrato (Plazo):	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 03 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2024
Modificatorio (suspensión)	HASTA EL 16 DE JULIO DE 2025		
Modificatorio 01 (prorroga de plazo)	20 DE AGOSTO DE 2025		
Modificatorio 05 (prorroga de plazo)	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Modificatorio 06 (prorroga de plazo)	22 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Modificatorio 07 (prorroga de plazo)	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS G. GALDO MEJIA		
Interventor Externo	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		

MAYORES CANTIDADES DE OBRA (OBRAS DE ESTABILIZACION)

ITEM			DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	674.2		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	159,00	252.253,00	40.108.227,00
40	NP.7		ANCLAJE TIPO ACTIVO D=4", TORONES=1/2"	ML	214,00	710.028,00	151.945.992,00
SUBTOTAL EJECUTADO							\$ 192.054.219,00

OBRA NO PREVISTA

ITEM			DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
SUBTOTAL EJECUTADO							\$ 0,00

JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES: Durante la ejecución de la obra en el punto K1+100, fue necesaria la instalación de una cantidad mayor de metros lineales de anclajes respecto a los inicialmente aprobados, con el fin de garantizar la estabilidad del talud y dar cumplimiento a los diseños vigentes. Asimismo, se requirió la ejecución de metros lineales adicionales de drenes, conforme a los ajustes incorporados en los nuevos diseños para este punto.

Por lo tanto, se autoriza la inclusión del acta de mayores cantidades de obra aquí relacionada.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaría de Infraestructura
Destatador del Gasto

Firma
CONSORCIO LR
Contratista

Firma
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Interventor

Firma
JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato

 GOBIERNO DE CALDAS		PREACTA NRO SIETE (07) FINAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 18092024-1275 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 18092024-1275	
Secretaría :		INFRAESTRUCTURA	
Fecha acta:		08 DICIEMBRE DE 2025	
Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra		18092024-1275	Acto Administrativo: N/A
No. Pedido en SAP:		4500026149	
NIT o RUT:		901.886.571-9	
Contratista:		CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 810.002.434-0 (PARTICIPACION: 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL, CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION: 25%)	
Representante Legal:		HERNAN CAÑAS ORTIZ	
Valor del Contrato (\$):		\$ 1.421.240.244,00	Aporte Departamento: \$ 1.421.240.244,00
Valor Adición:		\$ 0,00	Aporte otras entidades: N/A
Objeto del contrato		ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)	
Disponibilidad presupuestal		3500043950	FONDO 2 - 0394
Duración del contrato (Plazo):		TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
Fecha de iniciación		OCTUBRE 03 DE 2024	Fecha de terminación: DICIEMBRE 31 DE 2024
Modificatorio 01 (prorroga de plazo):		HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2025	
Modificatorio 02 (prorroga de plazo):		HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
Modificatorio 03 (prorroga de plazo):		HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	
Modificatorio 04 (prorroga de plazo):		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Supervisor Departamento		JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA	
Interventor Externo		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO


NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
				OBRAS DE DRENAJE			
1	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	0,00	0,00
2	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	0,00	0,00
3	630.1.3.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0,00	0,00
4	630.1.4.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0,00	0,00
5	630.1.6			CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0,00	0,00
6	640.1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0,00	0,00
7	663.1.2			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE D=4"	ML	0,00	0,00
8	665.1			TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIÁMETRO 503 mm	ML	0,00	0,00
9	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO-2500 O SIMILAR	M2	0,00	0,00
10	610.2a			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON AFIRMADO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	0,00	0,00
11	675.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	0,00	0,00
12	642.2.1P			JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	ML	0,00	0,00
13	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	0,00	0,00
14	670.5			DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	M3	0,00	0,00
15	600.2P			REJILLAS DE 30 CM	ML	0,00	0,00
				OBRAS DE ESTABILIZACIÓN			
16	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	0,00	
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	0,00	
18	630.1.3.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	18,00	VER ANEXO (PRE-ACTAS)
19	630.1.5			CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0,00	
20	640.1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2.219,76	VER ANEXO (PRE-ACTAS)
21	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	0,00	
22	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	0,00	
23	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	0,00	
24	623.1P			ANCLAJE TIPO pasivo D=4", Varilla 1"	ML	12,00	VER ANEXO (PRE-ACTAS)
25	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	180,00	VER ANEXO (PRE-ACTAS)

26	653.1.3		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE D=3"	ML	0,00	
27	630.3.3P		DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CLASE C	M3	2.18	VER ANEXO (PRE-ACTAS)
28	810.1P		ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN CON ABONOS VERDES	M2	0,00	
29	810.2P		BARRERAS VIVAS	ML	0,00	
30	810.3P		ESTAQUILLADO DE MADERA BLANDA	UND.	0,00	
			MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO			
31	311.10		AFIRMADO	M3	0,00	
32	310.1		CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	
			REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE			
33	1P		Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0,00	
			Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0,00	
			Valor IVA 19% (Ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños (19%) (INMODIFICABLE)	GL	0,00	
			NO PREVISTOS PACTADOS			
34	NP.1		DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	0,00	
35	NP.2		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	0,00	
36	NP.3		REPALEO MANUAL	M3	0,00	
37	NP.4		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	0,00	
38	NP.5		AUXILIARES DE TRANSITO	DIA	0,00	
39	NP.6		ELABORACIÓN PMT	UND.	0,00	
40	NP.7		ANCLAJE TIPO ACTIVO D=4", TORONES=1/2"	ML	214,00	VER ANEXO (PRE-ACTAS)

OBRA NO PREVISTA

ITEM			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	MEDIDAS

Firma



 CONSORCIO LR
 Contratista

Firma


 JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 Interventor

CONSORCIO LR						CONSORCIO LR						PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra						PRE ACTA Estado Vigente Versión 1																	
FECHA:						4/12/2025																													
PREACTA N°						2																													
CONTRATO N°																																			
OBJETO						"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- (ENMARCAO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO.(LOTE 3)"																													
CONTRATISTA						CONSORCIO LR																													
INTERVENTOR						JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ																													
N° ITEM						630.1.3.1						DESCRIPCIÓN ITEM						CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA						Unidad de Medida						m3					
N°		LOCALIZACIÓN										DIMENSIONES							CANT. PARCIALES		CANT. ACUMULADAS		OBSERVACIONES												
		Ancho	Alto	Largo	Radio	Peso	Unidad	%																											
2		1,5	1,5	0,20			40							18,00		18,00		18,00																	
																SUBTOTAL		18,00																	
																TOTAL		18,00																	


ING. DANIELA MONTES GONZALEZ
RESIDENTE CONTRATISTA
M.P.: 051037-0542511 CLD





 JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
INTERVENTOR



CONSORCIO LR		CONSORCIO LR				PREACTA DE OBRA		PRE ACTA Estado Vigente Versión 1			
FECHA:		Memoria para el cálculo de cantidades de obra									
PREACTA N°		4/12/2025									
CONTRATO N°		3									
OBJETO		18092024-1275									
CONTRATISTA		"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCAO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: SAN LORENZO (LOTE 3")									
INTERVENTOR		CONSORCIO LR									
		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ									
N° ITEM		840.1		DESCRIPCIÓN ITEM		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa			Unidad de Medida	kg	
N°		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT. PARCIALES		CANT. ACUMULADAS		OBSERVACIONES
				Ancho	Alto	Largo	Diametro	Peso	Unidad	#Elem	
1		K1+160				1,50	1/2"	0,99	8	40	
2		Acero longitudinal superior placa dado				1,50	1/2"	0,99	8	40	475,20
3		Acero transversal superior placa dado				1,50	1/2"	0,99	8	40	475,20
4		Acero longitudinal inferior placa dado				1,50	1/2"	0,99	8	40	475,20
5		Acero transversal inferior placa dado				1,50	1/2"	0,99	8	40	475,20
6						1,80	3/8"	0,56	3	40	120,96
7		Acero dados anclajes activos				0,60	1/2"	0,99	6	40	142,56
8						0,40	1/2"	0,99	2	40	31,68
						0,30	1/2"	0,99	2	40	23,76
											SUBTOTAL
											2219,76
											TOTAL
											2219,76

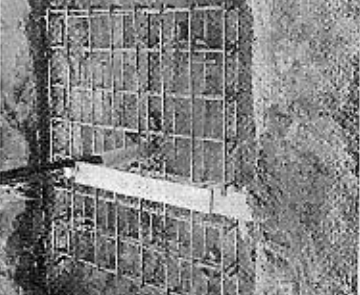

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
INTERVENTOR


ING. DANIELA MONTÉS GONZÁLEZ
RESIDENTE CONTRATISTA
M.P.: 051037-0542511 CLD

CONSORCIO LR

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PRE ACTA

Estado Vigente

Versión 1

FECHA:

4/12/2025

PREACTA N°

5

CONTRATO N°

18092024-1275

OBJETO

"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCAO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)"

CONTRATISTA

CONSORCIO LR

INTERVENTOR

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

N° ITEM

630.3.3P

DESCRIPCIÓN ITEM

DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CLASE C

Unidad de Medida

m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Alto	Largo	Diametro	Peso			
1	K1+160 Datos	0,28	0,5	0,5			40	2,61	
2	Dados acia anterior K2+430	1,00	1,0	0,5			1	-0,45	Se le resta al total 0.45, cobrados en el acta anterior
								SUBTOTAL	2,16
								TOTAL	2,16

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

INTERVENTOR

ING. DANIELA MONTES GONZALEZ

RESIDENTE CONTRATISTA

M.P: 051037-0542511 CLD

CONSORCIO LR

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PRE ACTA
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:

PREACTA N°

CONTRATO N°

OBJETO

CONTRATISTA

INTERVENTOR

4/12/2025

6




18092024-1275

"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC- (ENMARCAO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)"

CONSORCIO LR

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

N° ITEM		NP.7	DESCRIPCIÓN ITEM	ANCLAJE TIPO ACTIVO D=4", TORONES=1/2"							Unidad de Medida	ml
N°	LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES						CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
				Ancho	Alto	Largo	Diametro	Peso	Unidad			
			K2+430									
2			Anclajes Tipo 1			25,00			26	20%	130,00	
3			Anclajes Tipo 2			30,00			14	20%	84,00	
											SUBTOTAL	214,00
											TOTAL	214,00

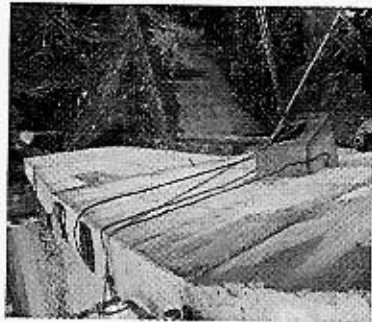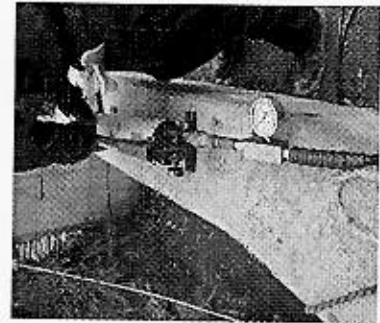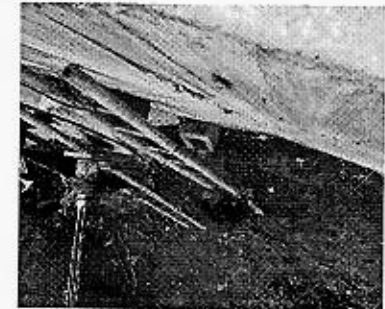

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
INTERVENTOR

ING. DANIELA MONTES GONZALEZ
RESIDENTE CONTRATISTA
M.P: 051037-0542511 CLD

FECHA	9	12	2025
-------	---	----	------

Página 1 de 4

UNIDAD EJECUTORA: Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO: Caldas

CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1274

OBJETO DEL CONTRATO: "ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC- (ENMARcado EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE ROSOCCO, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA SAN LORENZO (LOTE 3)"

ALCANCE CONTRACTUAL

ATENDER 3 PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, MEDIANTE OBRAS DE ESTABILIDAD

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

S 1.421.240 244,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

1 DE OCTUBRE DE 2024

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

OCHO (8) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:

CONSORCIO LR

INTERVENTOR:

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO
1	18092024-1274 Modificatorio No. 1 Prorroga No. 1	1,5 Meses	\$ 1.421.240.244	\$ 1.421.240.244
2	18092024-1274 Modificatorio No. 5 Prorroga No. 2	0,67 Meses		
3	18092024-1274 Modificatorio No. 6 Prorroga No. 3	2,27 Meses		
4	18092024-1274 Modificatorio No. 7 Prorroga No. 4	1,3 Meses		

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS) Y REANUDACIÓN (R)

ACTA No.			FECHA	PERÍODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	x		14/01/2025	14/01/2025	13/04/2025	3 Meses	
2		x	4/04/2025	13/04/2025	-	3,2 Meses	
3			18/07/2025				18/07/2025
		TOTAL				6,2 Meses	

En la ciudad de Manizales, Caldas a los 04 días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron los siguientes: por parte de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA de la GOBERNACIÓN de CALDAS el supervisor del contrato el ingeniero JUAN CARLOS GIRALDO MEJÍA, por parte de la interventoría JOHN ESNE DER CARDONA GUTIERREZ el representante legal apoderado la ingeniera residente FERNANDO CARO, por parte del contratista CONSORCIO LR el representante legal el ingeniero HERNAN CAÑAS ORTIZ, la ingeniera residente DANIELA MONTES GONZALEZ, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No: 18092024-1274

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

La obra se ejecutó en la vía La Central – San Lorenzo, en el departamento de Caldas, interviniendo los puntos K1+150, K1+600 y K2+430 mediante obras de estabilización. En el punto K1+150 se llevaron a cabo actividades de instalación de enclajes activos. En el punto K1+600 se construyó un muro de contención, mientras que en el punto K2+430 se ejecutó un muro pantalla anclado mediante enclajes activos.

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN:

ABSCISA	ESTRUCTURA	COSTADO	TIPO DE CIMENTACIÓN	ALTURA Mts Muro Zapata + Vástago	LONG CONSTRUÍDA Mts	CANTIDAD CAISSON	CANTIDAD DE ANCLAJES	CANTIDAD DE DRENES
K1+180	Anclajes pasivos	Izquierdo	-	-	-	-	40	8
K1+600	Muro reforzado	Derecho	Caisson	Zapata 0,6m + Vástago 3,3m	20	4	-	-
K2+430	Muro Reforzado con anclajes activos	Derecho	Caisson	Modulo 1 Zapata 1m + Vástago 5m Modulo 2 Zapata 1m + Vástago 4,7m	14	4	6	5

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL:

En los puntos intervenidos se dispuso de la señalizales de tránsito correspondientes, además de señalización vial tubular, barreras tipo maletines y cinta de seguridad, como medida preventiva para garantizar la protección de los transeúntes y usuarios de la vía. Adicionalmente, se contó con personal de paleteros, quienes rotaban entre los diferentes frentes según las necesidades de operación y

		DEPARTAMENTO DE CALDAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Secretaria de INFRAESTRUCTURA									
				FEC-IA	9 12 2025								
UNIDAD EJECUTORA		Secretaria de Infraestructura	DEPARTAMENTO	Caldas	Página 2 de 4								
CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1274 DEL 2025													
OBJETO DEL CONTRATO: ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- (ENMARcado EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)													
SITIOS CRITICOS Y/O ZONAS GEOTECNICAMENTE INESTABLES: En atención al alcance contractual y a los lineamientos técnicos establecidos para la estabilización de los sectores críticos en la vía La Central – San Lorenzo, se adelantaron actividades de diagnóstico, diseño y ejecución de obras en los puntos K1+160, K1+600 y K2+430, con el fin de mitigar las condiciones de inestabilidad presentes y garantizar la funcionalidad y seguridad de la infraestructura vial.													
Durante la fase inicial se llevó a cabo una evaluación detallada de las condiciones geotécnicas, hidráulicas y estructurales de cada punto, identificándose problemáticas asociadas a movimientos en masa, insuficiencia de estructuras de contención, ausencia de manejo adecuado de aguas superficiales y subsuperficiales, y deficiencias en los elementos existentes de protección. Estas condiciones representaban riesgos significativos para la estabilidad del talud y la integridad de la vía, por lo que se definieron intervenciones específicas según las necesidades de cada punto.													
A partir de los resultados del diagnóstico y de la revisión de los diseños suministrados por la entidad contratante, se formularon y ejecutaron obras de estabilización y control destinadas a corregir las problemáticas identificadas, mejorar las condiciones de drenaje y reforzar los elementos estructurales existentes. Las soluciones implementadas incluyeron anclajes activos, cimentaciones profundas tipo caisson, mureta de contención en concreto reforzado, drenes horizontales, y estructuras complementarias.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PUNTO CRITICO</th> <th>CONDICIÓN Y OBRA EJECUTADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K1+160</td> <td> <p>En la fase inicial se identificó la presencia de un movimiento activo asociado a un deslizamiento traslacional, desarrollado sobre materiales correspondientes a la Formación Amagá, compuesta por areniscas y arcillolitas cubiertas por una delgada capa de cenizas volcánicas. Se evidenció además la ausencia total de obras de manejo y control de aguas de escorrentía, así como la existencia de una conexión de acueducto domiciliario con fugas en la corona del talud, condición que contribuyó a la inestabilidad del terreno.</p> <p>Como parte del diagnóstico técnico, se determinó que el sitio requería prioritariamente un manejo adecuado de aguas subsuperficiales, mediante la implementación e instalación de drenes subhorizontales destinados a incrementar los esfuerzos efectivos dentro del talud.</p> <p>Dado que los diseños iniciales propuestos por la Gobernación no cumplían con los factores de seguridad exigidos por la normativa vigente, se desarrolló una propuesta de obra alternativa que garantizara la estabilidad del talud y diera solución a las problemáticas identificadas.</p> <p>En consecuencia, en el punto K1+160 se ejecutaron las siguientes actividades y obras de estabilización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anclajes activos tipo 1 - L=30m con 18m de Bulbo - Anclajes activos tipo 2 - L=25m con 15m de Bulbo - Drenes horizontales - L=20m </td> </tr> <tr> <td>K1+600</td> <td> <p>El punto objeto de intervención existía una obra previa consistente en un muro de contención en concreto reforzado de 20 m de longitud y 4 m de altura, apoyado sobre cimentación profunda tipo caisson de 1 m de diámetro y 6 m de profundidad.</p> <p>Durante el análisis inicial se identificó un fenómeno de remoción en masa tipo reptamiento, manifestado mediante deformaciones lentas y progresivas que afectaban un área mayor a la protegida por la estructura existente. Esta condición se veía agravada por la ausencia de un adecuado manejo de aguas superficiales provenientes del talud superior, lo que generaba infiltraciones y contribuía a la disminución de la estabilidad del terreno.</p> <p>Considerando estas problemáticas y de acuerdo con los diseños revisados, se recomendó extender la obra de contención en concreto hidráulico existente a lo largo de 20m adicionales, entre los PK1+603 y PK1+623, con el fin de atender de manera integral la zona con mayores deformaciones.</p> <p>En cumplimiento de lo anterior, en el punto K1+600 se ejecutaron las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de cimentación profunda mediante caissons de 1,2 m de diámetro y 5,5m de profundidad. - Levantamiento de un muro de contención de 3,5 m de altura y 20 m de longitud. - Instalación de un filtro en el trasdós del muro para garantizar el adecuado drenaje y reducir las presiones hidrostáticas. </td> </tr> <tr> <td>K2+430</td> <td> <p>La problemática inicialmente identificada en este punto correspondió al hundimiento de la banca, generado por el desconfinamiento de la estructura vial en las proximidades de una obra hidráulica existente, específicamente un box culvert de 2 m de altura por 1 m de ancho. Este proceso de falla se asociaba principalmente a la insuficiencia del sostenimiento lateral en la zona de descarga de la estructura hidráulica, donde deberían existir dos aletas de confinamiento, pero solo se disponía de una, lo que comprometía la estabilidad del relleno adyacente.</p> <p>Adicionalmente, se evidenció que la escorrentía superficial se concentraba de manera directa en este punto, debido a que metros aguas arriba se encuentra un muro de contención de reciente construcción que no incorpora obras para el manejo adecuado de las aguas superficiales, ocasionando que el flujo se dirija hacia el sector crítico y contribuya al debilitamiento del terreno.</p> <p>Con el fin de mejorar la estabilidad y mitigar las condiciones de falla, los diseños recomendaron la construcción de una pantalla anclada apoyada sobre cimentación profunda tipo caisson, capaz de resistir los empujes laterales y transferir las cargas a una viga cabezal, la cual distribuiría dichos esfuerzos hacia los pilotes garantizando un adecuado soporte en el suelo de cimentación.</p> <p>Siguiendo lo establecido en los diseños, en este punto se ejecutó la obra propuesta, complementada con medidas adicionales que reforzaron la estabilidad del sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cimentación profunda mediante caissons de 1,2 m de diámetro y 5,5 m de profundidad. - Construcción de un muro de contención en dos módulos: el primero de 14 m de longitud y 4,65 - 5 m de altura. - Instalación de anclajes activos de 15 m de longitud, con bulbo de 9 m. - Construcción de aletas en concreto para el adecuado confinamiento del relleno. - Ejecución de anclajes pasivos de 4 m en las aletas (dos en la aleta derecha y uno en la aleta izquierda). - Instalación de drenes horizontales de 15 m de longitud. </td> </tr> </tbody> </table>						PUNTO CRITICO	CONDICIÓN Y OBRA EJECUTADA	K1+160	<p>En la fase inicial se identificó la presencia de un movimiento activo asociado a un deslizamiento traslacional, desarrollado sobre materiales correspondientes a la Formación Amagá, compuesta por areniscas y arcillolitas cubiertas por una delgada capa de cenizas volcánicas. Se evidenció además la ausencia total de obras de manejo y control de aguas de escorrentía, así como la existencia de una conexión de acueducto domiciliario con fugas en la corona del talud, condición que contribuyó a la inestabilidad del terreno.</p> <p>Como parte del diagnóstico técnico, se determinó que el sitio requería prioritariamente un manejo adecuado de aguas subsuperficiales, mediante la implementación e instalación de drenes subhorizontales destinados a incrementar los esfuerzos efectivos dentro del talud.</p> <p>Dado que los diseños iniciales propuestos por la Gobernación no cumplían con los factores de seguridad exigidos por la normativa vigente, se desarrolló una propuesta de obra alternativa que garantizara la estabilidad del talud y diera solución a las problemáticas identificadas.</p> <p>En consecuencia, en el punto K1+160 se ejecutaron las siguientes actividades y obras de estabilización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anclajes activos tipo 1 - L=30m con 18m de Bulbo - Anclajes activos tipo 2 - L=25m con 15m de Bulbo - Drenes horizontales - L=20m 	K1+600	<p>El punto objeto de intervención existía una obra previa consistente en un muro de contención en concreto reforzado de 20 m de longitud y 4 m de altura, apoyado sobre cimentación profunda tipo caisson de 1 m de diámetro y 6 m de profundidad.</p> <p>Durante el análisis inicial se identificó un fenómeno de remoción en masa tipo reptamiento, manifestado mediante deformaciones lentas y progresivas que afectaban un área mayor a la protegida por la estructura existente. Esta condición se veía agravada por la ausencia de un adecuado manejo de aguas superficiales provenientes del talud superior, lo que generaba infiltraciones y contribuía a la disminución de la estabilidad del terreno.</p> <p>Considerando estas problemáticas y de acuerdo con los diseños revisados, se recomendó extender la obra de contención en concreto hidráulico existente a lo largo de 20m adicionales, entre los PK1+603 y PK1+623, con el fin de atender de manera integral la zona con mayores deformaciones.</p> <p>En cumplimiento de lo anterior, en el punto K1+600 se ejecutaron las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de cimentación profunda mediante caissons de 1,2 m de diámetro y 5,5m de profundidad. - Levantamiento de un muro de contención de 3,5 m de altura y 20 m de longitud. - Instalación de un filtro en el trasdós del muro para garantizar el adecuado drenaje y reducir las presiones hidrostáticas. 	K2+430	<p>La problemática inicialmente identificada en este punto correspondió al hundimiento de la banca, generado por el desconfinamiento de la estructura vial en las proximidades de una obra hidráulica existente, específicamente un box culvert de 2 m de altura por 1 m de ancho. Este proceso de falla se asociaba principalmente a la insuficiencia del sostenimiento lateral en la zona de descarga de la estructura hidráulica, donde deberían existir dos aletas de confinamiento, pero solo se disponía de una, lo que comprometía la estabilidad del relleno adyacente.</p> <p>Adicionalmente, se evidenció que la escorrentía superficial se concentraba de manera directa en este punto, debido a que metros aguas arriba se encuentra un muro de contención de reciente construcción que no incorpora obras para el manejo adecuado de las aguas superficiales, ocasionando que el flujo se dirija hacia el sector crítico y contribuya al debilitamiento del terreno.</p> <p>Con el fin de mejorar la estabilidad y mitigar las condiciones de falla, los diseños recomendaron la construcción de una pantalla anclada apoyada sobre cimentación profunda tipo caisson, capaz de resistir los empujes laterales y transferir las cargas a una viga cabezal, la cual distribuiría dichos esfuerzos hacia los pilotes garantizando un adecuado soporte en el suelo de cimentación.</p> <p>Siguiendo lo establecido en los diseños, en este punto se ejecutó la obra propuesta, complementada con medidas adicionales que reforzaron la estabilidad del sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cimentación profunda mediante caissons de 1,2 m de diámetro y 5,5 m de profundidad. - Construcción de un muro de contención en dos módulos: el primero de 14 m de longitud y 4,65 - 5 m de altura. - Instalación de anclajes activos de 15 m de longitud, con bulbo de 9 m. - Construcción de aletas en concreto para el adecuado confinamiento del relleno. - Ejecución de anclajes pasivos de 4 m en las aletas (dos en la aleta derecha y uno en la aleta izquierda). - Instalación de drenes horizontales de 15 m de longitud.
PUNTO CRITICO	CONDICIÓN Y OBRA EJECUTADA												
K1+160	<p>En la fase inicial se identificó la presencia de un movimiento activo asociado a un deslizamiento traslacional, desarrollado sobre materiales correspondientes a la Formación Amagá, compuesta por areniscas y arcillolitas cubiertas por una delgada capa de cenizas volcánicas. Se evidenció además la ausencia total de obras de manejo y control de aguas de escorrentía, así como la existencia de una conexión de acueducto domiciliario con fugas en la corona del talud, condición que contribuyó a la inestabilidad del terreno.</p> <p>Como parte del diagnóstico técnico, se determinó que el sitio requería prioritariamente un manejo adecuado de aguas subsuperficiales, mediante la implementación e instalación de drenes subhorizontales destinados a incrementar los esfuerzos efectivos dentro del talud.</p> <p>Dado que los diseños iniciales propuestos por la Gobernación no cumplían con los factores de seguridad exigidos por la normativa vigente, se desarrolló una propuesta de obra alternativa que garantizara la estabilidad del talud y diera solución a las problemáticas identificadas.</p> <p>En consecuencia, en el punto K1+160 se ejecutaron las siguientes actividades y obras de estabilización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anclajes activos tipo 1 - L=30m con 18m de Bulbo - Anclajes activos tipo 2 - L=25m con 15m de Bulbo - Drenes horizontales - L=20m 												
K1+600	<p>El punto objeto de intervención existía una obra previa consistente en un muro de contención en concreto reforzado de 20 m de longitud y 4 m de altura, apoyado sobre cimentación profunda tipo caisson de 1 m de diámetro y 6 m de profundidad.</p> <p>Durante el análisis inicial se identificó un fenómeno de remoción en masa tipo reptamiento, manifestado mediante deformaciones lentas y progresivas que afectaban un área mayor a la protegida por la estructura existente. Esta condición se veía agravada por la ausencia de un adecuado manejo de aguas superficiales provenientes del talud superior, lo que generaba infiltraciones y contribuía a la disminución de la estabilidad del terreno.</p> <p>Considerando estas problemáticas y de acuerdo con los diseños revisados, se recomendó extender la obra de contención en concreto hidráulico existente a lo largo de 20m adicionales, entre los PK1+603 y PK1+623, con el fin de atender de manera integral la zona con mayores deformaciones.</p> <p>En cumplimiento de lo anterior, en el punto K1+600 se ejecutaron las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de cimentación profunda mediante caissons de 1,2 m de diámetro y 5,5m de profundidad. - Levantamiento de un muro de contención de 3,5 m de altura y 20 m de longitud. - Instalación de un filtro en el trasdós del muro para garantizar el adecuado drenaje y reducir las presiones hidrostáticas. 												
K2+430	<p>La problemática inicialmente identificada en este punto correspondió al hundimiento de la banca, generado por el desconfinamiento de la estructura vial en las proximidades de una obra hidráulica existente, específicamente un box culvert de 2 m de altura por 1 m de ancho. Este proceso de falla se asociaba principalmente a la insuficiencia del sostenimiento lateral en la zona de descarga de la estructura hidráulica, donde deberían existir dos aletas de confinamiento, pero solo se disponía de una, lo que comprometía la estabilidad del relleno adyacente.</p> <p>Adicionalmente, se evidenció que la escorrentía superficial se concentraba de manera directa en este punto, debido a que metros aguas arriba se encuentra un muro de contención de reciente construcción que no incorpora obras para el manejo adecuado de las aguas superficiales, ocasionando que el flujo se dirija hacia el sector crítico y contribuya al debilitamiento del terreno.</p> <p>Con el fin de mejorar la estabilidad y mitigar las condiciones de falla, los diseños recomendaron la construcción de una pantalla anclada apoyada sobre cimentación profunda tipo caisson, capaz de resistir los empujes laterales y transferir las cargas a una viga cabezal, la cual distribuiría dichos esfuerzos hacia los pilotes garantizando un adecuado soporte en el suelo de cimentación.</p> <p>Siguiendo lo establecido en los diseños, en este punto se ejecutó la obra propuesta, complementada con medidas adicionales que reforzaron la estabilidad del sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cimentación profunda mediante caissons de 1,2 m de diámetro y 5,5 m de profundidad. - Construcción de un muro de contención en dos módulos: el primero de 14 m de longitud y 4,65 - 5 m de altura. - Instalación de anclajes activos de 15 m de longitud, con bulbo de 9 m. - Construcción de aletas en concreto para el adecuado confinamiento del relleno. - Ejecución de anclajes pasivos de 4 m en las aletas (dos en la aleta derecha y uno en la aleta izquierda). - Instalación de drenes horizontales de 15 m de longitud. 												

		DEPARTAMENTO DE CALDAS		Secretaría de INFRAESTRUCTURA		
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA				
				FECHA 9 12 2025		
UNIDAD EJECUTORA		Secretaría de Infraestructura		Página 3 de 4		
		DEPARTAMENTO		Caldas		
CONTRATO DE OBRA No:		18092024-1274 DEL 2025				
OBJETO DEL CONTRATO:		"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- (ENMARcado EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)"				
VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:						
Valor total básico de la obra ejecutada:		\$ 1.421.240.244				
Valor Ajustes:		\$ 0				
Valor IVA:		\$ 0				
Valor total de la obra :		\$ 1.421.240.244				
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:						
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
OBRAS DE ESTABILIZACIÓN						
603.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	626,24	\$ 37.652,00	\$ 23.704.514,00
610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	240,97	\$ 104.464,00	\$ 25.172.690,00
630.1.3.1		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	96,45	\$ 871.962,00	\$ 85.848.422,00
630.1.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	2,51	\$ 638.640,00	\$ 1.602.986,00
640.1		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	15.633,56	\$ 7.561,00	\$ 118.717.547,00
673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAS MINIMA DE	M2	264,67	\$ 12.220,00	\$ 3.234.267,00
673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	34,27	\$ 226.230,00	\$ 7.752.902,00
621.1.2		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m. INCLUYE EXCAVACION EN	ML	48,00	\$ 3.148.166,00	\$ 151.111.488,00
623.1P		ANCLAJE TIPO pasivo D=4", Varilla 1"	ML	12,00	\$ 252.562,00	\$ 3.030.744,00
674.2		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	235,00	\$ 252.253,00	\$ 59.279.455,00
683.1.3		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE D=3"	ML	42,70	\$ 32.316,00	\$ 1.379.893,00
630.3.3P		DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CLASE C	M3	3,18	\$ 1.186.188,00	\$ 3.748.354,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE						
1P		Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	1,00	\$ 41.000.000,00	\$ 41.000.000,00
		Valor IVA 19% (Ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños (19%) (INMODIFICABLE)	GL	1,00	\$ 7.790.000,00	\$ 7.790.000,00
NO PREVISTOS PACTADOS						
		DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	644,20	\$ 2.030,00	\$ 1.307.726,00
		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	11,60	\$ 179.103,00	\$ 2.077.595,00
		REPALEO MANUAL	M3	441,90	\$ 11.582,00	\$ 5.122.505,00
		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	951,92	\$ 17.680,00	\$ 16.829.946,00
		AUXILIARES DE TRANSITO	DIA	152,00	\$ 208.433,00	\$ 31.681.816,00
		ELABORACION PMT	UND.	1,00	\$ 1.950.030,00	\$ 1.950.030,00
		ANCLAJE TIPO ACTIVO D=4", TORONES=1/2"	ML	1.168,00	\$ 710.028,00	\$ 827.692.646,00
SUBTOTAL OBRAS						\$ 1.421.236.497,00
SALDO DEL CONTRATO						\$ 4.748,00
CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES						
La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones solicitadas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.						
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO						
Valor total concedido:		\$ 284.248.046,00				
Valor total amercizado y/o legalizado:		\$ 284.248.046,00				



DEPARTAMENTO DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Secretaría de
INFRAESTRUCTURA

FECHA9122025

Página4de4

UNIDAD EJECUTORA

Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO

Caldas

CONTRATO DE OBRA No:

18052024-1274 DEL 2025

OBJETO DEL CONTRATO.

"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC- (ENMARcado EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA SAN LORENZO (LOTE 3)"

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ACTA	VALOR NETO PAGADO AL CONTRATISTA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	nov-24	\$ 99.040.708,00	\$ 19.608.141,00	\$ 78.432.565,00	\$ 98.040.708,00
2	dic-24	\$ 298.608.808,00	\$ 105.654.690,00	\$ 131.152.118,00	\$ 334.947.514,00
3	ago-25	\$ 46.527.563,00	\$ 9.305.512,00	\$ 37.222.051,00	\$ 381.375.077,00
4	sep-25	\$ 123.145.469,00	\$ 24.629.094,00	\$ 98.516.375,00	\$ 504.520.546,00
5	oct-25	\$ 257.159.206,00	\$ 53.430.710,00	\$ 213.728.495,00	\$ 771.679.762,00
6	nov-25	\$ 419.177.082,00	\$ 71.619.302,00	\$ 347.557.180,00	\$ 1.190.856.834,00
7	dic-25	\$ 230.378.683,00		\$ 230.378.683,00	\$ 1.421.235.497,00
TOTALES		\$ 1.421.235.497,00	\$ 284.248.049,00	\$ 1.136.987.448,00	

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera a Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del período de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, la GOBERNACIÓN DE CALDAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Firma



HERNÁN CAÑAS ORTIZ
Representante legal
CONSORCIO LR
CONTRATISTA
Matrícula No.: 2560 CPD

Firma



DANIELA MONTES GONZALEZ
Residente de obra
CONSORCIO LR
CONTRATISTA
Matrícula No.: 051037-0542511 CLD

Firma




JUAN CARLOS GIRALDO MEJÍA
SUPERVISOR
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Matrícula No.:

Firma



JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Representante legal
INTERVENTORIA
Matrícula No.: 17202169291 CLD

Firma



FERNANDO CARO
Residente de interventoría
INTERVENTORIA
Matrícula No.: 05037-0543672 CLD

		INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO		Código: FD-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION 07 FINAL							
CONTRATO	18092024-1275		RADICADO JURID. NRO:		18092024-1275		
OBJETO:	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGLARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 810.002.434-3 (PARTICIPACION: 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION: 25%)						
NOMBRE DEL SUPERVISOR (E)	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA						
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				MODIFICATORIO (PRORROGA PLAZO):		
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U. (30%)	\$ 1.421.240.244	PORCENTAJE AL %	30	HASTA 31/12/2025			
VALOR TOTAL	\$ 1.421.240.244						
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
	CANTIDAD	VTOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	VTOTAL	PESO
OBRAS DE DRENAJE							
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1.000,00	41.566.340,00	2,93%	-2,93%	0,00	0,00	0,00%
RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO	33,00	3.199.920,00	0,22%	-0,22%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) COMPRA DE MEZCLA	41,00	35.751.282,00	2,52%	-2,52%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (C) COMPRA DE MEZCLA	267,00	257.148.080,00	10,09%	-10,09%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	32,00	20.439.480,00	1,44%	-1,44%	0,00	0,00	0,00%
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	25.650,00	193.939.550,00	13,65%	-13,65%	0,00	0,00	0,00%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE D=4"	408,00	14.578.856,00	1,03%	-1,03%	0,00	0,00	0,00%
TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5065 DE DIAMETRO 300 mm	11,00	21.288.630,00	1,50%	-1,50%	0,00	0,00	0,00%
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO-2500 G SIMILAR	2.010,00	24.532.200,00	1,73%	-1,73%	0,00	0,00	0,00%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON AFIRMADO (analizado sin preparación de la superficie base del	46,00	9.637.598,00	0,68%	-0,68%	0,00	0,00	0,00%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	408,00	105.875.640,00	7,45%	-7,45%	0,00	0,00	0,00%
JUNTAS DE CONSTRUCCION	367,00	30.940.592,00	2,18%	-2,18%	0,00	0,00	0,00%
DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	27,00	6.610.831,00	0,46%	-0,46%	0,00	0,00	0,00%
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	2,00	12.674.004,00	0,89%	-0,89%	0,00	0,00	0,00%
REJILLAS DE 30 CM	100,00	2.353.800,00	0,17%	-0,17%	0,00	0,00	0,00%
OBRAS DE ESTABILIZACION							
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	358,00	15.065.096,00	1,06%	0,61%	626,24	23.704.514,00	1,67%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	122,00	13.769.248,00	0,97%	0,80%	240,87	25.172.690,00	1,77%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) COMPRA DE MEZCLA	10,00	88.070.182,00	6,20%	-0,15%	58,45	85.848.422,00	6,04%
CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	4,10	2.618.424,00	0,18%	-0,07%	2,51	1.502.986,00	0,11%
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	18.765,00	141.636.795,00	9,98%	-1,55%	15.833,56	119.717.547,00	8,42%
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	245,00	3.042.780,00	0,21%	0,01%	264,67	3.234.267,00	0,23%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	42,00	9.727.860,00	0,68%	-0,14%	34,27	7.752.902,00	0,55%
PILOTE DE CONCRETO VAGIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACION EN	48,00	151.111.468,00	10,63%	0,00%	48,00	151.111.468,00	10,63%
ANCLAJE TIPO pasivo D=4", Varilla 1"	444,00	112.137.528,00	7,89%	-7,58%	12,00	3.030.744,00	0,21%
DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	76,00	19.171.228,00	1,35%	2,82%	235,00	59.279.455,00	4,17%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE D=3"	72,00	2.326.752,00	0,16%	-0,07%	42,70	1.379.893,00	0,10%
DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CLASE C	2,00	2.372.376,00	0,17%	0,10%	3,16	3.748.354,00	0,26%
ESTABLECIMIENTO DE VEGETACION CON ABONOS VERDES	175,00	3.064.528,00	0,22%	-0,22%	0,00	0,00	0,00%
BARRERAS VIVAS	50,00	195.750,00	0,01%	-0,01%	0,00	0,00	0,00%
ESTAQUILLADO DE MADERA BLANCA	1.022,00	3.895.864,00	0,27%	-0,27%	0,00	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O RUTINARIO AFIRMADO	40,01	8.123.592,00	0,57%	-0,57%	0,00	0,00	0,00%
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	766,00	1.318.905,00	0,09%	-0,09%	0,00	0,00	0,00%
REVISION Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE			0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (MODIFICABLE)	1,00	41.000.000,00	2,88%	0,00%	1,00	41.000.000,00	2,88%
Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	1,00	13.828.105,00	0,97%	-0,97%	0,00	0,00	0,00%
Valor IVA 18% (Ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y	1,00	7.790.000,00	0,55%	0,00%	1,00	7.790.000,00	0,55%
ITEMS NO PREVISTOS							
DESCAPOTE Y LIMPIEZA	194,00	0,00	0,00%	0,09%	644,20	1.307.726,00	0,09%

Table with 8 columns: Item, Quantity, Unit, Price, Total Price, and other metrics. Rows include DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, REPALEO MANUAL, TRANSPORTE DE MATERIALES, AUXILIARES DE TRANSITO, ELABORACION PMT, and ANCLAJE TIPO ACTIVO.

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include CONTRATISTA, VALOR DEL CONTRATO, VALOR ADICIONAL, VALOR TOTAL, PLAZO INICIAL, FECHA INICIACION, FECHA TERMINACION, and MODIFICATORIO 01 through 07.

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ESTA A CARGO DE JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ. LA SUPERVISION (E) ESTA A CARGO DEL ING. JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO: ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa, CONCRETO REFORZADO DE 28MPa, LLENOS, DRENES Y ANCLAJES ACTIVOS

[Signature]

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
INTERVENTOR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA

09 DICIEMBRE DE 2025

ACTA NRO. 06 PARCIAL

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO

18092024-1275

CONSULTORIA

OBRA: ☒

Nro. CONTRATO RADICADO:

18092024-1275

OBJETO DEL CONTRATO:

ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- ENMARcado EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CLADAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN

CONTRATISTA:

CONSORCIO LR

INTERVENTOR (EXTERNO)

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

SUPERVISOR (E.)

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

PREGUNTAS

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal

X

Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora

X

La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros

X

Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.

X

Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas

X

Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable

X

Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra

X

Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios

X

Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva

X

La obra cuenta con valla publicitaria

X

Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra

X

La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas

X

En la obra se realizan quemas a cielo abierto

X

Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil

X

Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado

X

El cambio de aceites se realiza en la obra

X

Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra

X

El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas

X

Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados

X

Se usan baños portátiles

X

Se entrega volantes informativos para la comunidad

X

Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra

X

Se afectan corredores de fauna nativa

X

Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región

X

Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra

X

Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra

X

Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)

X

Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire

X

Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición

X

se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra

X

Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región


X

OBSERVACIONES:

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
INTERVENTOR

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

INFORME MENSUAL 8 Y FINAL
CONTRATO No. 18092024-1275

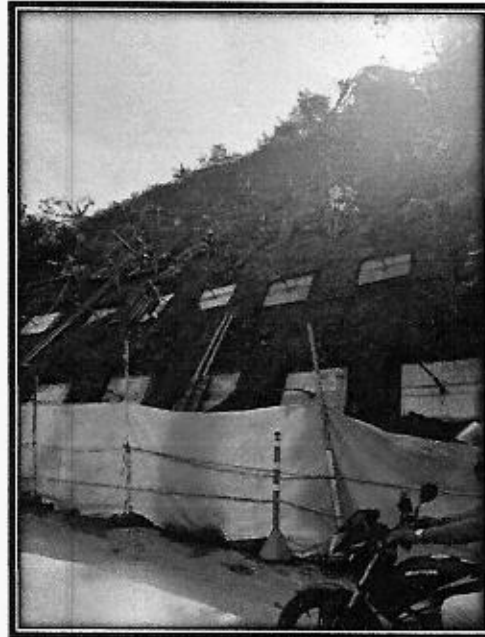

FECHA: 09 de diciembre de 2025

OBJETO: "ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE
CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS
QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL
INDÍGENA -CRIDEC- (ENMARCADO EN EL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE
RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: SAN
LORENZO (LOTE 3)"

CONTRATISTA: CONSORCIO LR

INTERVENTOR: John Esneider Cardona Gutierrez

CONTRATO No: 18092024-1275

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
2.1. Localización del proyecto.....	4
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto	4
2.3. Inventario y estado inicial de la vía.....	5
2.4. Características técnicas del proyecto	5
3. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO	5
3.1. Generalidades	5
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	6
3.3. Estado de avance	7
3.4. Aspectos administrativos y legales.....	8
3.4.1. Visitas de supervisión	8
3.4.2. Control de Pólizas y Reservas Presupuestales	8
4. CONCLUSIONES	9

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico mensual corresponde al desarrollo del Contrato No. 18092024-1275, cuyo objeto es la "ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARcado EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)".

En este informe se presenta el estado de avance correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de noviembre de 2025 y el 04 de diciembre de 2025, destacando las actividades ejecutadas, los recursos empleados, el progreso financiero y físico del contrato, así como las conclusiones y recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Adicionalmente, se incluyen anexos con el registro fotográfico de las obras realizadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

El presente contrato cuenta con tres frentes de trabajo, correspondientes a los puntos críticos a intervenir ubicados en el tramo vial Central – San Lorenzo en el departamento de Caldas.

No.	FRENTE	TIPO DE OBRA	COORDENADAS
1	K1+160	Sistema de anclajes activos	5°27'19.74" N 75°41'9.73" O
2	K1+600	Continuación muro de contención existente	5°27'20.68" N 75°41'17.70" O
3	K2+430	Muro pantalla con anclajes activos	5°27'29,37" N 75°41'36,11" O

Inicialmente, se abrieron los frentes de trabajo, 1, 2 y 3 al realizarse un levantamiento topográfico con tecnología de dron en los 3 frentes el día 10 de octubre del 2024, además se comenzaron las labores de gestión social (socialización, actas de vecindad, planificación de las actividades) el 11 de octubre del 2024 y realizaron sondeos manuales y mecánicos en los frentes de trabajo del 10 de octubre al 15 de octubre del 2024. Se presentó una suspensión del 14 de enero del 2025 al 18 de julio del 2025. Actualmente, se finalizaron labores en los frentes 1, 2 y 3.

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El tramo vial Central - San Lorenzo beneficia directamente a las comunidades indígenas del resguardo de San Lorenzo, que forman parte del Consejo Regional Indígena de Caldas

(CRIDEC). La ejecución de este proyecto contribuye a mejorar la movilidad rural, fortalecer la seguridad vial, y reducir riesgos asociados a deslizamientos e inestabilidad de taludes.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo vial presentaba las siguientes problemáticas antes del inicio del proyecto:

- Punto K1+160: Talud inestable con riesgo de desprendimientos.
- Punto K1+600: Muro de contención existente deteriorado.
- Punto K2+430: Altos riesgos de deslizamiento debido a la inestabilidad del terreno.

2.4. Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla la realización de las siguientes obras:

- **Estabilidad de taludes:** Implementación de sistemas de anclajes activos y muros de contención.

3. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO

3.1. Generalidades

El proyecto se ejecutó mediante el contrato de obra No. 18092024-1275: "ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)". En este, se pretende dar solución a problemáticas relacionadas con estabilidad y manejo de aguas en los puntos críticos K1+160, K1+600 y K2+430 del tramo vial Central – San Lorenzo

Número del contrato:	18092024-1275
Objeto:	ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA – CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)
Contratista:	Consortio LR
Fecha del contrato:	18 de septiembre de 2024
Plazo de Ejecución inicial:	Noventa (90) días

Valor Inicial:	\$ 1.421.240.243
Prórroga 01:	Hasta el 20 de agosto
Prórroga 02:	Hasta el 14 de septiembre
Prórroga 03:	Hasta el 22 de noviembre
Prórroga 04:	Hasta el 31 de diciembre
Valor adiciones:	N/A
Valor total del contrato:	Mil cuatrocientos veintiún millones doscientos cuarenta mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
Fecha de inicio:	03 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión del contrato:	14 de enero de 2025
Fecha de reinicio:	18 de julio de 2025
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2025
Interventor:	John Esneider Cardona Gutierrez

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el mes de noviembre y diciembre del 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades en los dos frentes de trabajo antes de su culminación:

FRENTE 1 (K1+160)

- **Excavación para dados:** Se ejecutaron las excavaciones requeridas previas a la construcción de los dados para los anclajes.
- **Drenes:** Se realizaron las perforaciones correspondientes para la instalación de los drenes.
- **Dados:** Se inició la construcción de los dados destinados a los anclajes activos.
- **Concreto de 28MPa:** Se llevó a cabo la construcción de las placas asociadas a los dados de los anclajes activos.

FRENTE 3 (K2+430)

- **Relleno para estructuras:** Se ejecutó el lleno en el trasdós del muro para la conformación de la vía.
- **Material granular:** Se construyó el filtro con material granular en la cara interna del muro, con el fin de garantizar el adecuado drenaje de aguas.
- **Geotextil:** Se instaló el geotextil de manera simultánea a la colocación del material granular y al proceso de relleno.
- **Subbase:** Se finalizó con la instalación y compactación de la subbase con el fin de nivelar y acondicionar el terreno, de manera que esté preparado en caso de que en el futuro se realice pavimentación en este punto.

3.3. Estado de avance

El acta de inicio del proyecto se suscribió el 03 de octubre de 2024 y su acta de reinicio el 18 de julio del 2025, de esta manera durante el periodo de ejecución del contrato, se adelantó la etapa de construcción de obra tal cual se describió anteriormente, con lo cual el avance financiero final acumulado es de 100%.

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Inicial contratada	\$1.421.240.244
Inversión total	\$1.421.240.244
Porcentaje total ejecutado	100%
Inversión total acta 1	\$98.040.706
Inversión total acta 2	\$236.806.808
Inversión total acta 3	\$46.527.563
Inversión total acta 4	\$123.145.469
Inversión total acta 5	\$267.159.206
Inversión total acta 6	\$419.177.082
Inversión total acta 7 y final	\$230.378.663
Inversión total ejecutada	\$1.421.235.497

AVANCE FÍSICO

■ Ejecutado ■ Por ejecutar



3.4. Aspectos administrativos y legales

3.4.1. Visitas de supervisión

El contratista en compañía con interventoría y supervisión han realizado acompañamiento a todos procesos constructivos, mediante visitas técnicas para la revisión de los aspectos técnicos y administrativos del contrato.

3.4.2. Control de Pólizas y Reservas Presupuestales

Una vez firmado el contrato de obra, el contratista entregó las pólizas respectivas a la entidad contratante, cuyas vigencias fueron actualizadas de manera pertinente tras la suscripción del acta de inicio, de fecha 03 de octubre de 2024. La última actualización de estas pólizas corresponde al Acta modificatoria No. 7 "Prórroga No. 4" suscrita el día 28 de octubre de 2025, las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 1: VIGENCIA DE PÓLIZAS Y AMPAROS

Póliza	Asegurador a	No. Póliza	Inicio Vigencia	Fin vigencia	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A.	42-44- 101156922	18/09/2024	30/04/2026	\$ 284.248.048,8
Buen manejo de anticipo	Seguros del Estado S.A.	42-44- 101156922	18/09/2024	30/04/2026	\$ 284.248.048,8
Pago de salarios	Seguros del Estado S.A.	42-44- 101156922	18/09/2024	31/12/2028	\$ 284.248.048,8

Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	42-44-101156922	18/09/2024	18/09/2029	\$ 426.372.073,2
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del Estado S.A.	42-40-101047326	18/09/2024	31/12/2025	\$ 287.400.000

4. CONCLUSIONES

- Se finalizaron actividades en el frente 1, 2 y 3.
- Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, se desarrollaron actividades clave en los dos frentes de trabajo, destacando en el Frente 3 (K2+430) la instalación del acero, y la ejecución de lleno, material granular y geotextil. Igualmente, en el Frente 1 se realizaron actividades de construcción de dados
- Se aprobó una prórroga contractual para extender la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.



Hernán Cañas Ortiz
Representante legal Consorcio LR
Contratista
Matrícula Profesional No.: 2550

REGISTRO FOTOGRÁFICO

