

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO		VERSIÓN: 0	
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-047	
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO			FECHA: 24/Jul/2019	

INFORME No:	6	FECHA:	12	de	DICIEMBRE	de	2025					
PERIODO:	DEL	1	de	MAYO	de	2025	AL	31	de	MAYO	de	2025
CONVENIO No:	4563	DE	2024									

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ – BOYACÁ".

LOCALIZACIÓN:

INFORMACIÓN DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ			
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
JHON FREDY PIÑA CAMARGO			
Teléfono: 7420111EXT4126		Dirección AV. COLÓN N° 22A-16	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:		23 DE MAYO DE 2025	
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MIISTERIO DE SALUD	TOTAL
\$ 1.356.745.539,00	\$ 0,00	\$ 11.256.363.687,00	\$ 12.613.109.226,00
OBSERVACIÓN			


ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. HMM-CO-01-2025	29/01/2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	29/01/2025
Estudios Previos	29/01/2025
Proyecto de pliego de condiciones	29/01/2025
Pliego de condiciones definitivos	10/02/2025
Acto de adjudicación	31/03/2025
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. ESE – 002 – 2025	11/03/2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	26/03/2025
Estudios Previos	11/03/2025
Proyecto de pliego de condiciones	11/03/2025
Pliego de condiciones definitivos	20/03/2025
Acto de adjudicación	10/04/2025

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI	\$ 11.966.541.300,00
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓNDELANUEVAINFRAESTRUCTURAPARALAE.S.EHOSPITALLASMERCEDESDELMUNICIPIODEMONGUÍ–BOYACÁ, al proponente CONSORCIO E.S.E. MONGUÍ 2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO E.S.E. MONGUI 2025	DANILO PINEDA CHAPARRO
Teléfono: 3212484284 Dirección calle 104 b #57-57 apto 304	Teléfono: 3212484284 Dirección calle 104 b #57-57 apto 304

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI	\$ 646.119.306,00
OBJETO:	
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ – BOYACÁ",	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONBASES S.A.S	MONICA MARCELA CRUZ SANABRIA
Teléfono: 3124797394 Dirección: calle 152 a # 1358 t. 3 oficina 412	Teléfono: 3124797394 Dirección: calle 152 a # 1358 t. 3 oficina 412

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORIA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	3	12	2024	22	5	2025		4	2025
PLAZO INICIAL	UN (01) AÑO Y VEINTINUEVE (29) DIAS			VEINTE (20) MESES			VEINTE (20) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2025	21	1	2027	21	1	2027
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2025	21	1	2027	21	1	2027

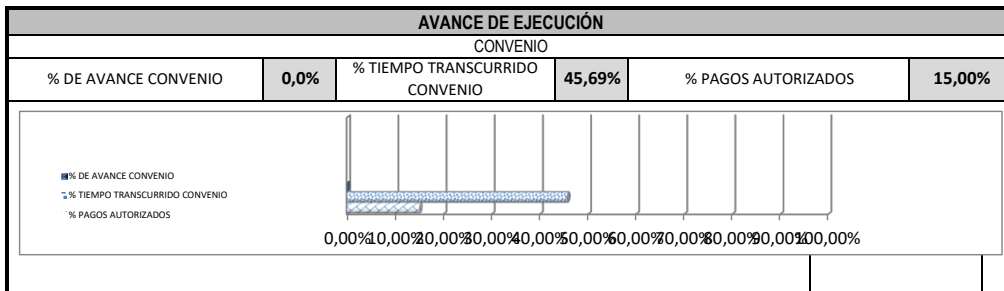

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONTRATO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL EJECUCION, AVANCE Y ESTADO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> SE REALIZO LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA EDIFICACION EXISTENTE, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. </div>

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	3	12	2024	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	358-753559-01	BANCO:	BANCOLOMBIA	SUCURSAL:	SOGAMOSO
NOMBRE CUENTA:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ - BOYACÁ.				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA		VALOR	
Desembolso No 1. APOORTE GOBERNACION	15,00%	11	2	2025	\$ 203.512.000,00
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 203.512.000,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	OBRA

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO (Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
20/05/2025	SUPERVISOR	SOLICITUD DE INFORMES DE SUPERVISION DEL CONVENIO	SE ENVIO OFICIO A LA ESE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERÍODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	3	12	2024	31	12	2024	
Informe de Supervisión No. 2	1	1	2025	31	1	2025	
Informe de Supervisión No. 3	1	2	2025	28	2	2025	
Informe de Supervisión No. 4	1	3	2025	31	3	2025	
Informe de Supervisión No. 5	1	4	2025	30	4	2025	
Informe de Supervisión No. 6	1	5	2025	31	5	2025	Corresponde al presente informe

OBSERVACIONES:
1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ - (Comprende 116 folios).
2. NOTA: El presente informe se elabora con base en la información contenida en los informes presentados por la E.S.E. Hospital Las Mercedes del municipio de Monguí, teniendo en cuenta que las actividades objeto del convenio fueron ejecutadas en el mes de mayo del año 2025. En virtud de lo anterior, hago constar que suscribo el presente informe en calidad de supervisor del convenio a partir del 23 de mayo de 2025. El informe de supervisión por parte del hospital fue radicado, conforme a las observaciones realizadas, el 12 de diciembre de 2025 ante la Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACION	FOLIOS
Etapas precontractuales de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICÓ	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICÓ	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICÓ	
Copia del Acto administrativo mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICÓ	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICÓ	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICÓ	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	SI	23
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	NO	
Seguimiento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de Boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u>		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	8 - 116
Acta de socialización del contrato de obra	SI	25
Copia de informes de interventoría presentados al municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	08 AL 15
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	25
Actas Generadas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	SI	4
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	SI	4
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	SI	6
Actas Generadas (Visitas, comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	25
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	22
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019


Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	3
Correspondencia enviada y recibida	SI	14
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	SI	8 AL 15
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	23
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	4
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI	6
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	SI	14

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Supervisor Departamento
NOMBRE:	JHON FREDY PIÑA CAMARGO

FIRMA:	
	Apoyo Supervisor Departamento
NOMBRE:	EDWARD IVAN SUAREZ RUANO
