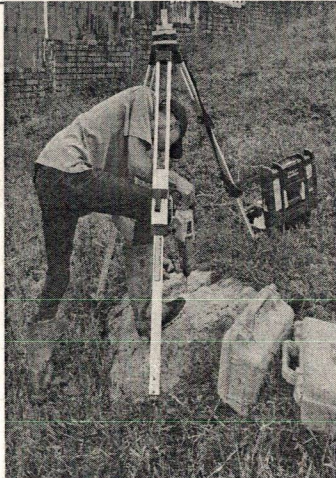
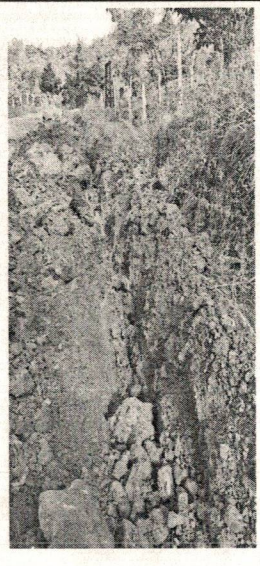
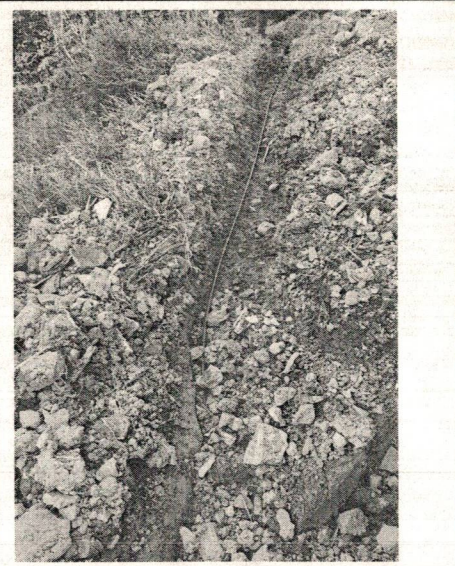
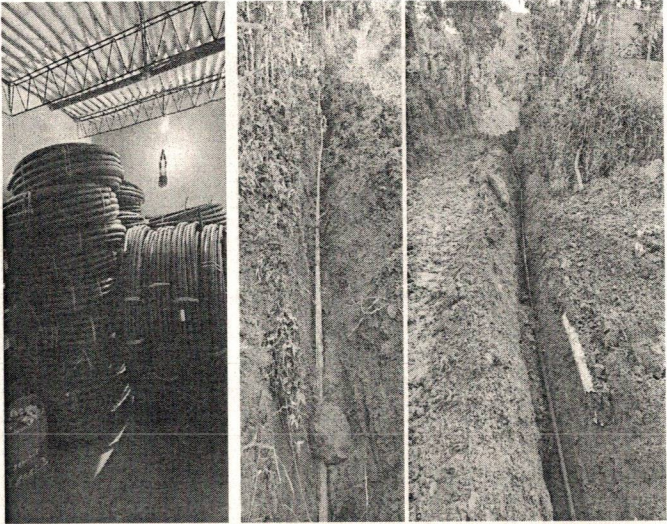
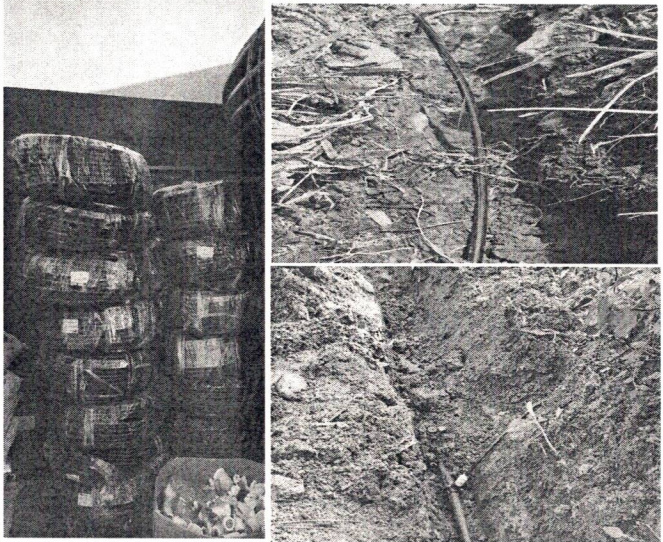
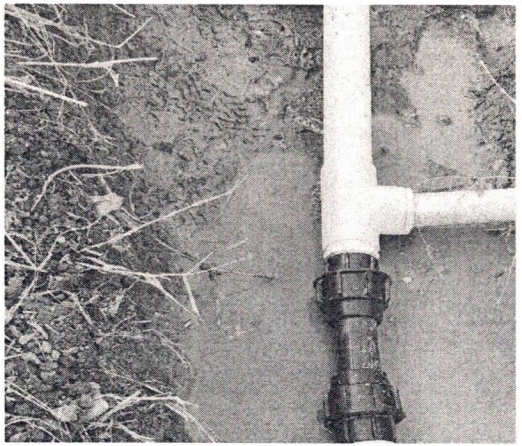


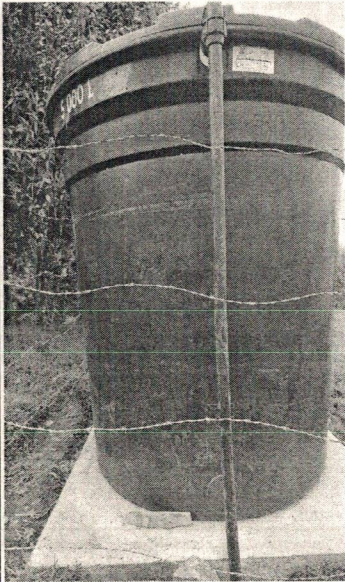
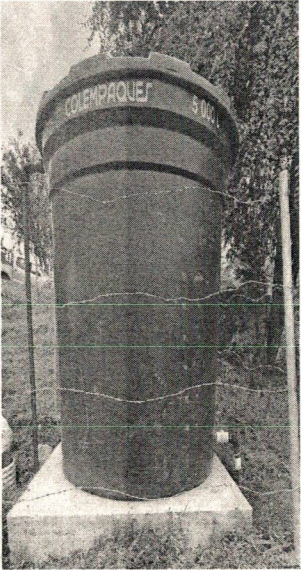
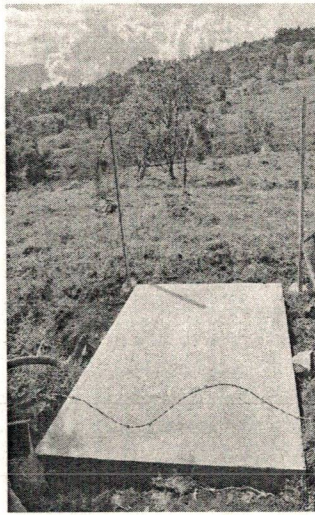
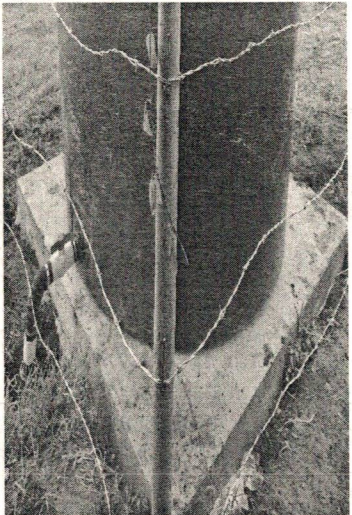
		ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO										 NIT. 891.801.282-0															
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"																									
		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL																									
		MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA																									
		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN										CODIGO: S.E-GCO-FO-21															
												VERSIÓN: 002															
												FECHA: 10/09/2024															
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL																											
DEPENDENCIA:				SECRETARIA DE PLANEACION						FECHA:		4		de		DICIEMBRE		de		2025							
PERIODO:		DEL		1		de		NOVIEMBRE				de		2025		AL		4		de		DICIEMBRE		de		2025	
INFORMACIÓN CONTRATO																											
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDESDE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ																									
N° Contrato		MSE-SAMC-006-2025				Fecha de suscripción contrato				31 DE JULIO DE 2025				Fecha de Terminación según contrato				15 DE OCTUBRE DE 2025									
N° CDP		195		Fecha CDP		07 DE JULIO DE 2025				N° RP		626		Fecha RP		31 DE JULIO DE 2025											
Nombre del Supervisor:				JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE								Identificación:				C.C No.1.049.619.915 de Tunja											
Nombre Contratista:				CYM INGENIEROS SAS R/L CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ								Identificación:				NIT: 901801713-9 CC No. 6.775.508 DE TUNJA.											
Teléfono:				3132835521								Dirección:				CL 4 2 21 - Centro, San Eduardo, Boyacá											
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN														CONTRATO													
														dd		mm		aaaa									
FECHA DE INICIACIÓN														1		8		2025									
PLAZO INICIAL														DOS (02) MESES Y QUINCE DIAS													
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL														15		10		2025									
SUSPENSION 01:														29		8		2025									
REINICIO 01:														18		9		2025									
ADICIONES EN PLAZO														PRORROGA No01													
PLAZO ADICIONAL														UN (01) MES													
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)														4		12		2025									
AVANCE DE EJECUCIÓN																											
% DE AVANCE CTO				100%		% TIEMPO TRANSCURRIDO				100,0%		% PAGOS AUTORIZADOS				100,0%											
1 0%20%40%60%80%100%120%																											
ÍTEM		ÍTEM/GOBER						DESCRIPCIÓN-- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE DESEMPEÑO		UNIDAD		CANTIDAD EJECUT		REGISTRO FOTOGRAFICO													

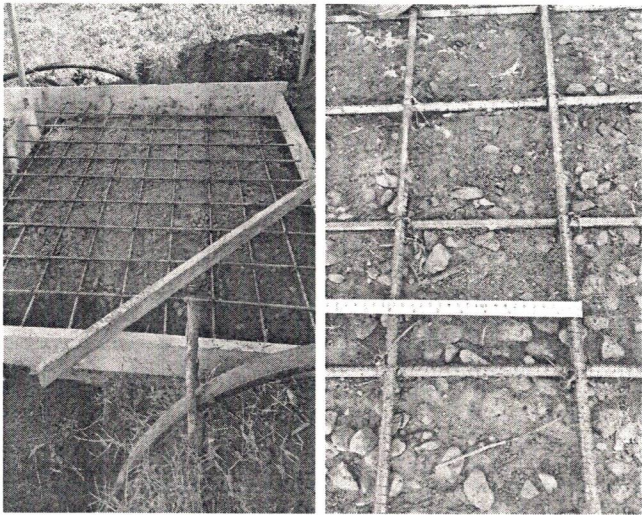
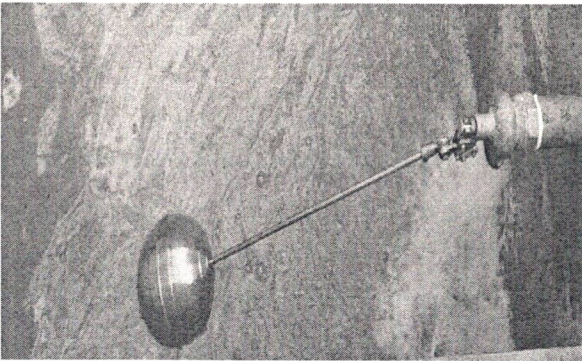
1	SECCION 1:PRELIMINARES					
1,1	4.01.0 3	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	ML	5109,30		
2	SECCIÓN 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS					
2,1	2.01.7 1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	10,24		

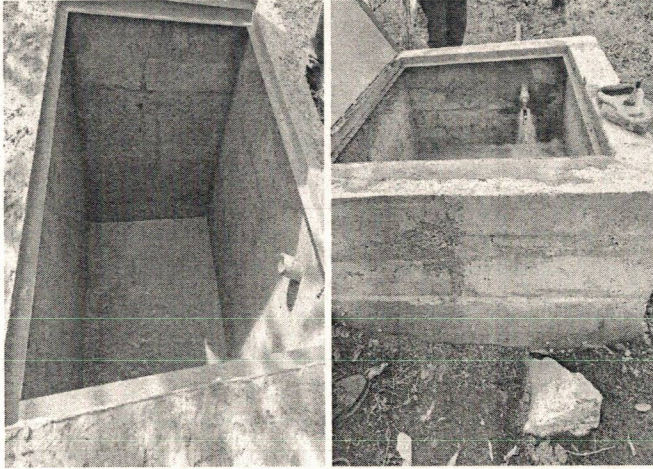
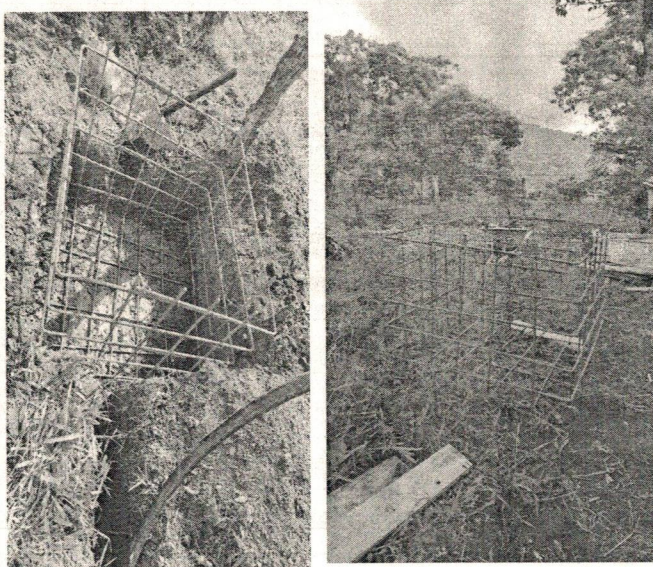
2,2	3,03,1 0	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	523,97	
2,2,1	3.02.0 2	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.	M3	470,16	

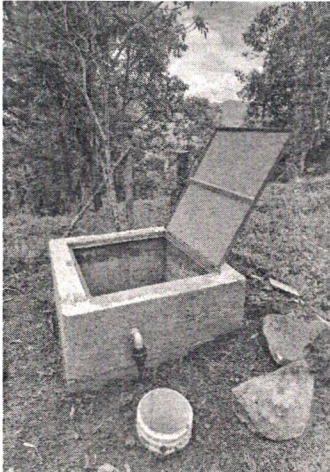
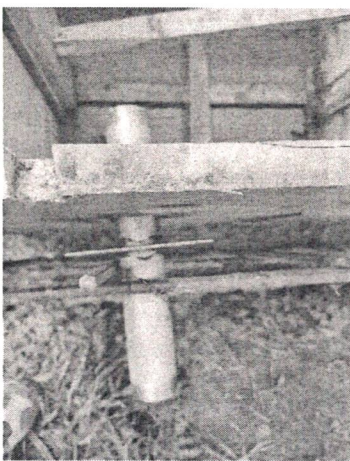
2,3	2,01,09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	998,50	
3	SECCIÓN 3: TUBERIAS				
3,1	APU	TUBERIA PEAD PN8 RDE 21 50MM	ML	2988,30	

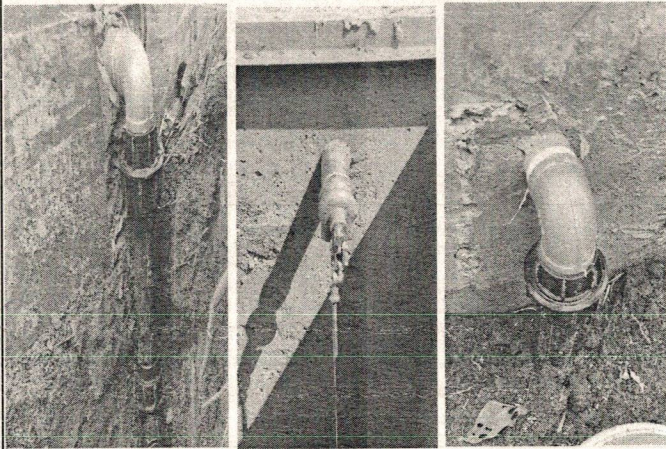
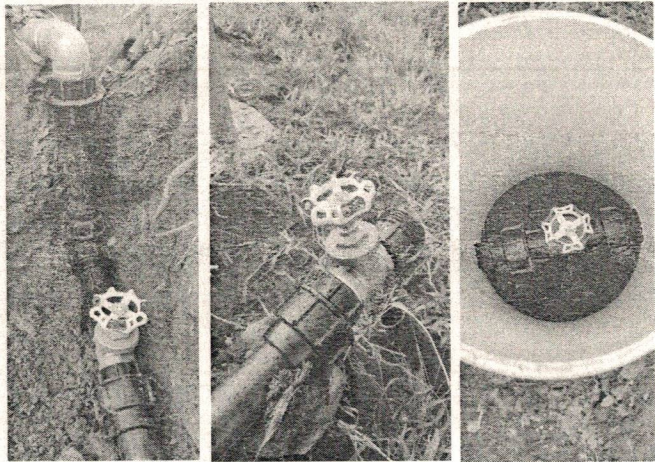
3,2	APU	TUBERIA PEAD RDE 7,4, 16MM	ML	2121,00	
3,3	APU	BUJE ROSCADO PVC 2" x 1 1 /2" (ADAPTADOR DE TUBO PVC DE 2" A TUEBRIA PEAD 50MM)	UND	1,00	
4	SECCIÓN 4: TANQUE DE ALMACENAMIENTO				

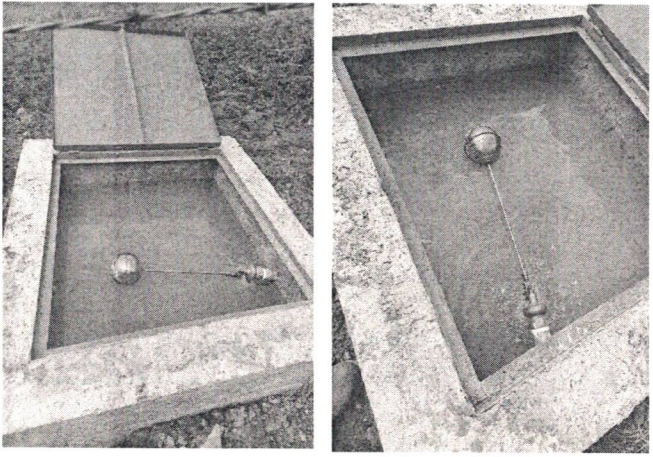
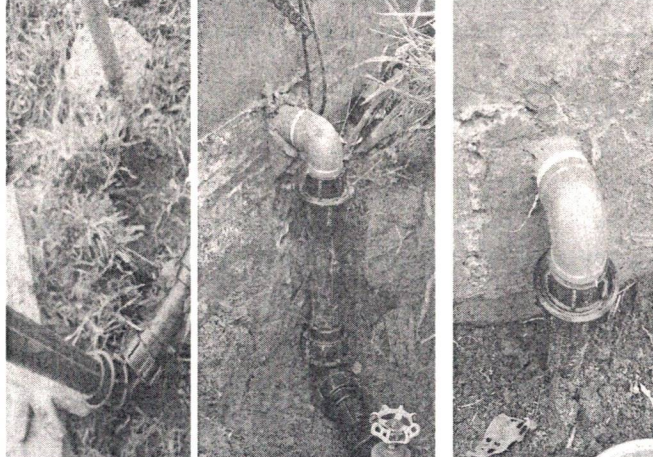
4,1	2.12.1 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	1,00	 
4,2	2.02.1 8	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	M2	4,00	 

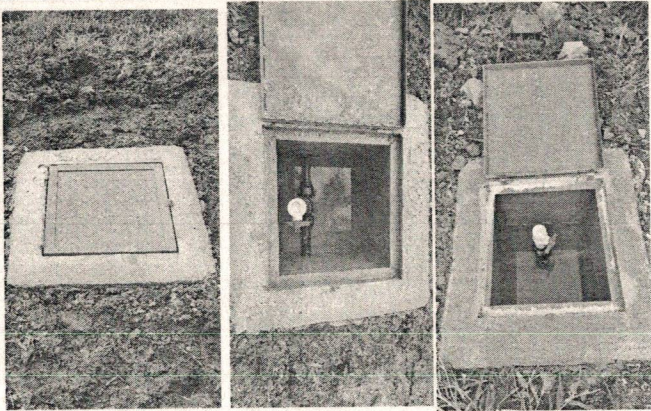
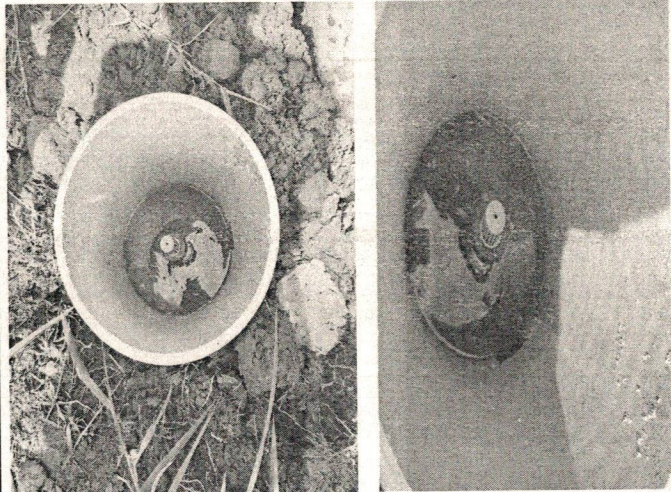
4,3	2.02.3 5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	35,86	
4,4	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1 1/2"	UND	1,00	
5		SECCIÓN 5: CAMARAS DE QUIEBRE DE PRESION.			

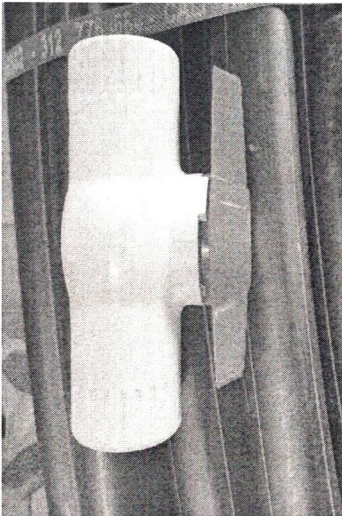
5,1	1,01,0 6	CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa. (4000 PSI)	M3	2,88	
5,2	2.02.3 5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	136,96	

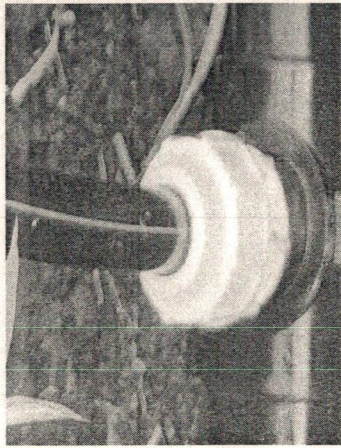
5,3	APU	TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1,1*1,1M	UND	3,00	 
5,4		PASAMUROS LISO BRIDA SALIDA	UND	3,00	 

5,5		PASAMUROS A 90 GRADOS BRIDA CON ENTRADA FLOTADOR	UND	3,00	
5,6		VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" BRIDA	UND	3,00	

5,7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1 1/2"	UND	3,00	
5,8		CODO DE 90 RAPIDO 50MM	UND	3,00	
6		SECCIÓN 6: CAJAS DE 60*60 VALVULA DE LAVADO			


6,1		CAJAS DE 60*60 VALVULA DE LAVADO, INCLUYE TAPA LAMINA	UND	3,00	
7		SECCIÓN 7 : VALVULAS Y VENTOSAS, ACCESORIOS			
7,1	2,14,3 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DE 3/4"	UND	6,00	

7,2	APU	VALVULAS DE LAVADO PVC DE 1 1/2"	UND	8,00	 
7,3	APU	COLLARIN DE DERIVACION DE 50MM- 1 1/2" A 1/2"	UND	24,00	 

7,4	APU	ADAPTADOR RAPIDO MACHO DE 50MM * 1/2"	UND	24,00	 
-----	-----	---------------------------------------	-----	-------	---




SEGUIMIENTO FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 245.742.144,00
Valor Adición 01:	
Valor Total del contrato:	\$ 245.738.559,00
Valor Anticipo:	\$ 98.296.857,60
Valor Sin ejecutar:	\$ 3.585,00
Valor a pagar presenta acta:	\$ 147.441.701,40

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL												
DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERÍODOS											Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	octubre	noviembre	
Salud											\$ 95.200,00	\$ 95.200
Pensión											\$ 551.500,00	\$ 551.500
Aportes ARL											\$ 264.800,00	\$ 264.800
CCF											\$ 138.000,00	\$ 138.000
PAICBF / PASENA												\$ 0
Valor pagado por periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 1.049.500,00	\$ 1.049.500

OBSERVACIONES	
ADJUNTA CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EXPEDIDA POR CONTRATISTA DEL MES DE NOVIEMBRE No.7994420989	
FIRMA:  VoBo NOMBRE: JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	

Documentos y folios Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.
----------------------------	--

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"										 NT-891-AC-1-2020 Páginas 1			
		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL													
		FECHA: 10/09/2024													
ACTA DE RECIBO FINAL															
CONTRATO:		MSE-SAMC-005-2025				DE FECHA:		13 DE OCTUBRE 2025				FECHA DE INICIACIÓN REAL		ACTA No.	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ										01 DE AGOSTO DE 2025		01-FINAL	
CONTRATISTA:		CYM INGENIEROS SAS										FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:		FECHA PRESENTE ACTA	
SUPERVISOR:		JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE													
		V. INICIAL				\$ 245.742.144,00		PLAZO:		TRES MESES Y MEDIO (3,5)		04 DE DICIEMBRE 2025			
		V. ADICIONAL				0,00		% EJECUTADO		100,00%		FECHA ACTA ANTERIOR			
		VALOR TOTAL				\$ 245.742.144,00		% TIEMPO		100,00%		N/A			
CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDAD FINAL EJECUTADA	
								ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE NUEVOS ÍTEMS N° 01							
No.	COD - GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	INCREMENTO + DISTANCIA	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
PRELIMINARES															
1	4.01.03	LCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	ML	4933,30		\$ 1.391,28	\$ 6.864.297,00	175,50		\$ 244.170,00	5109,30	\$ 7.108.467,00	5109,30	\$ 7.108.467,00	
SECCIÓN 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS															
2.1	2.01.71	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMGLOMERADO	M3	84,03		\$ 98.145,60	\$ 8.244.230,00		-73,76	\$ -7.239.219,00	10,24	\$ 1.005.011,00	10,24	\$ 1.005.011,00	
2.2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	399,94		\$ 70.566,30	\$ 28.222.286,00	124,03		\$ 8.752.538,00	523,97	\$ 36.974.824,00	523,97	\$ 36.974.824,00	
2.2.1	5.02.02	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANA. ES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	500,18		\$ 33.925,65	\$ 16.965.539,00	-29,92		\$ -1.015.055,00	470,16	\$ 15.950.484,00	470,16	\$ 15.950.484,00	
2.3	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	984,18		\$ 31.719,00	\$ 31.217.205,00		14,32	\$ 454.216,00	998,50	\$ 31.671.422,00	998,50	\$ 31.671.422,00	
SECCIÓN 3: TUBERÍAS															
3.1	APU	TUBERÍA PEAD 160 RDE 21 50MM.	ML	3267,00		\$ 18.888,43	\$ 61.709.154,00		-278,70	\$ -5.264.261,00	2988,30	\$ 56.444.893,00	2988,30	\$ 56.444.893,00	
3.2	APU	TUBERÍA PEAD RDE 24 60MM.		1666,00		\$ 7.999,31	\$ 13.326.850,00	455,00		\$ 3.639.686,00	2121,00	\$ 16.966.537,00	2121,00	\$ 16.966.537,00	
3.3	APU	BUE ROSCAIDO PVC 2" x 1 1/2" (ADAPTADOR DE TUBO PVC DE 2" A TUBERÍA PEAD 50MM.)	UND	1,00		\$ 38.746,93	\$ 38.747,00	0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 38.747,00	1,00	\$ 38.747,00	
SECCIÓN 4: TANQUE DE ALMACENAMIENTO															
4.1	2.12.169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	1,00	14%	\$ 5.154.584,89	\$ 5.876.227,00	0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 5.876.227,00	1,00	\$ 5.876.227,00	
4.2	2.02.18	LCSA MACIZA PARA CEMENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	M2	4,00	14%	\$ 164.456,42	\$ 749.921,00	0,00		\$ 0,00	4,00	\$ 749.921,00	4,00	\$ 749.921,00	
4.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRI DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	43,82	14%	\$ 7.664,98	\$ 382.903,00		-7,96	\$ -69.555,00	35,86	\$ 313.347,00	35,86	\$ 313.347,00	
4.4	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1 1/2"	UND	1,00		\$ 491.023,11	\$ 491.023,00	0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 491.023,00	1,00	\$ 491.023,00	
SECCIÓN 5: CÁMARAS DE QUEBRE DE PRESIÓN															
5.1	1.01.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa (4000 PSI)	M3	2,55	14%	\$ 543.191,00	\$ 1.869.756,00	0,33		\$ 245.268,00	2,88	\$ 2.115.024,00	2,88	\$ 2.115.024,00	
5.2	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRI DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	203,40	14%	\$ 7.664,98	\$ 1.777.325,00		-66,44	\$ -580.540,00	136,96	\$ 1.196.785,00	136,96	\$ 1.196.785,00	
5.3	APU	TAPA EN LAMINA ALFA, ØR 1.1" 1/4	UND	3,00		\$ 417.206,74	\$ 1.251.620,00	0,00		\$ 0,00	3,00	\$ 1.251.620,00	3,00	\$ 1.251.620,00	
5.4	APU	PASAMUROS ISO BRIDA SALIDA	UND	3,00		\$ 181.430,46	\$ 544.291,00	0,00		\$ 0,00	3,00	\$ 544.291,00	3,00	\$ 544.291,00	
5.5	APU	PASAMUROS A 90 GRADOS BRIDA CON ENTRADA FLOTADOR	UND	3,00		\$ 200.508,01	\$ 601.524,00	0,00		\$ 0,00	3,00	\$ 601.524,00	3,00	\$ 601.524,00	
5.6	APU	VÁLVULA C/PUERTA DE 1 1/2" BRIDA	UND	3,00		\$ 277.723,11	\$ 833.169,00	0,00		\$ 0,00	3,00	\$ 833.169,00	3,00	\$ 833.169,00	
5.7	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1 1/2"	UND	3,00		\$ 490.823,11	\$ 1.472.469,00	0,00		\$ 0,00	3,00	\$ 1.472.469,00	3,00	\$ 1.472.469,00	
5.8	APU	CODO DE 90 RAPIDO 50MM	UND	3,00		\$ 99.393,87	\$ 298.182,00	0,00		\$ 0,00	3,00	\$ 298.182,00	3,00	\$ 298.182,00	
SECCIÓN 6: CAJAS DE 60" VALVULA DE LAVADO															
6.1		CAJAS DE 60"60 VALVULA DE LAVADO, INCLUYE TAPA LAMINA	UND	4,00		\$ 597.776,53	\$ 2.391.106,00		-1,00	\$ -597.777,00	3,00	\$ 1.793.330,00	3,00	\$ 1.793.330,00	


CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDAD FINAL EJECUTADA																
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE NUEVOS ÍTEMS N° 01																												
No.	COD - GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	INCREMENTO * DISTANCIA	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR														
SECCION 6: VALVULAS Y VENTOSAS, ACCESORIOS																												
7.1	2.14.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA DE 3/4"	UND	4,00		\$ 113.893,87	\$ 455.575,00	2,00		\$ 227.738,00	6,00	\$ 683.163,00	6,00	\$ 683.363,00														
7.2	APU	VALVULAS DE LAVADO PVC DE 1 1/2"	UND	4,00		\$ 206.343,87	\$ 825.375,00	4,00		\$ 825.375,00	8,00	\$ 1.650.510,00	8,00	\$ 1.650.751,00														
7.3	APU	COLLARIN DE DERIVACION DE 50MM-1 1/2" A 1 1/2"	UND	21,00		\$ 63.173,87	\$ 1.326.651,00	5,00		\$ 189.522,00	24,00	\$ 1.516.730,00	24,00	\$ 1.516.173,00														
7.4	APU	ADAPTADOR RAPIDO MACHO DE 50MM A 1 1/2"	UND	21,00		\$ 61.761,56	\$ 1.296.993,00	5,00		\$ 185.285,00	24,00	\$ 1.482.277,00	24,00	\$ 1.482.277,00														
SUBTOTAL							\$ 189.032.418,00			-\$ 2.757,00		\$ 189.029.661,00		\$ 189.029.661,00														
A (25%)							\$ 47.258.105,00			-\$ 689,00		\$ 47.257.415,00		\$ 47.257.415,00														
I (2%)							\$ 3.780.648,00			-\$ 55,00		\$ 3.780.593,00		\$ 3.780.593,00														
U (3%)							\$ 5.670.973,00			-\$ 83,00		\$ 5.670.890,00		\$ 5.670.890,00														
TOTAL							\$ 245.742.144,00			-\$ 3.585,00		\$ 245.738.559,00		\$ 245.738.559,00														
<table><tr><td>VALOR CONTRATO</td><td>\$ 245.742.144,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIONAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 245.742.144,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA</td><td>\$ 245.738.559,00</td></tr><tr><td>VALOR SIN EJECUTAR</td><td>\$ 3.585,00</td></tr><tr><td>VALOR ANTICIPO (40%)</td><td>\$ 98.296.857,40</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$ 147.441.701,40</td></tr></table>															VALOR CONTRATO	\$ 245.742.144,00	VALOR ADICIONAL	\$ -	VALOR TOTAL	\$ 245.742.144,00	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 245.738.559,00	VALOR SIN EJECUTAR	\$ 3.585,00	VALOR ANTICIPO (40%)	\$ 98.296.857,40	VALOR A PAGAR	\$ 147.441.701,40
VALOR CONTRATO	\$ 245.742.144,00																											
VALOR ADICIONAL	\$ -																											
VALOR TOTAL	\$ 245.742.144,00																											
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 245.738.559,00																											
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 3.585,00																											
VALOR ANTICIPO (40%)	\$ 98.296.857,40																											
VALOR A PAGAR	\$ 147.441.701,40																											
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE											\$ 245.738.559,00																	
 CARLOS HUMBERTO CAMPOS, R/L C/MI INGENIEROS SAS CONTRATISTA							 JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE SECRETARIA DE PLANEACION				 YELSON ALBEIRO ALFONSO GAITAN ALCALDE																	
ACTIVIDAD		NOMBRE SERV PUBL			CARGO																							
ELABORÓ		JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE			SECRETARIA DE PLANEACION																							
REVISÓ		YELSON ALBEIRO ALFONSO GAITAN			ALCALDE																							


ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

FECHA PRESENTE ACTA	DICIEMBRE 04 DE 2025		
CONTRATO	No. MSE-SAMC-006-2025	FECHA	31 DE JULIO DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ.		
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$245.742.144,00		
CONTRATISTA:	CYM INGENIEROS SAS		
NIT/CC	901801713-9		
SUPERVISOR/A:	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE		
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	45 DIAS		
ADICION N° 01	\$ 0,00		
PRORROGA N° 01	30 DIAS		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	75 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	4 DE DICIEMBRE DE 2025		

En la oficina de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio se reunieron: **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, Alcalde Municipal, **JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE**, secretaria de planeación, infraestructura y USPD, como **SUPERVISORA** delegada y **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ** Representante legal de **CYM INGENIEROS SAS** como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato		245.742.144,00
Anticipo 0		98.296.857,60
Valor total presente acta		147.441.701,40
Valor Amortizar del acta parcial 001		0,00
Saldo sin ejecutar		3.585,00
Saldo por pagar		147.441.701,40


JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE
SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y USPD
SUPERVISORA


CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ R-L CYM INGENIEROS SAS
CONTRATISTA


YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde Municipal

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	SECRETARIA DE PLANEACION	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

DICIEMBRE 15 DE 2025

CONTRATO

No. MSE-SAMC-006-2025

FECHA DE SUSCRIPCION:

31 DE JULIO DE 2025

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ.

VALOR INICIAL CONTRATADO

\$ 245,742,144

CONTRATISTA:

CY M INGENIEROS SAS

NIT/CC

901801713-9

SUPERVISOR:

JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE

FECHA DE ACTA DE INICIO

01 DE AGOSTO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

45 DIAS

ADICION N°1

\$ 0,00

PRORROGA N°1

30 DIAS

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN

75 días

FECHA DE TERMINACION INICIAL

4 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION REAL

4 DE DICIEMBRE DE 2025

En la oficina de la Secretaria de Planeacion, infraestructura y USPD del Municipio se reunieron: YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN, Alcalde municipal, JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE como SUPERVISORA delegada y CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ Representante legal de CYM INGENIEROS SAS como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion final del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo	-	\$ 98.296.857,60
		\$ -
Sumatoria de Pagos Parciales	-	\$ 98.296.857,60
VALOR TOTAL		\$ 98.296.857,60

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato		\$ 245.742.144,00
Valor adicional	-	\$ -
Valor anticipo		\$ 98.296.857,60
Valor acta final		\$ 147.441.701,40
Valor sin ejecutar		\$ 3.585,00
VALOR A PAGAR		\$ 147.441.701,40

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE.

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE
SUPERVISORCY M INGENIEROS SAS
CONTRATISTAYEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	SECRETARIA PLANEACION	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	
