



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6.0



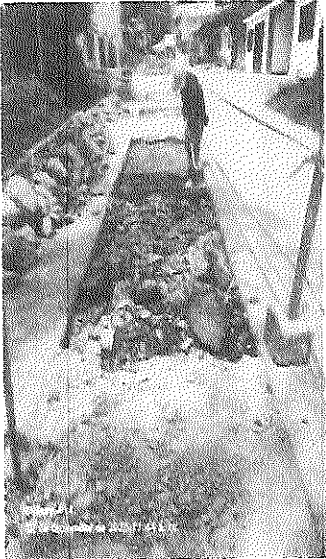
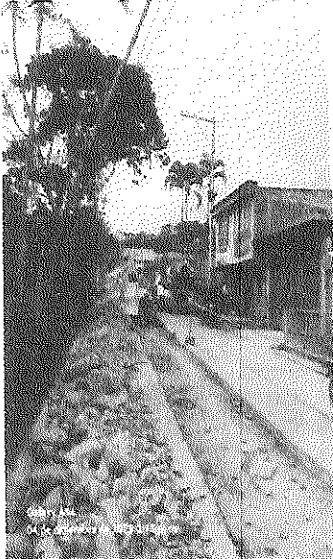
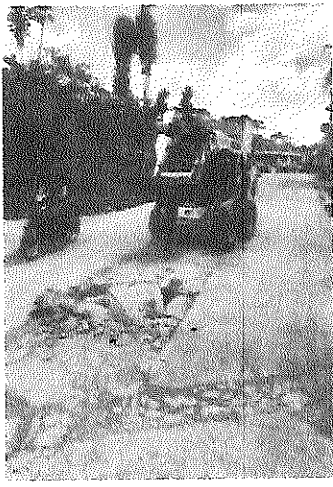
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.						OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION OBRAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I"											
						CONTRATISTA: YOALVETH LOZANO LOSADA					FECHA DE INICIACION:		04/11/2025		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		
						CONTRATO No. 142 DEL OCTUBRE 08 DE 2025					FECHA DE APROBACION DE POLIZA/		05/11/2025				
						VALOR: \$ 166.429.386,00					FVPC:		05/10/2026				
						ANTICIPO: \$ 66.571.754,40					FECHA DE TERMINACION:		03/02/2026		FECHA		
											PLAZO: TRES (03) MESES				12/12/2025		
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA							
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA					
						+/	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
L RED DE ACUEDUCTO																	
20	VIAS																
20.02	Demolicion de pavimento flexibe	M2	38,80	\$ 25.529,00	\$ 990.525,00												
20.04	Pavimento asfaltico (mescia en caliente) Mdc-2 Incluye colocación y compactado	M3	3,88	\$ 1.276.000,00	\$ 4.950.880,00												
20.06	Demolicion de pavimento rigido	M2	680,74	\$ 38.938,00	\$ 26.506.654,00				649,11	\$ 25.275.045,00			649,11	\$ 25.275.045,00			
20.07	Pavimento rigido 3000PSi ; incluye suministro, instalación y curado	M3	102,11	\$ 942.374,00	\$ 96.226.752,00				63,28	\$ 59.633.427,00			63,28	\$ 59.633.427,00			
SUB-TOTAL CAPITULO					\$ 128.674.811,00					\$ 84.908.472,00				\$ 84.908.472,00			
3	RELLENOS																
3.03	Relieno con recebo compactado, incluye suministro e instalación	M3	56,00	\$ 60.000,00	\$ 3.360.000,00				17,94	\$ 1.076.400,00			17,94	\$ 1.076.400,00			
3.04	Base triturada tamaño maximo 1 1/2"	M3	6	\$ 184.783,00	\$ 1.108.698,00												
3.05	Excavación manual en material comun o todo factor	M3	62	\$ 39.043,00	\$ 2.420.666,00												
3.06	Recolección, cargue, trasporte y bote de material sobrante	M3	167,99	\$ 30.000,00	\$ 5.039.730,00												
SUB-TOTAL CAPITULO					\$ 4.468.698,00					\$ 1.076.400,00				\$ 1.076.400,00			
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$ 133.143.509,00					\$ 85.984.872,00				\$ 85.984.872,00			
A. (17%)					\$ 22.634.397,00					\$ 14.617.428,00				\$ 14.617.428,00			
I. (3%)					\$ 3.994.305,00					\$ 2.579.546,00				\$ 2.579.546,00			
U. (5%)					\$ 6.657.175,00					\$ 4.299.244,00				\$ 4.299.244,00			
TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL					\$ 166.429.386,00					\$ 107.481.090,00				\$ 107.481.090,00			
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 40%										\$ 42.992.436,00				\$ 42.992.436,00			
TOTAL A PAGAR										\$ 64.488.654,00				\$ 64.488.654,00			

NOTA: La cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

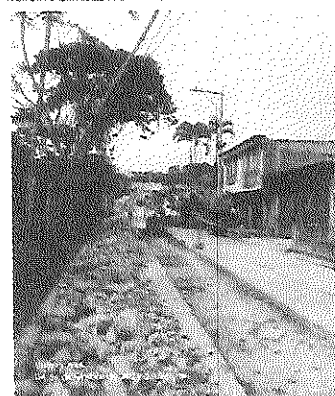
YOALVETH LOZANO LOSADA
CONTRATISTA DE OBRA

DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA
INTERVENTORA

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA:		YOALVETH LOZANO LOSADA		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN OBRAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I		
INTERVENTOR:		DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA					
NUMERO DE CONTRATO		142 DE 2025		ACTA:PARCIAL No. 01	Fecha:		12/12/2025
20,06		Demolicion de pavimento rigido					M2
   		LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	TOTAL EJECUTADO
				6,90	1,50		10,35
				17,20	1,50		25,80
				6,37	1,60		10,19
				2,30	1,65		3,80
				9,00	1,63		14,67
				46,60	1,50		69,90
		Domiciliaria		1,70	0,65		1,11
		Domiciliaria		2,97	1,60		4,75
				2,22	1,60		3,55
				27,90	1,55		43,25
				5,90	1,70		10,03
				2,50	1,05		2,63
		Domiciliaria		3,30	0,60		1,98
				9,10	1,30		11,83
				20,30	1,50		30,45
				2,10	1,50		3,15
				5,70	1,50		8,55
				9,00	1,50		13,50
				7,52	1,50		11,28
				7,60	1,52		11,55
		Domiciliaria		3,7	1,57		5,81
		Domiciliaria		3,23	1,79		5,78
				1,82	0,63		1,15
		Domiciliaria		2,8	1,53		4,28
		Domiciliaria		4,98	1,4		6,97
				2,8	1,78		4,98
		Domiciliaria		12,2	1,61		19,64
		Domiciliaria		20,71	1,7		35,21
		Domiciliaria		2,4	1,58		3,79
		Domiciliaria		1,03	1,54		1,59
		Domiciliaria		4,1	1,6		6,56
		22,52	1,5		33,78		
Domiciliaria		2,70	0,90		2,43		
Domiciliaria		1,40	0,60		0,64		
Domiciliaria		3,00	1,00		3,00		
		2,40	1,60		3,64		
		1,20	1,60		1,92		
Domiciliaria		2,60	0,70		1,82		
		4,00	2,30		9,20		
		22,90	1,70		38,93		
Domiciliaria		1,90	0,70		1,33		

Tramos ubicados por la carrera 6 entre calle 4 y salida a la vereda La Cabaña

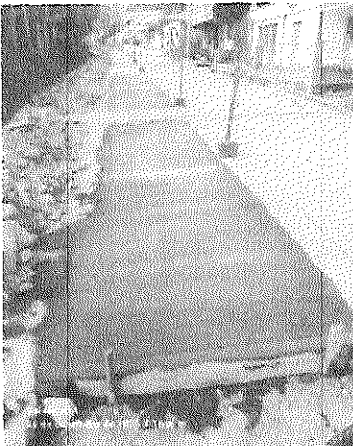
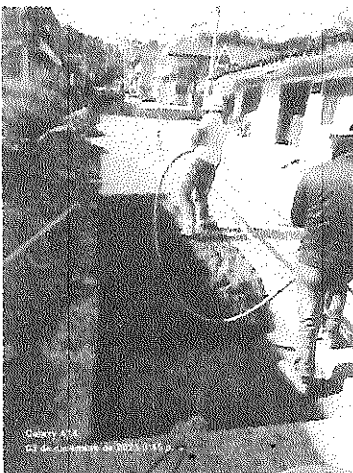



TOTAL	649,11
-------	--------

DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA
INTERVENTORA

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA:	YOALVETH LOZANO LOSADA	OBJETO:	CONSTRUCCION Y ADECUACION OBRAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
INTERVENTOR:	DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA		ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I
NÚMERO DE CONTRATO	142 DE 2025	ACTA: PARCIAL No. 01	Fecha: 12/12/2025

20,107	Pavimento rígido 3000PSI ; Incluye suministro, instalación y curado	M3			
					
					
LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	TOTAL EJECUTADO
Tramos ubicados por la carrera 6 entre calle 5B y salida a la vereda La Cabaña		6,90	1,50	0,15	1,55
		17,20	1,50	0,15	3,87
		6,37	1,60	0,15	1,53
		2,30	1,65	0,15	0,57
		9,00	1,63	0,15	2,20
		46,60	1,50	0,15	10,49
	Domiciliaria	1,70	0,65	0,15	0,17
	Domiciliaria	2,97	1,60	0,15	0,71
		2,22	1,60	0,15	0,53
		27,90	1,55	0,15	6,49
	Domiciliaria	5,90	1,70	0,15	1,50
		2,50	1,05	0,15	0,39
		3,30	0,60	0,15	0,30
		9,10	1,30	0,15	1,77
		20,30	1,50	0,15	4,57
		2,10	1,50	0,15	0,47
	Domiciliaria	5,70	1,50	0,15	1,28
		9,00	1,50	0,15	2,03
		7,52	1,50	0,15	1,69
		7,60	1,52	0,15	1,73
		3,70	1,57	0,15	0,87
		3,23	1,79	0,15	0,87
		1,82	0,63	0,15	0,17
		2,80	1,53	0,15	0,64
		4,98	1,40	0,15	1,05
		2,80	1,78	0,15	0,75
		12,20	1,61	0,15	2,95
		20,71	1,70	0,15	5,28
		2,40	1,58	0,15	0,57
		1,03	1,54	0,15	0,24
		4,10	1,60	0,15	0,98
		22,52	1,50	0,15	5,07
TOTAL					63,28


YOALVETH LOZANO LOSADA
 CONTRATISTA



DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA
 INTERVENTORA

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA:	YOALVETH LOZANO LOSADA	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN OBRAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I	
INTERVENTOR:	DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA			
NÚMERO DE CONTRATO	142 DE 2025	ACTA: PARCIAL No. 01	Fecha:	12/12/2025

3,03	Relleno con rebase compactado, incluye suministro e instalaci3n						M3
	LOCALIZACI3N	OBSERVACIONES	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	TOTAL EJECUTADO	
	Tramos ubicados por la carrera 6 entre calle 5B y salida a la vereda La Cabaña		2,40	0,80	0,60	1,15	
			2,60	0,70	1,30	2,37	
			7,50	0,60	0,30	1,35	
			4,20	1,00	0,30	1,26	
			8,00	1,50	0,10	1,20	
			9,00	1,65	0,08	1,19	
			2,30	1,65	0,15	0,57	
			20,30	1,50	0,10	3,05	
			17,20	1,50	0,05	1,29	
			27,90	1,60	0,04	1,79	
			45,60	1,50	0,04	2,74	
TOTAL						17,94	


YOALVETH LOZANO LOSADA
 CONTRATISTA


DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA
 INTERVENTORA
