

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	  
	INFORME DE OBRA	

CONTRATO DE OBRA No. 142 DE 2025

INFORME DE OBRA

FINAL

PARCIAL X

Nombre del Contratista:	YOALVETH LOZANO LOSADA C.C. 12.139.245	Contrato No:	142 DE 2025
		No de Convenio	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN OBRAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I."		Valor: Ciento sesenta y seis millones cuatrocientos veintinueve mil trescientos ochenta y seis pesos M/cte. (\$ 166.429.386,00) M/CTE Valor Anticipo: 40% Sesenta y seis millones quinientos setenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta centavos. M/cte. (\$ 66.571.754,40) Fecha Aprobación Póliza inicial: 14/10/2025 Fecha Aprobación Póliza acta de inicio: 05/11/2025 Fecha Aprobación Póliza acta suspensión reinicio: N/A FVCP: 05-10-2026	
Duración:	TRES (3) MESES	Municipio:	SALADOBLANCO – HUILA
Nombre del Interventor:	DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA C.C No. 26.579.000		
1. RESUMEN EJECUTIVO			
1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)			
El proyecto tiene como objetivo realizar la reposición de las placas de concreto que se deterioraron después de la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Salado Blanco. Las fallas observadas en la estructura vial corresponden a hundimientos, fisuras y desprendimientos ocasionados por excavaciones previas y falta de capacidad estructural posterior al relleno. El alcance del proyecto incluye todas las etapas necesarias para la reconstrucción integral de las placas afectadas: Demoliciones: • Demolición de pavimento flexible (38,8 m²). • Demolición de pavimento rígido (680,74 m²).			

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	INFORME DE OBRA	

Excavaciones y Transporte

- Excavación manual en material común (62 m³).
- Recolección y transporte del material hasta disposición final (167,991 m³).

Mejoramiento de la Estructura del Pavimento

- Relleno con recebo seleccionado y compactado (56 m³).
- Colocación de base granular triturada (6 m³).

Construcción de Pavimento

- Pavimento rígido en concreto 3.000 PSI (102,111 m³).
- Pavimento asfáltico MDC-2 en zonas puntuales (3,88 m³).

Estado y Avance del Proyecto

Según el Acta de Inicio:

- El proyecto ya inició formalmente el 4 de noviembre de 2025.
- El contratista recibió el anticipo del 40%, lo que permite ejecutar actividades iniciales sin retrasos.
- La entidad e interventoría validaron pólizas, personal y maquinaria.

A la fecha se han identificado las placas que serán demolidas, se ha realizado el proceso de demolición de las placas seleccionadas y ya se han iniciados las labores de excavaciones y rellenos cambiando los materiales que no cumplen para soporte de la placa a fundir; igualmente se ha empezado a restituir placas de concreto.

En desarrollo del proyecto se ha tratado y con la ayuda de empresas públicas de Saladoblanco, de mantener señalizada la obra, sin embargo, esta labor ha sido bien difícil de mantener teniendo en cuenta que los habitantes del sector retiran la señalización de su sitio o en ocasiones la tiran al piso y posteriormente es deteriorada por el paso de vehículos.

El flujo vehicular se ha tratado de mantener por un carril mientras se trabaja por el otro, la obra viene marchando de forma adecuada y en el mes de noviembre se viene con un avance de obra del 34.37%, estando en el avance normal de acuerdo con la programación entregada.

Para efectos del acta parcial que se esta cobrando el proyecto alcanza un avance del 64.6%.

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	  
	INFORME DE OBRA	

1.1.1 Estado de las pólizas – ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Póliza legalización del contrato. Anexo 0

Fecha de expedición: 14/10/2025

Fecha de Aprobación: 14/10/2025

No. póliza	amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
CHU-100059302	Cumplimiento	\$ 49.928.815,80	08/10/2025	08/09/2026
CHU-100059302	Buen manejo del anticipo	\$ 66.571.754,40	08/10/2025	08/09/2026
CHU-100059302	Prestaciones Sociales	\$ 33.285.877,20	08/10/2025	08/05/2029
CHU-100059302	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 49.928.815,80	08/05/2026	08/05/2031
CHU-100011198	Amparo básico. - Predios, Labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026
CHU-100011198	Patronal	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026
CHU-100011198	Contratistas y subcontratistas	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026
CHU-100011198	Vehículos propios y no propios	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026

ANEXO 1

Fecha de expedición: 05/11/2025

Fecha de Aprobación: COPIA CONTROLADA

No. póliza	amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Desde
CHU-100059302	Cumplimiento	\$ 49.928.815,80	08/10/2025	08/09/2026
CHU-100059302	Buen manejo del anticipo	\$ 66.571.754,40	08/10/2025	08/09/2026
CHU-100059302	Prestaciones Sociales	\$ 33.285.877,20	08/10/2025	08/05/2029
CHU-100059302	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 49.928.815,80	08/05/2026	08/05/2031
CHU-100011198	Amparo básico. - Predios, Labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	08/05/2025	08/05/2026
CHU-100011198	Patronal	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026
CHU-100011198	Contratistas y subcontratistas	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026
CHU-100011198	Vehículos propios y no propios	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026

ANEXO 2

Fecha de expedición: 05/11/2025

Fecha de Aprobación: 05/11/2025

No. póliza	amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Desde
CHU-100059302	Cumplimiento	\$ 49.928.815,80	04/11/2025	05/10/2026
CHU-100059302	Buen manejo del anticipo	\$ 66.571.754,40	04/11/2025	05/10/2026
CHU-100059302	Prestaciones Sociales	\$ 33.285.877,20	04/11/2025	04/06/2029
CHU-100059302	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 49.928.815,80	04/06/2026	04/06/2031
CHU-100011198	Amparo básico. - Predios, Labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	04/11/2025	08/06/2026
CHU-100011198	Patronal	\$ 284.700.000,00	04/11/2025	08/06/2026

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	  
	INFORME DE OBRA	

CHU-100011198	Amparo básico. - Predios, Labores y operaciones	\$	284.700.000,00	04/11/2025	08/06/2026
CHU-100011198	Patronal	\$	284.700.000,00	04/11/2025	08/06/2026
CHU-100011198	Contratistas y subcontratistas	\$	284.700.000,00	04/11/2025	08/06/2026
CHU-100011198	Vehículos propios y no propios	\$	284.700.000,00	04/11/2025	08/06/2026

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	04-11-2025			
Suspensión No. 1				
Reiniciación No.1				

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	1	04-11-2025 ✓
ACTA PARCIAL DE OBRA	1	12-12-2025 ✓

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto

La ejecución del proyecto se encontraba para el mes de noviembre en un avance del 34.37%, sin embargo para la fecha del acta parcial el avance alcanzo el 64.6%.

El valor inicial del proyecto es de ciento sesenta y seis millones cuatrocientos veintinueve mil trescientos ochenta y seis pesos (\$166.429.386,00) Mcte. Inicialmente se pagó un anticipo del 40% correspondiente a sesenta y seis millones quinientos setenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta centavos (\$66.571.754,40), Se esta proyectando con el avance que se tenga un acta parcial en el mes de diciembre, el acta parcial cobrada asciende al valor de ciento siete millones cuatrocientos ochenta y un mil noventa pesos M/CTE (\$107.481.090,00).

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

El proyecto a la fecha lleva un avance acorde con la programación presentada.

Se recomienda a la alcaldía municipal realizar mas controles en los tramos ya intervenidos, teniendo en cuenta que la comunidad se encarga de quitar la señalización y poner en uso un concreto que no lleva mas de 2 días de fundido.

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C. (Certification)
	INFORME DE OBRA	 ISO 14001 U.C. (Certification)

2. INFORME FINANCIERO

2.1. Estado Financiero del Contrato

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo (40%)	15-11-2025			\$ 66.571.754,40
PARCIAL No. 1	12-12-2025	\$ 107.481.090,0	\$ 42.992.436,0	\$ 64.488.654,00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 166.429.386,00	NA	\$ 166.429.386,00	\$ 107.481.090,0	\$ 58.948.296,00


2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Las personas que se encuentran laborando en obra son las siguientes:

1. Jorge Enrique Cediel Tovar ✓ *Hor. Residente.*
2. Sergio Andrés DUSSAN Revelo ✓ *Maestro y obrero.*
3. Mauricio Roa Baicue x
4. Jefferson Valderrama ✓
5. Yoalveth Lozano Losada ✓ *Director.*

El personal relacionado anteriormente se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con lo establecido en la Ley y la exigencia de la entidad contratante.

3. Registro Fotográfico

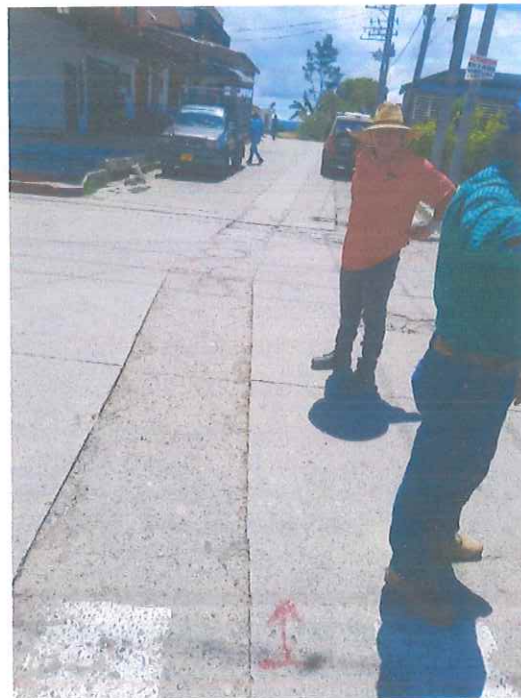

SELECCIÓN DE LOS TRAMOS QUE SERÁN RESTITUIDOS



TRAMOS A RESTITUIR



SELECCIÓN TRAMOS A RESTITUIR

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co



Neiva – Huila (Colombia).



CORTE DE FRONTERA PARA CONCRETO



DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO

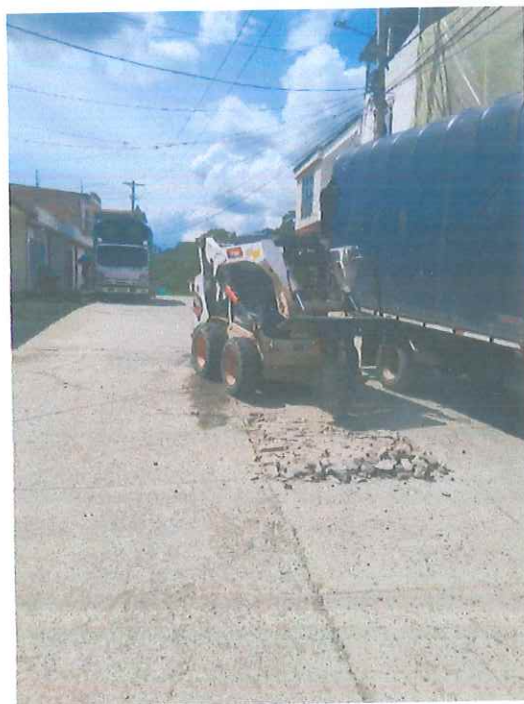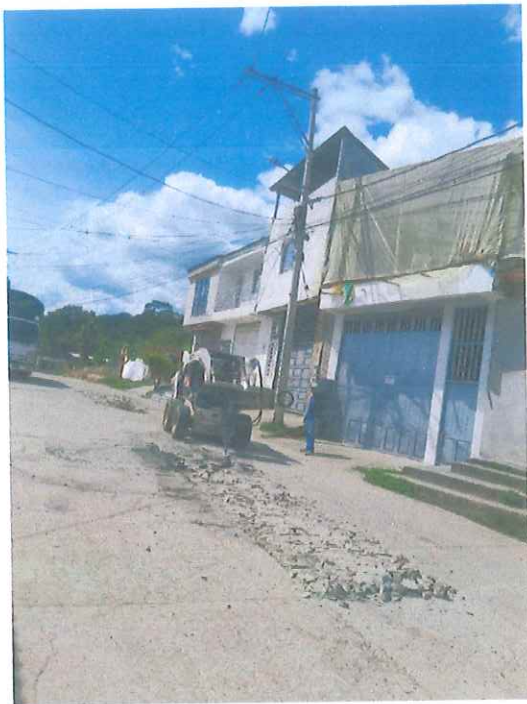

DEMOLICIÓN PLACAS DE CONCRETO



SEÑALIZACIÓN DE LOS TRAMOS DEMOLIDOS


...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

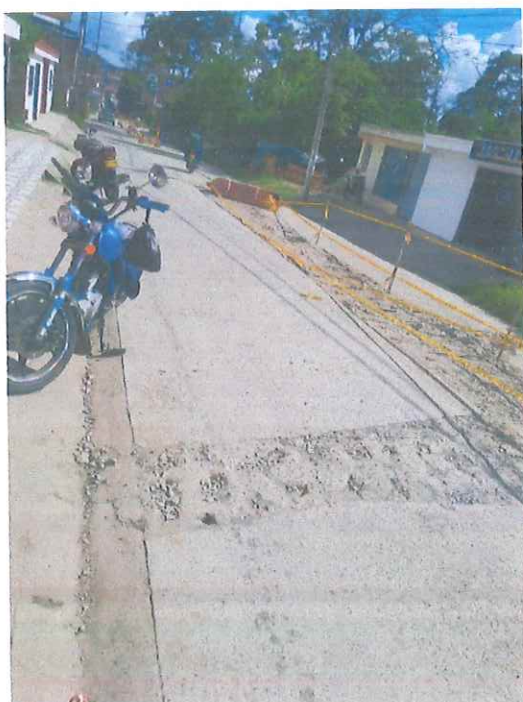

SEÑALIZACIÓN TRAMOS INTERVENIDOS



RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS BRECHAS

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS BRECHAS

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



RELLENOS CON RECEBO COMPACTADO


...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17


Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

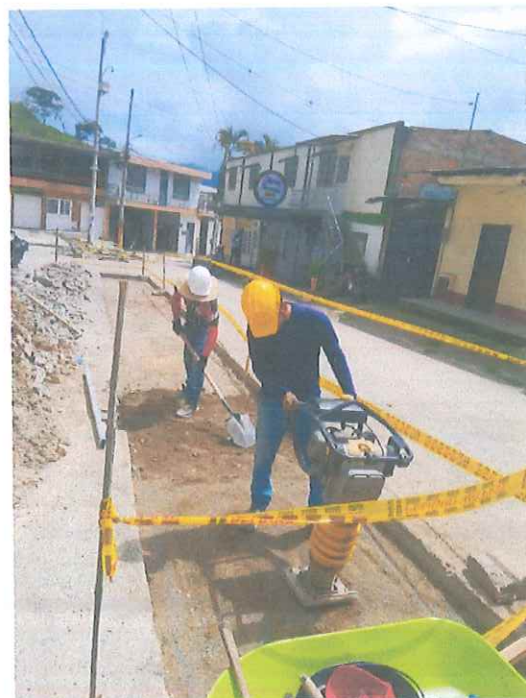

RELLENO CON RECEBO COMPACTADO

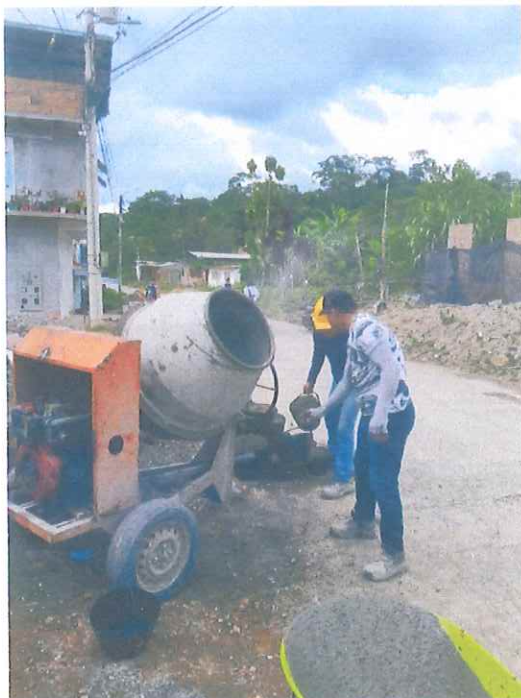

INSTALACIÓN Y VIBRADO DEL CONCRETO DE CONCRETO

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



ACABADOS DE LAS PLACAS Y APLICACIÓN DEL ANTISOL



INSTALACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO



INSTALACIÓN PLACAS DE CONCRETO Y APLICACIÓN ANTISOL


YOALVETH LOZANO LOSADA
CONTRATISTA

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 145 DE 2025

INFORME DE INTERVENTORIA **ACTA PARCIAL No. 01**

CONTRATO DE OBRA **No. 142 DE 2025**

CONTRATO DE OBRA No. 142 DE 2025

....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelaHuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia)

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 SYSTEMS CERTIFICATION  ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION  OHSAS 18001 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

INFORME DE INTERVENTORIA

☐

FINAL

☒

PARCIAL No 01

Periodo: Del 04 de Noviembre al 12 de Diciembre de 2025

Contrato de Interventoría No.	Contrato No.145 de 2025
Contratista:	
Identificación:	C.C. 26.579.000 de Tarqui – H.
Objeto:	Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OBRAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I"
Valor Inicial	Trece Millones Trescientos Catorce Mil Trescientos Cincuenta pesos (\$13.314.350,00) M/Cte.
Plazo	Trece (13) Meses
Anticipo (40%)	Cinco Millones Novecientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos (\$5.991.457,50) con Cincuenta Centavos M/Cte.
Contratista	Diana Margarita Segura Ochoa
Supervisor	Jaime Augusto Muñoz Ordóñez
Contratante	Aguas del Huila S.A. E.S.P
Fecha de Inicio	4 de noviembre de 2025
Fecha de Terminación	3 de diciembre de 2026
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 SYSTEMS CERTIFICATION  ISO 14001 ENVIRONMENTAL CERTIFICATION  OHSAS 18001 CERTIFICATION
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

**RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**

POLIZAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO – ANEXO No. 0				
Fecha de expedición: 17/10/2025			Fecha de Aprobación: 18/10/2025	
No. Pólizas	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
CHU-100059822	Cumplimiento del contrato	\$ 3.994.305,00	16/10/2025	16/05/2026
CHU-100059822	Buen Manejo del Anticipo	\$ 5.991.457,50	16/10/2025	16/05/2026
CHU-100059822	Prestaciones Sociales	\$ 2.662.870,00	16/10/2025	16/01/2029
CHU-100059822	Calidad del Servicio	\$ 3.994.305,00	16/01/2026	16/01/2031
CHU-100011281	Responsabilidad Extracontractual	\$ 284.700.000,00	16/10/2025	16/01/2026

POLIZAS CON BASE EN EL ACTA DE INICIO – ANEXO No. 1				
Fecha de expedición: 6/11/2025			Fecha de Aprobación: 06/11/2025	
No. Pólizas	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
CHU-100059822	Cumplimiento del contrato	-\$ 3.994.305,00	16/10/2025	16/05/2026
CHU-100059822	Buen Manejo del Anticipo	-\$ 5.991.457,50	16/10/2025	16/05/2026
CHU-100059822	Prestaciones Sociales	-\$ 2.662.870,00	16/10/2025	16/01/2029
CHU-100059822	Calidad del Servicio	-\$ 3.994.305,00	16/01/2026	16/01/2031
CHU-100011281	Responsabilidad Extracontractual	-\$ 284.700.000,00	16/10/2025	16/01/2026

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 SYSTEMS CERTIFICATION
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	 ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION
		 OHSAS 18001 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

POLIZAS CON BASE EN EL ACTA DE INICIO – ANEXO No. 2				
Fecha de expedición: 6/11/2025			Fecha de Aprobación: 06/11/2025	
No. Pólizas	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
CHU-100059822	Cumplimiento del contrato	\$ 3.994.305,00	4/11/2025	4/06/2026
CHU-100059822	Buen Manejo del Anticipo	\$ 5.991.457,50	4/11/2025	4/06/2026
CHU-100059822	Prestaciones Sociales	\$ 2.662.870,00	4/11/2025	4/02/2029
CHU-100059822	Calidad del Servicio	\$ 3.994.305,00	4/02/2031	4/02/2031
CHU-100011281	Responsabilidad Extracontractual	\$ 284.700.000,00	4/11/2025	4/02/2026

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista:	YOALVETH LOZANO LOSADA
Identificación:	C.C. 12.139.245
Contrato No.	142 de 2025
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN OBRAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I."
Valor Inicial:	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 166.429.386,00) M/CTE.
Valor Adicional:	N.A.
Valor Final:	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 166.429.386,00) M/CTE.
Fecha Aprobación Póliza:	05 de Noviembre de 2025
FVPC:	05 de Octubre de 2026

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

Duración:	TRES (03) MESES
Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Nombre del Supervisor del Contrato Aguas del Huila:	JAIME AUGUSTO MUÑOZ ORDOÑEZ
Anticipo (40%):	\$ 66.571.754,40
Fecha de Inicio:	04 de Noviembre de 2025
Fecha de Terminación:	03 de Febrero de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir).

A la fecha del corte del presente informe, 12 de diciembre de 2025, que comprende el periodo del 04 de Noviembre de 2025 al 12 de diciembre de 2025, la obra del contrato en mención, presenta un porcentaje de avance acumulado a la fecha del 64,58% del valor total del contrato, que corresponde a un valor de \$ 107.481.090,00

Las actividades contratadas para cumplir con el objeto del presente contrato son las siguientes:

I. RED DE ACUEDUCTO

20 VIAS			
20,02	Demolición de pavimento flexible	M2	38,80
20,04	Pavimento asfáltico (mezcla en caliente) Mdc-2 Incluye colocación y compactado	M3	3,88
20,06	Demolición de pavimento rígido	M2	680,74
20,07	Pavimento rígido 3000PSI; Incluye suministro, instalación y curado	M3	102,11
3 RELLENOS			
3,03	Relleno con recebo compactado, incluye suministro e instalación	M3	56,00
3,04	Base triturada tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformación y compactación c/0,10m)	M3	6
3,05	Excavación manual en material común o todo factor	M3	62
3,06	Recolección, cargue, transporte y bote de material sobrante	M3	167,99

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia)

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 Certified Management System
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	 ISO 14001 Certified Environmental Management System
		 OHSAS Certified Occupational Health and Safety Management System

Las actividades que se ejecutaron durante el presente periodo, son las que se describen a continuación:

VALOR CONTRATADO					\$ 166.429.386,00
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. RED DE ACUEDUCTO					
20	VIAS				
20,02	Demolición de pavimento flexible	M2		\$ 25.529,00	
20,04	Pavimento asfáltico (mezcla en caliente) Mdc-2 Incluye colocación y compactado	M3		\$ 1.276.000,00	
20,06	Demolición de pavimento rígido	M2	649,11	\$ 38.938,00	\$ 25.275.045,00
20,07	Pavimento rígido 3000 PSI; Incluye suministro, instalación y curado	M3	63,28	\$ 942.374,00	\$ 59.633.427,00
SUB-TOTAL CAPITULO					\$ 84.908.472,00
3	RELLENOS				
3,03	Relleno con recebo compactado, incluye suministro e instalación	M3	17,94	\$ 60.000,00	\$ 1.076.400,00
3,04	Base triturada tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformación y compactación c/0,10m)	M3		\$ 184.783,00	
3,05	Excavación manual en material común o todo factor	M3		\$ 39.043,00	
3,06	Recolección, cargue, transporte y bote de material sobrante	M3		\$ 30.000,00	
SUB-TOTAL CAPITULO					\$ 1.076.400,00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$ 85.984.872,00
A. (17%)					\$ 14.617.428,00
I. (3%)					\$ 2.579.546,00
U. (5%)					\$ 4.299.244,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL					\$ 107.481.090,00
AVANCE DE OBRA %					64,58%

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 ESTÁNDAR INTERNACIONAL  ISO 14001 ESTÁNDAR INTERNACIONAL  OHSAS 18001
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

Durante la visita inicial de Inspección, realizada con el Supervisor de aguas del Huila, se identificaron las secciones de las placas más deterioradas, las cuales se seleccionaron para hacer la reposición.

Durante lo que va corrido del plazo contractual, se ha ejecutado la demolición de las secciones de placas seleccionadas y se han ejecutado actividades de demolición y relleno.

De acuerdo con las condiciones del material encontrado en sitio, se han reemplazado los materiales que no cumplen con las condiciones técnicas requeridas para el soporte del pavimento rígido a construir.

De igual manera, se dio inicio a la restitución de placas en concreto de 3000 PSI conforme a las especificaciones del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto, el Contratista ha implementado medidas para suministrar y mantener la señalización adecuada en los sitios de trabajo. Sin embargo, su conservación ha resultado compleja, debido a la falta de respeto por parte de algunos habitantes del sector, quienes deliberadamente se detienen a retirar la señalización instalada y, en otros casos, transitan con los vehículos sobre la misma, ocasionando la ruptura y deterioro de los elementos que soportan las cintas de señalización.

Lo anterior se advierte debido a que algunos habitantes del sector hacen uso de determinados tramos de la obra que aún no han alcanzado la resistencia de diseño requerida, generando afectaciones sobre las áreas intervenidas y la señalización instalada.

Considerando la inexistencia de una vía alterna y la necesidad de mantener la circulación vehicular en ambos sentidos, la ejecución de las actividades se ha planificado y desarrollado de manera que se preserve habilitada la mayor sección posible de la calzada, disponiendo el material sobrante de obra al costado del andén. En consecuencia, se ha garantizado la operación del tránsito mediante un esquema de circulación alternada por un carril, permitiendo la intervención progresiva de la vía.

Bajo estas condiciones, el proyecto se está desarrollando y con corte al 12 de diciembre, registra un avance físico del orden del 64.58 %, que, comparado con el avance de obra programado, 54,64 % Presenta un avance significativo del 9,94% respecto a la programación presentada, con lo cual se concluye que el Contratista de Obra está avanzando de manera satisfactoria y se prevé que puede alcanzar el objetivo del contrato dentro del plazo contractual.

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

1.1.1 Estado de las pólizas				
POLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO – ENDOSO No. 0				
Fecha de expedición: 14/10/2025			Fecha de Aprobación: 14/10/2025	
No. Pólizas	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
CHU-100059302	Cumplimiento del contrato	\$ 49.928.815,80	08/10/2025	08/09/2026
CHU-100059302	Buen Manejo del Anticipo	\$ 66.571.754,40	08/10/2025	08/09/2026
CHU-100059302	Salarios y prestaciones sociales	\$ 33.285.877,20	08/10/2025	08/05/2029
CHU-100059302	Estabilidad de la obra	\$ 49.928.815,80	08/05/2026	08/05/2031
CHU-100011198	Responsabilidad civil, predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026

POLIZAS ACTA DE INICIO – ENDOSO No. 1				
Fecha de expedición: 05/11/2025			Fecha de Aprobación: 05/11/2025	
No. Pólizas	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
CHU-100059302	Cumplimiento del contrato	\$ 49.928.815,80	08/10/2025	08/09/2026
CHU-100059302	Buen Manejo del Anticipo	\$ 66.571.754,40	08/10/2025	08/09/2026
CHU-100059302	Salarios y prestaciones sociales	\$ 33.285.877,20	08/10/2025	08/05/2029
CHU-100059302	Estabilidad de la obra	\$ 49.928.815,80	08/10/2025	08/05/2031
CHU-100011198	Responsabilidad civil, predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	08/10/2025	08/05/2026

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 certified  ISO 14001 certified  OHSAS 18001
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

POLIZA OTRO SÍ No. 1 – ENDOSO No. 2				
Fecha de expedición: 05/11/2025			Fecha de Aprobación: 05/11/2025	
No. Pólizas	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
CHU-100059302	Cumplimiento del contrato	\$ 49.928.815,80	04/11/2025	05/10/2026
CHU-100059302	Buen Manejo del Anticipo	\$ 66.571.754,40	04/11/2025	05/10/2026
CHU-100059302	Salarios y prestaciones sociales	\$ 33.285.877,20	04/11/2025	04/06/2029
CHU-100059302	Estabilidad de la obra	\$ 49.928.815,80	04/06/2025	04/06/2031
CHU-100011198	Responsabilidad civil, predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	04/11/2025	08/06/2026

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto				
Historial Cronológico del Proyecto				
ACTIVIDAD	FECHA	DIAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DIAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Acta de inicio	04/11/2025	39		03/02/2026
ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas demodificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)				
Tipo de acta	No	Fecha		
Acta de inicio		04/11/2025		

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 EST. 15.000.000.000.000  ISO 14001 EST. 15.000.000.000.000  OHSAS EST. 15.000.000.000.000
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir) OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.....	\$ 166.429.386,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO.....	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.....	\$ 166.429.386,00
VALOR DEL ANTICIPO.....	\$ 66.571.754,40
PORCENTAJE DE ANTICIPO.....	40%

AVANCE FISICO REAL:

Avance Físico Mensual..... 30,21 %

Avance Físico Acumulado..... 64,58 %

AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

De acuerdo a la programación inicialmente presentada, el avance físico a la fecha debería ser del 54,64 %, de acuerdo a esto, el contratista presenta un adelanto en la ejecución, respecto a la programación del 9,94% en la ejecución de las actividades.

PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA

La obra presenta un adelanto en la ejecución del 9,94% según el cronograma de obra presentado.

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total Transcurrido 39 días

Avance Porcentual según plazo inicial..... 43,33%

AVANCE FINANCIERO

Inversión contratada..... \$ 166.429.386,00

Inversión Ejecutada en el Periodo..... \$ 107.481.090,00

Porcentaje Ejecutado en el Periodo..... 64,58 %

Inversión Total Ejecutada..... \$ 107.481.090,00

Porcentaje Total Ejecutado..... 64,58 %

El presente informe, corresponde al período del Acta Parcial No. 01. Durante este período se ejecutaron obras por valor de \$ 107.481.090,00 que corresponde al 64,58% del valor total del contrato.

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C. (Certification)
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	 ISO 14001 U.C. (Certification)
		 OHSAS U.C. (Certification)

El contrato cuenta con modalidad anticipo del 40% del contrato, que un valor de \$ 66.571.754,40 de los recursos que se han destinado a la ejecución de esta obra, de acuerdo con el plan de inversión de anticipo, presentado y aprobado por la interventoría.

A continuación, se muestra la relación de Actas Parciales del Contrato No. 142 de 2025

VALOR TOTAL CONTRATO No. 162 de 2023	\$ 166.429.386,00
VALOR TOTAL ANTICIPO 40%	\$ 66.571.754,40
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00

VALOR TOTAL CONTRATO No. 142 de 2025	\$ 166.429.386,00
--------------------------------------	-------------------

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA	VALOR FACTURADO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	(%)
1	PARCIAL No. 01	12/11/2025	\$ 107.481.090,00	\$ 42.992.436,00	\$64.488.654,00	64,58%
TOTAL			\$ 107.481.090,00	\$ 42.992.436,00	\$64.488.654,00	64,58%

NOTA: Porcentajes calculados respecto al valor total contratado.

En el período informado se generó el Acta Parcial de Obra No. 01

En la siguiente tabla y grafica correspondiente, se observa el *Valor Programado vs Valor Ejecutado* del período informado.

MES	SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO
NOVIEMBRE	SEMANA 1	\$ 8.283.330,00	\$ 8.600.000,00
	SEMANA 2	\$ 23.843.760,00	\$ 21.000.300,00
	SEMANA 3	\$ 23.843.760,00	\$ 27.599.552,00
DICIEMBRE	SEMANA 4	\$ 23.843.760,00	\$ 30.000.000,00
	SEMANA 5	\$ 11.114.592,86	\$ 20.281.238,00

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 EST. 10.000.000.000.000
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	 ISO 14001 EST. 10.000.000.000.000
		 OHSAS EST. 10.000.000.000.000

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

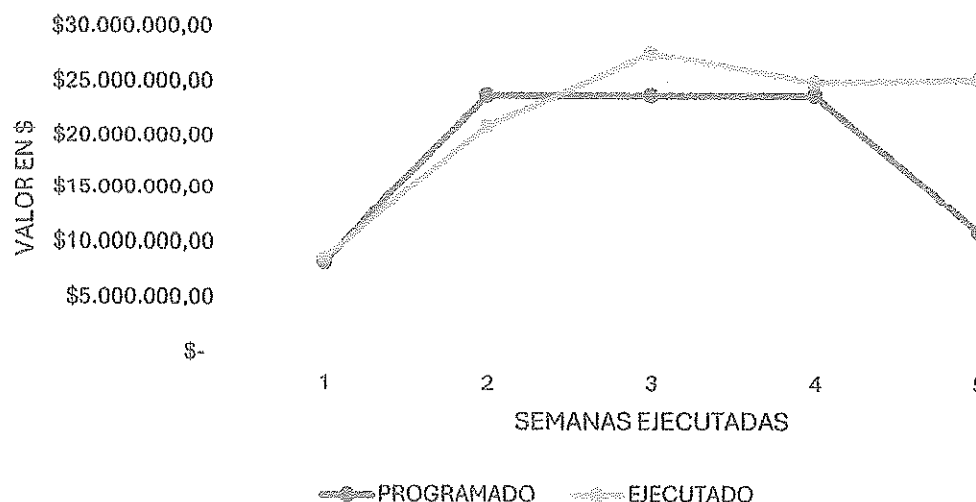


TABLA DE EJECUCION ACTA PARCIAL No. 01

VALOR CONTRATADO					\$ 166.429.386,00
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. RED DE ACUEDUCTO					
20	VIAS				
20,02	Demolición de pavimento flexible	M2		\$ 25.529,00	
20,04	Pavimento asfaltico (mezcla en caliente) Mdc-2 Incluye colocación y compactado	M3		\$ 1.276.000,00	
20,06	Demolición de pavimento rígido	M2	649,11	\$ 38.938,00	\$ 25.275.045,00
20,07	Pavimento rígido 3000 PSI; Incluye suministro, instalación y curado	M3	63,28	\$ 942.374,00	\$ 59.633.427,00
	SUB-TOTAL CAPITULO				\$ 84.908.472,00

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 1994, 2000, 2008
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	 ISO 14001 1996, 2004
		 OHSAS 18001

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3	RELLENOS				
3,03	Relleno con recebo compactado, incluye suministro e instalación	M3	17,94	\$ 60.000,00	\$ 1.076.400,00
3,04	Base triturada tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformación y compactación c/0,10m)	M3		\$ 184.783,00	
3,05	Excavación manual en material común o todo factor	M3		\$ 39.043,00	
3,06	Recolección, cargue, transporte y bote de material sobrante	M3		\$ 30.000,00	
	SUB-TOTAL CAPITULO				\$ 1.076.400,00
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				\$ 85.984.872,00
	A. (17%)				\$ 14.617.428,00
	I. (3%)				\$ 2.579.546,00
	U. (5%)				\$ 4.299.244,00
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL				\$ 107.481.090,00
	AVANCE DE OBRA %				64,58%

1.3.1. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir) INTERVENTORIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.....	\$ 13.314.350,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO.....	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.....	\$ 13.314.350,00
VALOR DEL ANTICIPO.....	\$ 5.991.457,50
PORCENTAJE DE ANTICIPO.....	45%

AVANCE FISICO REAL

Avance Físico Mensual.....	30,21%
Avance Físico Acumulado.....	64,58%

AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total Transcurrido 39 días
Avance Porcentual según plazo inicial..... 43,33%

AVANCE FINANCIERO

Inversión contratada..... \$ 13.314.350,00
Inversión Ejecutada en el Periodo..... \$ 8.598.407,23

Porcentaje Ejecutado en el Periodo..... 64,58%
Inversión Total Ejecutada..... \$ 8.598.407,23

Porcentaje Total Ejecutado..... 64,58%

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

- A la fecha del corte del presente informe, se ha ejecutado el 64,58% correspondiente a la suma de \$ 107.481.090,00 respecto al valor total contratado para la ejecución de las obras.
- Han transcurrido 39 días del plazo contractual, es decir se ha ejecutado el 43,33% del plazo.
- Durante el presente período se ha generado el acta parcial de obra No. 01
- Durante el presente período no se han efectuado modificaciones de obra
- El contrato registra un avance físico del orden del 64,58%, que, comparado con el avance de obra programado, 54,64 % Presenta un avance significativo del 9,94% respecto a la programación presentada, con lo cual se concluye que el Contratista de Obra está avanzando de manera satisfactoria y se prevé que puede alcanzar el objetivo del contrato dentro del plazo contractual.

1.5. Estado Básico del Cronograma

El cronograma de obra entregado por el contratista cumple con los requerimientos de la entidad contratante, el cual permitirá realizar un buen seguimiento durante el desarrollo de la obra.

El % de avance programado es de 54,64 % = \$ 90.929.202,86
El % de avance ejecutado es de 64,58% = \$ 107.481.090,00

No presenta atraso en la ejecución de las actividades.

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

2. INFORME BASICO				
2.1. Estado Financiero del Contrato <u>DE OBRA</u>				
Relación de Pago (Anticipo y/oActa de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor	Amortización	Valor pagado
Anticipo (40%)	14/11/2025	\$66.571.754,40	\$ 0,00	\$ 66.571.754,40
ACTA PARCIAL No. 01	12/12/2025	\$107.481.090,00	\$ 42.992.436,00	\$ 64.488.654,00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor total Contratado	Valor Facturado	Valor No Facturado
\$ 166.429.386,00	\$ 0,00	\$ 166.429.386,00	\$107.481.090,00	\$ 58.948.296,00
2.1.1. Estado Financiero del Contrato <u>DE INTERVENTORIA</u>				
Relación de Pago (Anticipo y/oActa de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor	Amortización	Valor pagado
Anticipo (45%)	14/11/2025	\$ 5.991.457,50	\$ 0,00	\$ 5.991.457,50
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor total Contratado	Valor Facturado	Valor No Facturado
\$ 13.314.350,00	\$ 0,00	\$ 13.314.350,00		\$ 13.314.350,00
2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista				
EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA				
Nombre y Apellido		Numero de Cedula	Cargo	
Yoalveth Lozano Losada		12.139.245	Director de Obra ✓	
Jorge Enrique Cediel Tovar		12.136.262	Residente ✓	
Sergio Andrés Dussan Revelo		1.080.295.861	Maestro de Obra ✓	
Mauricio Roa Baicue		1.080.294.332	Ayudante de Obra ✓	
Jeferson Valderrama Ome		1.080.294.251	Ayudante de Obra ✓	

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 by the International Organization for Standardization  ISO 14001 by the International Organization for Standardization  OHSAS 18001 by the Occupational Safety and Health Association
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

Equipo:

Una (1) Volqueta.

Una (1) Mezcladora de concreto.

Un (1) Compactador tipo Canguro.

2.3. Personal y equipo empleado por el interventor
Personal:

Ingeniero Director: Diana Margarita Segura Ochoa

Ingeniero residente: Yamile Artunduaga Rivera

Personal de Apoyo:

Auxiliar de Ingeniería: Norma Constanza Osorio Rangel

3. ASPECTOS TECNICOS
3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

Durante el presente período no se han efectuado modificaciones en obra

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Durante la ejecución del proyecto, el Contratista ha implementado medidas para suministrar y mantener la señalización adecuada en los sitios de trabajo. Sin embargo, su conservación ha resultado compleja, debido a la falta de respeto por parte de algunos habitantes del sector, quienes deliberadamente se detienen a retirar la señalización instalada y, en otros casos, transitan con los vehículos sobre la misma, ocasionando la ruptura y deterioro de los elementos que soportan las cintas de señalización.

Lo anterior se advierte debido a que algunos habitantes del sector hacen uso de determinados tramos de la obra que aún no han alcanzado la resistencia de diseño requerida, generando afectaciones sobre las áreas intervenidas y la señalización instalada.

Sin embargo, se ha cumplido con las metas trazadas y con el cronograma de obra.

De acuerdo con el avance presentado, se prevé que el objeto contractual se podrá culminar al 100% en su ejecución, dentro del plazo contractual.

3.3. Problemas y Soluciones Adoptadas

El contratista ha cumplido con todas las especificaciones técnicas requeridas por el pliego de condiciones.

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdellhulla.gov.co

Neiva – Huila (Colombia)

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 2015
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	 ISO 14001 2015
		 OHSAS 18001

4. CONTROL DE CALIDAD		
4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio		
Se anexan los resultados de laboratorio de las pruebas tomadas en sitio.		
4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio		
N/A		
4.3. Comentarios y Conclusiones		
N/A		
4.4. Comité de Obra		
Fecha de realización	Resultado del comité (Descripción)	Resultados del comité
30/10/2025	Socialización del proyecto y conformación de veeduría	Conformación de veeduría
15/11/2025	Avance y Ejecución de las Obras.	Se realiza seguimiento a la ejecución del contrato. Se expone la necesidad de utilizar un aditivo acelerante para el concreto y antisol para el curado. Se establece el compromiso por parte del Contratista de mejorar la señalización
30/02/2025	Avance y Ejecución de las Obras.	Se realiza seguimiento a la ejecución del contrato. El Contratista expone inconvenientes con la comunidad que no respeta la señalización.
5. INFORME AMBIENTAL		
5.1. Identificación de situaciones Ambientales		
No se realizaron actividades que causaran daños a la parte ambiental.		
5.2. Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros		
No se han generado daños ni perjuicios a terceros.		
5.3. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo		
N/A		

$$1/k, \mathcal{C}^{\infty} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \mathcal{C}^{\infty} = \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$$



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE INTERVENTORIA
VERSION:7.0



ISO 9001








ISO 14001



OHSAS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

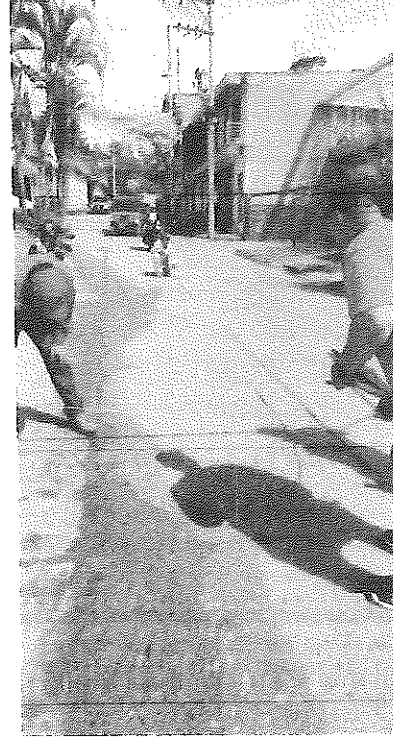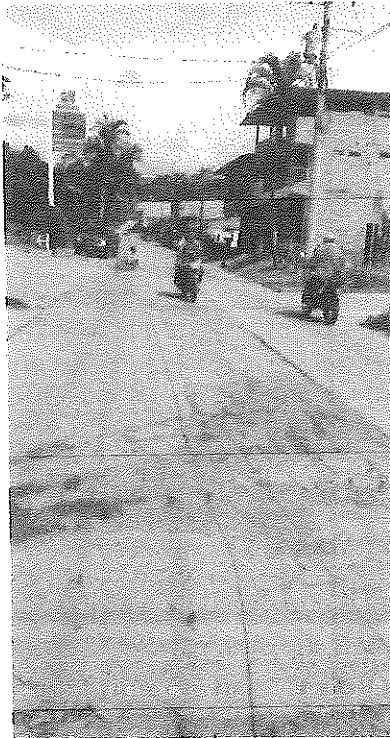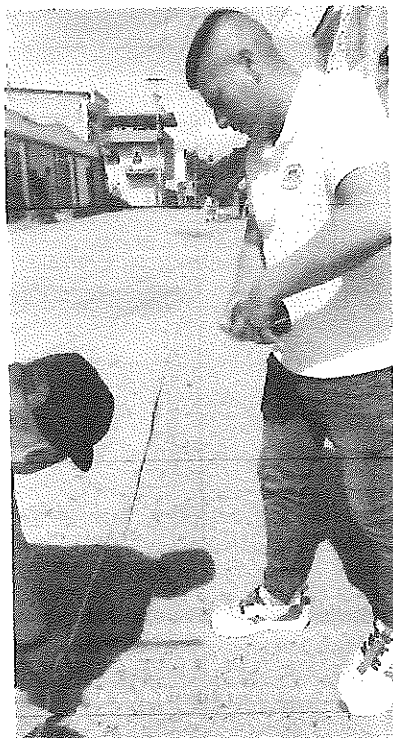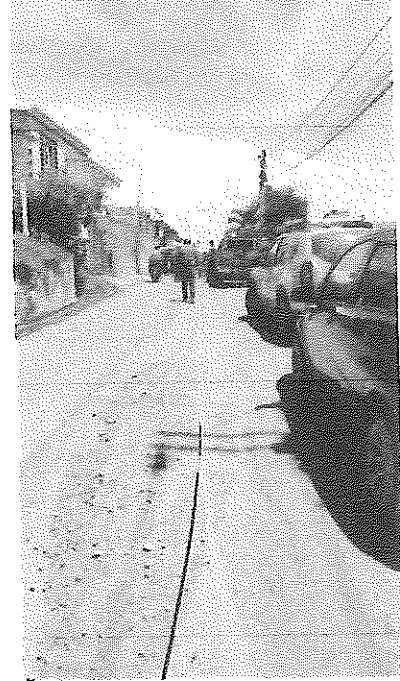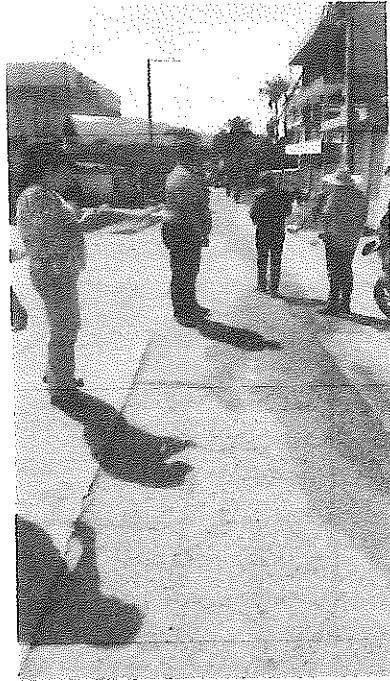

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia)



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE INTERVENTORIA
VERSION:7.0






ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad



ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental



OHSAS
18001
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

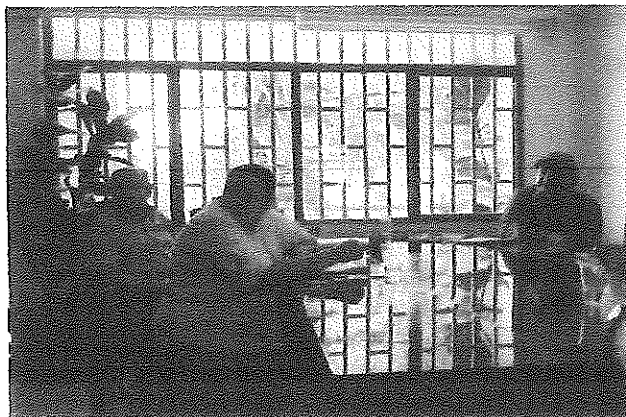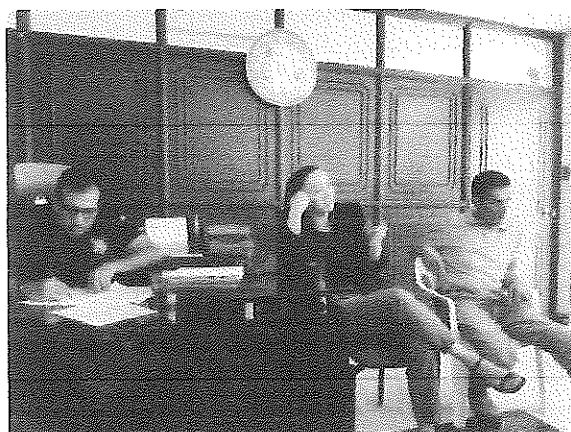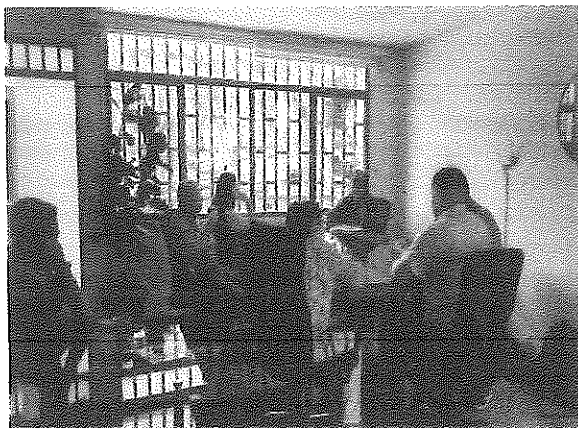

SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE VEEDURIA

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia)



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE INTERVENTORIA
VERSION:7.0







ISO 9001



ISO 14001



OHSAS

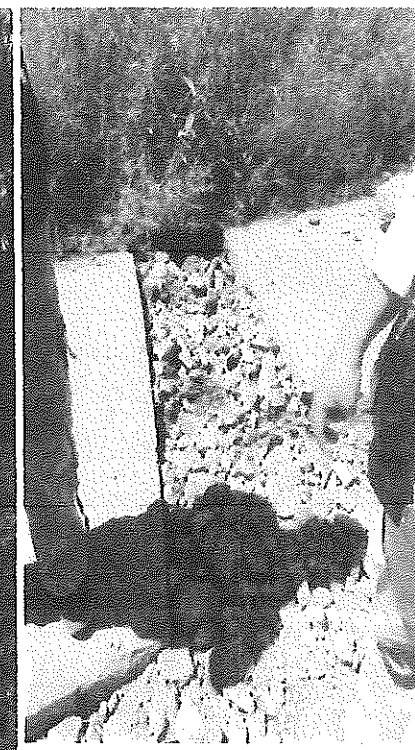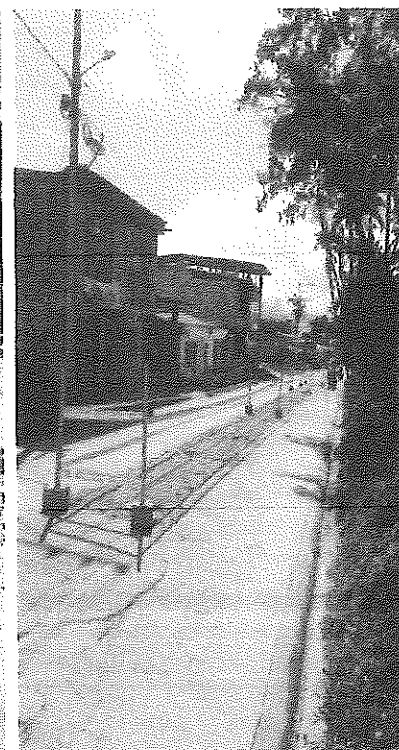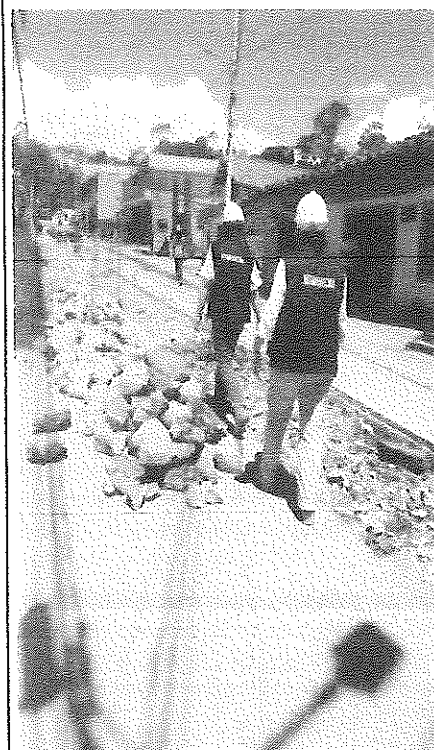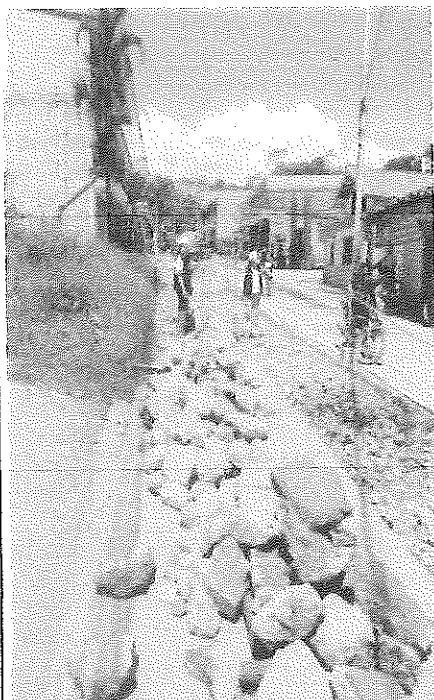

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia)



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE INTERVENTORIA
VERSION:7.0






ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



ISO 14001
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



OHSAS 18001
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

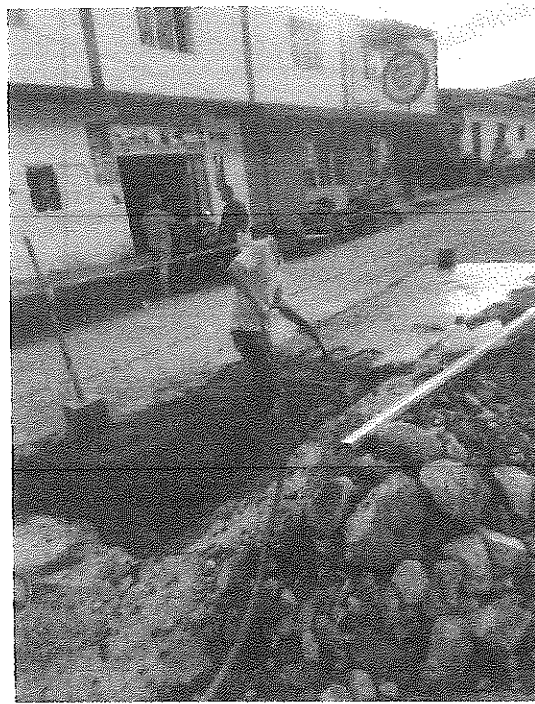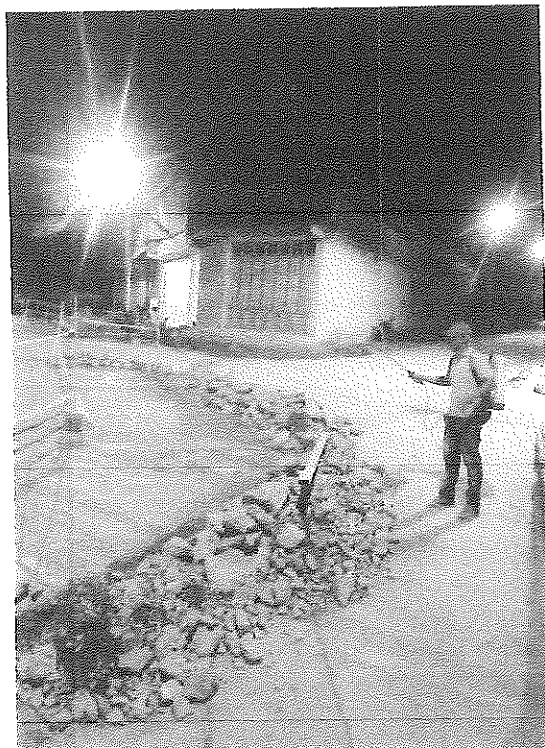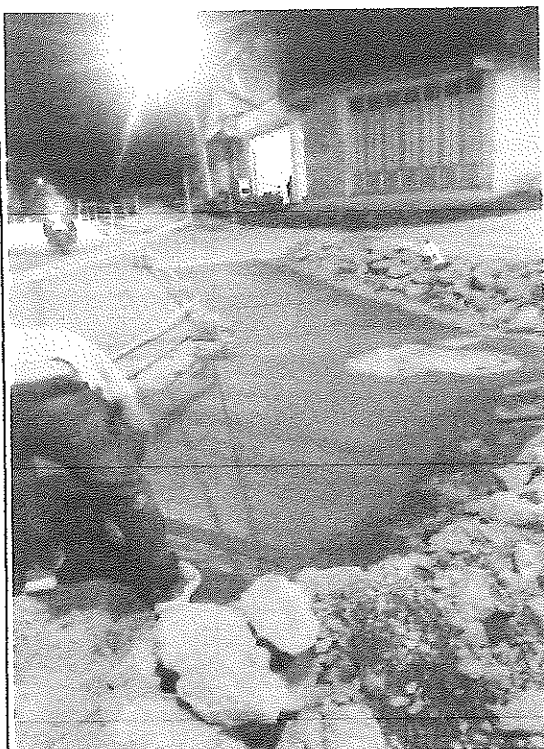

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Nelva – Huila (Colombia)



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE INTERVENTORIA
VERSION:7.0



ISO 9001

ESTRATEGIA DE CALIDAD






ISO 14001

MANEJO DEL AMBIENTE



OHSAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

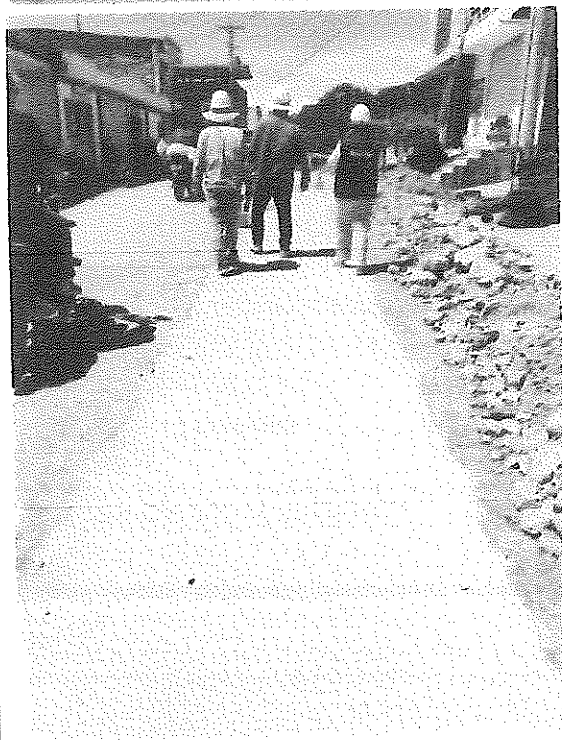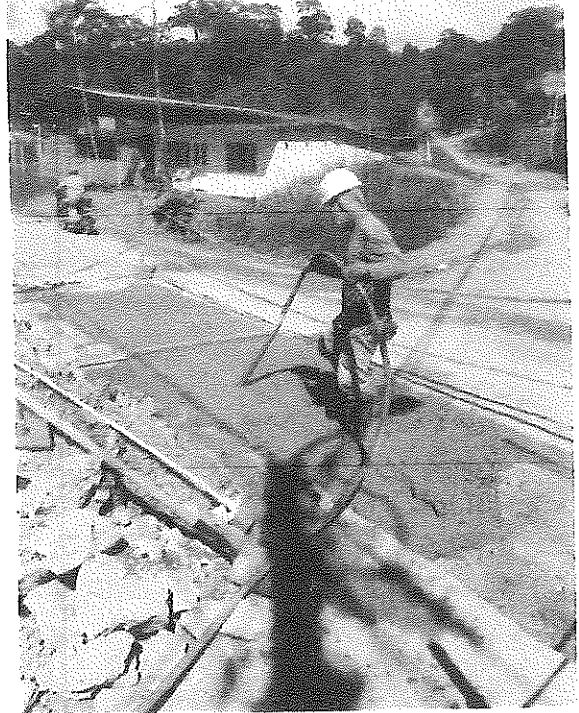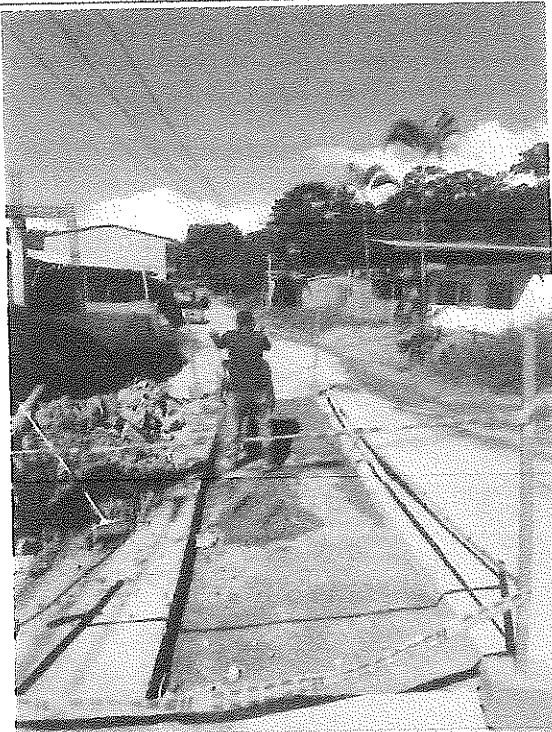

PAVIMENTO RIGIDO DE 3000 PSI

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia)



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE INTERVENTORIA
VERSION:7.0





ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad



ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental



OHSAS
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

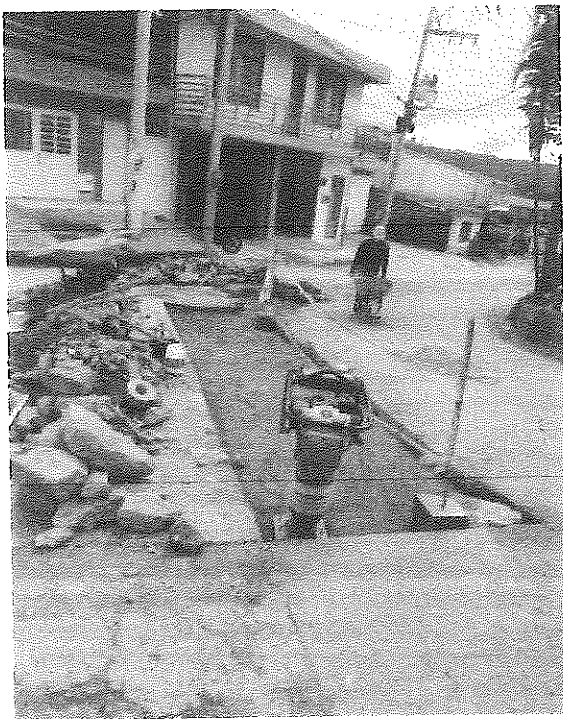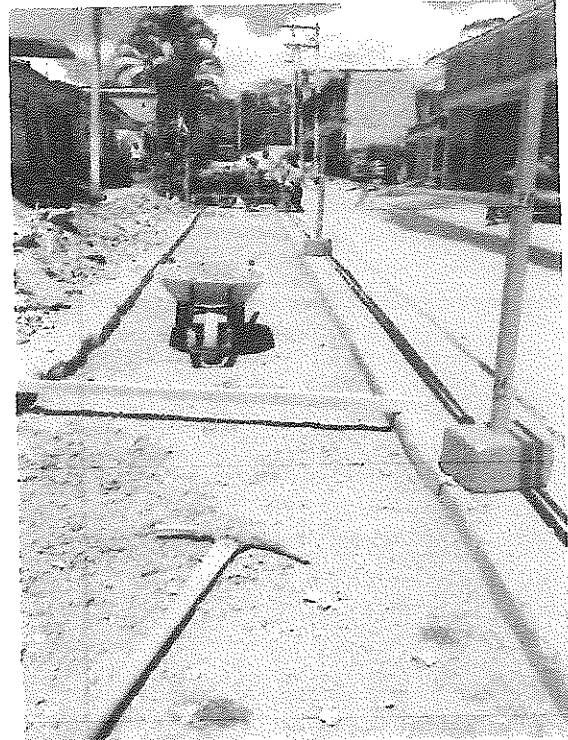

RELLENO CON RECEBO COMPACTADO

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Nelva – Huila (Colombia)



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE INTERVENTORIA
VERSION:7.0





ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



ISO 14001
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



OHSAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

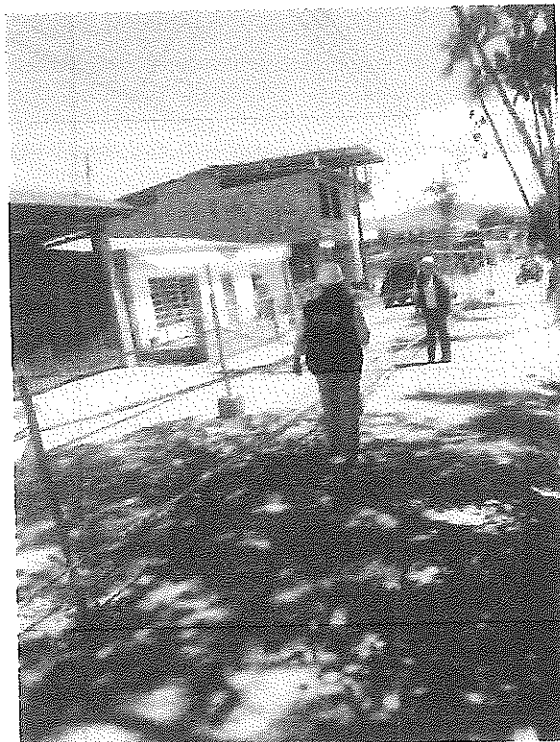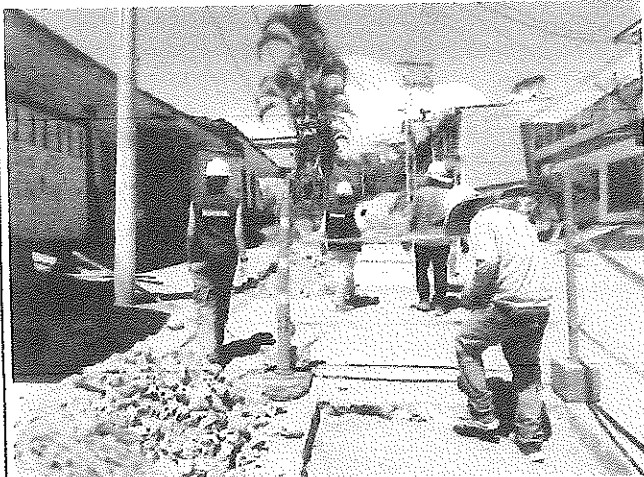

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia)

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	




DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA
INTERVENTORA

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 MANEJO DE CALIDAD
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	 ISO 14001 MANEJO AMBIENTAL  OHSAS MANEJO DE SEGURIDAD

ANEXOS

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS
	INFORME DE INTERVENTORIA VERSION:7.0	

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	26579000	DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA	avenida 28 No 31-85 Torre 2 Apto 302	3125475201	dianam.segurao2@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			HUILA	NEIVA
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	1	11/11/2025	91371321	\$422.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD						Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	181.300	0		0	0	0	0	6	700	0	182.000	1

TOTALES PENSIÓN						Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria											
25-14	Colpensiones	960309004-7	232.000			0	0	0	0	6	900	0	232.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES						Aportes Otros	Valor Nota	Días Mora	Valor Mora	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades											
				No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización		Spide a Favor	Favor			
14-11	ARL SURA	890933700-8	7.600				7.600	6	100	7.700			76	7.700	1

TOTALES CAJAS						NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Código CCF	Nombre										

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LIMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	181.300	182.000
Pensión	1	232.000	232.900
Riesgos Laborales	1	7.600	7.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	420.900	422.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	26579000	DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA	avenida 26 No 31-65 Torro 2 Apto 302	3125475201	dianam.segura2@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			HUILA	NEIVA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2025-10	2025-10	I	11/11/2025	91371321	1 0
					TOTAL A PAGAR
					\$422.600

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Salida	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Cód. AFP	IBC AFP	Colización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Valor de Seguro	Colización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte GSAP	Aporte MEN
1	UC	26579000	SEGURA OCHOA DIANA MARGARITA	57	U		N											25-14	1.420.063	432.050	0	0	0	0	EPS006	1.420.063	101.369	14-11	1.420.300	1	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	26579000	DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA	avcoida 26 No 31-68 Torre 2 Apt 302	3125475201	dianamsegura2@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	L- Independiente			HUILA	NEIVA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	09/12/2025	92221900	\$422.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD						Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS905	Sanitas EPS	800261440-6	181.300	0			0		0	7	800	0	182.100	1

TOTALES PENSIÓN						Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria											
25-14	Colpensiones	900036304-7	232.000			0	0	0	0	7	1.100	0	233.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES						Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Estado a Favor	Valor Estado a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	No. Autorización	Valor												
14-11	ARL SURA	600503790-5	7.600						7.600	7	100	7.700			76	7.700	1

TOTALES CAJAS						NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Código CCF	Nombre										

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
SENA					0
0	7	0	0		
ICBSF					0
0	7	0	0		
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	181.300	182.100
Pensión	1	232.000	233.100
Riesgos Laborales	1	7.600	7.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBSF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	420.900	422.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	26575900	DANA MARGARITA SEGURA CCHOA	avenida 26 No 31-68 Torre 2 Apto 302	3125475201	dianem.segura02@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			HUILA	NEIVA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					1
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-11	1	09/12/2025	92221500	\$422.900

DETALLE POR COTIZANTE																																						
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES												
Nº	Tipo	Nº de identificación	Apellidos y nombres	COTIZANTE	Apellido	Nombre	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de vejez	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC exen cotizaciones	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	25575900	SEGURA CCHOA DIANA MARGARITA	57	0	N											25-14	1.420.600	232.026	0	0	0	0	EPS000	1.420.600	101.100	15-11	1.420.900	1	7639		9	0	0	0	0	0	0

PAGADA
