

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN 1
				PÁGINA 1 DE 1
				FECHA 01 12 2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: oct-25
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 53 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,476,902,061.00
		FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28/11/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	01/12/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	01/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JESUS RINCON	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	02/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	03-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				
ORDEN DE PAGO				
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7				
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERO LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 1,487,694,807.00 VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MCTE				
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 53 DEL PERIODO oct-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.				
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)				
Firma digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	Firma digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	Firma digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	Firma digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ	
Matrícula No. 19202-65504 CAU	Matrícula No. 19202-65504 CAU	Matrícula No. 25202-147800 CNO	Matrícula No. 22203-273807 COR	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO	
Fecha firma: 02/12/2025	Fecha firma: 02/12/2025	Fecha firma: 03/12/2025	Fecha de Firma: 03-12-2025	
(Suscribe según su competencia)				
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).				
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				

UNIDAD EJECUTORA:SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CAQUETÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.53

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:oct-25

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.53 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.:991 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:114 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:114 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:29/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:985 DE 2021

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VALOR INICIAL (incluido IVA):\$999.567.436.435,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):\$13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):\$413.052.964.666,00

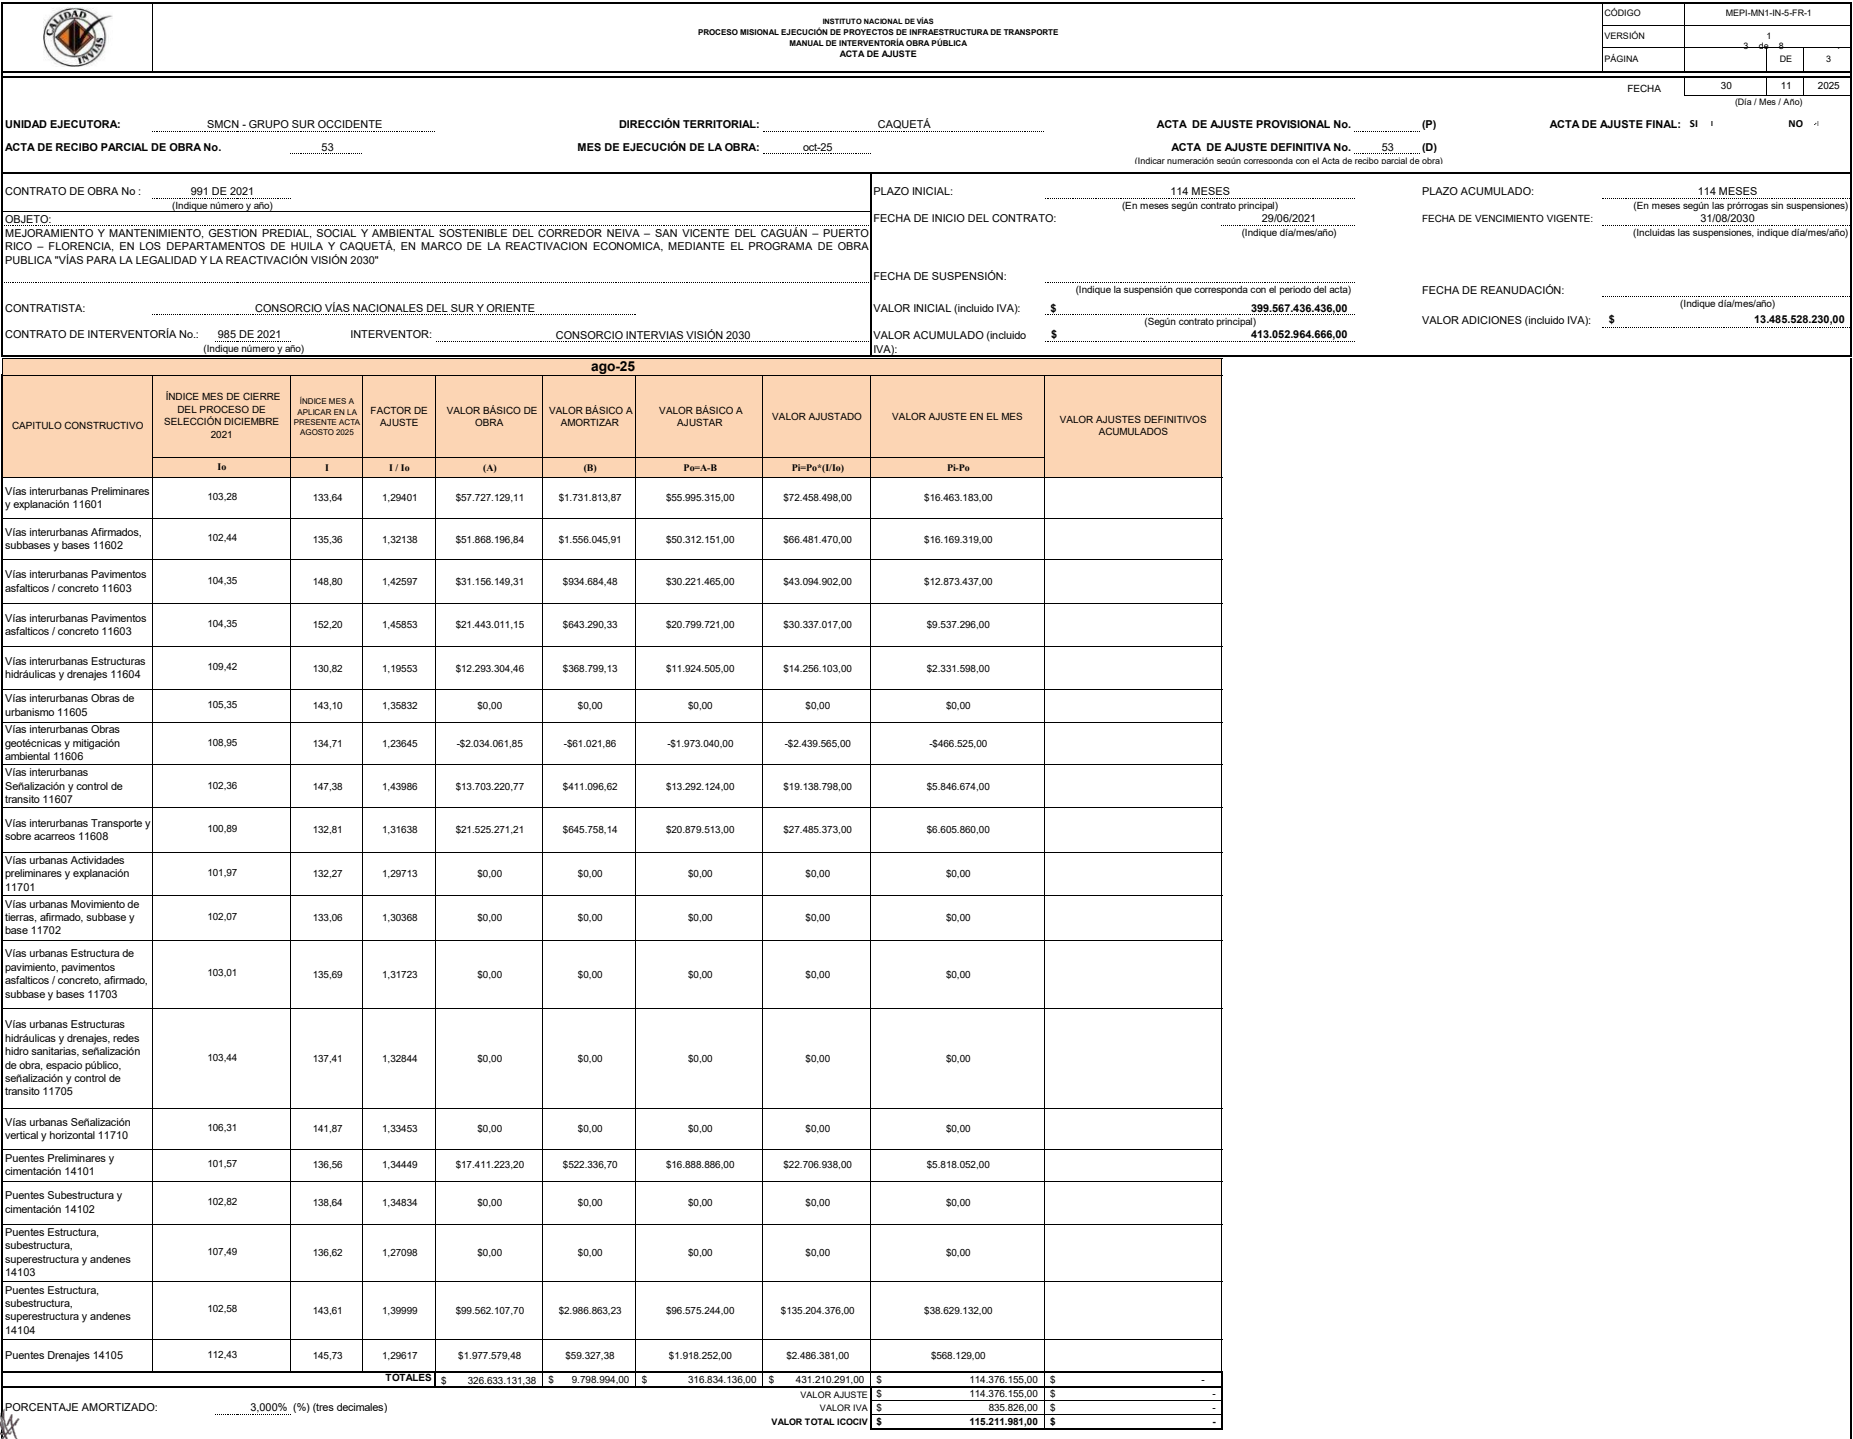
DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$81.727.458.532,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$79.531.372.835,00

agos-sept-oct-25 (Mantenimiento)									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$15.324,00	\$459,72	\$14.864,00	\$15.168,00	\$304,00	
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$21.315.170,00	\$639.455,10	\$20.675.715,00	\$21.018.312,00	\$342.597,00	
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$2.458.923,00	\$73.767,69	\$2.385.155,00	\$2.397.033,00	\$11.878,00	
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$428.116.359,00	\$12.843.490,77	\$415.272.868,00	\$434.101.340,00	\$18.828.472,00	
8.1 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	105,07	1,04934		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTALES				\$451.905.776,00	\$13.557.173,00	\$438.348.602,00	\$457.531.853,00	\$19.183.251,00	\$-
PORCENTAJE AMORTIZADO:				3.000% (%) (tres decimales)			VALOR AJUSTE	\$19.183.251,00	\$-
							VALOR IVA	\$140.185,00	\$-
							VALOR TOTAL ICCP	\$19.323.436,00	\$-

Ago-Sep-Oct-25 (obra)									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$587.627.311,00	\$17.628.819,33	\$569.998.492,00	\$581.666.361,00	\$11.667.869,00	\$161.355.763,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$529.864.292,00	\$15.889.928,76	\$513.774.363,00	\$522.287.604,00	\$8.513.241,00	\$365.877.803,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$220.616.615,00	\$6.618.498,45	\$213.998.117,00	\$215.063.828,00	\$1.065.711,00	\$17.627.633,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$979.349.297,00	\$29.380.478,91	\$949.968.818,00	\$991.729.447,00	\$41.760.629,00	\$251.927.259,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$328.851.479,00	\$9.865.544,37	\$318.985.935,00	\$326.466.155,00	\$7.480.220,00	\$366.264.256,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$72.296.055,00	\$2.168.881,65	\$70.127.173,00	\$73.306.739,00	\$3.179.566,00	\$309.196.640,00
8.1 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	105,07	1,04934	\$617.086.000,00	\$18.512.580,00	\$598.573.420,00	\$628.107.033,00	\$29.533.613,00	\$767.514.420,00
TOTALES				\$3.335.491.049,00	\$100.064.732,00	\$3.235.426.318,00	\$3.338.627.167,00	\$103.200.849,00	\$2.239.763.774,00
PORCENTAJE AMORTIZADO:				3.000% (%) (tres decimales)			VALOR AJUSTE	\$122.384.100,00	\$2.239.763.774,00
							VALOR IVA	\$894.345,00	\$16.367.505,00
							VALOR TOTAL ICCP	\$123.278.445,00	\$2.256.131.279,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE								
	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1							
	VERSIÓN	1							
PÁGINA	2	DE	3						
				FECHA	30	11	2025		
				(Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: _____SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE_____		DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____CAQUETÁ_____		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____(P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____53_____		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: _____oct-25_____		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _____53_____(D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO DE OBRA No.: _____991 DE 2021_____ (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: _____114 MESES_____ (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: _____114 MESES_____ (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUANÉ – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____29/06/2021_____ (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____31/08/2030_____ (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: _____CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE_____				FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: _____985 DE 2021_____INTERVENTOR: _____CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030_____				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ _____399.567.436.436,00_____ (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ _____13.485.528.230,00_____ (Según contrato principal)			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: _____985 DE 2021_____ (Indique número y año)				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ _____413.052.964.666,00_____ (Según contrato principal)					
ago-25 (Mantenimiento)									
CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA AGOSTO 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _O	I	I / I _O	(A)	(B)	P _O -A-B	P _i -P _o *(I/I _O)	P _i -P _o	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	133,64	1,29401	\$ 1.500,63	\$45,02	\$ 1.456,00	\$ 1.884,00	\$428,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	135,36	1,32138	\$ 2.087.321,06	\$62.619,63	\$ 2.024.701,00	\$ 2.675.399,00	\$ 650.698,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	148,80	1,42597	\$ 2.937.866,13	\$88.135,98	\$ 2.849.730,00	\$ 4.063.629,00	\$ 1.213.899,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	152,20	1,45853	\$ 38.986.091,96	\$ 1.169.582,76	\$ 37.816.509,00	\$ 55.156.513,00	\$ 17.340.004,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	130,82	1,19553		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	143,10	1,35832		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	134,71	1,23645		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	147,38	1,43986		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	132,81	1,31638	\$ 240.793,85	\$ 7.223,82	\$ 233.570,00	\$ 307.467,00	\$ 73.897,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	132,27	1,29713		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	133,06	1,30368		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	135,69	1,31723		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	137,41	1,32844		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	141,87	1,33453		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Puentes Preliminares y cimentación 14101	101,57	136,56	1,34449		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Puentes Subestructura y cimentación 14102	102,82	138,64	1,34834		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	107,49	136,62	1,27098		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104	102,58	143,61	1,39999		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Puentes Drenajes 14105	112,43	145,73	1,29617		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTALES	\$ 44.253.573,62	\$ 1.327.607,00	\$ 42.925.966,00	\$ 62.204.892,00	\$ 19.278.926,00	\$ -			
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE	\$ 19.278.926,00	\$ -			
				VALOR IVA	\$ 140.884,00	\$ -			
				VALOR TOTAL ICOCIV	\$ 19.419.810,00	\$ -			



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1		
									VERSIÓN	1		
									PÁGINA	4	de	8
									FECHA	30	11	2025
									(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ 53				MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: _____ oct-25				ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _____ 53 (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		
CONTRATO DE OBRA No.: _____ 991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: _____ 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: _____ 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 29/08/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____ 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
								FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: _____ CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE								VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ _____ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ _____ 13.485.528.230,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: _____ 985 DE 2021 INTERVENTOR: _____ CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030								VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ _____ 413.052.964.666,00				
sep-25 (Mantenimiento)												
CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA SEPT 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS			
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe-A-B	Pi-Pe*(I/Io)	Pi-Pe				
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	133,59	1,29352	\$11.718,70	\$351,56	\$11.367,00	\$14.703,00	\$3.336,00				
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	135,51	1,32285	\$16.300.314,95	\$489.009,45	\$15.811.306,00	\$20.915.986,00	\$5.104.680,00				
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	148,44	1,42252	\$22.942.394,46	\$688.271,83	\$22.254.123,00	\$31.656.935,00	\$9.402.812,00				
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	152,20	1,45856	\$304.450.325,78	\$9.133.509,77	\$295.316.816,00	\$430.737.295,00	\$135.420.479,00				
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	130,37	1,19142		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	142,81	1,35556		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	134,25	1,23223		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	146,41	1,43039		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	100,89	134,46	1,33274	\$1.880.408,15	\$56.412,24	\$1.823.996,00	\$2.430.912,00	\$606.916,00				
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	132,79	1,30223		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	133,50	1,30799		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	135,99	1,32014		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	137,03	1,32477		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	141,73	1,33321		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Puentes Preliminares y cimentación 14101	101,57	136,11	1,34006		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Puentes Subestructura y cimentación 14102	102,82	137,91	1,34124		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	107,49	135,88	1,26409		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104	102,58	142,60	1,39015		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Puentes Drenajes 14105	112,43	145,55	1,29457		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
TOTALES				\$ 345.585.162,04	\$ 10.367.555,00	\$ 335.217.608,00	\$ 485.755.831,00	\$ 150.538.223,00	\$ -			
								\$ 150.538.223,00	\$ -			
								\$ 1.100.087,00	\$ -			
								\$ 151.638.310,00	\$ -			
PORCENTAJE AMORTIZADO: _____ 3.000% (%) (tres decimales)												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-1			
									VERSIÓN	1		
									PÁGINA	5	de	3
									FECHA	30	de	2025
									(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)			ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53			MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-25			ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 53 (D)			(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE						FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:				
						(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)						INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 13.485.528.230,00		
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 413.052.964.666,00						
sep-25												
CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA SEPT 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS			
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi-Po*(I/Io)	Pi-Po				
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	133,59	1,29352	\$450.802.898,72	\$13.524.086,96	\$437.278.812,00	\$565.628.889,00	\$128.350.077,00				
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	135,51	1,32285	\$405.049.304,30	\$12.151.479,13	\$392.897.825,00	\$519.744.888,00	\$126.847.063,00				
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	148,44	1,42252	\$243.304.710,28	\$7.299.141,31	\$236.005.569,00	\$335.722.642,00	\$99.717.073,00				
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	152,20	1,46856	\$167.452.837,73	\$5.023.585,13	\$162.429.253,00	\$236.912.811,00	\$74.483.558,00				
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	130,37	1,19142	\$96.000.916,21	\$2.880.027,49	\$93.120.889,00	\$110.946.090,00	\$17.825.201,00				
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	142,81	1,35556	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	134,25	1,23223	-\$15.884.402,91	-\$476.532,09	-\$15.407.871,00	-\$18.986.041,00	-\$3.578.170,00				
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	146,41	1,43039	\$107.011.239,57	\$3.210.337,19	\$103.800.902,00	\$148.475.772,00	\$44.674.870,00				
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	100,89	134,46	1,33274	\$168.095.223,32	\$5.042.856,70	\$163.052.367,00	\$217.306.412,00	\$54.254.045,00				
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	132,79	1,30223	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	133,50	1,30799	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	135,99	1,32014	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	137,03	1,32477	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	141,73	1,33321	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Puentes Preliminares y cimentación 14101	101,57	136,11	1,34006	\$135.967.785,14	\$4.079.033,55	\$131.888.752,00	\$178.738.841,00	\$44.850.089,00				
Puentes Subestructura y cimentación 14102	102,82	137,91	1,34124	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	107,49	135,88	1,26409	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104	102,58	142,60	1,39015	\$777.500.760,01	\$23.325.022,80	\$754.175.737,00	\$1.048.417.401,00	\$294.241.664,00				
Puentes Drenajes 14105	112,43	145,55	1,29457	\$15.443.320,59	\$463.299,62	\$14.980.021,00	\$19.392.686,00	\$4.412.665,00				
TOTALES				\$ 2.550.744.592,96	\$ 76.522.338,00	\$ 2.474.222.256,00	\$ 3.360.300.391,00	\$ 886.078.135,00	\$ -			
				VALOR AJUSTE		\$ 886.078.135,00		\$ -		\$ -		
				VALOR IVA		\$ 6.475.186,00		\$ -		\$ -		
				VALOR TOTAL ICODIV		\$ 892.553.321,00		\$ -		\$ -		
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,0000% (tres decimales)												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1		
								VERSIÓN	1		
								PÁGINA	6	de	3
								FECHA	30	de	2025
								(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO					
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-25		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 53 (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:					
				(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 13.485.528.230,00			
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 413.052.964.666,00							
oct-25 (Mantenimiento)											
CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS		
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Po			
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	133,62	1,29381	\$ 2.104,68	\$63,14	\$ 2.042,00	\$ 2.642,00	\$600,00			
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	135,44	1,32217	\$ 2.927.533,98	\$87.826,02	\$ 2.839.708,00	\$ 3.754.577,00	\$914.869,00			
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	147,91	1,41744	\$ 4.120.450,41	\$123.613,51	\$ 3.996.837,00	\$ 5.665.277,00	\$ 1.668.440,00			
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	152,59	1,46230	\$ 54.679.230,26	\$ 1.640.376,91	\$ 53.038.853,00	\$ 77.558.715,00	\$ 24.519.862,00			
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	129,67	1,18502		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	142,28	1,35053		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	133,94	1,22938		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	145,09	1,41749		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	134,48	1,33294	\$ 337.721,01	\$ 10.131,63	\$ 327.589,00	\$ 436.656,00	\$ 109.067,00			
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	132,79	1,30223		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	133,53	1,30828		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	135,88	1,31907		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	136,53	1,31993		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	141,43	1,33039		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Puentes Preliminares y cimentación 14101	101,57	135,52	1,33425		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Puentes Subestructura y cimentación 14102	102,82	137,12	1,33355		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	107,49	135,27	1,25842		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104	102,58	141,54	1,37981		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Puentes Drenajes 14105	112,43	141,27	1,25650		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
TOTALES				\$ 62.067.040,34	\$ 1.862.011,00	\$ 60.205.029,00	\$ 87.417.867,00	\$ 27.212.838,00	\$ -		
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)							VALOR AJUSTE	\$ 27.212.838,00	\$ -		
							VALOR IVA	\$ 198.863,00	\$ -		
							VALOR TOTAL ICIO CIV	\$ 27.411.701,00	\$ -		

FECHA

30

11

2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ 53

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: _____ oct-25

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _____ 53 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : _____ 991 DE 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: _____ 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: _____ 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAQUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____ 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: _____ CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: _____ 985 DE 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: _____ CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ _____ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ _____ 13.485.628.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ _____ 413.052.964.666,00

oct-25									
CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Po	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	133,62	1,29381	\$80.964.129,17	\$2.428.923,88	\$78.535.205,00	\$101.609.634,00	\$23.074.429,00	\$1.327.593.013,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	135,44	1,32217	\$72.746.790,86	\$2.182.403,73	\$70.564.387,00	\$93.298.116,00	\$22.733.729,00	\$3.497.828.752,00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	147,91	1,41744	\$43.697.487,41	\$1.310.924,62	\$42.386.563,00	\$60.080.410,00	\$17.693.847,00	\$1.281.891.576,00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	152,59	1,46230	\$30.074.503,12	\$902.235,09	\$29.172.268,00	\$42.658.607,00	\$13.486.339,00	\$5.726.968.392,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	129,67	1,18502	\$17.241.749,34	\$517.252,48	\$16.724.497,00	\$19.818.863,00	\$3.094.366,00	\$2.064.712.089,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	142,28	1,35053	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.861.991,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	133,94	1,22938	-\$2.852.836,24	-\$85.585,09	-\$2.767.251,00	-\$3.402.003,00	-\$634.752,00	\$955.478.343,00
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	145,09	1,41749	\$19.219.201,67	\$576.576,05	\$18.642.626,00	\$26.425.736,00	\$7.783.110,00	\$95.403.490,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	134,48	1,33294	\$30.189.875,47	\$905.696,26	\$29.284.179,00	\$39.034.054,00	\$9.749.875,00	\$739.696.774,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	132,79	1,30223	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.547.648,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	133,53	1,30828	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$176.042.905,00
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	135,88	1,31907	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$67.041.659,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	136,53	1,31993	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.382.082,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	141,43	1,33039	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.192.965,00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	101,57	135,52	1,33425	\$24.419.792,66	\$732.593,78	\$23.687.199,00	\$31.604.645,00	\$7.917.446,00	\$58.585.587,00
Puentes Subestructura y cimentación 14102	102,82	137,12	1,33355	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.962.853,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	107,49	135,27	1,25842	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.628.814,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104	102,58	141,54	1,37981	\$139.639.013,28	\$4.189.170,40	\$135.449.843,00	\$186.895.048,00	\$51.445.205,00	\$873.974.731,00
Puentes Drenajes 14105	112,43	141,27	1,25650	\$2.773.617,93	\$83.208,54	\$2.690.409,00	\$3.380.499,00	\$690.090,00	\$39.559.633,00
TOTALES				\$ 458.113.324,66	\$ 13.743.400,00	\$ 444.369.925,00	\$ 601.403.609,00	\$ 157.033.684,00	\$ 16.996.353.297,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-1	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	3

			FECHA	30	11	2025
			(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-25	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 53 (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 413.052.964.666,00		

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (tres decimales)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VALOR AJUSTE</td> <td style="width: 35%;">\$ 1.354.517.961,00</td> <td style="width: 35%;">\$ 16.996.353.297,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$ 9.898.400,00</td> <td>\$ 124.204.120,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL ICCIV</td> <td>\$ 1.364.416.361,00</td> <td>\$ 17.120.557.417,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VALOR AJUSTE</td> <td style="width: 35%;">\$ 1.476.902.061,00</td> <td style="width: 35%;">\$ 19.236.117.071,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$ 10.792.746,00</td> <td>\$ 140.571.624,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL ICCP + ICCIV</td> <td>\$ 1.487.694.807,00</td> <td>\$ 19.376.688.695,00</td> </tr> </table>	VALOR AJUSTE	\$ 1.354.517.961,00	\$ 16.996.353.297,00	VALOR IVA	\$ 9.898.400,00	\$ 124.204.120,00	VALOR TOTAL ICCIV	\$ 1.364.416.361,00	\$ 17.120.557.417,00	VALOR AJUSTE	\$ 1.476.902.061,00	\$ 19.236.117.071,00	VALOR IVA	\$ 10.792.746,00	\$ 140.571.624,00	VALOR TOTAL ICCP + ICCIV	\$ 1.487.694.807,00	\$ 19.376.688.695,00
VALOR AJUSTE	\$ 1.354.517.961,00	\$ 16.996.353.297,00																	
VALOR IVA	\$ 9.898.400,00	\$ 124.204.120,00																	
VALOR TOTAL ICCIV	\$ 1.364.416.361,00	\$ 17.120.557.417,00																	
VALOR AJUSTE	\$ 1.476.902.061,00	\$ 19.236.117.071,00																	
VALOR IVA	\$ 10.792.746,00	\$ 140.571.624,00																	
VALOR TOTAL ICCP + ICCIV	\$ 1.487.694.807,00	\$ 19.376.688.695,00																	



NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL</th> </tr> <tr> <td>*VALOR AJUSTE PROVISIONAL</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td> <td>\$ -</td> </tr> </table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)	RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL		*VALOR AJUSTE PROVISIONAL	\$ -	VALOR IVA	\$ -	*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO</th> </tr> <tr> <td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td> <td></td> </tr> </table>	RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO		VALOR AJUSTE DEFINITIVO		VALOR IVA		VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL																	
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL	\$ -																
VALOR IVA	\$ -																
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -																
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO																	
VALOR AJUSTE DEFINITIVO																	
VALOR IVA																	
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR																	

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 1.476.902.061,00	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.487.694.807,00 (Indicar el valor incluido IVA)	VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MCTE

NOTAS:

- Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-S-FR-2 para los giros subsiguientes.
- El formato MEPI-MN1-IN-S-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
- El (o) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
- Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
- El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
- El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
- Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:  Nombre: ANIBAL ENRIQUE QUEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matriculación Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma:  Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matriculación Profesional No.: 25202 - 44184 CND
---	---

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA:SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CAQUETÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.54

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:nov-25

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 54 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.435,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 413.052.964.666,00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 84.633.994.516,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$ 81.632.874.444,00

octubre 2025 - Actividades de mantenimiento vial proyecto 132									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$31.030.979,00	\$930.929,37	\$30.100.050,00	\$30.598.808,00	\$498.758,00	
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$14.521.532,00	\$435.645,96	\$14.085.886,00	\$14.724.540,00	\$638.654,00	
8.1 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	105,07	1,04934	\$523.737.250,00	\$15.712.117,50	\$508.025.133,00	\$533.091.093,00	\$25.065.960,00	
TOTALES				\$ 569.289.761,00	\$ 17.078.693,00	\$ 552.211.069,00	\$ 578.414.441,00	\$ 26.203.372,00	\$ -
								VALOR AJUSTE	\$ 26.203.372,00
								VALOR IVA	\$ 191.486,00
								VALOR TOTAL ICCP	\$ 26.394.858,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3.000% (%) (tres decimales)

oct-25									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$340.693.248,00	\$10.220.797,44	\$330.472.451,00	\$337.237.222,00	\$6.764.771,00	\$168.120.534,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$561.738.228,00	\$16.852.146,84	\$544.886.081,00	\$553.914.843,00	\$9.028.762,00	\$375.405.323,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$166.529.560,00	\$4.995.886,80	\$161.533.673,00	\$162.338.111,00	\$804.438,00	\$18.432.071,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$13.932.085,00	\$417.962,55	\$13.514.122,00	\$14.108.203,00	\$594.081,00	\$252.521.340,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$183.537.950,00	\$5.506.138,50	\$178.031.812,00	\$182.206.658,00	\$4.174.846,00	\$370.439.102,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$265.780.777,00	\$7.973.423,31	\$257.807.354,00	\$269.496.339,00	\$11.688.985,00	\$321.524.279,00
8.1 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	105,07	1,04934	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$792.580.380,00
TOTALES				\$ 1.532.211.848,00	\$ 45.966.355,00	\$ 1.486.245.493,00	\$ 1.519.301.378,00	\$ 33.055.883,00	\$ 2.299.023.029,00
								VALOR AJUSTE	\$ 59.299.255,00
								VALOR IVA	\$ 433.048,00
								VALOR TOTAL ICCP	\$ 69.692.303,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3.000% (%) (tres decimales)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1		
								VERSIÓN	1		
								PÁGINA	2	DE	3

							FECHA	3	12	2025
							(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-25

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 54 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 413.052.964.666,00

octubre 2025 - Actividades de mantenimiento vial proyecto 132									
CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe-A-B	Pi-Pe*(I/Io)	Pi-Pe	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	133,62	1,29381		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	135,44	1,32217	\$31.030.979,00	\$930.929,37	\$30.100.050,00	\$39.797.383,00	\$9.697.333,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	147,91	1,41744	\$14.521.532,00	\$435.645,96	\$14.085.886,00	\$19.965.898,00	\$5.880.012,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	152,59	1,46230	\$523.737.250,00	\$15.712.117,50	\$508.025.133,00	\$742.885.152,00	\$234.860.019,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	129,67	1,18502		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	142,28	1,35053		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	133,94	1,22938		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	145,09	1,41749		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	100,89	134,48	1,33294		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	132,79	1,30223		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	133,53	1,30828		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	135,88	1,31907		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	136,53	1,31993		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	141,43	1,33039		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Puentes Preliminares y cimentación 14101	101,57	135,52	1,33425		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Puentes Subestructura y cimentación 14102	102,82	137,12	1,33355		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	107,49	135,27	1,25842		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104	102,58	141,54	1,37981		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Puentes Drenajes 14105	112,43	141,27	1,25650		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTALES				\$ 569.289.761,00	\$ 17.078.683,00	\$ 552.211.069,00	\$ 802.648.433,00	\$ 250.437.364,00	\$ -
								\$ 250.437.364,00	\$ -
								\$ 1.830.119,00	\$ -
								\$ 252.267.483,00	\$ -

PERCENTAJE AMORTIZADO: 3.000% (%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE

VALOR IVA

VALOR TOTAL ICOCIV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE								CÓDIGO	MEP3-MB1-1145-FR-1																						
VERSIÓN											1																					
PÁGINA											DE		3																			
											FECHA		3		12		2025															
											(Día / Mes / Año)																					
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ																					
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54											MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-25																					
											ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)											ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO										
											ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 54 (D)											(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)										
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)											PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)										
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)											FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)										
											FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)											FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)										
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE											VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)											VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 13.485.528.230,00										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)											INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030											VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 413.052.964.666,00										
											oct-25																					
CAPITULO CONSTRUCTIVO		ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA, OCTUBRE 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS																						
		Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Po																							
Vías Interurbanas Preliminares y explanación 11601		103,28	133,62	1,29381	\$340.736.164,00	\$10.222.084,92	\$330.514.079,00	\$427.622.421,00	\$97.108.342,00	\$1.424.701.355,00																						
Vías Interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602		102,44	135,44	1,32217	\$536.011.081,00	\$16.080.332,43	\$519.930.749,00	\$687.436.838,00	\$167.506.089,00	\$3.675.032.174,00																						
Vías Interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603		104,35	147,91	1,41744	\$217.913.770,00	\$6.537.413,10	\$211.376.357,00	\$299.613.303,00	\$88.236.946,00	\$1.376.008.534,00																						
Vías Interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603		104,35	152,59	1,46230	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.961.828.411,00																						
Vías Interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604		109,42	129,67	1,18502	\$164.840.411,00	\$4.945.212,33	\$159.895.199,00	\$189.479.009,00	\$29.583.810,00	\$2.094.295.899,00																						
Vías Interurbanas Obras de urbanismo 11605		105,35	142,28	1,35053	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.861.991,00																						
Vías Interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606		108,95	133,94	1,22938	\$10.705.941,00	\$321.178,23	\$10.384.763,00	\$12.766.820,00	\$2.382.057,00	\$957.860.400,00																						
Vías Interurbanas Señalización y control de tránsito 11607		102,36	145,09	1,41749	\$30.360.123,00	\$910.803,69	\$29.449.319,00	\$41.744.115,00	\$12.294.796,00	\$107.698.286,00																						
Vías Interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608		100,89	134,48	1,33294	\$166.529.560,00	\$4.995.886,80	\$161.533.673,00	\$215.314.694,00	\$53.781.021,00	\$793.477.795,00																						
Vías urbanas Actividades Preliminares y explanación 11701		101,97	132,79	1,30223	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.547.648,00																						
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702		102,07	133,53	1,30828	\$25.727.147,00	\$771.814,41	\$24.955.333,00	\$32.648.563,00	\$7.693.230,00	\$183.736.135,00																						
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703		103,01	135,88	1,31907	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$67.041.659,00																						
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705		103,44	136,53	1,31993	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.382.082,00																						
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710		106,31	141,43	1,33039	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.192.965,00																						
Puentes Preliminares y cimentación 14101		101,57	135,52	1,33425	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$58.585.587,00																						
Puentes Subestructura y cimentación 14102		102,82	137,12	1,33355	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.962.853,00																						
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103		107,49	135,27	1,25842	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.628.814,00																						
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104		102,58	141,54	1,37981	\$8.392.392,00	\$251.771,76	\$8.140.620,00	\$11.232.509,00	\$3.091.889,00	\$877.066.620,00																						
Puentes Drenajes 14105		112,43	141,27	1,25650	\$30.995.259,00	\$929.857,77	\$30.065.401,00	\$37.777.176,00	\$7.711.775,00	\$47.271.408,00																						
TOTALES		\$ 1.532.211.848,00	\$ 45.966.355,00	\$ 1.486.245.493,00	\$ 1.955.635.448,00	\$ 469.389.955,00	\$ 17.716.180.616,00																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEP1-MN1-IN-S-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	3

		FECHA		3	12	2025
		(Día / Mes / Año)				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-25	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 54 (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 413.052.964.666,00		

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (tres decimales)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR AJUSTE</td> <td>\$ 719.827.319,00</td> <td>\$ 17.716.180.616,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$ 5.260.277,00</td> <td>\$ 129.464.397,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL ICOCIV</td> <td>\$ 725.087.596,00</td> <td>\$ 17.845.645.013,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR AJUSTE</td> <td>\$ 779.086.574,00</td> <td>\$ 20.015.203.645,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$ 5.693.325,00</td> <td>\$ 146.264.949,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV</td> <td>\$ 784.779.899,00</td> <td>\$ 20.161.468.594,00</td> </tr> </table>	VALOR AJUSTE	\$ 719.827.319,00	\$ 17.716.180.616,00	VALOR IVA	\$ 5.260.277,00	\$ 129.464.397,00	VALOR TOTAL ICOCIV	\$ 725.087.596,00	\$ 17.845.645.013,00	VALOR AJUSTE	\$ 779.086.574,00	\$ 20.015.203.645,00	VALOR IVA	\$ 5.693.325,00	\$ 146.264.949,00	VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV	\$ 784.779.899,00	\$ 20.161.468.594,00
VALOR AJUSTE	\$ 719.827.319,00	\$ 17.716.180.616,00																	
VALOR IVA	\$ 5.260.277,00	\$ 129.464.397,00																	
VALOR TOTAL ICOCIV	\$ 725.087.596,00	\$ 17.845.645.013,00																	
VALOR AJUSTE	\$ 779.086.574,00	\$ 20.015.203.645,00																	
VALOR IVA	\$ 5.693.325,00	\$ 146.264.949,00																	
VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV	\$ 784.779.899,00	\$ 20.161.468.594,00																	

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL	RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>*VALOR AJUSTE PROVISIONAL</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>	*VALOR AJUSTE PROVISIONAL	\$ -	VALOR IVA	\$ -	*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>	VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$ -	VALOR IVA	\$ -	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$ -
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL	\$ -												
VALOR IVA	\$ -												
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -												
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$ -												
VALOR IVA	\$ -												
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$ -												
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)													

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 779.086.574,00	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 784.779.899,00 (Indicar el valor incluido IVA)
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE	

NOTAS:

- Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEP1-MN1-IN-S-FR-2 para los giros subsiguientes.
- El formato MEP1-MN1-IN-S-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
- El (o) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
- Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEP1-MN1-IN-5.
- El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
- El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
- Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:  Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma:  Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND
---	---

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha Factura	DIA	MES	AÑO
		27	11	2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	Fecha de Vencimiento	DIA	MES	AÑO
Direccion: CR 59 26 60		28	12	2025
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	Interventor			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA AJUSTES 53 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: OCTUBRE 2025 IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: \$10.792.746	1.136.078.508

OBSERVACIONES:			
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5			
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3			
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1			
#\$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#\$			
VALOR EN LETRAS:		SUBTOTAL	1.136.078.508,00
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS		ADMINISTRAC	20%
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE		IMPREVISTOS	5%
		UTILIDAD	5%
		IVA	10.792.746,00
FAVOR CONSIGNAR A:		TOTAL FACTURA	1.487.694.807,00
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		RETE IVA	-
NIT: 901,475,034-7		RETE ICA	-
BANCO: DAVIVIENDA		RETE FUENTE	-
CUENTA CORRIENTE: 055969998453		AMORT. ANT	
FORMA DE PAGO: CONTADO		RETE GARAN.	
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO		OTROS DESCUENTOS	
FECHA DE EMISIÓN		TOTAL A PAGAR	1.487.694.807,00
HORA DE EMISION			

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	ACEPTADA
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	INTERVENTORIA	FIRMA Y SELLO CC o NIT

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha Factura	DIA	MES	AÑO
		3	12	2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	Fecha de Vencimiento	DIA	MES	AÑO
Direccion: CR 59 26 60		3	1	2026
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	Interventor			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA AJUSTES 54 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: NOVIEMBRE 2025 IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: \$5.693.325	599.297.365

OBSERVACIONES:			
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5			
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3			
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1			
#\$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#\$			
VALOR EN LETRAS:		SUBTOTAL	599.297.365,00
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS		ADMINISTRAC	20%
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS		IMPREVISTOS	5%
M/CTE		UTILIDAD	5%
		IVA	5.693.325,00
FAVOR CONSIGNAR A:		TOTAL FACTURA	784.779.899,00
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		RETE IVA	-
NIT: 901,475,034-7		RETE ICA	-
BANCO: DAVIVIENDA		RETE FUENTE	-
CUENTA CORRIENTE: 055969998453		AMORT. ANT	
FORMA DE PAGO: CONTADO		RETE GARAN.	
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO		OTROS DESCUENTOS	
FECHA DE EMISIÓN		TOTAL A PAGAR	784.779.899,00
HORA DE EMISION			

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA		ACEPTADA
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		INTERVENTORIA	FIRMA Y SELLO CC o NIT



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

3.000%

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

53

oct-25

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 509925	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 217,793,257.00
No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	\$ 1,046,094,851.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 88,151,472.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 135,655,227.00
						TOTAL ACTA	\$ 1,487,694,807.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____

Firmado digitalmente
por RINCON
SILVA JESUS
EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

X

3.000%

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

54

nov-25

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 509925	RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 278,662,341.00
No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	\$ 503,629,088.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No. C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 2,488,470.00
					TOTAL ACTA	\$ 784,779,899.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____

Firmado (BID, USAID, CAF, Etc...)

digitalmente
por RINCON
SILVA JESUS
EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. 53 Valor basico \$ 1,476,902,061.00 Período: oct-25

Valor incluido el Iva: \$ 1,487,694,807.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 17,310,923.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 17,310,923.00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ 206,495,776.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 206,495,776.00
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 483,270,763.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 483,270,763.00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ 780,617,345.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 780,617,345.00
TOTALES			\$ 1,487,694,807.00	\$ -	\$ -	\$ 1,487,694,807.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS				VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
DEPARTAMENTO 1 - HUILA					
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA		\$ 17,310,923.00	\$ 17,185,338.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA				\$ 17,310,923.00	\$ 17,185,338.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ					
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN		\$ 527,486,159.00	\$ 523,659,417.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO		\$ 162,280,380.00	\$ 161,103,088.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO		\$ -	\$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL		\$ -	\$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTANITA		\$ 780,315,726.00	\$ 774,654,788.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA		\$ 301,619.00	\$ 299,429.53
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ				\$ 1,470,383,884.00	\$ 1,459,716,723.00
TOTAL				\$ 1,487,694,807.00	\$ 1,476,902,061.00


ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND


JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13
VERSIÓN 1
PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
Acta No. 54 Valor basico \$ 779,086,574.00 Período: nov-25
Valor incluido el Iva: \$ 784,779,899.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 2,488,470.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 2,488,470.00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 314,529,668.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 314,529,668.00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ 467,761,761.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 467,761,761.00
TOTALES			\$ 784,779,899.00	\$ -	\$ -	\$ 784,779,899.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 2,488,470.00	\$ 2,470,417.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 2,488,470.00	\$ 2,470,417.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 212,594,250.00	\$ 211,051,947.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ 239,332,204.00	\$ 237,595,926.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ -	\$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ -	\$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTANITA	\$ 330,364,975.00	\$ 327,968,283.50
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 782,291,429.00	\$ 776,616,157.00
TOTAL			\$ 784,779,899.00	\$ 779,086,574.00

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	30	10	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMON - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL: oct-25 PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 995 DE 2021 INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	509925	C-2491-0600-132-511020-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 3.600.000.000,00	\$ 2.741.704.400,00
2025	119125	C-2491-0600-132-511020-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 218.395.081,00	-
2025	119125	C-2491-0600-132-511020-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.300.844.988,00	-
2025	119125	C-2491-0600-132-511020-2401008-02	16	NACION	Contrato principal	\$ 18.106.315.587,00	\$ 7.270.284.163,00
2025	126725	C-2491-0600-135-511020-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 6.074.377.314,00	\$ 88.151.472,00
2025	126725	C-2491-0600-135-511020-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.901.546.811,00	\$ 144.659.530,00
2025	126725	C-2491-0600-135-511020-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 135.185.186,00	-
TOTAL						\$ 31.366.696.667,00	\$ 10.244.779.965,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 413.052.964.666,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Año	No. de Acta	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIA	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
														SI NO	
1		OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
1		AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
2		OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
2		AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
3		OBRA	ago-21	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137,00	\$ -	\$ 25.821.137	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00		X	
3		AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00		X	
4		OBRA	sep-21	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518,00	\$ -	\$ 326.243.518	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00		X	
4		AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00		X	
5		OBRA	oct-21	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562,00	\$ -	\$ 152.527.562	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.379.510.886,00	\$ 399.062.844.219,00		X	
5		AJUSTES	oct-21	\$ 2.078.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00	\$ -	\$ 2.091.735	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.377.419.151,00	\$ 399.060.752.484,00		X	
6		OBRA	nov-21	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806,00	\$ -	\$ 376.670.806	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00		X	
6		AJUSTES	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00		X	
ADICION 1															
7		OBRA	dic-21	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980,00	\$ -	\$ 291.042.980	\$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 408.569.609.908,00		X	
7		AJUSTES	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	\$ 9.709.705.365,00	\$ 408.278.566.928,00		X	
8		OBRA	ene-22	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393,00	\$ -	\$ 163.505.393	\$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.379.533.305,00	\$ 408.115.061.535,00		X	
8		AJUSTES	ene-22	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00	\$ -	\$ 2.745.463	\$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.376.787.842,00	\$ 408.112.316.072,00		X	
9		OBRA	feb-22	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856,00	\$ 2.402.243,00	\$ 93.947.613,00	\$ 8.883.125.987,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.282.840.229,00	\$ 408.015.966.216,00		X	
10		OBRA	mar-22	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671,00	\$ 23.853.865,00	\$ 932.883.806,00	\$ 8.859.272.122,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 22.349.956.423,00	\$ 407.059.228.545,00		X	
11		OBRA	abr-22	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641,00	\$ 7.921.421,00	\$ 309.793.220,00	\$ 8.851.350.701,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 22.040.163.203,00	\$ 406.741.513.904,00		X	
12		OBRA	may-22	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227,00	\$ 35.287.500,00	\$ 1.380.033.727,00	\$ 9.816.063.201,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 20.660.129.476,00	\$ 405.326.192.677,00		X	
13		OBRA	jun-22	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450,00	\$ 24.906.210,00	\$ 974.039.240,00	\$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 19.686.090.236,00	\$ 404.327.247.227,00		X	
REFORMACION 12															
14		OBRA	jul-22	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534,00	\$ 54.642.385,00	\$ 2.136.970.149,00	\$ 9.736.514.608,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 17.540.120.087,00	\$ 402.135.634.893,00		X	
15		OBRA	ago-22	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619,00	\$ 35.576.902,00	\$ 1.391.351.717,00	\$ 9.700.937.704,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 16.157.768.370,00	\$ 400.708.706.074,00		X	
16		OBRA	sep-22	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591,00	\$ 39.584.115,00	\$ 1.543.780.476,00	\$ 9.661.353.589,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 14.613.987.894,00	\$ 399.125.341.483,00		X	
17		OBRA	oct-22	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053,00	\$ 30.782.801,00	\$ 1.200.529.252,00	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.413.458.642,00	\$ 397.894.029.430,00		X	
9		AJUSTES	feb-22	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00	\$ -	\$ 1.470.957	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.411.987.685,00	\$ 397.892.558.473,00		X	
10		AJUSTES	mar-22	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00	\$ -	\$ 1.291.488	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.410.696.197,00	\$ 397.891.266.985,00		X	
11		AJUSTES	abr-22	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00	\$ -	\$ 6.437.488	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.404.258.709,00	\$ 397.884.829.497,00		X	
12		AJUSTES	may-22	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00	\$ -	\$ 16.875.556	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.387.383.153,00	\$ 397.867.953.941,00		X	
13		AJUSTES	jun-22	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00	\$ -	\$ 25.582.410	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.361.800.743,00	\$ 397.842.371.531,00		X	
14		AJUSTES	jul-22	\$ 170.596.773,00	\$ 1.246.883,00	\$ 171.843.656,00	\$ -	\$ 171.843.656	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.189.955.287,00	\$ 397.610.526.075,00		X	
15		AJUSTES	ago-22	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00	\$ -	\$ 159.596.215	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.030.359.072,00	\$ 397.510.929.860,00		X	
16		AJUSTES	sep-22	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00	\$ -	\$ 227.121.525	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 12.803.237.547,00	\$ 397.283.808.335,00		X	
17		AJUSTES	oct-22	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00	\$ -	\$ 175.548.289	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 12.627.689.258,00	\$ 397.108.260.046,00		X	
18		OBRA	nov-22	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697,00	\$ 29.606.467,00	\$ 1.154.652.230,00	\$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 11.473.037.028,00	\$ 395.924.001.349,00		X	
18		AJUSTES	nov-22	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00	\$ -	\$ 226.811.374	\$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 11.246.225.654,00	\$ 395.697.189.975,00		X	
19		OBRA	dic-22	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947,00	\$ 36.461.924,00	\$ 1.422.015.023,00	\$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 9.824.210.631,00	\$ 394.238.713.028,00		X	
19		AJUSTES	dic-22	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.989,00	\$ 208.829.221,00	\$ -	\$ 208.829.221	\$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 9.615.381.410,00	\$ 394.029.883.807,00		X	
20		OBRA	ene-23	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996,00	\$ 44.983.350,00	\$ 1.754.350.646,00	\$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 35.627.697.431,00	\$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X	
20		AJUSTES	ene-23	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00	\$ -	\$ 223.670.855	\$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 35.404.026.576,00	\$ 392.006.876.956,00	29633 27/03/2023	X	
21		OBRA	feb-23	\$ 2.349.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.466.852.592,00	\$ 60.171.315,00	\$ 2.406.681.277,00	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 33.057.344.289,00	\$ 389.600.025.364,00		X	
21		AJUSTES	feb-23	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00	\$ -	\$ 485.583.802	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 32.571.761.497,00	\$ 389.114.442.562,00		X	
22		OBRA	mar-23	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555,00	\$ 70.279.784,00	\$ 2.740.910.791	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 29.830.850.706,00	\$ 388.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X	
22		AJUSTES	mar-23	\$ 413.857.639,00	\$ 3.024.344,00	\$ 416.881.983,00	\$ -	\$ 416.881.983	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 29.413.968.723,00	\$ 385.886.370.024,00		X	
23		OBRA	abr-23	\$ 2.969.914.739,00	\$ 21.703.223,00	\$ 2.991.617.962,00	\$ 74.790.449,00	\$ 2.916.827.513	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 26.497.141.210,00	\$ 382.894.752.062,00	64557 de 04/07/2023	X	
23		AJUSTES	abr-23	\$ 671.859.839,00	\$ 4.909.745,00	\$ 676.769.584,00	\$ -	\$ 676.769.584	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 25.820.371.626,00	\$ 382.212.987.478,00	59596 de 20/06/2023	X	
24		OBRA	may-23	\$ 3.807.359.585,00	\$ 27.823.012,00	\$ 3.835.182.597,00	\$ 95.879.565,00	\$ 3.739.303.032	\$ 9.218.337.054	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 28.021.068.594,00	\$ 378.382.799.881,00	68310 de 12/07/2023	X	
24		AJUSTES	may-23	\$ 987.989.317,00	\$ 7.216.776,00	\$ 995.199.133,00	\$ -	\$ 995.199.133	\$ 9.218.337.054	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 21.085.879.461,00	\$ 378.003.618.146,00	7573 de 04/08/2023	X	
25		OBRA	jun-23	\$ 2.937.830.604,00	\$ 21.405.972,00	\$ 2.959.236.576,00	\$ 73.766.107,00	\$ 2.885.469.469	\$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 26.099.289.262,00	\$ 377.188.966.474,00	79946 de 12/09/2023	X	
26		OBRA	jun-23	\$ 3.820.505.317,00	\$ 28.657.540,00	\$ 3.849.162.857,00	\$ 91.174.076,00	\$ 3.758.988.781,00	\$ 9.053.497.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 14.663.712.311,00	\$ 370.000.043.150,00	80962 de 31/08/2023	X	
26		AJUSTES	jun-23	\$ 726.653.150,00	\$ 5.310.158,00	\$ 731.963.308,00	\$ -	\$ 731.963.308	\$ 9.053.497.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 13.921.249.053,00	\$ 370.058.040.107,00	81178 de 19/09/2023	X	
26		OBRA	jul-23	\$ 974.606.525,00	\$ 7.122.125,00	\$ 981.728.654,00	\$ -	\$ 981.728.654	\$ 9.053.497.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 12.939.520.358,00	\$ 369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X	
27		OBRA	ago-23	\$ 2.932.713.891,00	\$ 21.431.371,00	\$ 2.954.145.262,00	\$ 73.853.632,00	\$ 2.880.291.630	\$ 8.979.664.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 10.059.228.728,00	\$ 362.126.166.200,00	82843 de 02/10/2023	X	</



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-8		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	2
FECHA	30	10	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMON - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: oct-25

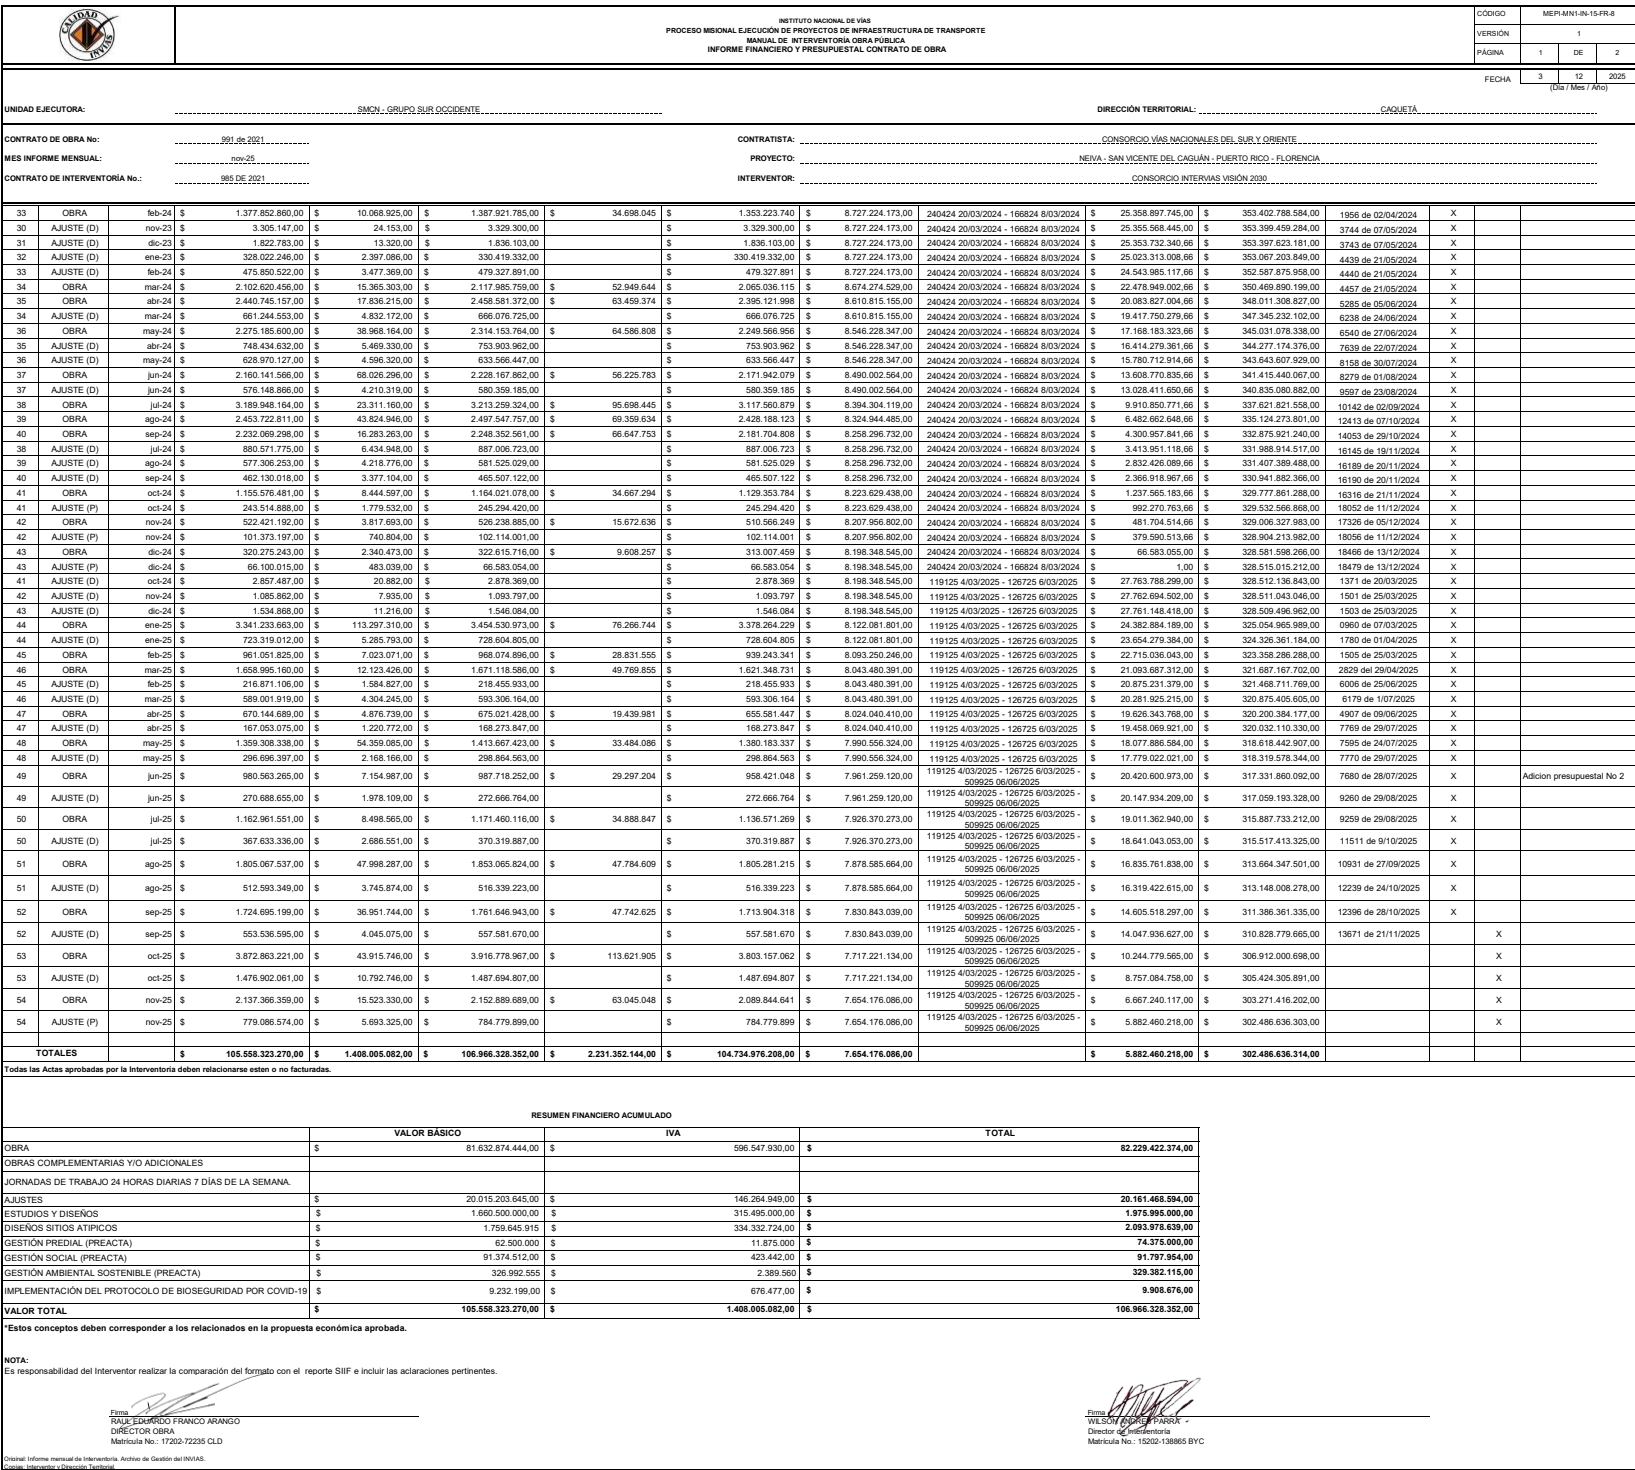
PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 985 de 2021

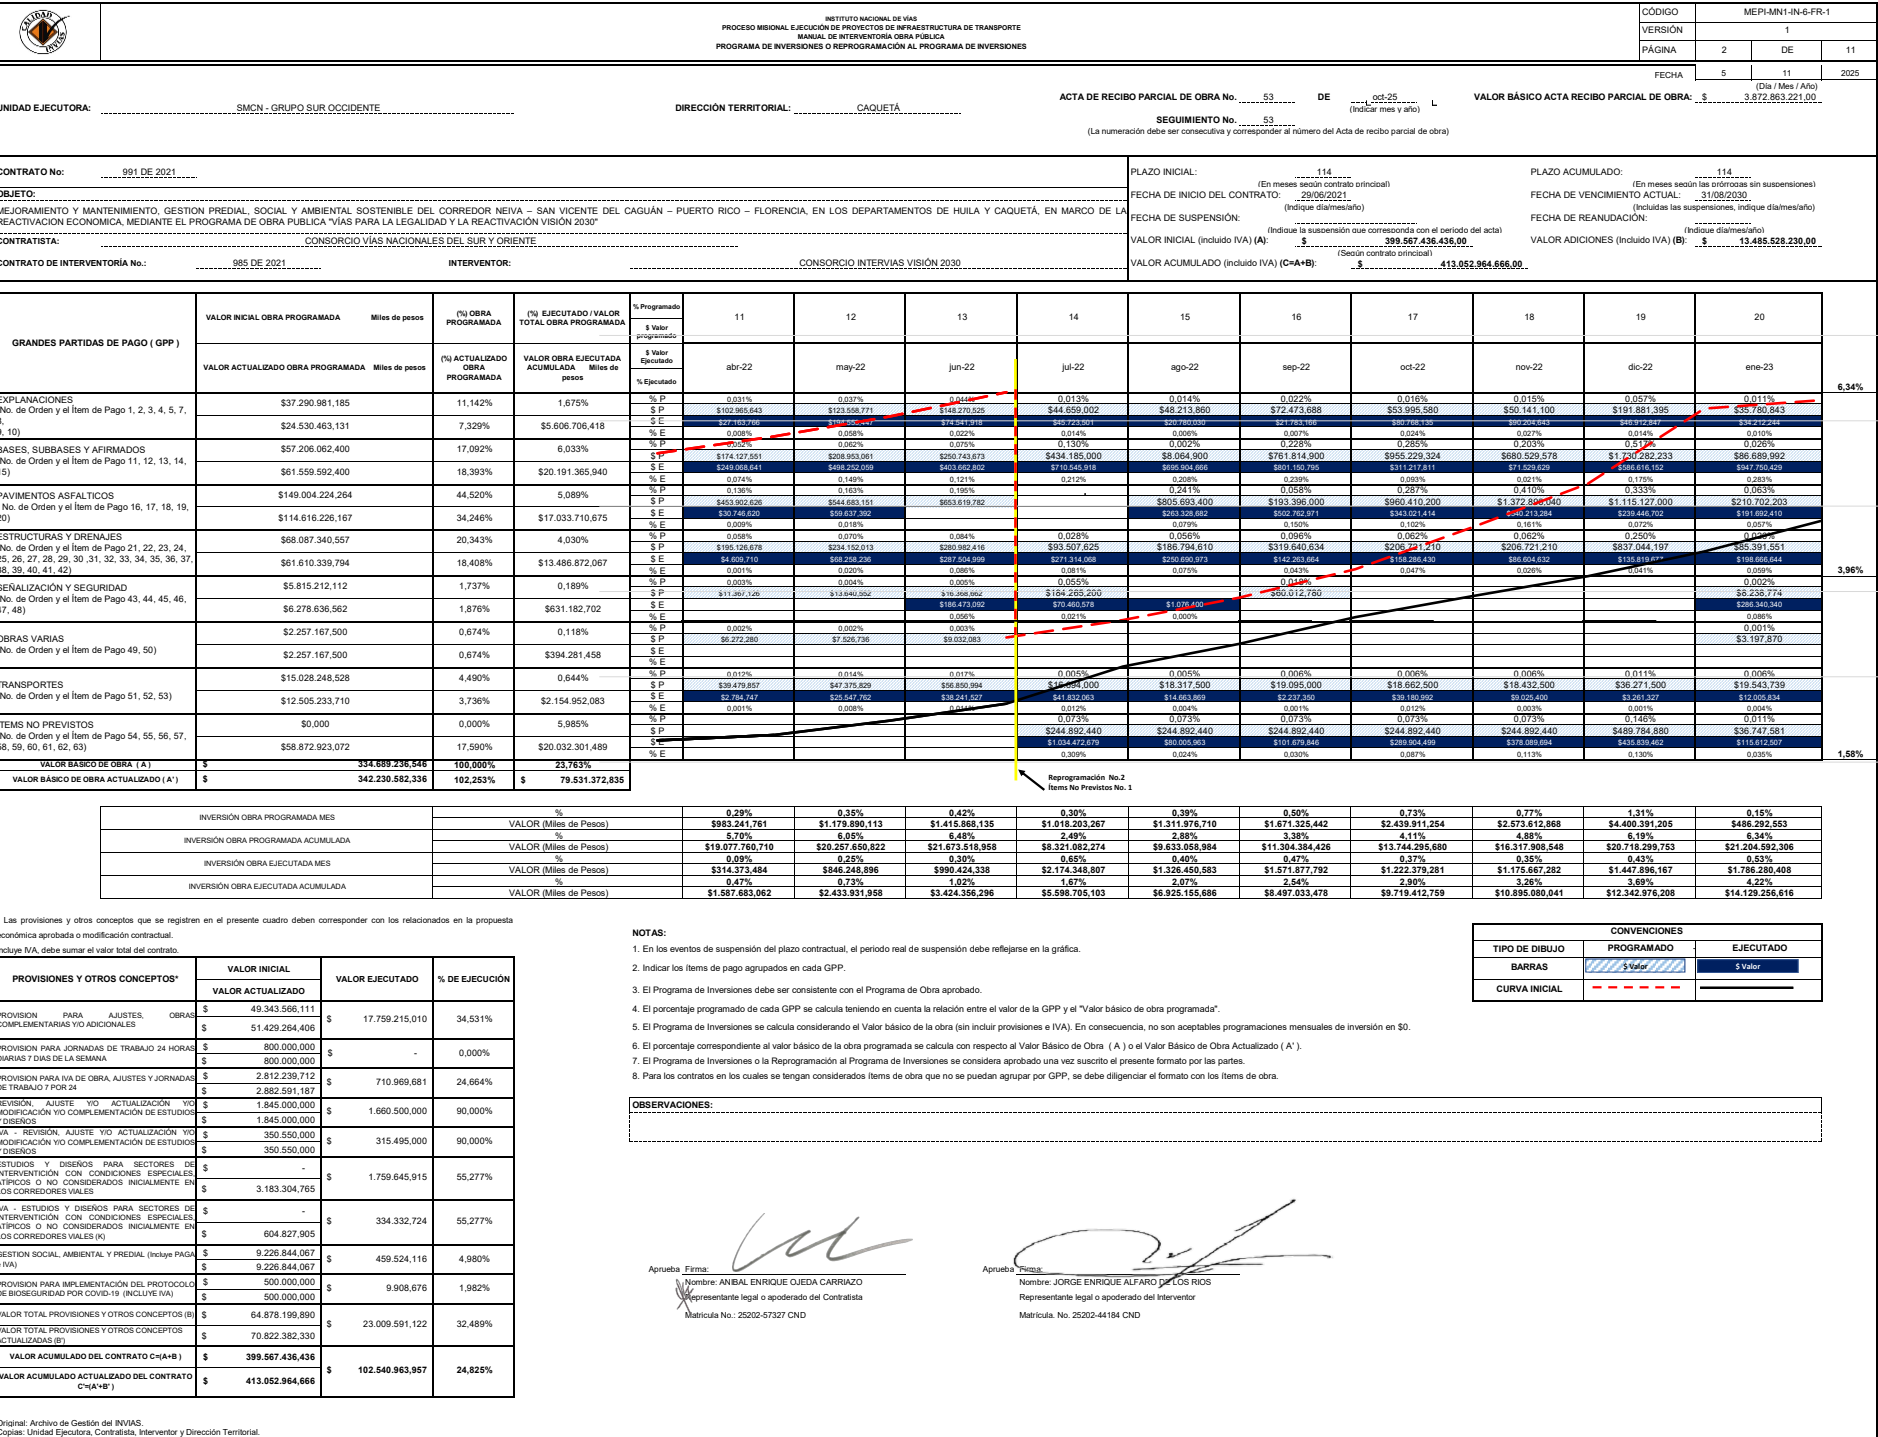
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

33	OBRA	feb-24	1,377,852,860.00	\$	10,068,925.00	\$	1,387,921,785.00	\$	34,698,045	\$	1,353,223,740	\$	8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	25,358,897,745.00	\$	353,402,786,584.00	1956 de 02/04/2024	X	
30	AJUSTE (D)	nov-23	3,305,147.00	\$	24,153.00	\$	3,329,300.00	\$		\$	3,329,300.00	\$	8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	25,355,568,445.00	\$	353,399,459,284.00	3744 de 07/05/2024	X	
31	AJUSTE (D)	dic-23	1,822,783.00	\$	13,320.00	\$	1,836,103.00	\$		\$	1,836,103.00	\$	8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	25,353,732,340.66	\$	353,397,623,181.00	3743 de 07/05/2024	X	
32	AJUSTE (D)	ene-23	328,022,246.00	\$	2,397,086.00	\$	330,419,332.00	\$		\$	330,419,332.00	\$	8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	25,023,313,008.66	\$	353,067,203,849.00	4439 de 21/05/2024	X	
33	AJUSTE (D)	feb-24	475,850,522.00	\$	3,477,369.00	\$	479,327,891.00	\$		\$	479,327,891.00	\$	8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	24,543,985,117.66	\$	352,587,875,958.00	4440 de 21/05/2024	X	
34	OBRA	mar-24	2,102,620,456.00	\$	15,365,303.00	\$	2,117,985,759.00	\$	52,949,644	\$	2,065,036,115	\$	8,674,274,529.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	22,478,949,002.66	\$	350,469,890,199.00	4457 de 21/05/2024	X	
35	OBRA	abr-24	2,440,745,157.00	\$	17,836,215.00	\$	2,458,581,372.00	\$	63,459,374	\$	2,395,121,998	\$	8,610,815,155.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	20,083,827,004.66	\$	348,011,308,827.00	5285 de 05/06/2024	X	
34	AJUSTE (D)	mar-24	661,244,553.00	\$	4,832,172.00	\$	666,076,725.00	\$		\$	666,076,725	\$	8,610,815,155.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	19,417,750,279.66	\$	347,345,232,102.00	6238 de 24/06/2024	X	
36	OBRA	may-24	2,275,185,660.00	\$	38,968,164.00	\$	2,314,153,744.00	\$	64,586,808	\$	2,249,566,956	\$	8,546,228,347.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	17,168,183,323.66	\$	345,031,078,338.00	6540 de 27/06/2024	X	
35	AJUSTE (D)	abr-24	748,434,632.00	\$	5,469,330.00	\$	753,903,962.00	\$		\$	753,903,962	\$	8,546,228,347.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	16,414,279,361.66	\$	344,277,174,376.00	7639 de 22/07/2024	X	
36	AJUSTE (D)	may-24	628,970,127.00	\$	4,596,320.00	\$	633,566,447.00	\$		\$	633,566,447	\$	8,546,228,347.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	15,780,712,914.66	\$	343,643,607,929.00	8158 de 30/07/2024	X	
37	OBRA	jun-24	2,160,141,566.00	\$	68,026,296.00	\$	2,228,167,862.00	\$	56,225,783	\$	2,171,942,079	\$	8,490,002,564.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	13,608,770,835.66	\$	341,415,440,067.00	8279 de 01/08/2024	X	
37	AJUSTE (D)	jun-24	576,148,866.00	\$	4,210,319.00	\$	580,359,185.00	\$		\$	580,359,185	\$	8,490,002,564.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	13,028,411,650.66	\$	340,835,080,882.00	8987 de 23/08/2024	X	
38	OBRA	jul-24	3,189,948,164.00	\$	23,311,160.00	\$	3,213,259,324.00	\$	95,698,445	\$	3,117,560,879	\$	8,394,304,119.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	9,910,850,771.66	\$	337,621,821,558.00	10142 de 02/09/2024	X	
39	OBRA	ago-24	2,453,722,811.00	\$	43,824,946.00	\$	2,497,547,757.00	\$	69,359,634	\$	2,428,188,123	\$	8,324,944,485.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	6,482,662,648.66	\$	335,124,273,801.00	12413 de 07/10/2024	X	
40	OBRA	sep-24	2,232,069,298.00	\$	16,283,263.00	\$	2,248,352,561.00	\$	66,647,753	\$	2,181,704,808	\$	8,258,296,732.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	4,300,957,841.66	\$	332,875,921,240.00	14053 de 29/10/2024	X	
38	AJUSTE (D)	jul-24	880,571,775.00	\$	6,434,948.00	\$	887,006,723.00	\$		\$	887,006,723	\$	8,258,296,732.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	3,413,951,118.66	\$	331,988,914,517.00	16145 de 19/11/2024	X	
39	AJUSTE (D)	ago-24	577,306,253.00	\$	4,218,776.00	\$	581,525,029.00	\$		\$	581,525,029	\$	8,258,296,732.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	2,832,426,089.66	\$	331,407,389,488.00	16189 de 20/11/2024	X	
40	AJUSTE (D)	sep-24	462,130,018.00	\$	3,377,104.00	\$	465,507,122.00	\$		\$	465,507,122	\$	8,258,296,732.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	2,366,918,967.66	\$	330,941,882,366.00	16190 de 20/11/2024	X	
41	OBRA	oct-24	1,155,576,481.00	\$	8,444,597.00	\$	1,164,021,078.00	\$	34,667,294	\$	1,129,353,784	\$	8,223,629,438.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	1,237,565,183.66	\$	329,777,861,288.00	16316 de 11/12/2024	X	
41	AJUSTE (P)	oct-24	243,514,888.00	\$	1,779,532.00	\$	245,294,420.00	\$		\$	245,294,420	\$	8,223,629,438.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	992,270,763.66	\$	329,532,566,868.00	18052 de 11/12/2024	X	
42	OBRA	nov-24	522,421,192.00	\$	3,817,693.00	\$	526,238,885.00	\$	15,672,636	\$	510,566,249	\$	8,207,956,802.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	481,704,514.66	\$	328,006,327,983.00	17326 de 05/12/2024	X	
42	AJUSTE (P)	nov-24	101,373,197.00	\$	740,804.00	\$	102,114,001.00	\$		\$	102,114,001	\$	8,207,956,802.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	379,590,513.66	\$	328,904,213,982.00	18056 de 11/12/2024	X	
43	OBRA	dic-24	330,275,243.00	\$	2,340,473.00	\$	332,615,716.00	\$	9,608,257	\$	313,007,459	\$	8,198,348,545.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	66,583,055.00	\$	328,581,586,286.00	18466 de 13/12/2024	X	
43	AJUSTE (P)	dic-24	66,100,015.00	\$	483,039.00	\$	66,583,054.00	\$		\$	66,583,054	\$	8,198,348,545.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	\$	1.00	\$	328,515,015,212.00	18479 de 13/12/2024	X	
41	AJUSTE (D)	oct-24	2,857,487.00	\$	20,862.00	\$	2,878,369.00	\$		\$	2,878,369	\$	8,198,348,545.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	27,763,788,299.00	\$	328,512,136,843.00	1371 de 20/03/2025	X	
42	AJUSTE (D)	nov-24	1,085,862.00	\$	7,935.00	\$	1,093,797.00	\$		\$	1,093,797	\$	8,198,348,545.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	27,762,694,502.00	\$	328,511,043,046.00	1501 de 25/03/2025	X	
43	AJUSTE (D)	dic-24	1,534,868.00	\$	11,216.00	\$	1,546,084.00	\$		\$	1,546,084	\$	8,198,348,545.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	27,761,148,418.00	\$	328,509,496,962.00	1503 de 25/03/2025	X	
44	OBRA	ene-25	3,341,233,663.00	\$	113,297,310.00	\$	3,454,530,973.00	\$	76,266,744	\$	3,378,264,229	\$	8,122,081,801.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	24,382,884,189.00	\$	325,054,965,989.00	0960 de 07/03/2025	X	
44	AJUSTE (D)	ene-25	723,319,012.00	\$	5,285,793.00	\$	728,604,805.00	\$		\$	728,604,805	\$	8,122,081,801.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	23,654,279,384.00	\$	324,326,361,184.00	1780 de 01/04/2025	X	
45	OBRA	feb-25	961,051,825.00	\$	7,023,071.00	\$	968,074,896.00	\$	28,831,555	\$	939,243,341	\$	8,093,250,246.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	22,715,036,043.00	\$	323,358,286,288.00	1505 de 25/03/2025	X	
46	OBRA	mar-25	1,658,995,160.00	\$	12,123,426.00	\$	1,671,118,586.00	\$	49,769,855	\$	1,621,348,731	\$	8,043,480,391.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	21,093,887,312.00	\$	321,687,167,702.00	2829 de 29/04/2025	X	
45	AJUSTE (D)	feb-25	216,871,106.00	\$	1,584,827.00	\$	218,455,933.00	\$		\$	218,455,933	\$	8,043,480,391.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	20,875,231,379.00	\$	321,468,711,769.00	6006 de 25/06/2025	X	
46	AJUSTE (D)	mar-25	589,001,919.00	\$	4,304,245.00	\$	593,306,164.00	\$		\$	593,306,164	\$	8,043,480,391.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	20,281,925,215.00	\$	320,875,405,605.00	6179 de 10/07/2025	X	
47	OBRA	abr-25	670,144,889.00	\$	4,876,739.00	\$	675,021,628.00	\$	19,439,981	\$	655,581,447	\$	8,024,040,410.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	19,626,343,768.00	\$	320,200,384,177.00	4907 de 09/06/2025	X	
47	AJUSTE (D)	abr-25	167,653,075.00	\$	1,220,772.00	\$	168,873,847.00	\$		\$	168,873,847	\$	8,024,040,410.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	19,458,969,921.00	\$	320,032,110,339.00	7769 de 29/07/2025	X	
48	OBRA	may-25	1,359,368,338.00	\$	54,359,085.00	\$	1,413,667,423.00	\$	33,484,086	\$	1,380,183,337	\$	7,990,556,324.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	18,077,886,584.00	\$	318,618,442,907.00	7595 de 24/07/2025	X	
48	AJUSTE (D)	may-25	296,696,397.00	\$	2,168,166.00	\$	298,864,563.00	\$		\$	298,864,563	\$	7,990,556,324.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	\$	17,779,022,021.00	\$	318,319,578,344.00	7770 de 29/07/2025	X	
49	OBRA	jun-25	980,563,265.00	\$	7,154,987.00	\$	987,718,252.00	\$	29,297,204	\$	958,421,048	\$	7,961,259,120.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	\$	20,420,600,973.00	\$	317,331,860,092.00	7680 de 28/07/2025	X	Adicion presupuestal No 2
49	AJUSTE (D)	jun-25	270,688,655.00	\$	1,978,109.00	\$	272,666,764.00	\$		\$	272,666,764	\$	7,961,259,120.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	\$	20,147,934,209.00	\$	317,059,193,328.00	9260 de 29/08/2025	X	
50	OBRA	jul-25	1,162,961,551.00	\$	8,498,565.00	\$	1,171,460,116.00	\$	34,888,847	\$	1,136,571,269	\$	7,926,370,273.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	\$	19,011,362,940.00	\$	315,887,733,212.00	9259 de 29/08/2025	X	

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MESIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEP/MI-1N-15-FR-8														
										VERSIÓN		1														
										PÁGINA		1	DE 2													
										FECHA		3	12 2025													
										(Us\$ / Mes / Año)																
UNIDAD EJECUTORA:.....SMON - GRUPO SUR OCCIDENTE.....										DIRECCIÓN TERRITORIAL:.....CAQUETA.....																
CONTRATO DE OBRA No:.....991_06_2021.....										CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.....																
MES INFORME MENSUAL:.....2025-05.....										NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGHAN - PUERTO RICO - FLORENCIA.....																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:.....985 DE 2021.....										CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030.....																
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																										
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior													
2025		109208	C-2461-9600-132-611020-34010923-02			11	NACION			Contrato principal		\$ 3.600.000.000,00	\$ 1.967.537.501,00													
2025		119125	C-2461-9600-132-611020-34010923-02			11	NACION			Contrato principal		\$ 218.395.061,00	\$ -													
2025		119125	C-2461-9600-132-611020-34010917-02			11	NACION			Contrato principal		\$ 1.330.844.008,00	\$ -													
2025		119125	C-2461-9600-132-611020-34010908-02			16	NACION			Contrato principal		\$ 18.106.515.587,00	\$ 4.697.214.127,00													
2025		126725	C-2461-9600-133-611020-34010908-02			11	NACION			Contrato principal		\$ 6.074.377.314,00	\$ -													
2025		126725	C-2461-9600-135-611020-34010917-02			11	NACION			Contrato principal		\$ 1.901.548.611,00	\$ 2.488.469,00													
2025		126725	C-2461-9600-135-611020-34010923-02			11	NACION			Contrato principal		\$ 135.185.186,00	\$ -													
							TOTAL					\$ 31.366.066.067,00	\$ 6.667.240.117,00													
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:.....\$.....413.062.964.666,00.....																										
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																										
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA		Valor IVA		Valor Total Ejecutado Acumulado Acta		Anticipo Amortizado Acta		Valor Total Pagado Descontando Anticipo		Saldo Anticipo por Amortizar		No. de Registro y fecha		Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)		Saldo del Contrato		No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SHF		Observaciones	
1	OBRA	jun-21	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00		\$ 399.567.436.436,00				X			
1	AJUSTES	jun-21	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00		\$ 399.567.436.436,00				X			
2	OBRA	jul-21	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00		\$ 399.567.436.436,00				X			
2	AJUSTES	jul-21	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00		\$ 399.567.436.436,00				X			
3	OBRA	ago-21	\$ 25.633.813,00		\$ 187.324,00		\$ 25.821.137,00		\$ -		\$ 25.821.137		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00		\$ 399.541.615.299,00				X			
3	AJUSTES	ago-21	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00		\$ 399.541.615.299,00				X			
4	OBRA	sep-21	\$ 290.414.527,00		\$ 35.828.991,00		\$ 326.243.518,00		\$ -		\$ 326.243.518		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00		\$ 399.215.371.781,00				X			
4	AJUSTES	sep-21	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00		\$ 399.215.371.781,00				X			
5	OBRA	oct-21	\$ 151.421.024,00		\$ 1.106.538,00		\$ 152.527.562,00		\$ -		\$ 152.527.562		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.379.510.886,00		\$ 399.062.844.219,00				X			
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2.076.560,00		\$ 15.175,00		\$ 2.091.735,00		\$ -		\$ 2.091.735		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.377.419.151,00		\$ 399.060.752.484,00				X			
6	OBRA	nov-21	\$ 373.938.181,00		\$ 2.732.625,00		\$ 376.670.806,00		\$ -		\$ 376.670.806		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00		\$ 398.684.081.678,00				X			
6	AJUSTES	nov-21	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		-	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00		\$ 398.684.081.678,00				X			
ADICIÓN 1		dic-21					\$ -		\$ -		\$ -		\$ 9.885.528.230,00		-	245321 18/12/2021	\$ 10.000.748.345,00		\$ 408.569.609.908,00				X			
7	OBRA	dic-21	\$ 288.931.557,00		\$ 2.111.423,00		\$ 291.042.980,00		\$ -		\$ 291.042.980		\$ 9.885.528.230,00		-	245321 18/12/2021	\$ 9.709.705.365,00		\$ 408.278.566.928,00				X			
7	AJUSTES	dic-21	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 9.885.528.230,00		-	245321 18/12/2021	\$ 9.709.705.365,00		\$ 408.278.566.928,00				X			
8	OBRA	ene-22	\$ 162.319.214,00		\$ 1.186.179,00		\$ 163.505.393,00		\$ -		\$ 163.505.393		\$ 9.885.528.230,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.379.533.305,00		\$ 408.115.061.535,00				X			
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2.725.546,00		\$ 19.917,00		\$ 2.745.463,00		\$ -		\$ 2.745.463		\$ 9.885.528.230,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.376.787.842,00		\$ 408.112.316.072,00				X			
9	OBRA	feb-22	\$ 95.030.846,00		\$ 1.319.010,00		\$ 96.349.856,00		\$ 2.402.243,00		\$ 93.947.613,00		\$ 9.883.125.987,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.282.840.229,00		\$ 408.015.966.216,00				X			
10	OBRA	mar-22	\$ 815.420.772,00		\$ 141.316.899,00		\$ 956.737.671,00		\$ 23.853.865,00		\$ 932.883.806,00		\$ 9.859.272.122,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 22.349.956.423,00		\$ 407.059.228.545,00				X			
11	OBRA	abr-22	\$ 315.412.461,00		\$ 2.302.160,00		\$ 317.714.641,00		\$ 7.921.421,00		\$ 309.793.720,00		\$ 9.851.350.701,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 22.040.163.203,00		\$ 406.741.513.904,00				X			
12	OBRA	may-22	\$ 1.319.446.250,00		\$ 96.874.977,00		\$ 1.415.321.227,00		\$ 35.287.500,00		\$ 1.380.033.727,00		\$ 9.816.063.201,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 20.860.129.476,00		\$ 405.326.192.677,00				X			
12	OBRA	jun-22	\$ 991.701.814,00		\$ 7.243.636,00		\$ 998.945.450,00		\$ 24.906.210,00		\$ 974.039.240,00		\$ 9.791.156.991,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 19.686.090.236,00		\$ 404.327.247.227,00				X			
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22					\$ -		\$ -		\$ -		\$ 9.791.156.991,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 19.686.090.236,00		\$ 404.327.247.227,00				X			
14	OBRA	jul-22	\$ 2.175.716.723,00		\$ 15.895.811,00		\$ 2.191.612.534,00		\$ 54.642.385,00		\$ 2.136.970.149,00		\$ 9.736.514.606,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 17.549.120.087,00		\$ 402.135.634.693,00				X			
15	OBRA	ago-22	\$ 1.402.740.283,00		\$ 24.188.336,00		\$ 1.426.928.619,00		\$ 35.576.902,00		\$ 1.391.351.717,00		\$ 9.700.937.704,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 16.157.768.370,00		\$ 400.708.706.074,00				X			
16	OBRA	sep-22	\$ 1.571.877.792,00		\$ 11.486.799,00		\$ 1.583.364.591,00		\$ 39.584.115,00		\$ 1.543.780.476,00		\$ 9.661.353.589,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 14.613.987.894,00		\$ 399.125.341.483,00				X			
17	OBRA	oct-22	\$ 1.222.379.281,00		\$ 8.932.772,00		\$ 1.231.312.053,00		\$ 30.782.801,00		\$ 1.200.529.252,00		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.413.458.642,00		\$ 397.894.029.430,00				X			
9	AJUSTES	feb-22	\$ 1.460.286,00		\$ 10.671,00		\$ 1.470.957,00		\$ -		\$ 1.470.957		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.411.987.685,00		\$ 397.892.558.473,00				X			
10	AJUSTES	mar-22	\$ 1.282.119,00		\$ 9.369,00		\$ 1.291.488,00		\$ -		\$ 1.291.488		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.410.696.197,00		\$ 397.891.266.985,00				X			
11	AJUSTES	abr-22	\$ 6.390.786,00		\$ 46.702,00		\$ 6.437.488,00		\$ -		\$ 6.437.488		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.404.258.709,00		\$ 397.884.829.497,00				X			
12	AJUSTES	may-22	\$ 16.753.129,00		\$ 122.427,00		\$ 16.875.556,00		\$ -		\$ 16.875.556		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.387.383.153,00		\$ 397.887.953.941,00				X			
13	AJUSTES	jun-22	\$ 25.396.916,00		\$ 185.592,00		\$ 25.582.510,00		\$ -		\$ 25.582.510		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.361.880.743,00		\$ 397.842.371.531,00				X			
14	AJUSTES	jul-22	\$ 170.598.773,00		\$ 1.246.863,00		\$ 171.845.636,00		\$ -		\$ 171.845.636		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.189.965.287,00		\$ 397.670.526.075,00				X			
15	AJUSTES	ago-22	\$ 158.438.396,00		\$ 1.157.819,00		\$ 159.596.215,00		\$ -		\$ 159.596.215		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.030.359.072,00		\$ 397.510.929.860,00				X			
16	AJUSTES	sep-22	\$ 225.473.832,00		\$ 1.647.893,00		\$ 227.121.525,00		\$ -		\$ 227.121.525		\$ 9.630.570.788,00		-	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 12.803.237.547,00		\$ 397.283.808.335,00				X			
17	AJUSTES	oct-22	\$ 174.274.74.7																							



[illegible]



UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 DE 005-25 L VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3.872.863.221,00

SEGUIMIENTO No. 53

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato original)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las órdenes sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2020 (Inclúyase las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.587.436.436,00 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.485.528.230,00 (Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00 (Según contrato original)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Valor programado	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
					% Ejecutado											
EXPLANACIONES (No. de Orden y el ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10)	\$37.290.981.185		11,142%	1,675%	S P \$35.780.944 S E 150.212.366 % P 0,017% % E 0,026%	0,0111% 0,0227% 0,0245% 0,0385%	0,0227% \$69.452.111 0,0281% 0,0284%	0,0245% \$79.530.258 0,0284% 0,0284%	0,0385% \$126.928.412 0,0284% 0,0284%	0,0385% \$126.928.412 0,0284% 0,0284%	0,0417% \$158.860.515 0,0284% 0,0284%	0,047% \$158.860.515 0,0284% 0,0284%	0,052% \$174.526.567 0,0284% 0,0284%	0,052% \$174.526.567 0,0284% 0,0284%	0,056% \$199.458.622 0,0284% 0,0284%	12,44%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062.400		17,092%	6,033%	S P \$86.689.992 S E 148.683.374 % P 0,026% % E 0,026%	\$216.724.981 \$1.344.247.560 0,020% 0,020%	\$18.038.320 \$1.038.014.650 0,020% 0,020%	\$348.861.312 \$1.034.076.561 0,020% 0,020%	\$348.861.312 \$1.034.076.561 0,020% 0,020%	\$348.861.312 \$1.034.076.561 0,020% 0,020%	\$436.076.641 \$436.076.641 0,020% 0,020%	\$436.076.641 \$436.076.641 0,020% 0,020%	\$479.684.005 \$479.684.005 0,020% 0,020%	\$479.684.005 \$479.684.005 0,020% 0,020%	\$610.507.297 \$610.507.297 0,020% 0,020%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	\$149.004.224.264		44,520%	5,089%	S P \$210.702.702 S E 1.010.630.239 % P 0,026% % E 0,026%	\$204.004.004 \$626.755.511 0,020% 0,020%	\$502.023.263 \$803.237.221 0,020% 0,020%	\$803.237.221 \$1.024.34.124 0,020% 0,020%	\$803.237.221 \$1.024.34.124 0,020% 0,020%	\$803.237.221 \$1.024.34.124 0,020% 0,020%	\$1.004.408.526 \$1.004.408.526 0,020% 0,020%	\$1.004.408.526 \$1.004.408.526 0,020% 0,020%	\$1.004.451.179 \$1.004.451.179 0,020% 0,020%	\$1.004.451.179 \$1.004.451.179 0,020% 0,020%	\$1.405.665.137 \$1.405.665.137 0,020% 0,020%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340.557		20,343%	4,030%	S P \$85.391.552 S E 123.043.458 % P 0,026% % E 0,026%	\$213.478.879 \$142.913.537 0,020% 0,020%	\$217.292.450 \$126.074.707 0,020% 0,020%	\$347.667.888 \$347.667.888 0,020% 0,020%	\$347.667.888 \$347.667.888 0,020% 0,020%	\$347.667.888 \$347.667.888 0,020% 0,020%	\$434.584.860 \$434.584.860 0,020% 0,020%	\$434.584.860 \$434.584.860 0,020% 0,020%	\$434.584.860 \$434.584.860 0,020% 0,020%	\$434.584.860 \$434.584.860 0,020% 0,020%	\$608.418.804 \$608.418.804 0,020% 0,020%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5.815.212.112		1,737%	0,189%	S P \$8.238.775 S E 66.278.636,562 % P 0,002% % E 0,002%	\$20.596.938 \$22.338.444 0,001% 0,001%	\$35.581.350 \$35.581.350 0,001% 0,001%	\$35.581.350 \$35.581.350 0,001% 0,001%	\$35.581.350 \$35.581.350 0,001% 0,001%	\$35.581.350 \$35.581.350 0,001% 0,001%	\$44.476.687 \$44.476.687 0,001% 0,001%	\$44.476.687 \$44.476.687 0,001% 0,001%	\$44.476.687 \$44.476.687 0,001% 0,001%	\$44.476.687 \$44.476.687 0,001% 0,001%	\$62.267.362 \$62.267.362 0,001% 0,001%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el ítem de Pago 49, 50)	\$2.257.167.500		0,674%	0,118%	S P \$3.197.870 S E 143.070.070 % P 0,001% % E 0,001%	\$7.994.075 \$143.070.070 0,001% 0,001%	\$12.791.482 \$12.791.482 0,001% 0,001%	\$12.791.482 \$12.791.482 0,001% 0,001%	\$12.791.482 \$12.791.482 0,001% 0,001%	\$12.791.482 \$12.791.482 0,001% 0,001%	\$15.989.353 \$15.989.353 0,001% 0,001%	\$15.989.353 \$15.989.353 0,001% 0,001%	\$15.989.353 \$15.989.353 0,001% 0,001%	\$15.989.353 \$15.989.353 0,001% 0,001%	\$23.358.094 \$23.358.094 0,001% 0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el ítem de Pago 51, 52, 53)	\$15.028.248.528		4,409%	0,644%	S P \$19.543.739 S E 143.070.070 % P 0,006% % E 0,006%	\$48.859.346 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$43.798.037 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$70.076.859 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$70.076.859 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$70.076.859 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$87.596.074 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$87.596.074 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$87.596.074 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$87.596.074 \$143.070.070 0,006% 0,006%	\$122.834.503 \$122.834.503 0,006% 0,006%	
ÍTEMES NO PREVISTOS (No. de Orden y el ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0.000		3,736%	0,985%	S P \$36.171 S E 123.043.458 % P 0,003% % E 0,003%	\$61.888.954 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$125.016.069 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$200.125.711 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$200.125.711 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$200.125.711 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$250.032.139 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$250.032.139 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$250.032.139 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$250.032.139 \$123.043.458 0,003% 0,003%	\$350.044.994 \$123.043.458 0,003% 0,003%	4,22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$	334.689.236.546	100,000%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$	342.230.682.336	102,253%	\$	79.531.372,835											
Reprogramación No.3 Estudios y Diseños reprogr. no considerados inicialmente Ítem N° 42																Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	\$486.292.557	\$1.215.731.395	\$1.215.731.397	\$1.945.170.235	\$1.945.170.235	\$2.431.462.795	\$2.431.462.795	\$2.674.609.075	\$2.674.609.075	\$3.404.047.912
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	\$21.690.884.863	\$22.908.616.258	\$24.122.347.655	\$26.067.517.890	\$28.012.698.125	\$30.444.150.920	\$32.875.613.715	\$35.550.222.790	\$38.224.831.865	\$41.628.978.777
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	\$71%	0,83%	0,89%	1,14%	0,88%	1,08%	0,88%	0,80%	0,59%	0,40%
	%	\$4.84%	5,77%	6,86%	7,79%	8,67%	9,75%	10,63%	11,43%	12,02%	12,42%
	%	\$16.518.646.269	\$19.308.444.544	\$22.279.359.282	\$26.086.718.867	\$29.015.957.171	\$32.636.462.685	\$35.568.176.576	\$38.263.288.131	\$40.236.655.341	\$41.578.750.227

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Indique IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566.111	\$ 17.759.215.010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 800.000.000	\$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.812.239.712	\$ 710.969.681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000.000	\$ 1.660.500.000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350.550.000	\$ 315.495.000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATRÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES	\$ -	\$ 1.759.645.915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATRÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (K)	\$ 604.827.905	\$ 334.332.724	55,277%
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Indique PAGA E IVA)	\$ 9.226.844.067	\$ 459.524.116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVA IVA)	\$ 500.000.000	\$ 9.908.676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199.890	\$ 23.009.591.122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 70.822.382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)	\$ 399.587.436.436		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'(A'+B')	\$ 413.052.964.666		24,825%

- NOTAS:
- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
 - Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
 - El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
 - El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
 - El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
 - El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
 - El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 - Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.


OBSERVACIONES:

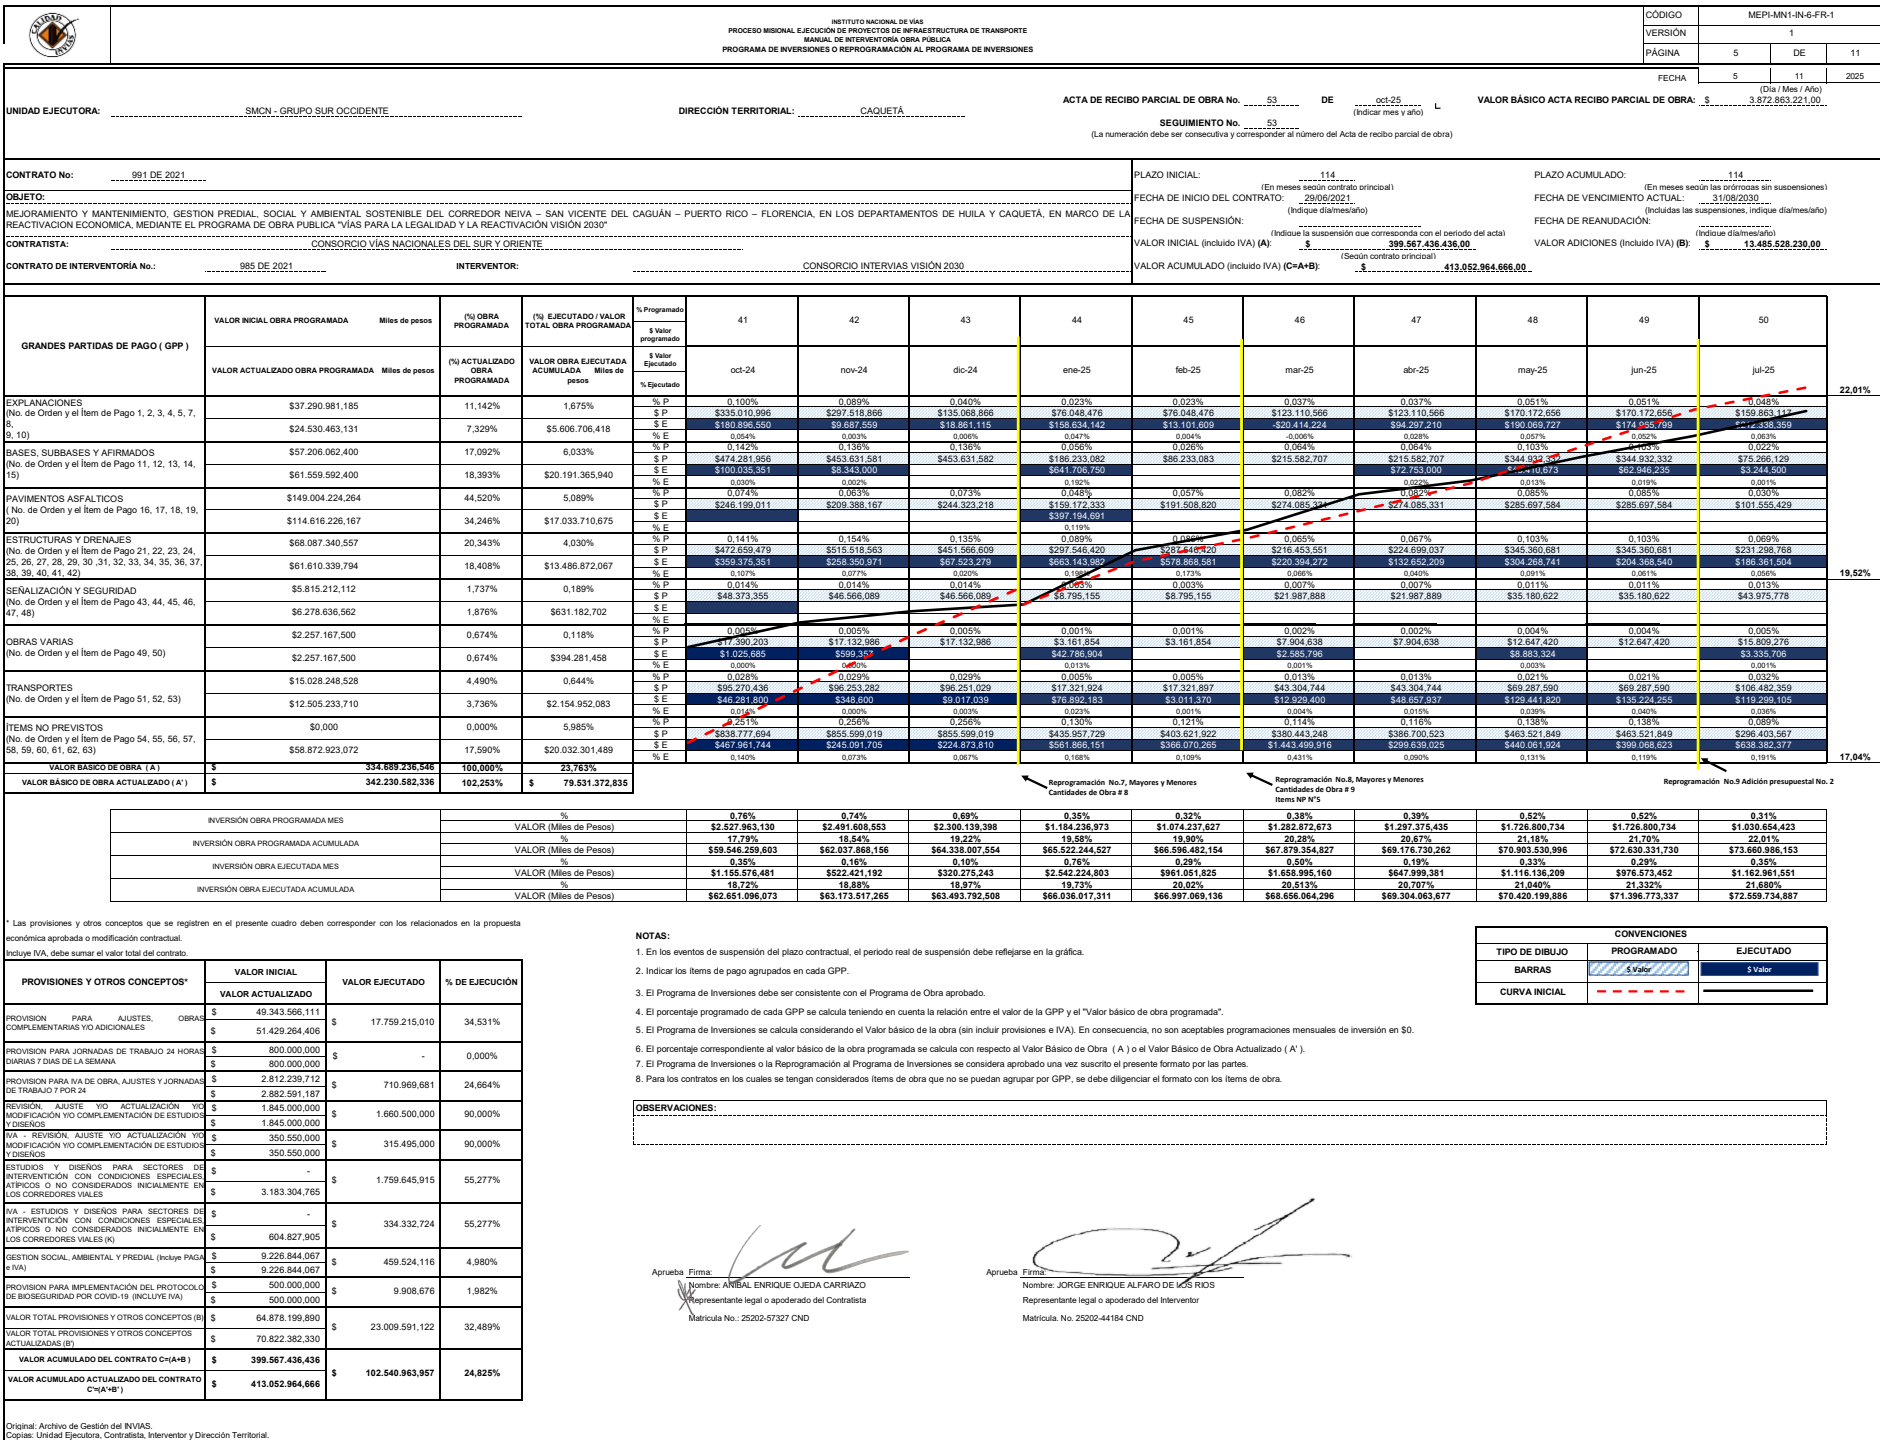
Aprueba Firma: 

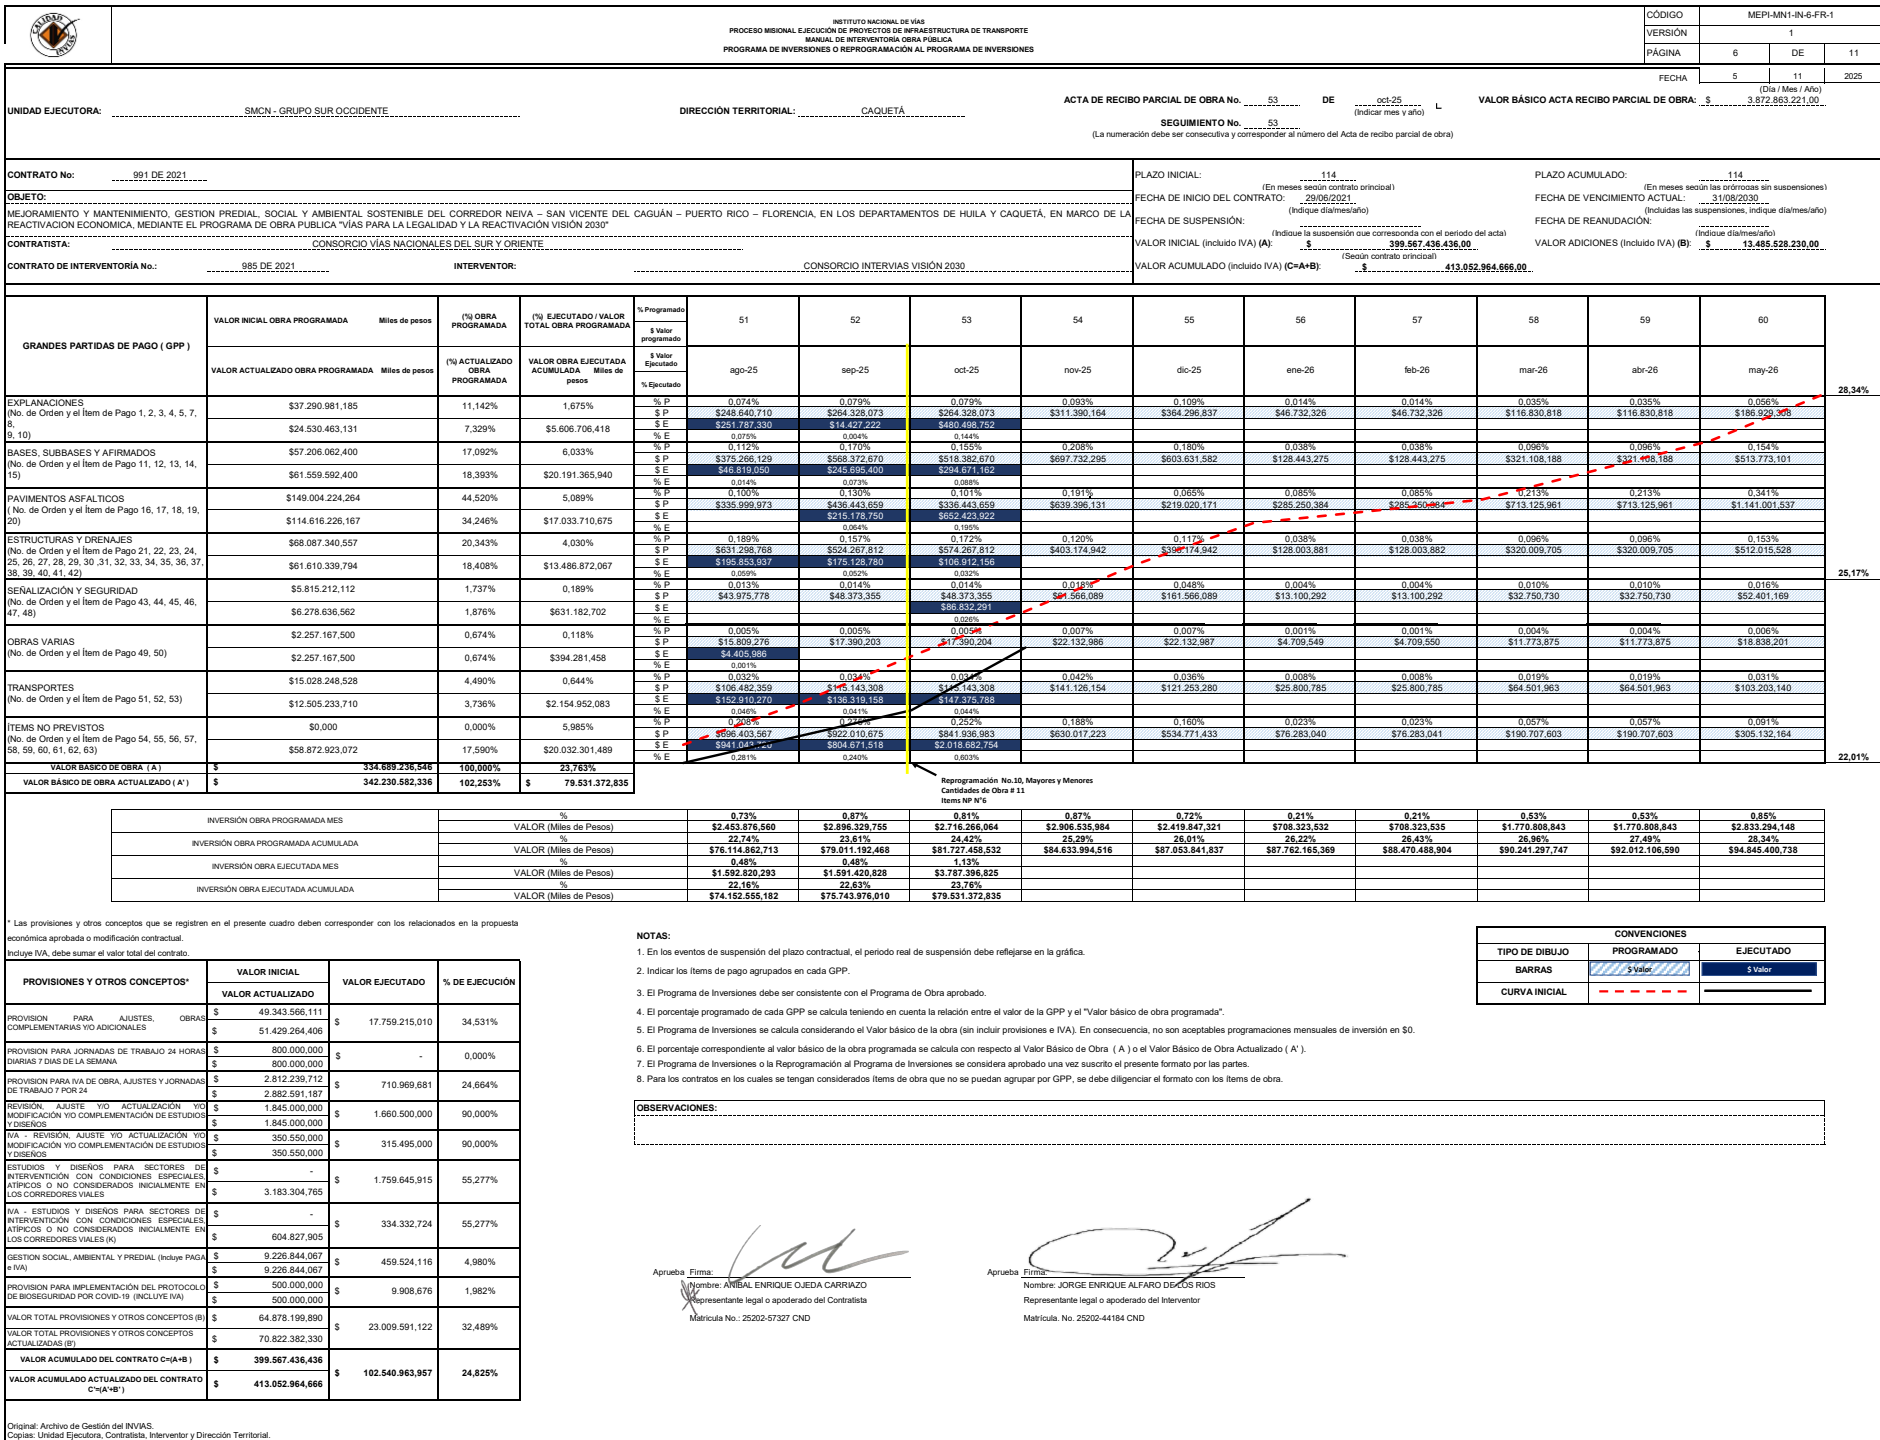
Nombre: ANIBAL ENRIQUE QUEJA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma: 

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-44184 CND

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVA INICIAL		





UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 DE 00025 L VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3.872.863.221,00

FECHA 5 11 2025

SEGUIMIENTO No. 53

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato original)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 299.567.436.00 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.485.528.230,00 (Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00 (Según contrato original)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor programado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
					% Ejecutado											
EXPLANACIONES (No. de Orden y el ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10)	\$37.290.981,185		11,142%	\$5.606.706,418	1,675%	% P 0,066%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,088%	0,088%	0,012%	0,012%	0,011%	37,44%
	\$24.530.463,131		7,329%			\$ P \$186.929.308	\$233.661.636	\$233.661.636	\$257.027.800	\$257.027.800	\$327.126.288	\$327.126.291	\$41.604.390	\$41.604.390	\$404.910.976	
						\$ E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400		17,092%	\$20.191.365,940	6,033%	% P 0,154%	0,192%	0,192%	0,211%	0,211%	0,269%	0,269%	0,034%	0,034%	0,085%	
	\$61.559.592,400		18,393%			\$ P \$513.773.101	\$642.216.376	\$642.216.376	\$706.438.014	\$706.438.014	\$899.102.927	\$899.102.927	\$114.349.199	\$114.349.199	\$285.872.996	
						\$ E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	\$149.004.224,264		44,520%	\$17.033.710,675	5,089%	% P 0,341%	0,426%	0,426%	0,469%	0,469%	0,597%	0,597%	0,076%	0,076%	0,190%	
	\$114.616.226,167		34,246%			\$ P \$1.141.001.537	\$1.426.251.922	\$1.426.251.922	\$1.568.877.114	\$1.568.877.114	\$1.996.752.691	\$1.996.752.689	\$253.949.868	\$253.949.868	\$634.874.671	
						\$ E										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$61.610.339,794		18,408%	\$13.486.872,067	4,303%	% P 0,016%	0,020%	0,020%	0,022%	0,022%	0,027%	0,027%	0,003%	0,003%	0,009%	32,89%
	\$5.815.212,112		1,737%			\$ P \$52.401.169	\$65.501.461	\$65.501.461	\$72.051.607	\$72.051.607	\$91.702.045	\$91.702.044	\$11.662.796	\$11.662.797	\$29.156.994	
	\$6.278.636,562		1,876%			\$ E										
						% E										
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el ítem de Pago 49, 50)	\$2.257.167,500		0,674%	\$394.281,458	0,118%	% P 0,006%	0,007%	0,007%	0,008%	0,008%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,003%	
	\$2.257.167,500		0,674%			\$ P \$18.838.201	\$23.547.751	\$23.547.751	\$25.902.526	\$25.902.526	\$32.966.851	\$32.966.851	\$4.192.770	\$4.192.770	\$10.481.927	
						\$ E										
						% E										
TRANSPORTES (No. de Orden y el ítem de Pago 51, 52, 53)	\$15.028.248,528		4,490%	\$2.154.952,083	0,644%	% P 0,031%	0,039%	0,039%	0,042%	0,042%	0,054%	0,054%	0,007%	0,007%	0,017%	
	\$12.505.233,710		3,736%			\$ P \$103.203.140	\$129.003.925	\$129.003.925	\$141.904.318	\$141.904.318	\$180.605.495	\$180.605.494	\$22.989.668	\$22.989.668	\$57.424.164	
						\$ E										
						% E										
ÍTEMES NO PREVISTOS (No. de Orden y el ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0,000		0,000%	\$20.032.301,489	5,985%	% P 0,091%	0,114%	0,114%	0,125%	0,125%	0,180%	0,180%	0,020%	0,020%	0,051%	28,34%
	\$58.872.923,072		17,590%			\$ P \$305.132.144	\$381.415.208	\$381.415.208	\$419.556.728	\$419.556.728	\$533.981.289	\$533.981.288	\$67.912.505	\$67.912.505	\$169.781.263	
						\$ E										
						% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334.689.236,548		100,00%	\$ 23.763%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 342.230.582,336		102,253%	\$ 79.531.372,835												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,85%	1,06%	1,06%	1,16%	1,16%	1,48%	1,48%	0,19%	0,19%	0,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2.833.294,148	\$3.541.617,687	\$3.541.617,687	\$3.895.779,455	\$3.895.779,456	\$4.958.264,759	\$4.958.264,757	\$630.599,214	\$630.599,215	\$1.576.498,041
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	29,18%	30,24%	31,30%	32,47%	33,63%	35,11%	36,59%	36,78%	36,97%	37,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$97.678.694,886	\$101.220.312,573	\$104.761.930,260	\$108.667.709,715	\$112.563.489,171	\$117.511.753,930	\$122.470.016,687	\$123.100.617,901	\$123.731.217,116	\$125.307.715,157
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566,111	\$ 17.759.215,010	34,531%
	\$ 51.429.264,406		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 800.000,000	\$ -	0,000%
	\$ 2.812.239,712	\$ 710.969,681	24,664%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000,000	\$ 1.660.500,000	90,000%
	\$ 350.550,000	\$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES	\$ -	\$ 1.759.645,915	55,277%
	\$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (K)	\$ -	\$ 334.332,724	55,277%
	\$ 604.827,905		
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA E IVA)	\$ 9.226.844,067	\$ 459.524,116	4,980%
	\$ 9.226.844,067		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVE IVA)	\$ 500.000,000	\$ 9.908,676	1,982%
	\$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199,890	\$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399.567.436,438		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 413.052.964,666	\$ 102.540.963,957	24,825%

- NOTAS:
- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
 - Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
 - El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
 - El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
 - El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
 - El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
 - El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 - Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

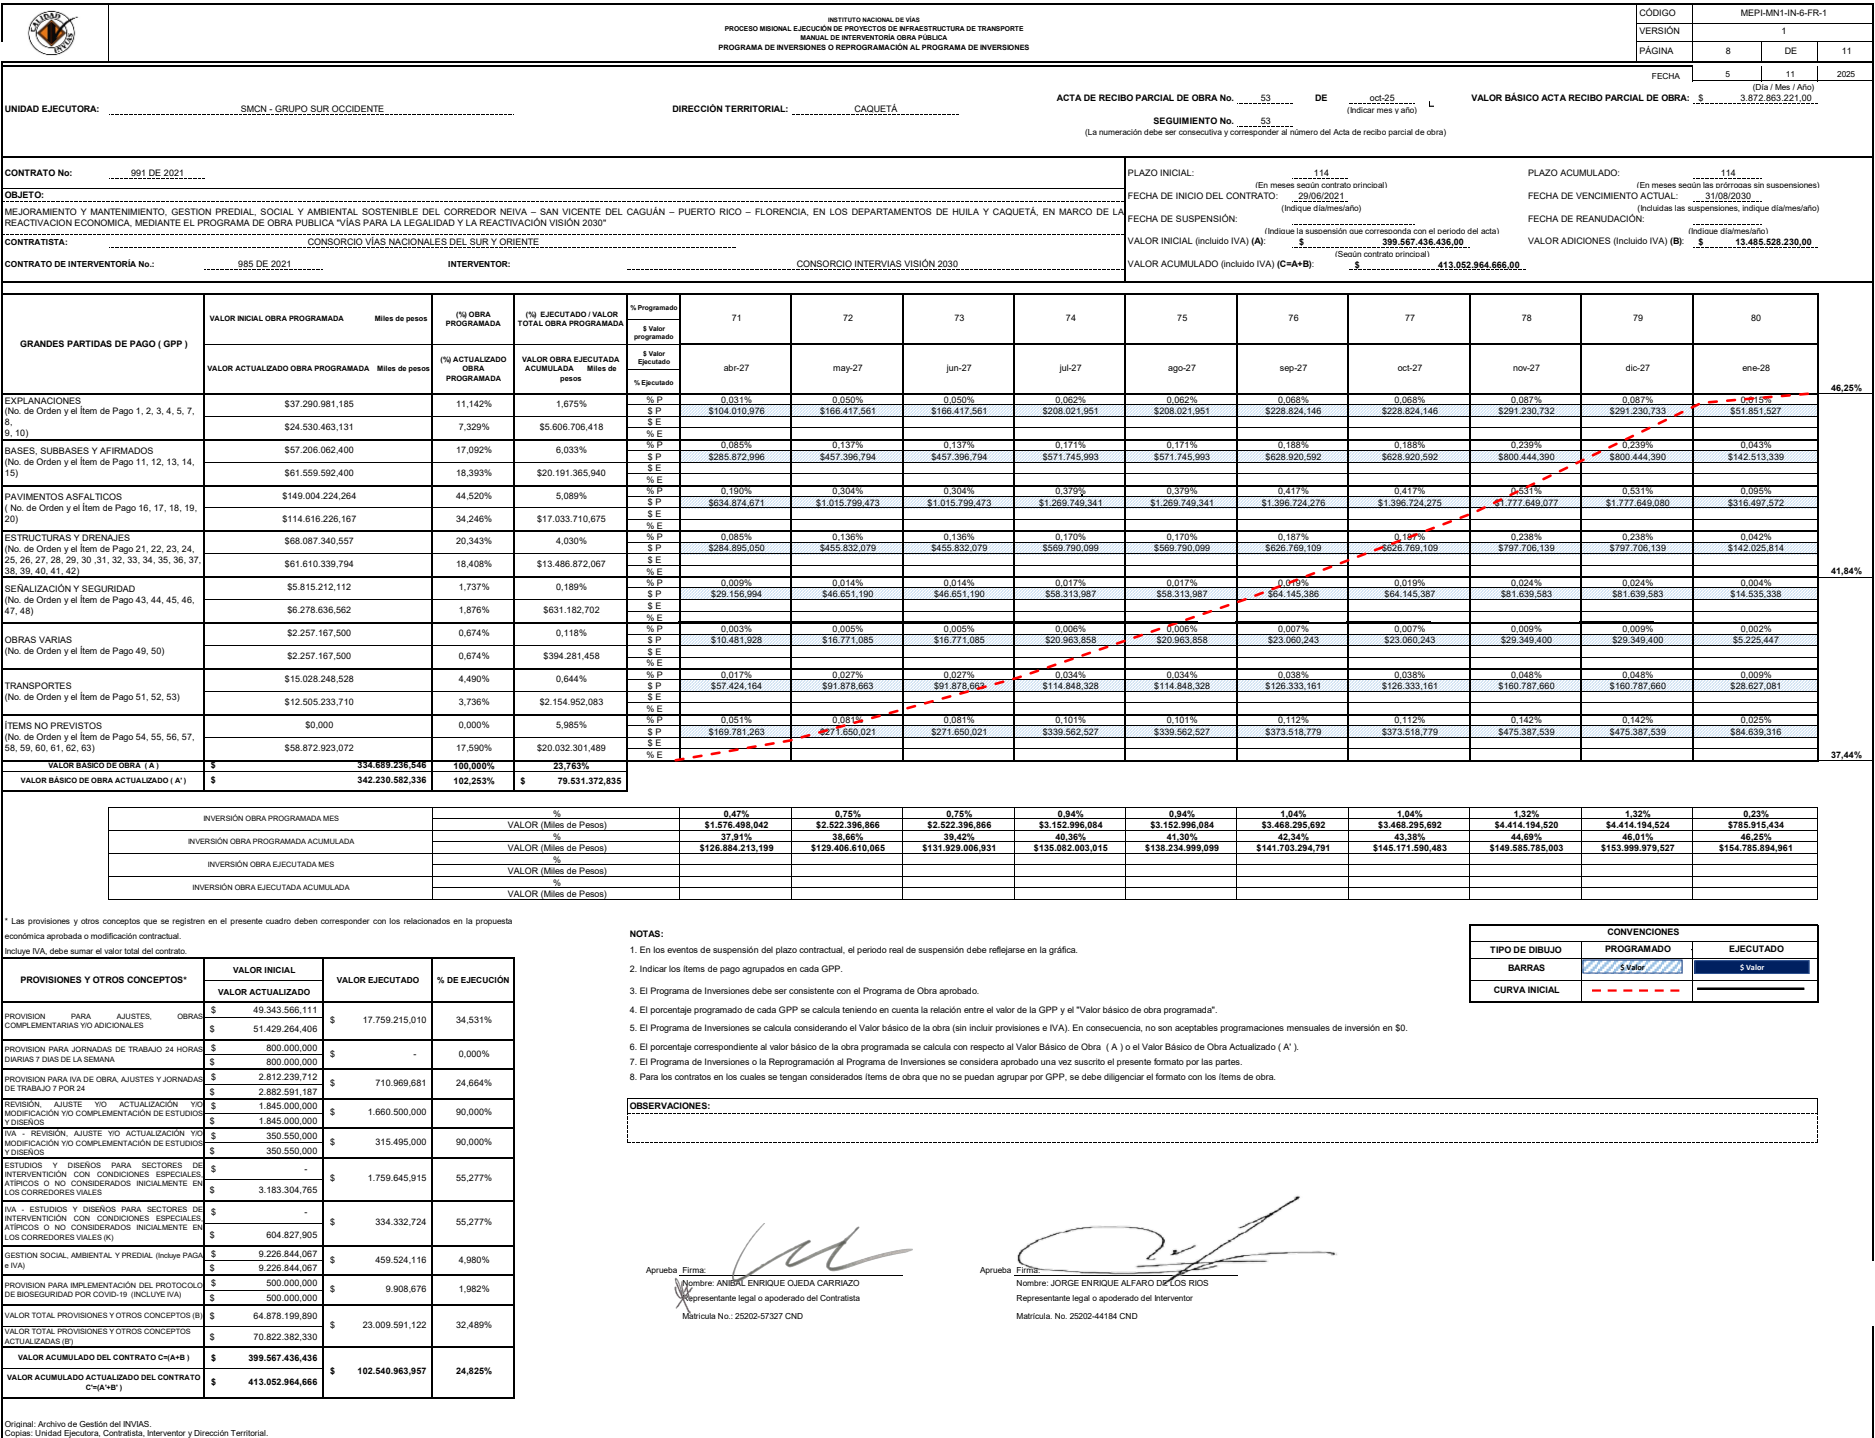
Aprueba Firma: 

Nombre: ANIBAL ENRIQUE QUEJADA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma: 

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-44184 CND

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	 \$ Valor	 \$ Valor
CURVA INICIAL		



[illegible]



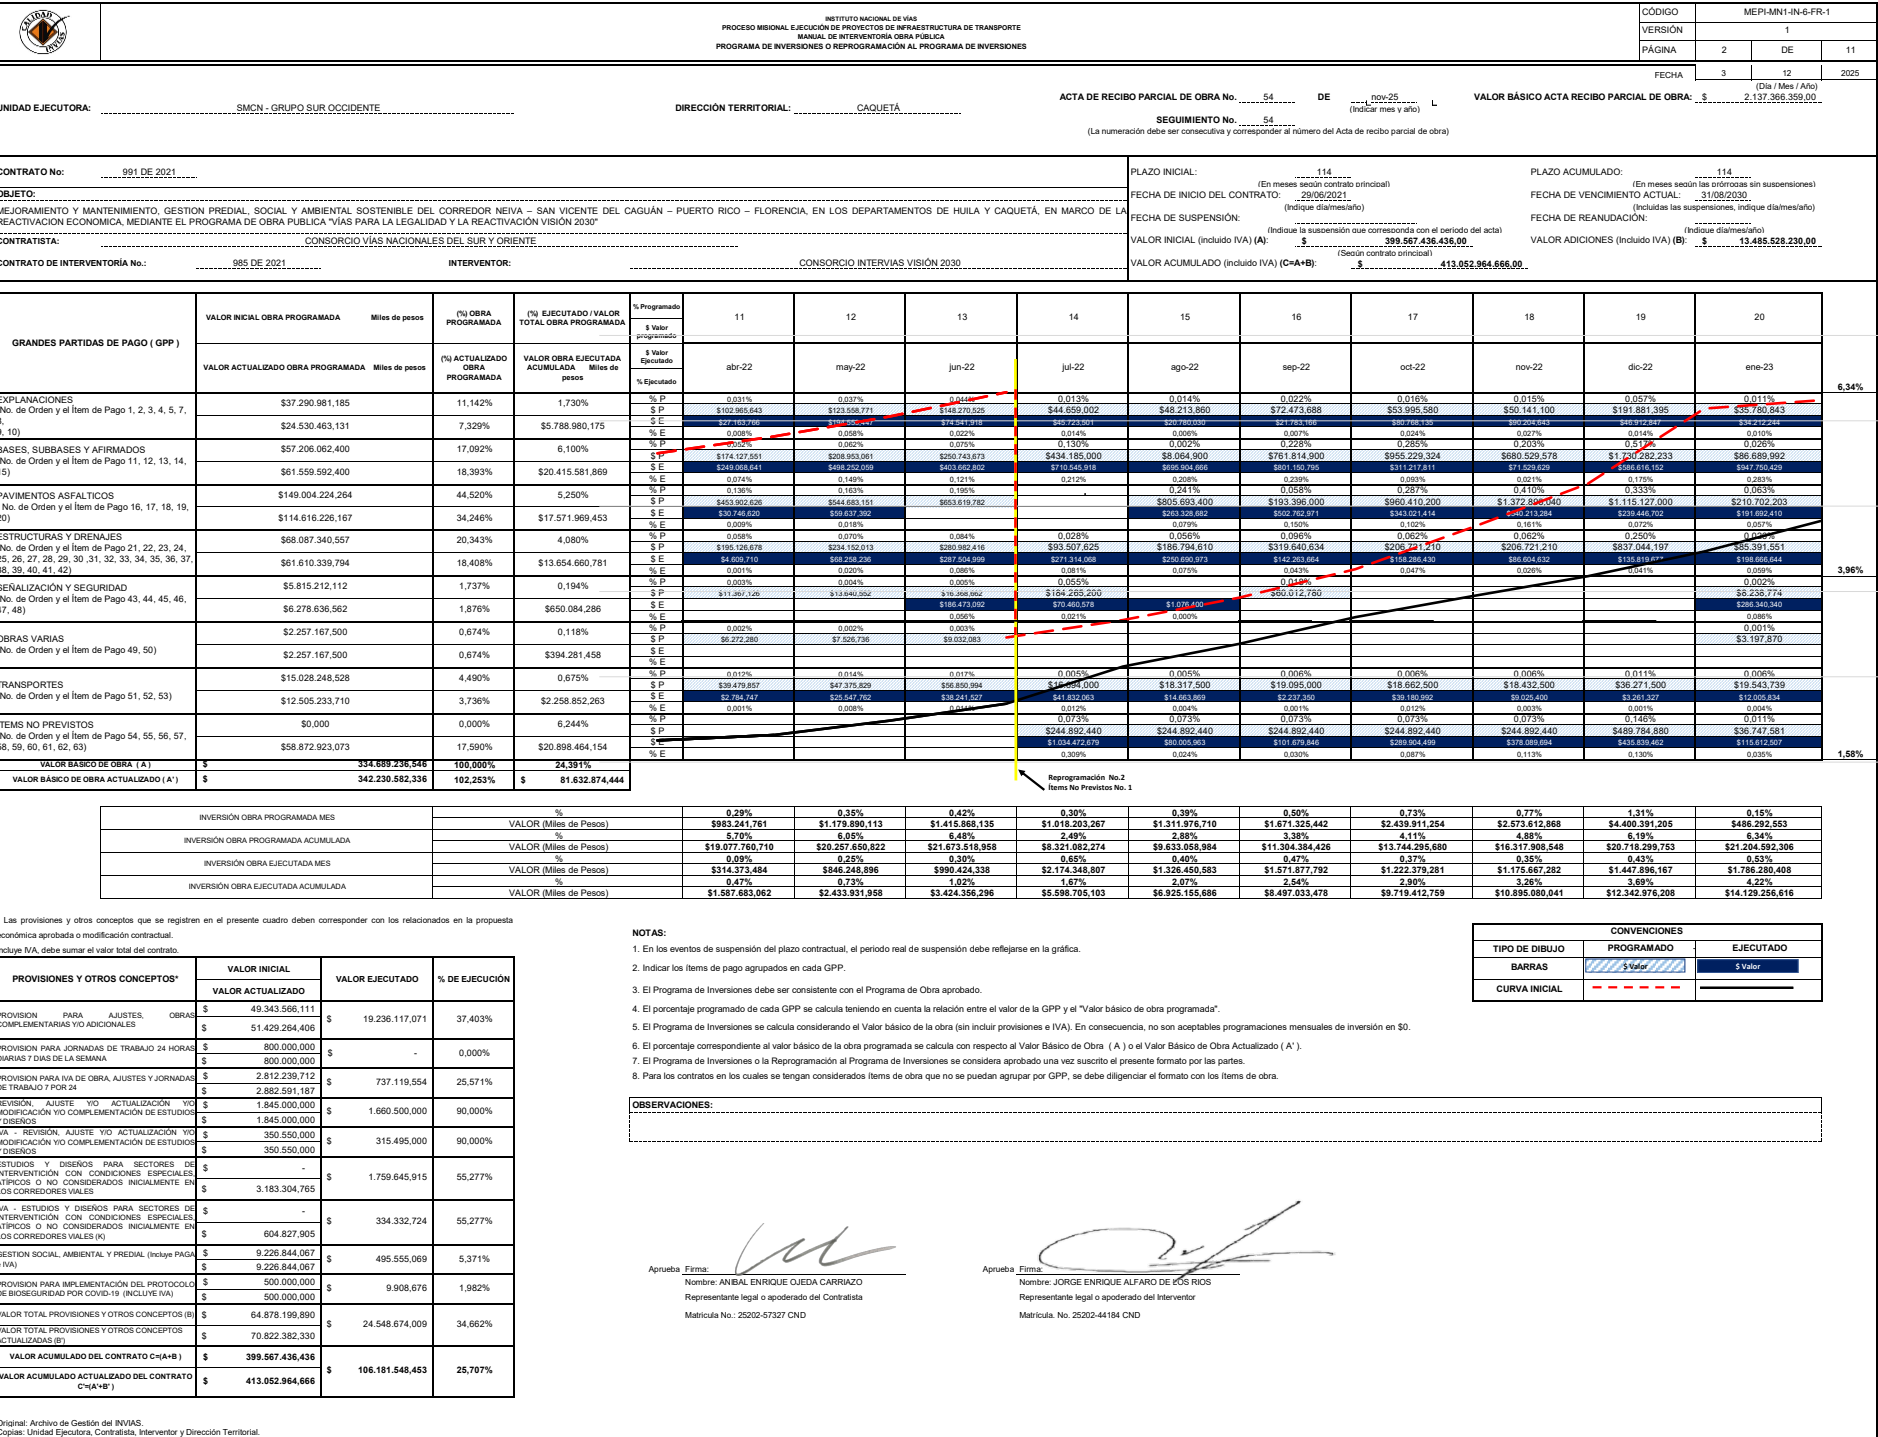
CONTRATO No: 991 DE 2021		PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2020 (Includas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 985 DE 2021		INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	
				VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.954.666,00	

[illegible]

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	 \$ Valor	 \$ Valor
CURVA INICIAL		

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566.111	\$ 17.759.215.010	34.531%
	\$ 51.429.264.406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 800.000.000	\$ -	0,000%
	\$ 800.000.000		
PROVISION PARA RIA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.912.239.712	\$ 710.969.681	24,664%
	\$ 2.882.591.187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000.000	\$ 1.660.500.000	90,000%
	\$ 1.845.000.000		
RIA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350.550.000	\$ 315.495.000	90,000%
	\$ 350.550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES	\$ -	\$ 1.759.645.915	55,277%
	\$ 3.183.304.765		
RIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES	\$ -	\$ 334.332.724	55,277%
	\$ 604.827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA A TITULO)	\$ 9.226.844.067	\$ 459.524.116	4,980%
	\$ 9.226.844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 500.000.000	\$ 9.908.676	1,982%
	\$ 500.000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199.880	\$ 23.009.591.122	32,488%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B)	\$ 70.822.382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399.567.436.436		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 413.952.964.666	\$ 102.540.963.957	24,825%

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPI-MN-INV-6-FR-1 1 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										FECHA	(Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										3	12 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 DE nov-25 L VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2,137,366,359.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SEGUIMIENTO No. 54 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATO No. 991 DE 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 995 DE 2021 INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la(s) suspensión(es) que correspondió con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436.436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13,485,238.230.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 413,052,664,666.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th> <th>VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA</th> <th>Miles de pesos</th> <th>(%) OBRA PROGRAMADA</th> <th>(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA</th> <th>% Programado</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th></th> </tr> <tr> <th>VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA</th> <th>Miles de pesos</th> <th>(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA</th> <th>VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos</th> <th>% Ejecutado</th> <th>jun-21</th> <th>jul-21</th> <th>ago-21</th> <th>sep-21</th> <th>oct-21</th> <th>nov-21</th> <th>dici-21</th> <th>ene-22</th> <th>feb-22</th> <th>mar-22</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EXPLANACIONES</td><td>\$37,290,981,185</td><td></td><td>11.142%</td><td>1.730%</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.41%</td></tr> <tr><td>No. de Orden y el ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)</td><td>\$24,530,463,131</td><td></td><td>7.329%</td><td>\$5,788,980,175</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>BASES, SUBBASIS Y AFIRMADOS</td><td>\$57,206,062,400</td><td></td><td>17.092%</td><td>6.100%</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(No. de Orden y el ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)</td><td>\$61,559,592,400</td><td></td><td>18.393%</td><td>\$20,415,581,869</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PAVIMENTOS ASFALTICOS</td><td>\$149,004,224,264</td><td></td><td>44.520%</td><td>5.250%</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(No. de Orden y el ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)</td><td>\$114,616,226,167</td><td></td><td>34.246%</td><td>\$17,571,969,453</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</td><td>\$68,087,340,557</td><td></td><td>20.343%</td><td>4.080%</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(No. de Orden y el ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)</td><td>\$61,610,339,794</td><td></td><td>18.408%</td><td>\$13,654,660,781</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD</td><td>\$5,815,212,112</td><td></td><td>1.737%</td><td>0.194%</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.79%</td></tr> <tr><td>(No. de Orden y el ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)</td><td>\$6,278,636,562</td><td></td><td>1.876%</td><td>\$650,084,286</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>OBRAS VARIAS</td><td>\$2,257,167,500</td><td></td><td>0.674%</td><td>0.118%</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(No. de Orden y el ítem de Pago 49, 50)</td><td>\$2,257,167,500</td><td></td><td>0.674%</td><td>\$394,281,458</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRANSPORTES</td><td>\$15,028,248,528</td><td></td><td>4.490%</td><td>0.67%</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(No. de Orden y el ítem de Pago 51, 52, 53)</td><td>\$12,505,233,710</td><td></td><td>3.736%</td><td>\$2,258,852,263</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ITEMS NO PREVISTOS</td><td>\$0.000</td><td></td><td>0.000%</td><td>6.244%</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(No. de Orden y el ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)</td><td>\$58,872,923,073</td><td></td><td>17.590%</td><td>\$20,898,464,154</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0%</td></tr> <tr><td>VALOR BASICO DE OBRA ACTUAL (A)</td><td>\$34,589,236,546</td><td></td><td>100.00%</td><td>24.391%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADA (A')</td><td>\$42,330,582,336</td><td></td><td>102.253%</td><td>\$41,632,874,444</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dici-21	ene-22	feb-22	mar-22		EXPLANACIONES	\$37,290,981,185		11.142%	1.730%	% P											5.41%	No. de Orden y el ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$24,530,463,131		7.329%	\$5,788,980,175	% E												BASES, SUBBASIS Y AFIRMADOS	\$57,206,062,400		17.092%	6.100%	% P												(No. de Orden y el ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	\$61,559,592,400		18.393%	\$20,415,581,869	% E												PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$149,004,224,264		44.520%	5.250%	% P												(No. de Orden y el ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	\$114,616,226,167		34.246%	\$17,571,969,453	% E												ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$68,087,340,557		20.343%	4.080%	% P												(No. de Orden y el ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$61,610,339,794		18.408%	\$13,654,660,781	% E												SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5,815,212,112		1.737%	0.194%	% P											2.79%	(No. de Orden y el ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$6,278,636,562		1.876%	\$650,084,286	% E												OBRAS VARIAS	\$2,257,167,500		0.674%	0.118%	% P												(No. de Orden y el ítem de Pago 49, 50)	\$2,257,167,500		0.674%	\$394,281,458	% E												TRANSPORTES	\$15,028,248,528		4.490%	0.67%	% P												(No. de Orden y el ítem de Pago 51, 52, 53)	\$12,505,233,710		3.736%	\$2,258,852,263	% E												ITEMS NO PREVISTOS	\$0.000		0.000%	6.244%	% P												(No. de Orden y el ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$58,872,923,073		17.590%	\$20,898,464,154	% E											0%	VALOR BASICO DE OBRA ACTUAL (A)	\$34,589,236,546		100.00%	24.391%													VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADA (A')	\$42,330,582,336		102.253%	\$41,632,874,444														
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dici-21	ene-22	feb-22	mar-22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EXPLANACIONES	\$37,290,981,185		11.142%	1.730%	% P											5.41%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No. de Orden y el ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$24,530,463,131		7.329%	\$5,788,980,175	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BASES, SUBBASIS Y AFIRMADOS	\$57,206,062,400		17.092%	6.100%	% P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(No. de Orden y el ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	\$61,559,592,400		18.393%	\$20,415,581,869	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$149,004,224,264		44.520%	5.250%	% P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(No. de Orden y el ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	\$114,616,226,167		34.246%	\$17,571,969,453	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$68,087,340,557		20.343%	4.080%	% P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(No. de Orden y el ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$61,610,339,794		18.408%	\$13,654,660,781	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5,815,212,112		1.737%	0.194%	% P											2.79%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(No. de Orden y el ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$6,278,636,562		1.876%	\$650,084,286	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBRAS VARIAS	\$2,257,167,500		0.674%	0.118%	% P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(No. de Orden y el ítem de Pago 49, 50)	\$2,257,167,500		0.674%	\$394,281,458	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRANSPORTES	\$15,028,248,528		4.490%	0.67%	% P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(No. de Orden y el ítem de Pago 51, 52, 53)	\$12,505,233,710		3.736%	\$2,258,852,263	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ITEMS NO PREVISTOS	\$0.000		0.000%	6.244%	% P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(No. de Orden y el ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$58,872,923,073		17.590%	\$20,898,464,154	% E											0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR BASICO DE OBRA ACTUAL (A)	\$34,589,236,546		100.00%	24.391%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADA (A')	\$42,330,582,336		102.253%	\$41,632,874,444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INVERSION OBRA PROGRAMADA MES</th> <th colspan="10">% VALOR (Miles de Pesos)</th> <th rowspan="2">0.00%</th> <th rowspan="2">0.00%</th> <th rowspan="2">0.00%</th> <th rowspan="2">0.13%</th> <th rowspan="2">0.23%</th> <th rowspan="2">0.58%</th> <th rowspan="2">3.98%</th> <th rowspan="2">0.12%</th> <th rowspan="2">0.10%</th> <th rowspan="2">0.21%</th> </tr> <tr> <th>VALOR (Miles de Pesos)</th> <th>0.00%</th> <th>0.00%</th> <th>0.00%</th> <th>0.13%</th> <th>0.23%</th> <th>0.58%</th> <th>3.98%</th> <th>0.12%</</th></tr></thead></table>												INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	% VALOR (Miles de Pesos)										0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.98%	0.12%	0.10%	0.21%	VALOR (Miles de Pesos)	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.98%	0.12%</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	% VALOR (Miles de Pesos)										0.00%		0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.98%	0.12%	0.10%	0.21%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	VALOR (Miles de Pesos)	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.98%	0.12%</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



UNIDAD EJECUTORA:SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.54 DE 2025-25 L VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.137.366.359,00

SEGUIMIENTO No.54

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:991 DE 2021

OBJETO:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:985 DE 2021 INTERVENTOR:CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL:114 (En meses según contrato original)

PLAZO ACUMULADO:114 (En meses según las órdenes sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):\$ 299.587.436.436,00 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):\$ 13.485.528.230,00 (Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):\$ 413.052.964.666,00 (Según contrato original)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	VALOR EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	%	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA		VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
							% Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecutado	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10)	\$37.290.981,185		11,142%	1,730%			% P 0,0111% % S P \$35.780,844 % S E \$25.217,566	0,0227% \$89.452,111 \$270.270,815	0,0245% \$79.330,258 \$280.264,202	0,0385% \$126.928,412 \$216.458,412	0,0385% \$126.928,412 \$216.458,412	0,0417% \$158.660,515 \$238.507	0,0417% \$158.660,515 \$238.507	0,055% \$174.526,567 \$413.052,964	0,055% \$174.526,567 \$413.052,964	0,0586% \$174.526,567 \$413.052,964	12,44%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400		17,092%	6,100%			% P 0,0176% % S P \$86.689,992 % S E \$349.693,374	0,0281% \$216.724,981 \$1.344.247,500	0,0281% \$216.724,981 \$1.344.247,500	0,0484% \$348.861,312 \$1.058.014,650	0,0484% \$348.861,312 \$1.058.014,650	0,0504% \$436.076,641 \$2.094.476,095	0,0504% \$436.076,641 \$2.094.476,095	0,054% \$479.684,805 \$2.574.160,900	0,054% \$479.684,805 \$2.574.160,900	0,057% \$479.684,805 \$2.574.160,900	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	\$149.004.224,264		44,520%	5,250%			% P 0,254% % S P \$210.702,204 % S E \$1.111.151,239	0,002% \$626.755,511 \$2.227,723	0,002% \$626.755,511 \$2.227,723	0,010% \$602.023,263 \$2.227,723	0,010% \$602.023,263 \$2.227,723	0,0254% \$803.237,221 \$2.227,723	0,0254% \$803.237,221 \$2.227,723	0,0254% \$1.004.046,526 \$3.231,742	0,0254% \$1.004.046,526 \$3.231,742	0,0254% \$1.004.046,526 \$3.231,742	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340,557		20,343%	4,080%			% P 0,026% % S P \$85.391,552 % S E \$1.111.151,239	0,064% \$215.478,879 \$2.227,723	0,064% \$215.478,879 \$2.227,723	0,085% \$217.292,430 \$2.227,723	0,085% \$217.292,430 \$2.227,723	0,104% \$347.667,888 \$2.227,723	0,104% \$347.667,888 \$2.227,723	0,130% \$434.584,860 \$3.231,742	0,130% \$434.584,860 \$3.231,742	0,130% \$434.584,860 \$3.231,742	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$6.815.212,112		1,737%	0,194%			% P 0,002% % S P \$8.238,775 % S E \$22.238,344	0,0006% \$20.998,938 \$22.238,344	0,0006% \$20.998,938 \$22.238,344	0,011% \$35.581,350 \$22.238,344	0,011% \$35.581,350 \$22.238,344	0,013% \$44.476,687 \$22.238,344	0,013% \$44.476,687 \$22.238,344	0,013% \$48.924,356 \$22.238,344	0,013% \$48.924,356 \$22.238,344	0,013% \$48.924,356 \$22.238,344	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el ítem de Pago 49, 50)	\$2.257.167,500		0,674%	0,118%			% P 0,001% % S P \$3.197,870 % S E \$143.267,109	0,002% \$7.994,676 \$143.267,109	0,002% \$7.994,676 \$143.267,109	0,014% \$12.793,482 \$143.267,109	0,014% \$12.793,482 \$143.267,109	0,005% \$15.989,353 \$143.267,109	0,005% \$15.989,353 \$143.267,109	0,005% \$17.588,288 \$143.267,109	0,005% \$17.588,288 \$143.267,109	0,005% \$17.588,288 \$143.267,109	
TRANSPORTES (No. de Orden y el ítem de Pago 51, 52, 53)	\$15.028.248,528		4,400%	0,675%			% P 0,006% % S P \$19.543,739 % S E \$3.775,600	0,015% \$48.859,346 \$1.901,901	0,015% \$48.859,346 \$1.901,901	0,019% \$43.788,037 \$1.901,901	0,019% \$43.788,037 \$1.901,901	0,021% \$67.596,074 \$1.901,901	0,021% \$67.596,074 \$1.901,901	0,028% \$96.355,681 \$1.901,901	0,028% \$96.355,681 \$1.901,901	0,028% \$96.355,681 \$1.901,901	
ITEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0,000		0,000%	6,244%			% P 0,011% % S P \$36.717,247 % S E \$1.111.151,239	0,022% \$91.868,954 \$2.227,723	0,022% \$91.868,954 \$2.227,723	0,037% \$125.016,069 \$2.227,723	0,037% \$125.016,069 \$2.227,723	0,050% \$200.025,711 \$2.227,723	0,050% \$200.025,711 \$2.227,723	0,050% \$250.032,139 \$2.227,723	0,050% \$250.032,139 \$2.227,723	0,050% \$250.032,139 \$2.227,723	4,22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334.589.236,546		100,00%	24,381%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 342.230.682,336		102,253%	\$ 81.632.874,444													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$486.292,557	\$1.215.731,395	\$1.215.731,397	\$1.945.170,235	\$1.945.170,235	\$2.431.462,795	\$2.431.462,795	\$2.674.609,075	\$2.674.609,075	\$3.404.047,912
	%	6,48%	6,84%	7,21%	7,79%	7,79%	9,62%	9,62%	10,62%	10,62%	12,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,83%	0,89%	1,14%	1,14%	1,08%	1,08%	0,89%	0,89%	0,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$21.699.884,863	\$22.908.616,258	\$24.122.347,655	\$26.067.517,890	\$26.067.517,890	\$28.012.698,125	\$28.012.698,125	\$30.224.813,865	\$30.224.813,865	\$41.628.978,777
	%	7,1%	7,3%	7,5%	7,7%	7,7%	8,0%	8,0%	8,6%	8,6%	9,7%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$16.518.646,289	\$19.308.444,544	\$22.279.359,282	\$26.086.718,867	\$26.086.718,867	\$29.015.957,171	\$29.015.957,171	\$32.636.462,685	\$32.636.462,685	\$41.578.750,227

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566,111	\$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 800.000,000	\$ -	0,000%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.812.239,712	\$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000,000	\$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350.550,000	\$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATRÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES	\$ -	\$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATRÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (K)	\$ -	\$ 334.332,724	55,277%
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA E IVA)	\$ 9.226.844,067	\$ 495.555,069	5,371%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVA IVA)	\$ 500.000,000	\$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199,890	\$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)	\$ 399.587.436,436		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'(A'+B')	\$ 413.052.964,666	\$ 106.181.548,453	25,707%

- NOTAS:
- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
 - Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
 - El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
 - El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
 - El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
 - El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
 - El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 - Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

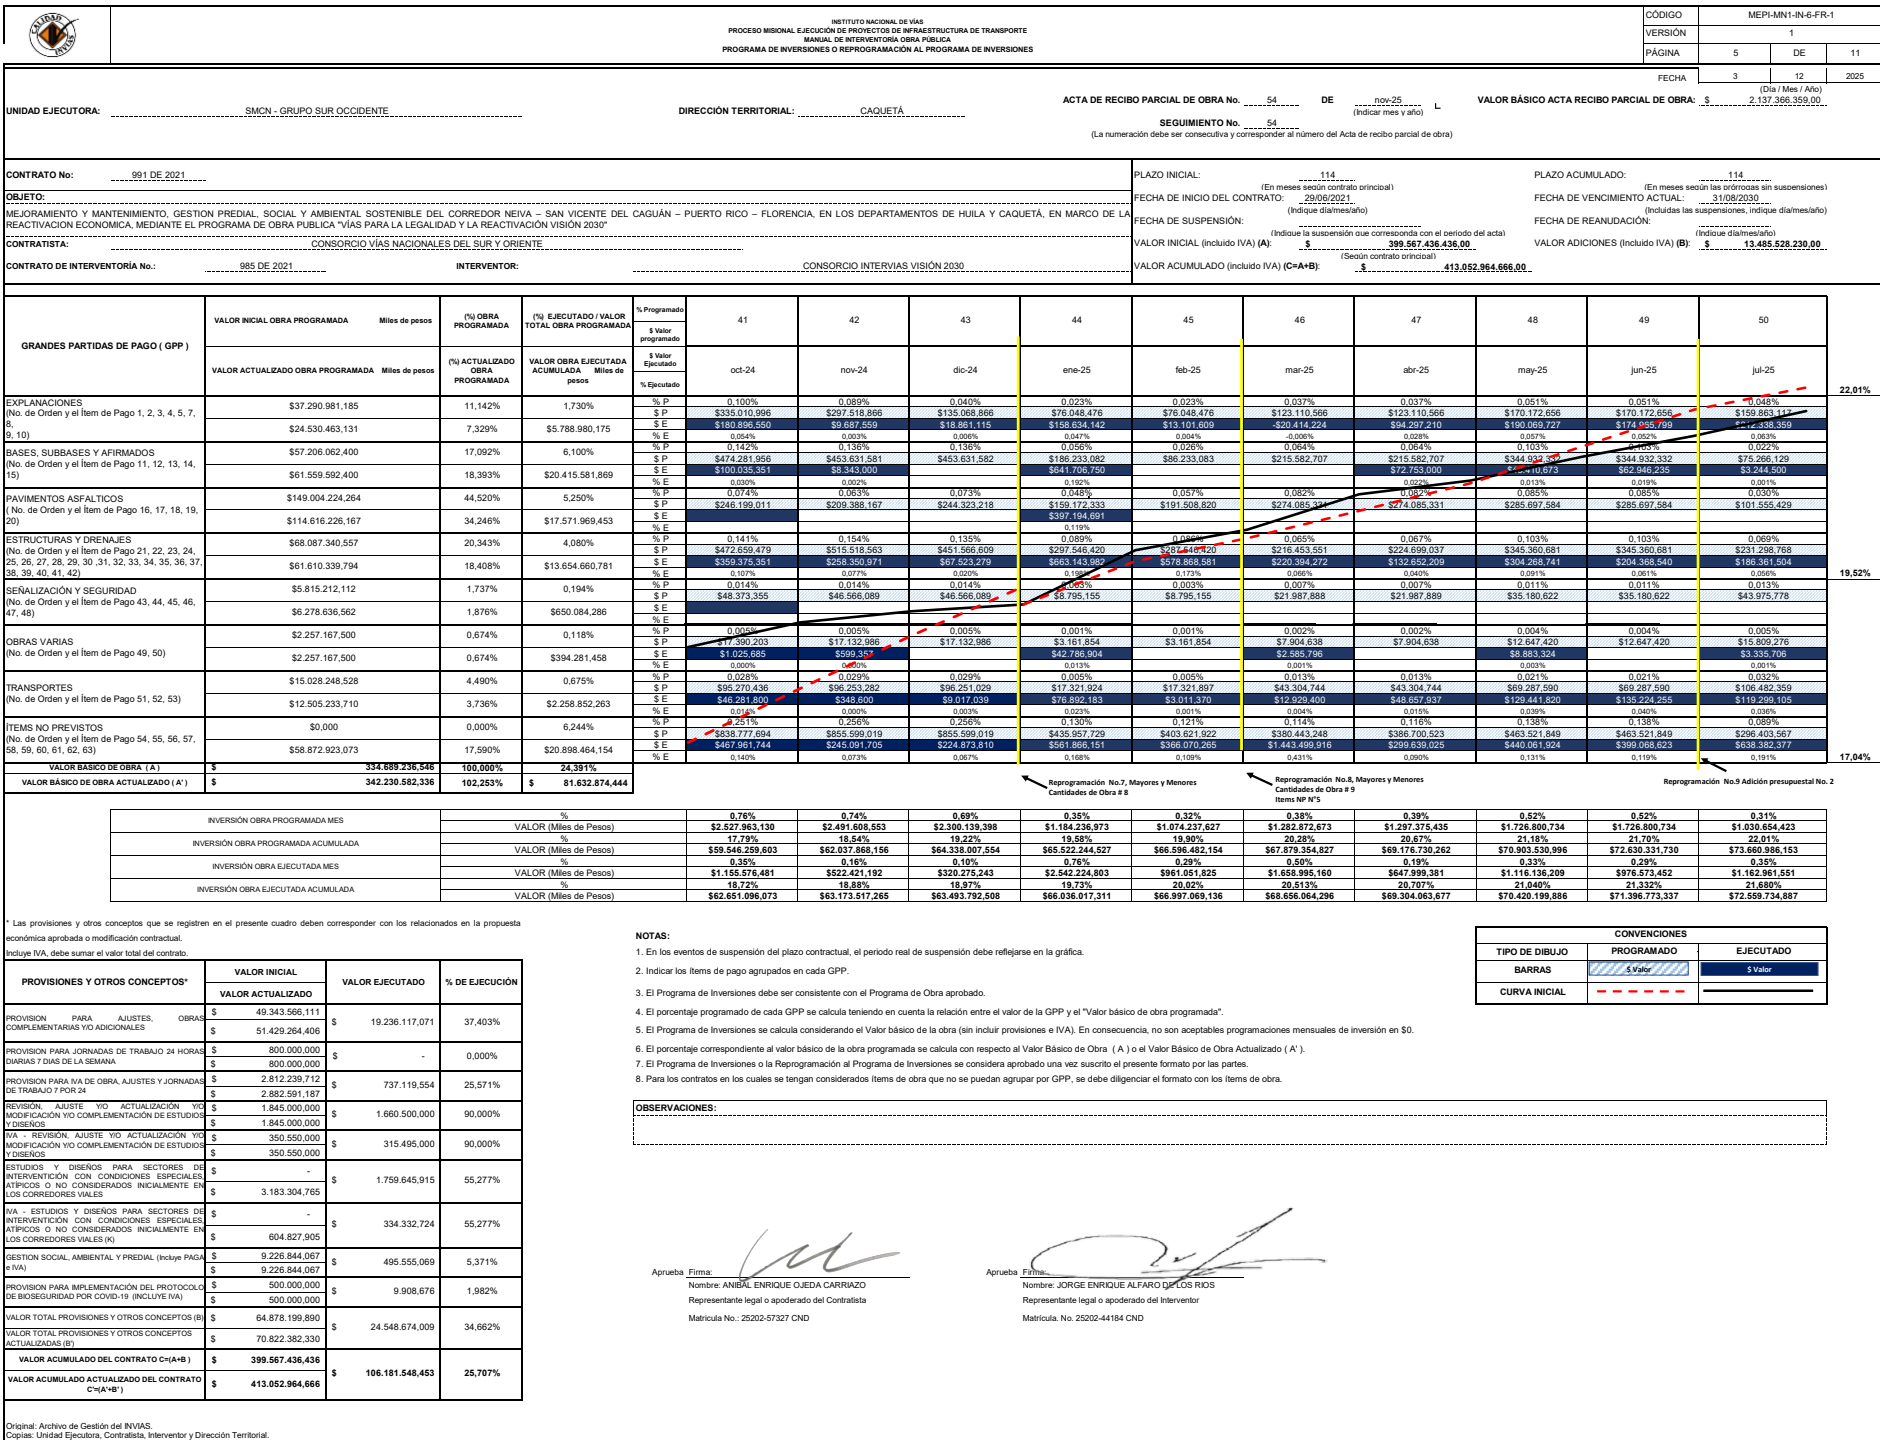
Aprueba Firma:

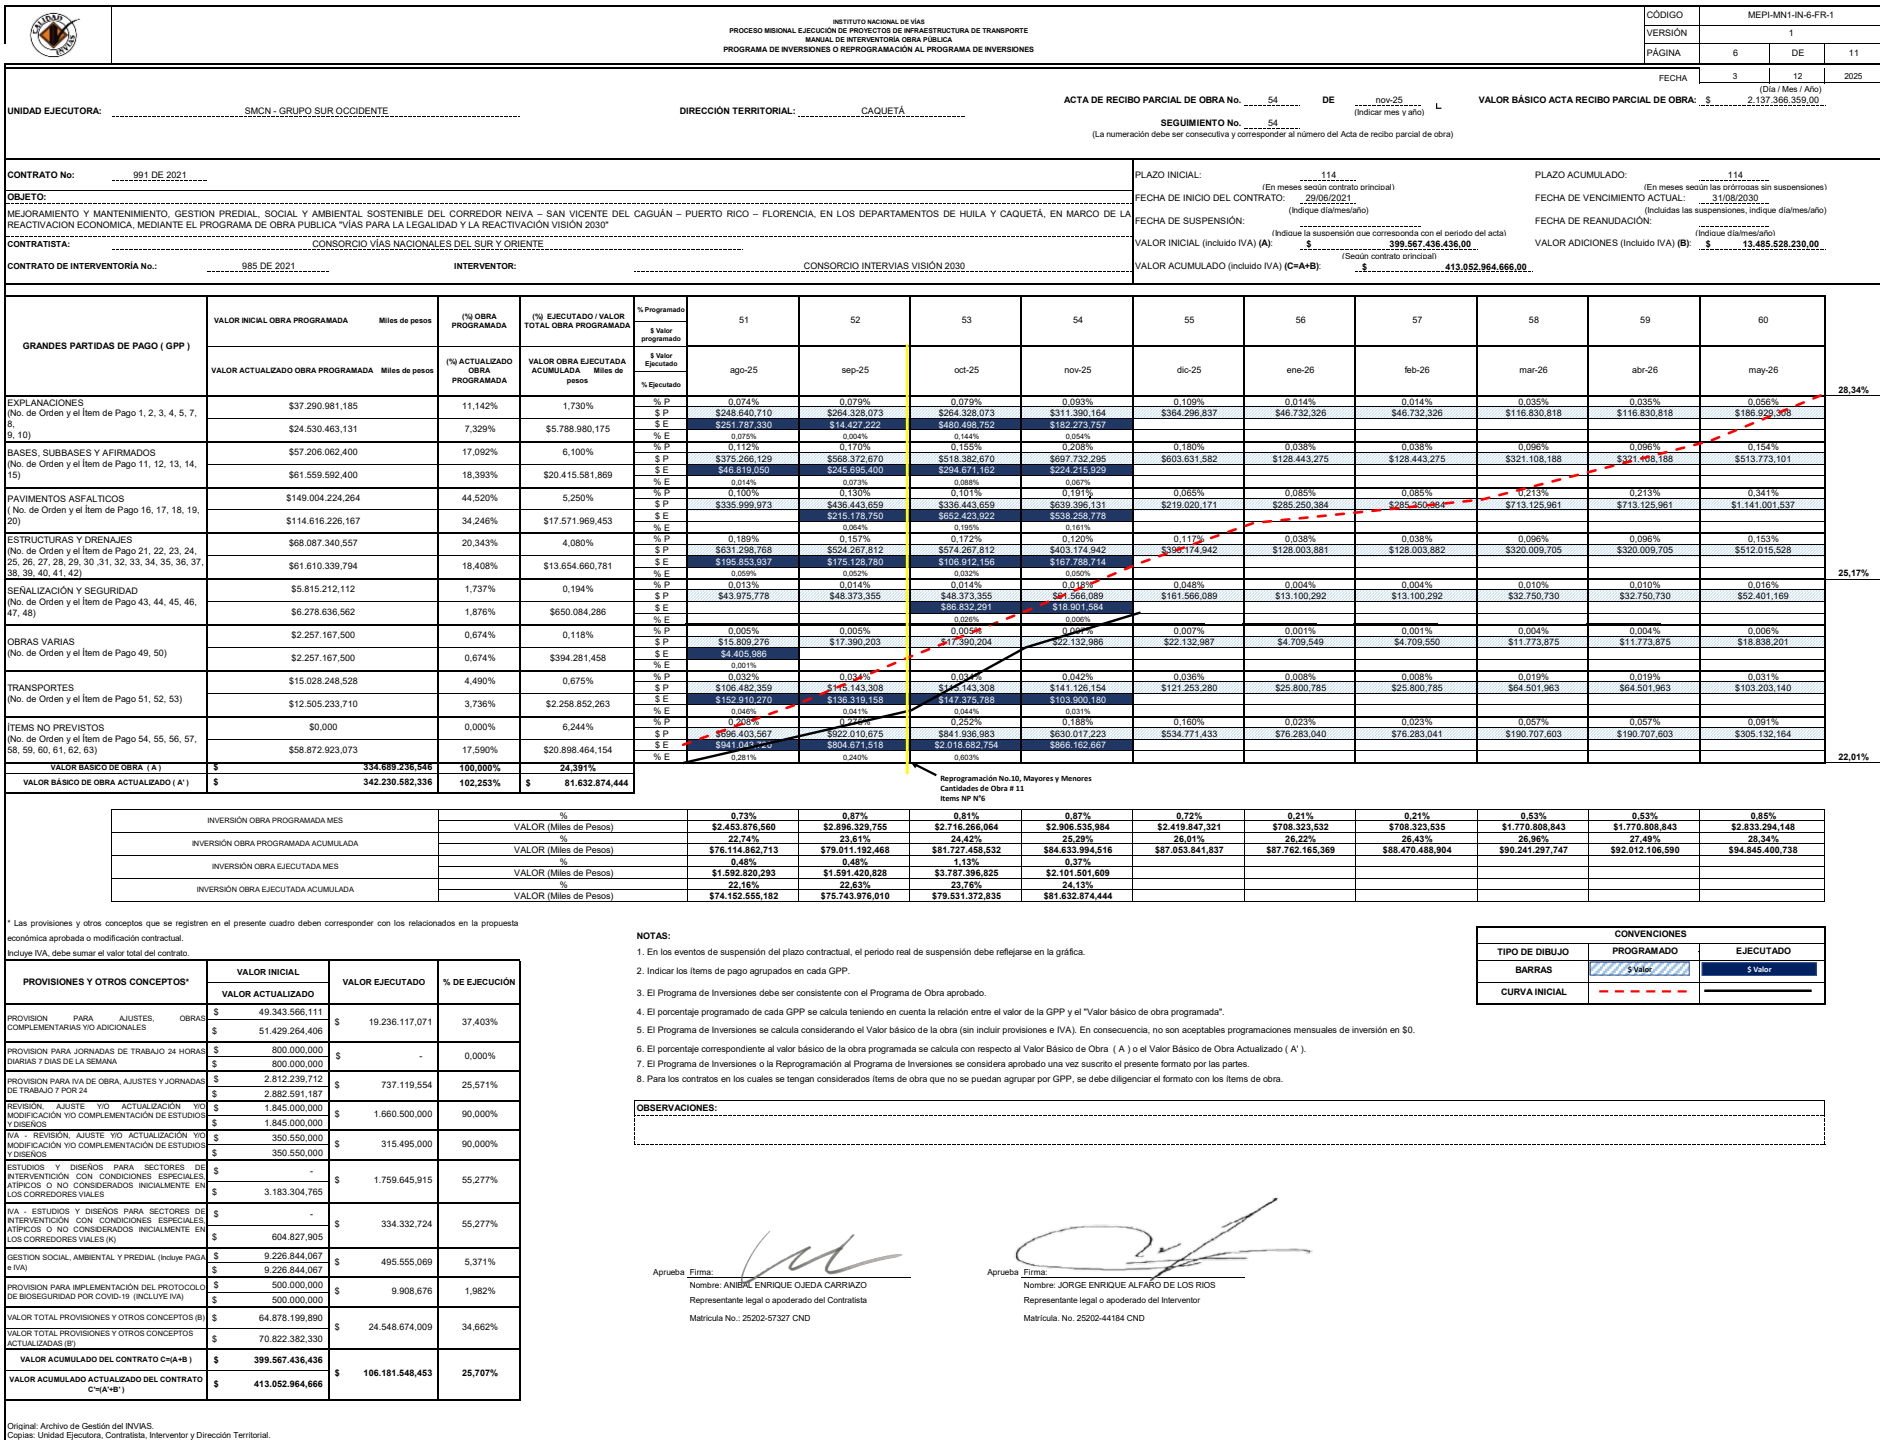
Nombre: ANIBAL ENRIQUE QUEJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

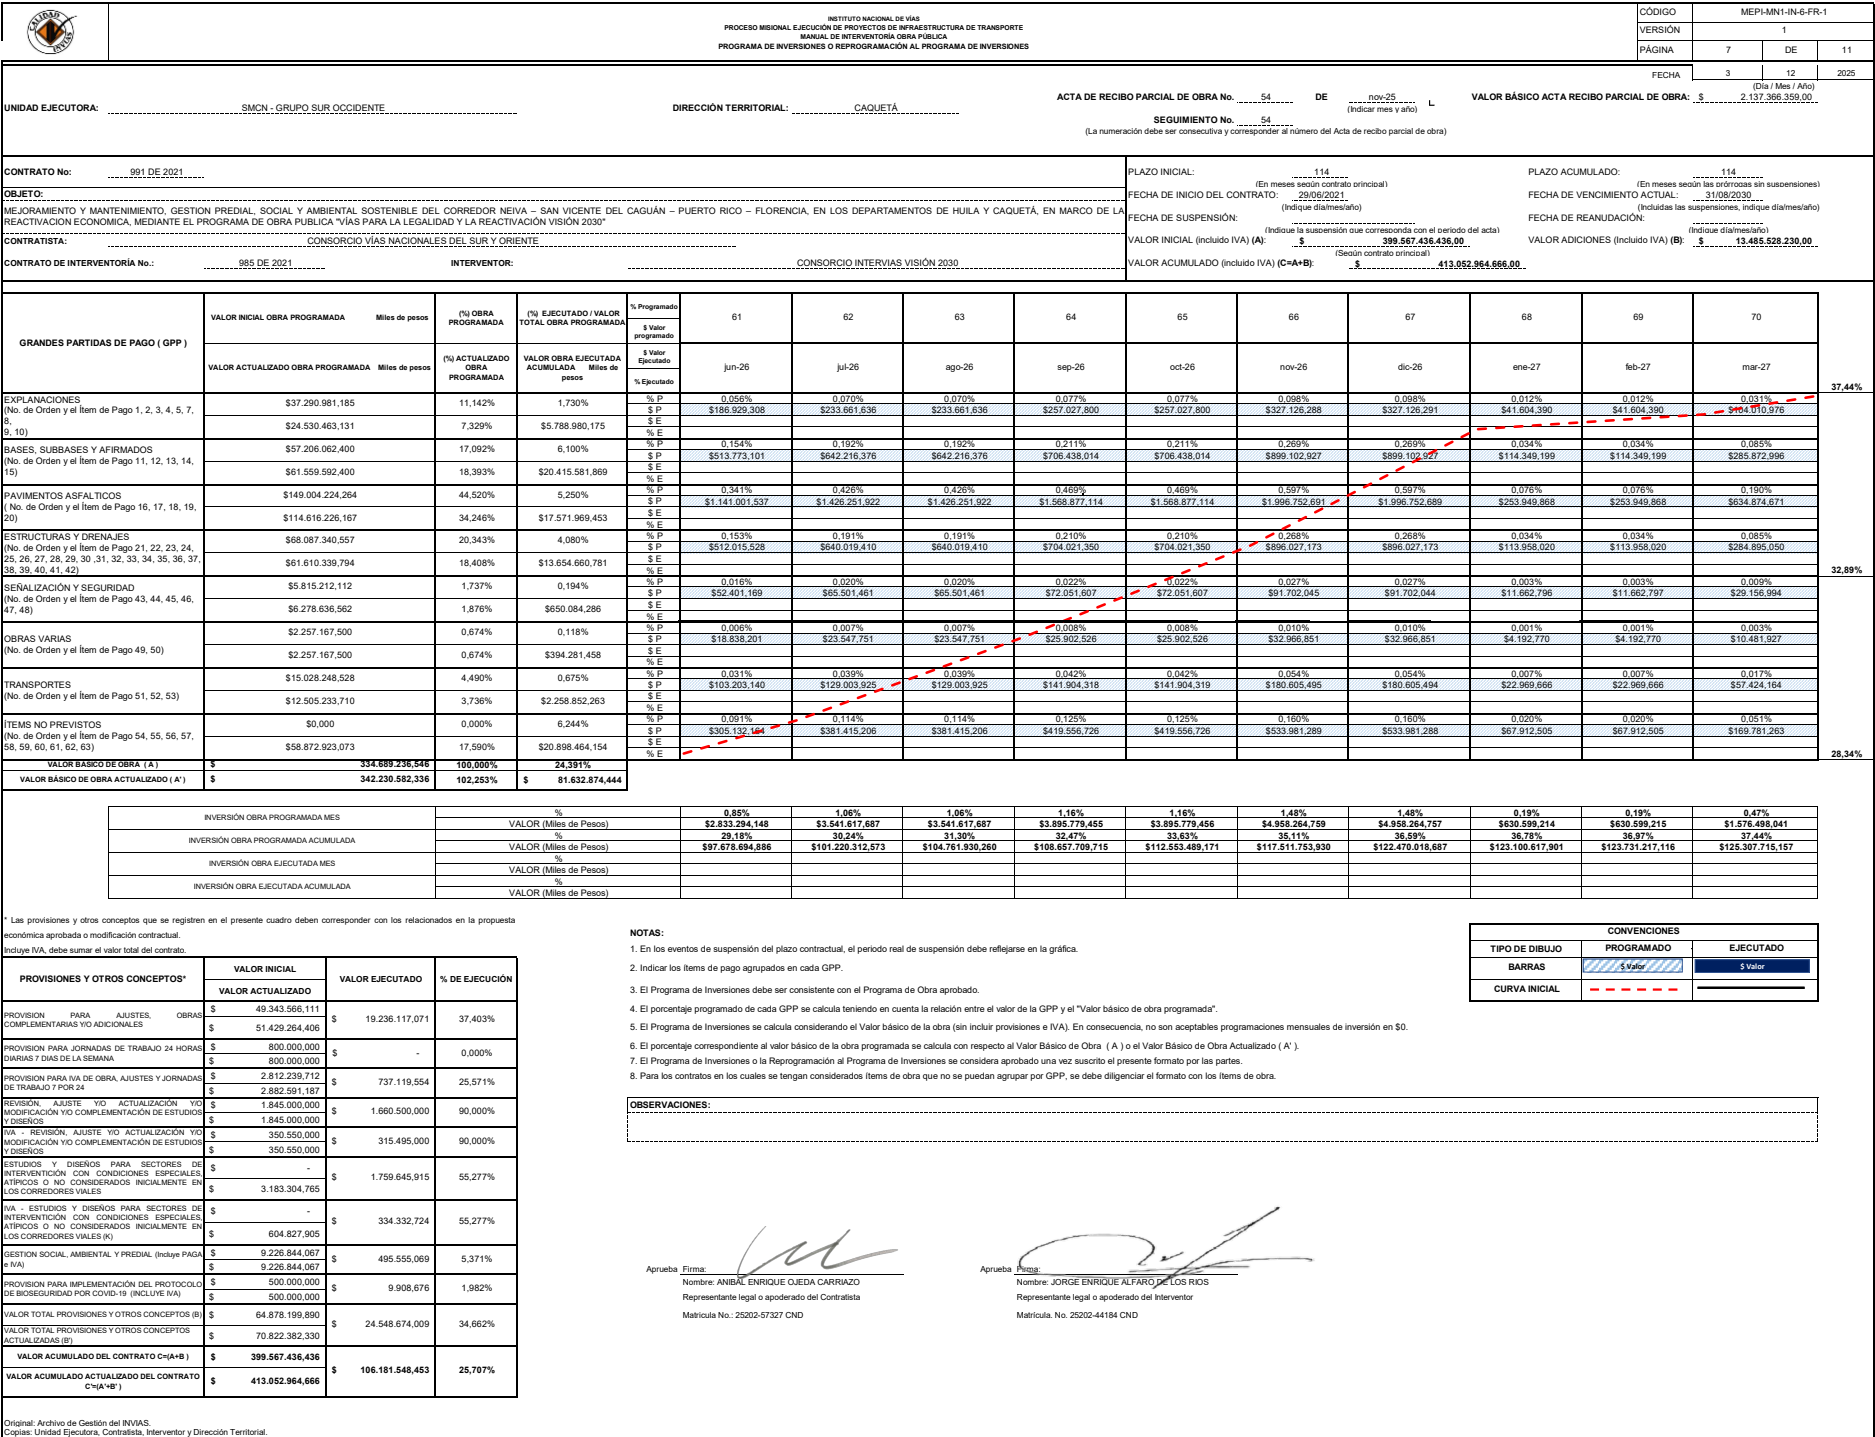
Aprueba Firma:

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-44184 CND

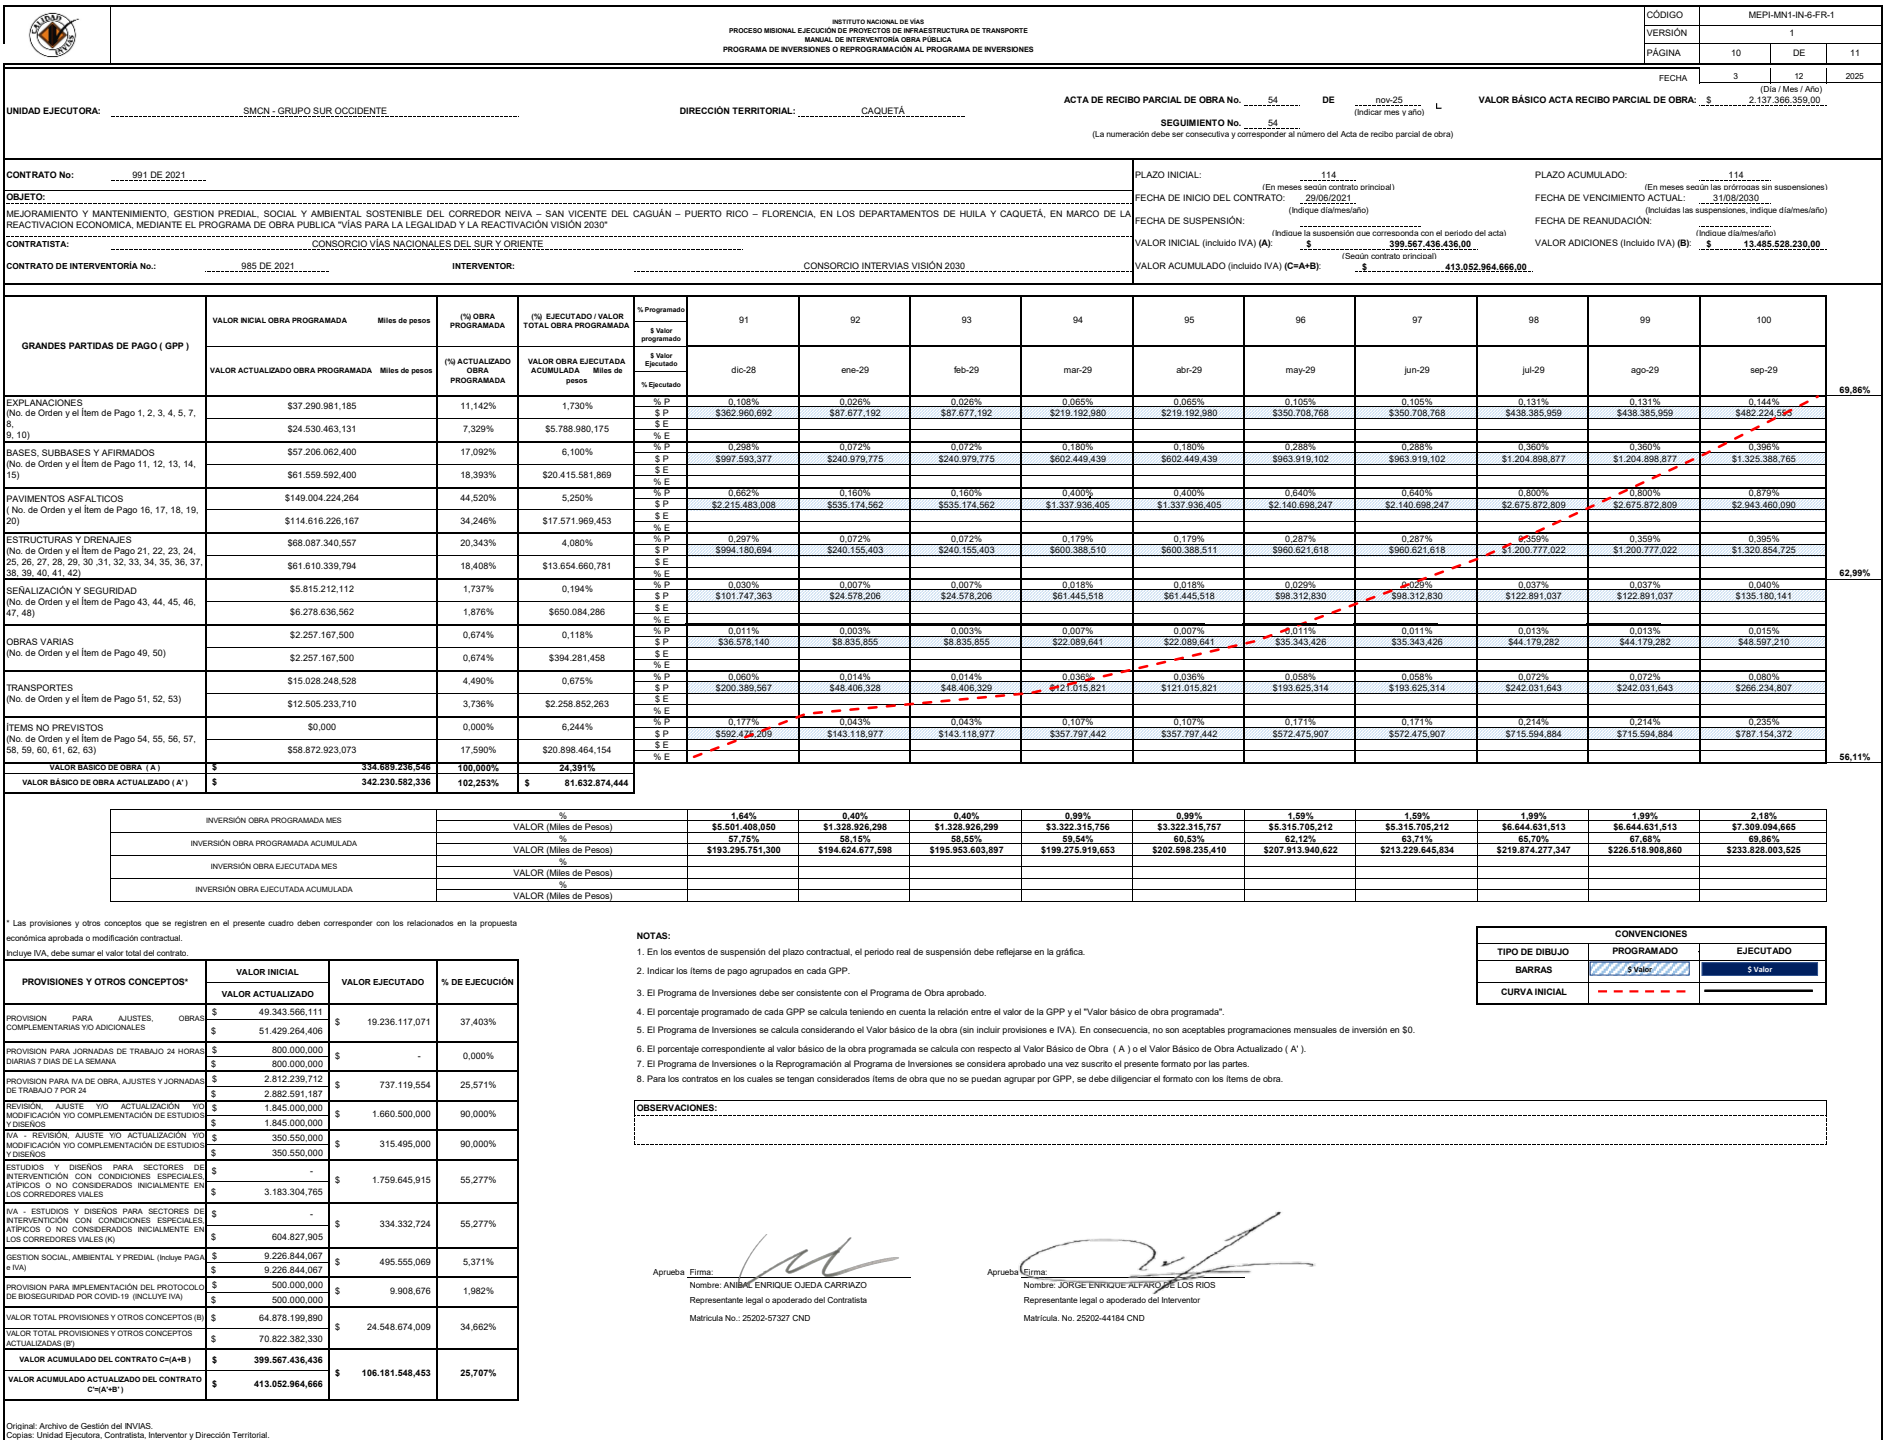
CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVA INICIAL	- - - - -	- - - - -







[illegible]





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN
1
PÁGINA
11 DE 11

FECHA
3 DE 12 2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 DE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.137.366.399,00
SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato original) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.465.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor programado	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA - Miles de pesos	% Ejecutado	% E	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P \$ P \$ E	0,144% \$482.224,555	0,183% \$613.740,343	0,213% \$713.740,343	0,149% \$500.000,000	0,149% \$500.000,000	0,149% \$500.000,000	0,149% \$500.000,000	0,234% \$783.324,738	0,312% \$1.043.244,738	0,311% \$1.040.029,194	0,322% \$1.077.002,526	102,25%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P \$ P \$ E	0,366% \$1.325.388,765	0,504% \$1.686.858,428	0,631% \$2.110.988,135	0,329% \$1.100.000,000	0,337% \$1.129.496,428	0,402% \$1.345.599,518	0,402% \$1.345.599,518	0,643% \$2.152.959,229	0,643% \$2.152.959,229	0,673% \$2.251.418,515	0,718% \$2.401.428,517	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	\$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P \$ P \$ E	0,879% \$2.943.460,090	1,119% \$3.746.221,933	1,352% \$4.526.221,931	0,234% \$784.434,346	0,249% \$834.434,345	0,732% \$2.451.515,236	0,685% \$2.327.441,159	0,865% \$2.894.155,589	0,866% \$2.897.250,474	1,003% \$3.355.376,226	0,988% \$3.308.061,307	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P \$ P \$ E	0,395% \$1.320.854,726	0,502% \$1.681.087,833	0,620% \$2.076.087,832	0,239% \$800.000,000	0,239% \$800.000,000	0,401% \$1.340.996,339	0,401% \$1.340.996,339	0,641% \$2.145.599,142	0,641% \$2.145.599,142	0,770% \$2.575.798,712	0,784% \$2.624.632,679	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P \$ P \$ E	0,040% \$135.180,141	0,051% \$172.047,452	0,051% \$172.047,453	0,060% \$200.000,000	0,060% \$200.000,000	0,060% \$200.000,000	0,060% \$200.000,000	0,045% \$150.603,870	0,045% \$150.603,870	0,045% \$150.603,870	0,016% \$55.086,856	86,06%
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el ítem de Pago 49, 50)	\$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P \$ P \$ E	0,015% \$48.597,210	0,018% \$61.850,995	0,018% \$61.850,996	0,017% \$56.616,850	0,017% \$56.616,850	0,017% \$56.616,850	0,017% \$56.616,850	0,017% \$56.616,850	0,017% \$56.616,850	0,017% \$56.616,849	0,032% \$108.676,532	
TRANSPORTES (No. de Orden y el ítem de Pago 51, 52, 53)	\$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P \$ P \$ E	0,080% \$266.234,807	0,101% \$338.844,300	0,101% \$338.844,301	0,090% \$300.000,000	0,090% \$300.000,000	0,090% \$300.000,000	0,101% \$339.446,187	0,084% \$314.025,235	0,084% \$314.025,235	0,126% \$422.143,074	0,153% \$512.348,088	
ÍTEMES NO PREVISTOS (No. de Orden y el ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0,000	0,000%	6,244%	% P \$ P \$ E	0,235% \$787.154,372	0,286% \$1.001.832,838	0,365% \$1.221.832,838	0,539% \$1.765.966,845	0,539% \$1.765.966,845	0,539% \$1.765.966,845	0,539% \$1.765.966,845	0,651% \$2.177.584,214	0,794% \$2.657.078,792	0,794% \$2.657.078,792	2,109% \$7.054.246,012	69,86%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334.889.236.546	100,000%	24,391%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 342.230.582.336	102,253%	\$ 81.632.874,444													

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566,111	\$ 10.236.117,071	37,403%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	\$ 800.000,000	\$ -	0,000%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24	\$ 2.812.239,712	\$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000,000	\$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350.550,000	\$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES	\$ -	\$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (K)	\$ -	\$ 334.332,724	55,277%
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA Y IVA)	\$ 9.226.844,067	\$ 495.555,069	5,371%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVE IVA)	\$ 500.000,000	\$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199,890	\$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)	\$ 399.567.436,436		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C(A'+B')	\$ 413.052.964,666	\$ 106.181.548,453	25,707%

NOTAS:

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
- El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

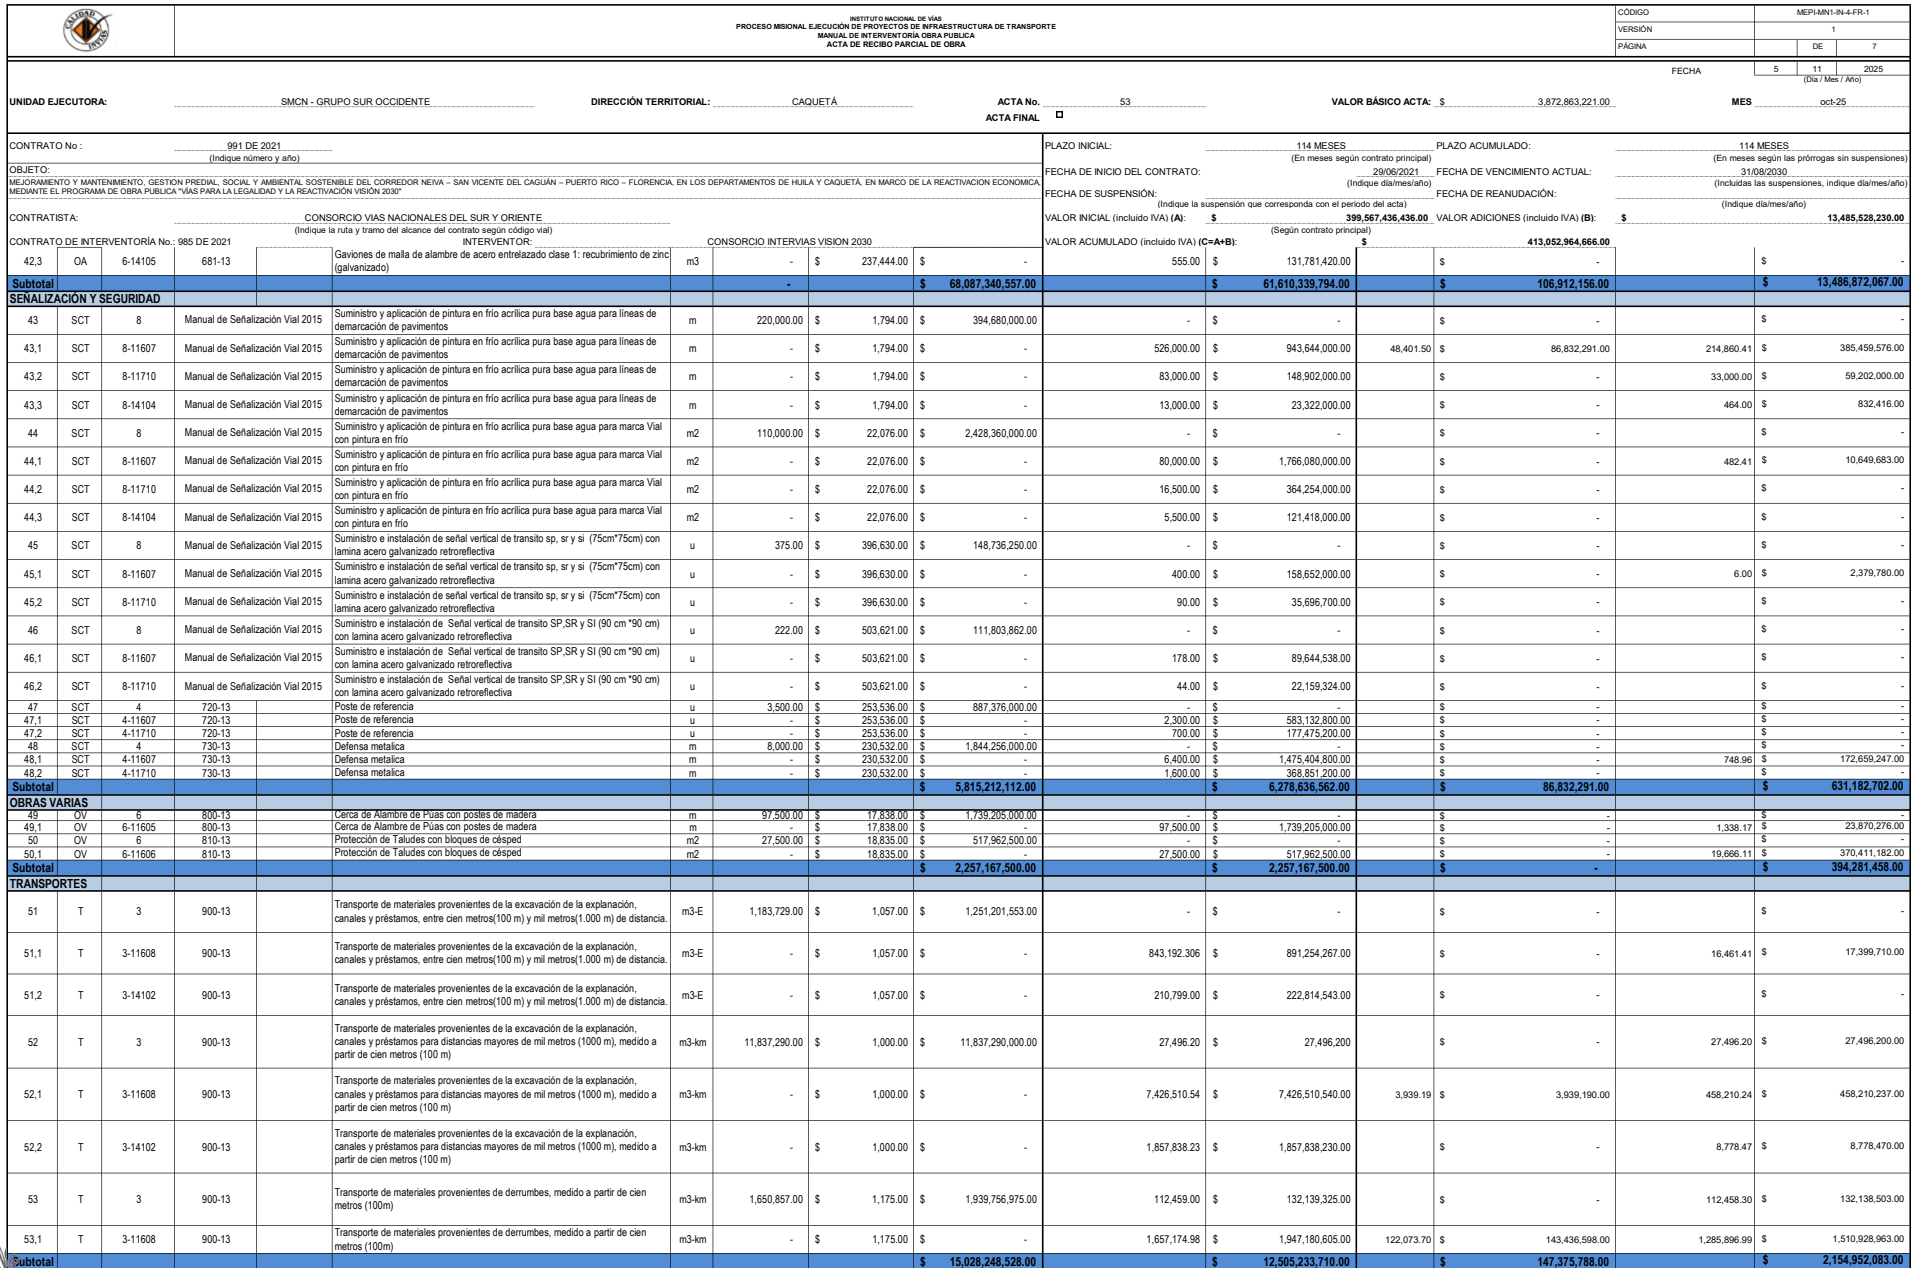
CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVA INICIAL	- - - - -	- - - - -

Aprobado Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

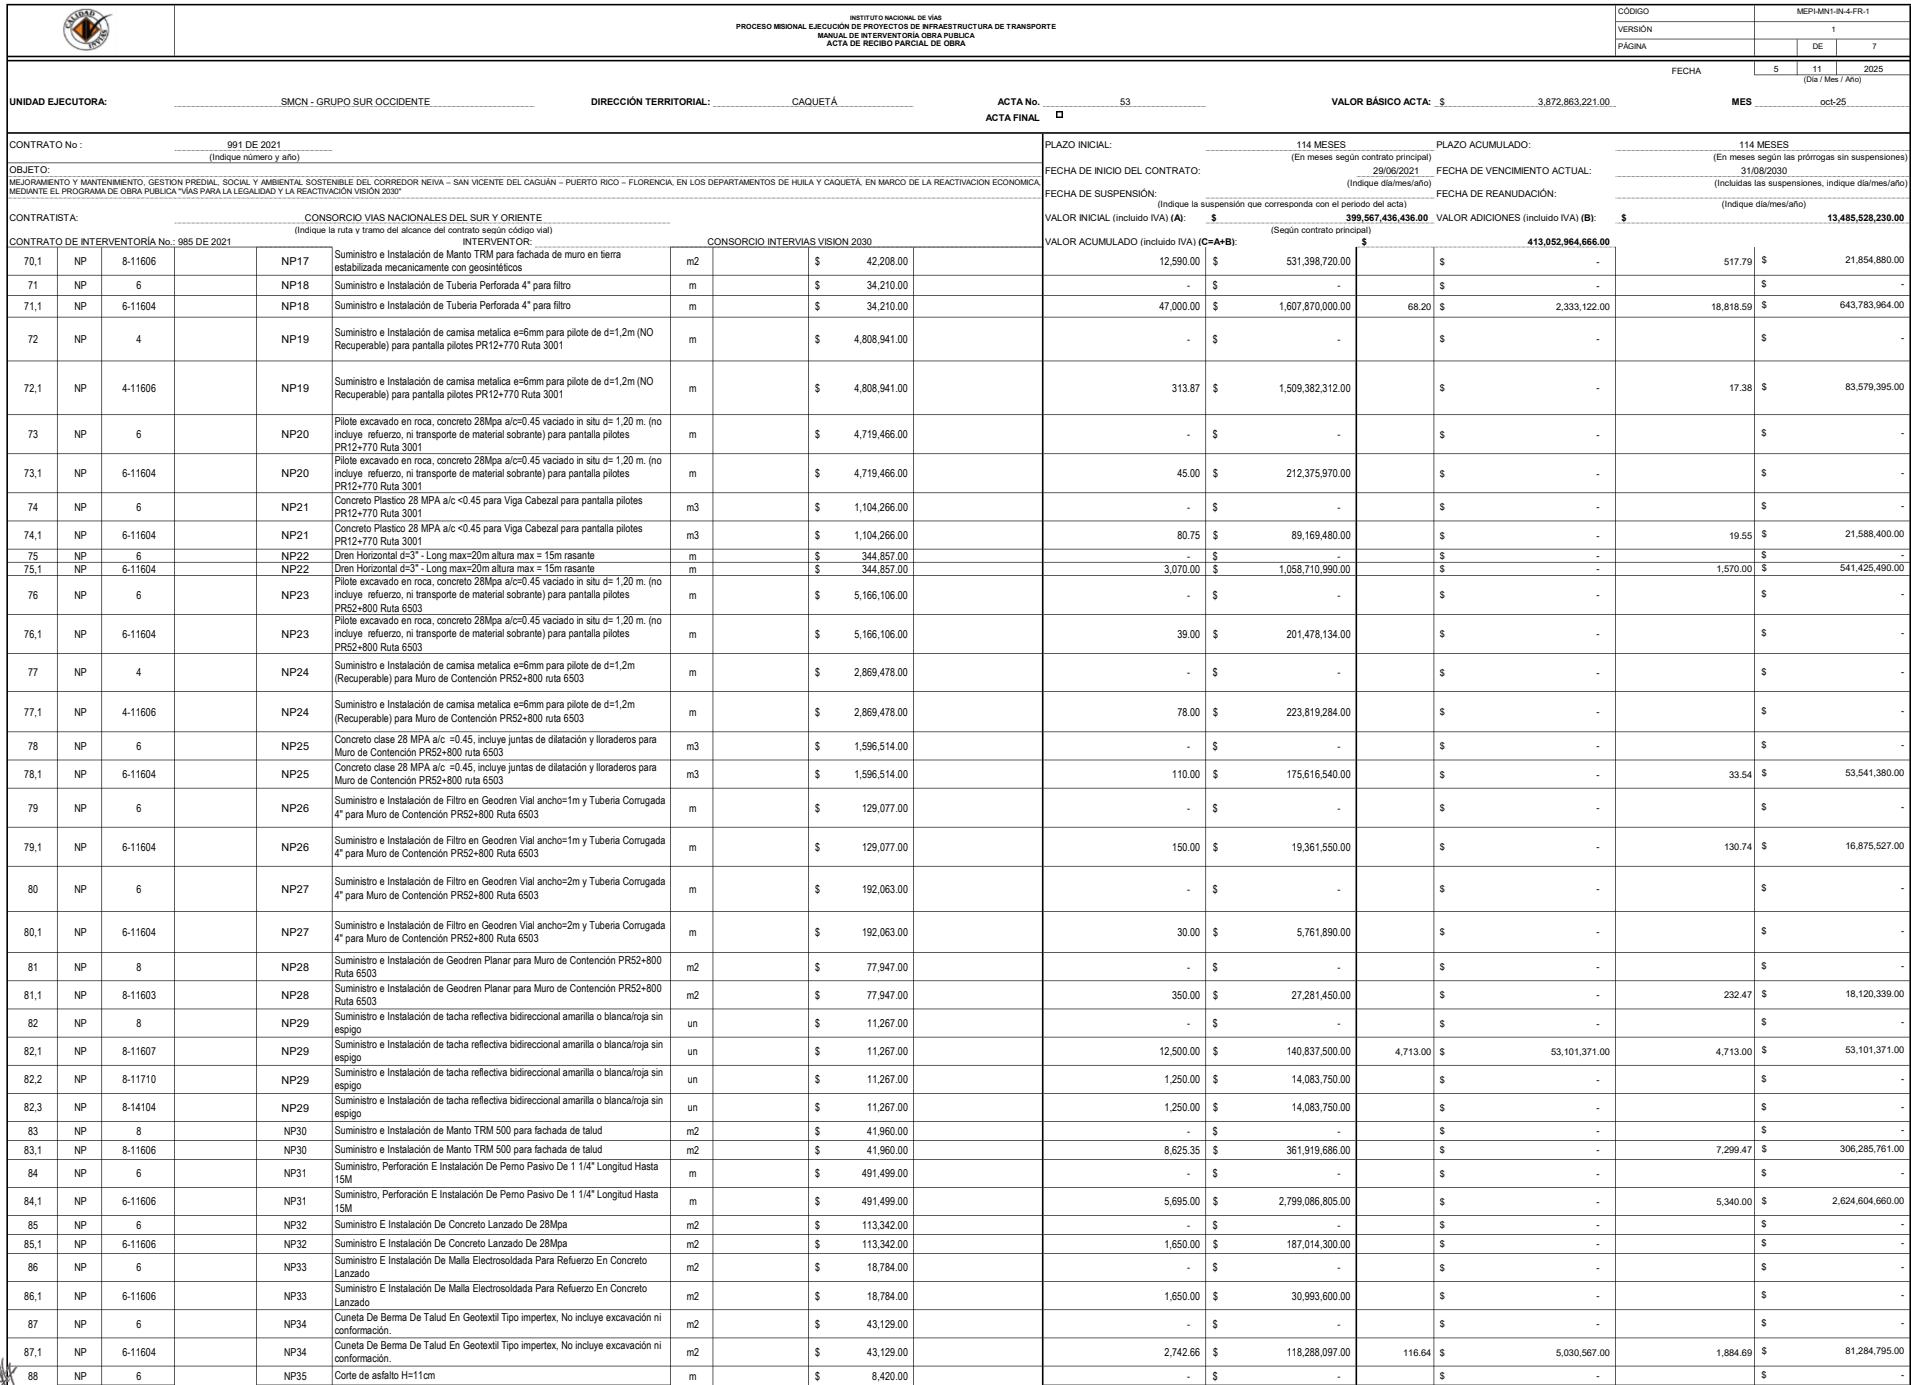
Aprobado Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-44184 CND

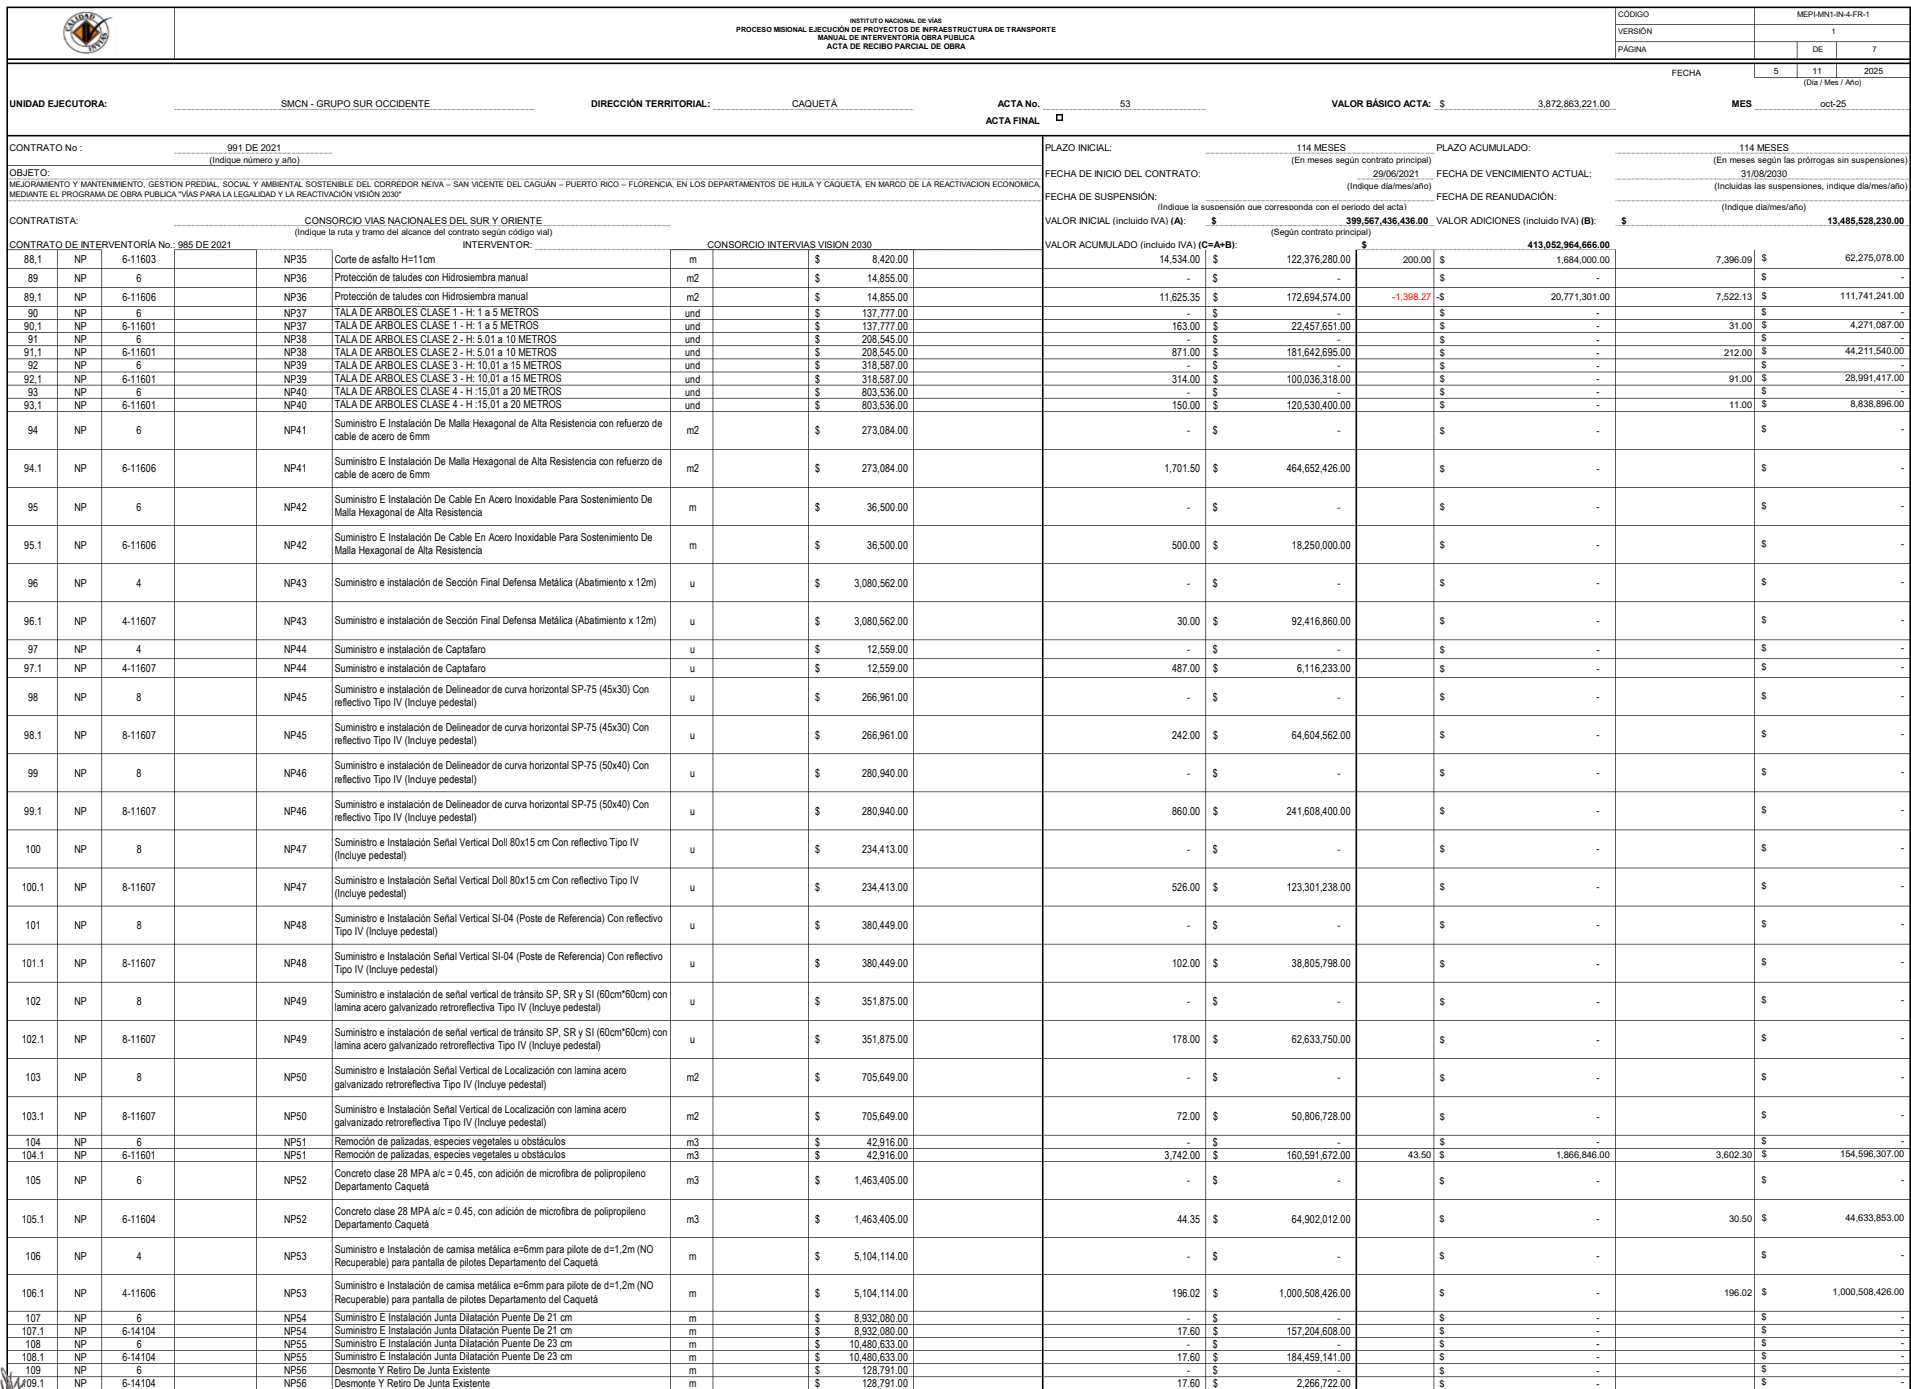
		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTARIO OBRAS PÚBLICAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/MI-NI-4-FR-1				
												VERSIÓN 1				
												PÁGINA DE 7				
												FECHA 5 11 2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No. 53		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.872.863.221,00		MES oct-25								
				ACTA FINAL ☒												
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)												
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)												
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código viat)		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)												
CONTRATO DE INTERVENITORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.485.528.230,00												
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00														
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 11		Última Acta de fecha OCT/2025		OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANACIONES																
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1.1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	2.979,00	\$ 337.779.873,00	\$ -	\$ -	1.829,21	\$ 207.408.315,00	
1.2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	559,00	\$ 63.383.333,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1.3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	186,00	\$ 21.089.962,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	4.515,00	\$ 314.406.540,00	\$ -	\$ -	310,45	\$ 21.618.496,00	
2.2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	1.129,00	\$ 78.619.044,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	130.000,00	\$ 581.750.000,00	\$ -	\$ -	1.120,00	\$ 5.012.000,00	
3.2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	30.000,00	\$ 134.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00	-	\$ -	1.960,51	\$ 20.028.570,00	1.960,51	\$ 20.028.570,00	
4.1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	454.197,00	\$ 4.640.076.552,00	1.551,85	\$ 15.853.700,00	101.249,51	\$ 1.034.365.023,00	
4.2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4.3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	75.700,49	\$ 773.356.206,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5.1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	36.394,00	\$ 2.197.324.144,00	\$ -	\$ -	19.549,34	\$ 1.180.311.123,00	
5.2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5.3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5.4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	6.065,00	\$ 366.180.440,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	E	1	211-13		Remoción de Derumbes	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00	-	\$ -	18.070,68	\$ 176.134.918,00	18.070,68	\$ 176.134.918,00	
6.1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derumbes	m3	-	\$ 9.747,00	\$ -	327.739,32	\$ 3.194.475.152,00	46.990,00	\$ 458.011.530,00	296.825,59	\$ 2.893.158.987,00	
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7.1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	160.000,00	\$ 2.015.040.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7.2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	40.000,00	\$ 503.760.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	E	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8.1	E	1-11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10.300,00	\$ -	300.000,00	\$ 3.090.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9.1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	240.000,00	\$ 1.805.040.000,00	882,00	\$ 6.633.522,00	9.130,30	\$ 68.668.986,00	
9.2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	60.001,00	\$ 451.267.521,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	E	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10.1	E	1-11606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1.332,00	\$ -	261.070,00	\$ 347.745.240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal									\$ 37.290.981.185,00		\$ 24.530.463.131,00		\$ 480.496.752,00		\$ 5.606.706.418,00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00	401.211,66	\$ 371.923.209,00	\$ -	\$ -	401.211,66	\$ 371.923.209,00	
11.1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	959.031,00	\$ 889.021.737,00	\$ -	\$ -	626.041,18	\$ 580.340.174,00	
11.2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	139.757,34	\$ 129.555.054,00	\$ -	\$ -	1.750,50	\$ 1.622.714,00	
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00	-	\$ -	1.504,26	\$ 218.117.700,00	1.504,26	\$ 218.117.700,00	
12.1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	145.236,00	\$ 21.059.220.000,00	1.886,03	\$ 273.474.350,00	80.254,65	\$ 11.636.923.960,00	
12.2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	36.308,74	\$ 5.264.767.300,00	\$ -	\$ -	115,90	\$ 16.805.500,00	
13	S	2	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
13.1	S	2-11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	9.840,00	\$ 1.773.610.800,00	117,60	\$ 21.196.812,00	765,33	\$ 137.946.906,00	
13.2	S	2-11702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	2.460,00	\$ 443.402.700,00	\$ -	\$ -	142,80	\$ 25.738.986,00	
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14.1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	155.100,00	\$ 24.040.500.000,00	\$ -	\$ -	46.445,38	\$ 7.199.033.900,00	
14.2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	38.775,00	\$ 6.010.125.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15.1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	5.712,00	\$ 1.087.479.120,00	\$ -	\$ -	15,30	\$ 2.912.891,00	
15.2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	1.428,00	\$ 271.869.780,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal									\$ 57.206.062.400,00		\$ 61.559.592.400,00		\$ 294.671.162,00		\$ 20.191.365.940,00	
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
16.1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	911.324,00	\$ 1.685.038.076,00	19.111,91	\$ 35.337.922,00	331.550,65	\$ 613.037.160,00	
16.2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	170.873,00	\$ 315.944.177,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
16.3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	56.958,00	\$ 105.315.342,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17	P	8	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17.1	P	8-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	38.456,97	\$ 29.804.154.308,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17.2	P	8-11703	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.000,00	\$ 9.300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17.3	P	8-14104	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.000,00	\$ 3.100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
18	P	8	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.790.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
18.1	P	8-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	68.865,00	\$ 53.385.875.000,00	796,24	\$ 617.086.000,00	21.162,80	\$ 16.401.170.395,00	
18.2	P	8-11703	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.916,00	\$ 10.009.900.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
18.3	P	8-14104	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.305,00	\$ 3.336.375.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
19	P	8	450-9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	\$ 856.527,00	\$ 3.261.654.816,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
19.1	P	8-11603	450-9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 856.527,00	\$ -	3.046,00	\$ 2.608.981.242,00	\$ -	\$ -	22,77	\$ 19.503.120,00	
19.2	P	8-11703	450-9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 856.527,00	\$ -	762,00	\$ 652.673.574,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20	P	8	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	4.284,00	\$ 72.822,00	\$ 311.969.448,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20.1	P	8-11603	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	-	\$ 72.822,00	\$ -	3.427,00	\$ 249.560.994,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
												VERSIÓN	1				
												PÁGINA	DE	7			
												FECHA		S 11 2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No.		53		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 3,872,863,221.00	MES oct-25		
								ACTA FINAL		☐							
CONTRATO No :		991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL:		114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAQUETÁ – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		29/09/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		(Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 399,567,436,436.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ 13,485,628,230.00					
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 413,052,964,666.00									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21	OA	6	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	\$ 32,667.00	\$ 260,519,325.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	
21.1	OA	6-11604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	39,460.00	\$ 1,289,039,820.00	40.48	\$ 1,322,360.00	31,053.10	\$ 1,014,411,633.00	-	-	
21.2	OA	6-11705	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	6,836.00	\$ 223,311,612.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
21.3	OA	6-14102	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	2,279.00	\$ 74,448,093.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
22	OA	6	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	\$ 81,882.00	\$ 1,896,059,592.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
22.1	OA	6-11604	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	18,525.00	\$ 1,516,864,050.00	36.48	\$ 2,987,055.00	152.06	\$ 12,450,977.00	-	-	
22.2	OA	6-11705	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	3,473.00	\$ 284,376,186.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
22.3	OA	6-14102	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	1,158.00	\$ 94,819,356.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
23	OA	6	610-13	Relleno para estructuras con relleno	m3	36,173.00	\$ 93,098.00	\$ 3,367,633,954.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
23.1	OA	6-11604	610-13	Relleno para estructuras con relleno	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	20,000.00	\$ 1,861,960,000.00	78.37	\$ 7,296,090.00	350.67	\$ 32,646,676.00	-	-	
23.2	OA	6-11705	610-13	Relleno para estructuras con relleno	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	5,000.00	\$ 465,490,000.00	-	\$ -	43.78	\$ 4,075,830.00	-	-	
23.3	OA	6-14103	610-13	Relleno para estructuras con relleno	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	1,500.00	\$ 139,647,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
24	OA	6	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38,609.00	\$ 176,922.00	\$ 6,830,781,498.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
24.1	OA	6-11604	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	30,887.00	\$ 5,464,589,814.00	-	\$ -	2,979.63	\$ 527,161,476.00	-	-	
24.2	OA	6-11705	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	5,791.00	\$ 1,024,555,302.00	-	\$ -	511.54	\$ 90,502,680.00	-	-	
24.3	OA	6-14103	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	1,931.00	\$ 341,636,382.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
25	OA	6	610-13	Rellenos con gravilla	m3	326.00	\$ 151,702.00	\$ 49,454,852.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
25.1	OA	6-11604	610-13	Rellenos con gravilla	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	661.00	\$ 100,275,022.00	-	\$ -	165.16	\$ 25,055,102.00	-	-	
25.2	OA	6-11705	610-13	Rellenos con gravilla	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	124.00	\$ 18,811,048.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
25.3	OA	6-14103	610-13	Rellenos con gravilla	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	41.00	\$ 6,219,782.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
26	OA	6	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	\$ 2,286,822.00	\$ 2,805,930,594.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
26.1	OA	6-11604	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2,286,822.00	\$ -	556.00	\$ 1,271,473,032.00	-	\$ -	542.00	\$ 1,239,457,524.00	-	-	
26.2	OA	6-14101	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2,286,822.00	\$ -	371.00	\$ 848,410,962.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
27	OA	6	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	\$ 1,232,450.00	\$ 5,263,793,950.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
27.1	OA	6-14103	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	\$ 1,232,450.00	\$ -	2,602.00	\$ 3,206,834,900.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
28	OA	6	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	\$ 996,330.00	\$ 8,745,784,740.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
28.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	3,822.00	\$ 3,807,973,260.00	22.23	\$ 22,148,416.00	1,844.98	\$ 1,838,212,428.00	-	-	
28.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	717.00	\$ 714,368,610.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
28.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	239.00	\$ 238,122,870.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
29	OA	6	630-13	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	2,703.00	\$ 1,086,707.00	\$ 2,937,369,021.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
29.1	OA	6-14104	630-13	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	-	\$ 1,086,707.00	\$ -	1,703.00	\$ 1,850,662,021.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
30	OA	6	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	\$ 687,013.00	\$ 9,594,136,545.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
30.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	10,000.00	\$ 6,870,130,000.00	-	\$ -	152.39	\$ 104,693,911.00	-	-	
30.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	1,900.00	\$ 1,305,324,700.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
30.3	OA	6-14103	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	698.00	\$ 479,535,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
31	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	\$ 473,683.00	\$ 1,631,364,252.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
31.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	2,755.00	\$ 1,304,996,665.00	18.12	\$ 8,583,136.00	797.36	\$ 377,696,012.00	-	-	
31.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	517.00	\$ 244,894,111.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
31.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	172.00	\$ 81,473,476.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
32	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopico	m3	6,348.00	\$ 439,711.00	\$ 2,791,285,428.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
32.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopico	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	4,500.00	\$ 1,978,699,500.00	-	\$ -	654.73	\$ 287,891,983.00	-	-	
32.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopico	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	900.00	\$ 395,739,900.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
32.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopico	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	300.00	\$ 131,913,300.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
33	OA	4	632.1P	Baranda Metálica	m	1,319.00	\$ 544,754.00	\$ 718,530,526.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
33.1	OA	4-14104	632.1P	Baranda Metálica	m	-	\$ 544,754.00	\$ -	1,319.00	\$ 718,530,526.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
34	OA	4	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,759,885.00	\$ 5,378.00	\$ 9,464,661,530.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
34.1	OA	4-11604	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	1,055,931.00	\$ 5,678,796,918.00	3.979.22	\$ 21,400,245.00	343,592.75	\$ 1,847,841,831.00	-	-	
34.2	OA	4-11705	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	351,977.00	\$ 1,892,932,306.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
34.3	OA	4-14101	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
34.4	OA	4-14103	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
34.5	OA	4-14104	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,995.00	\$ 473,237,110.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
34.6	OA	4-11606	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	-	\$ -	41,534.68	\$ 223,373,509.00	-	-	
35	OA	4	641-13	Acero de Priesfuerzo	Tl-m	111,740.00	\$ 2,237.00	\$ 249,962,380.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
35.1	OA	4-14103	641-13	Acero de Priesfuerzo	Tl-m	-	\$ 2,237.00	\$ -	111,740.00	\$ 249,962,380.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
36	OA	6	642.2P	Junta para puentes 1'40" (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	\$ 1,583,123.00	\$ 134,565,455.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
36.1	OA	6-14104	642.2P	Junta para puentes 1'40" (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	\$ 1,583,123.00	\$ -	85.00	\$ 134,565,455.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
37	OA	6	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287.00	\$ 617,637.00	\$ 177,261,819.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	
37.1	OA	6-11604	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	\$ 617,637.00	\$ -	2,630.00	\$ 1,624,385,310.00	28.00	\$ 17,293,836.00	856.90	\$ 529,253,145.00	-	-	
37.2	OA	6-11705	661-														




		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 7			
										FECHA		5 11 2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No. 53		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.872.863.221,00		MES oct-25	
CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 985 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.485.628.230,00					
ITEMS NO PREVISTOS						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00							
54	NP	3	NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	\$ 1.175,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54,1	NP	3-11608	NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	\$ 1.175,00	1.939.934,00	\$ 2.279.422.450,00	52.522,89	\$ 61.714.396,00	1.291.995,28	\$ 1.518.094.454,00	\$ -
55	NP	8	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$ 522.909,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55,1	NP	8-11603	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$ 522.909,00	11.120,00	\$ 5.814.748.080,00	23,83	\$ 12.460.921,00	5.158,75	\$ 2.697.556.804,00	\$ -
55,2	NP	8-11703	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$ 522.909,00	5.486,00	\$ 2.868.678.774,00		\$ -	833,72	\$ 435.959.691,00	\$ -
56	NP	1	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 118.425,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56,1	NP	1-11601	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 118.425,00	42.000,00	\$ 4.973.850.000,00	869,30	\$ 102.946.853,00	14.175,45	\$ 1.678.727.666,00	\$ -
56,2	NP	1-11701	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 118.425,00	10.500,00	\$ 1.243.462.500,00		\$ -		\$ -	\$ -
57	NP	2	NP4	Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 78.905,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
57,1	NP	2-11602	NP4	Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 78.905,00	42.000,00	\$ 3.314.010.000,00	493,51	\$ 38.940.407,00	13.504,73	\$ 1.065.590.335,00	\$ -
57,2	NP	2-11702	NP4	Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 78.905,00	10.500,00	\$ 828.502.500,00		\$ -		\$ -	\$ -
58	NP	2	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$ 99.544,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
58,1	NP	2-11602	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$ 99.544,00	4.200,00	\$ 418.084.800,00		\$ -	4.151,67	\$ 413.273.838,00	\$ -
58,2	NP	2-11702	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$ 99.544,00	8.050,00	\$ 801.329.200,00	596,15	\$ 59.343.156,00	6.825,13	\$ 679.400.741,00	\$ -
59	NP	1	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$ 11.303,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59,1	NP	1-11601	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$ 11.303,00	300.800,00	\$ 3.399.942.400,00	371,32	\$ 4.197.030,00	83.801,61	\$ 947.209.598,00	\$ -
59,2	NP	1-11701	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$ 11.303,00	107.260,00	\$ 1.212.359.780,00		\$ -	1.905,76	\$ 21.540.760,00	\$ -
60	NP	1	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$ 150.333,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60,1	NP	1-11601	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$ 150.333,00	4.864,00	\$ 731.219.712,00		\$ -	21,08	\$ 3.169.020,00	\$ -
60,2	NP	1-11701	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$ 150.333,00	1.216,00	\$ 182.804.928,00		\$ -		\$ -	\$ -
61	NP	8	NP8	Geomalla Biaxial 30 KNM o similar	m2	\$ 17.917,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61,1	NP	8-11603	NP8	Geomalla Biaxial 30 KNM o similar	m2	\$ 17.917,00	85.000,00	\$ 1.522.945.000,00		\$ -		\$ -	\$ -
61,2	NP	8-11703	NP8	Geomalla Biaxial 30 KNM o similar	m2	\$ 17.917,00	20.000,00	\$ 358.340.000,00		\$ -		\$ -	\$ -
62	NP	8	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$ 20.929,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62,1	NP	8-11602	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$ 20.929,00	170.000,00	\$ 3.557.930.000,00		\$ -		\$ -	\$ -
62,2	NP	8-11702	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$ 20.929,00	46.000,00	\$ 962.734.000,00		\$ -		\$ -	\$ -
63	NP	6	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$ 91.810,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63,1	NP	6-11604	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$ 91.810,00	1.152,00	\$ 105.765.120,00		\$ -	624,85	\$ 57.367.479,00	\$ -
63,2	NP	6-11705	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$ 91.810,00	216,00	\$ 19.830.960,00		\$ -		\$ -	\$ -
63,3	NP	6-14105	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$ 91.810,00	72,00	\$ 6.610.320,00		\$ -		\$ -	\$ -
64	NP	2	NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	\$ 218.221,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64,1	NP	2-11602	NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	\$ 218.221,00	17.219,00	\$ 3.757.547.399,00	724,15	\$ 158.024.737,00	3.831,20	\$ 836.048.295,00	\$ -
65	NP	8	NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 43.721,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65,1	NP	8-11603	NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 43.721,00	47.440,00	\$ 2.074.124.240,00	6.746,72	\$ 294.973.345,00	13.418,79	\$ 586.682.918,00	\$ -
66	NP	8	NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 79.973,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
66,1	NP	8-11603	NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 79.973,00	268,00	\$ 21.432.764,00		\$ -	124,05	\$ 9.920.651,00	\$ -
67	NP	8	NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 46.553,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67,1	NP	8-11603	NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 46.553,00	2.073,00	\$ 96.504.369,00		\$ -	247,44	\$ 11.519.074,00	\$ -
68	NP	8	NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 122.472,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68,1	NP	8-11604	NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 122.472,00	181,00	\$ 22.167.432,00		\$ -	150,60	\$ 18.444.283,00	\$ -
69	NP	8	NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$ 33.343,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
69,1	NP	8-11603	NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$ 33.343,00	1.166,00	\$ 38.877.938,00		\$ -	1.085,00	\$ 36.177.155,00	\$ -
70	NP	8	NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 42.208,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -





		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA					CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP/IMN1-IN-4-FR-1 1 7					
							FECHA		5 11 2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No. 53		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,872,863,221.00		MES oct-25		
						ACTA FINAL ☐								
CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)							PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021							INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13,485,528,230.00			
							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413,052,964,666.00							
110	NP	6		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaraúdas (No incluye el acero)	u	\$ 21,616.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
110.1	NP	6-11604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaraúdas (No incluye el acero)	u	\$ 21,616.00	590.00	\$ 12,753,440.00	\$ -	543.00	\$ 11,737,488.00	\$ -	
111	NP	6		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaraúdas (No incluye el acero)	u	\$ 22,571.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
111.1	NP	6-11604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaraúdas (No incluye el acero)	u	\$ 22,571.00	150.00	\$ 3,385,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
112	NP	4		NP59	Suministro e instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	\$ 4,808,941.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
112.1	NP	4-11606		NP59	Suministro e instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	\$ 4,808,941.00	90.00	\$ 432,804,690.00	\$ -	90.00	\$ 432,804,690.00	\$ -	
113	NP	6		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	\$ 1,104,266.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
113.1	NP	6-11604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	\$ 1,104,266.00	61.20	\$ 67,581,079.00	\$ -	61.20	\$ 67,581,079.00	\$ -	
114	NP	6		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	\$ 56,957.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
114.1	NP	6-11604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	\$ 56,957.00	377.12	\$ 21,479,624.00	\$ 17.01	968,839.00	\$ 12,950,313.00	\$ -	
115	NP	6		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y floraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	\$ 1,278,774.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
115.1	NP	6-11604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y floraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	\$ 1,278,774.00	30.24	\$ 38,670,126.00	\$ -	29.25	\$ 37,404,140.00	\$ -	
116	NP	6		NP63	Suministro e instalación de Filtro en Geotren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	\$ 122,176.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
116.1	NP	6-11604		NP63	Suministro e instalación de Filtro en Geotren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	\$ 122,176.00	36.00	\$ 4,398,336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
117	NP	8		NP64	Suministro e instalación de Geotren Planar ancho=1m	m	\$ 79,514.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
117.1	NP	8-11603		NP64	Suministro e instalación de Geotren Planar ancho=1m	m	\$ 79,514.00	68.40	\$ 5,438,758.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
118	NP	6		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	\$ 91,491.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
118.1	NP	6-14105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	\$ 91,491.00	26.00	\$ 2,378,766.00	\$ -	16.26	\$ 1,487,644.00	\$ -	
119	NP	6		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	\$ 8,711.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
119.1	NP	6-14105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	\$ 8,711.00	288.60	\$ 2,513,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
120	NP	6		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X11" - Dureza 60	u	\$ 7,243,323.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
120.1	NP	6-14104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X11" - Dureza 60	u	\$ 7,243,323.00	8.00	\$ 57,946,584.00	\$ 8.00	57,946,584.00	\$ 57,946,584.00	\$ -	
121.0	NP	6		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	\$ 1,049,049.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
121.1	NP	6-14104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	\$ 1,049,049.00	8.00	\$ 8,392,392.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
122.0	NP	4		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg	\$ 11,017.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
122.1	NP	6-14104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg	\$ 11,017.00	108,328.15	\$ 1,193,451,229.00	\$ 866.93	9,550,968.00	\$ 1,193,296,219.00	\$ -	
123.0	NP	4		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg	\$ 8,756.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
123.1	NP	4-14104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg	\$ 8,756.00	108,328.15	\$ 948,521,281.00	\$ 108,314.08	948,398,084.00	\$ 948,398,084.00	\$ -	
124.0	NP	3		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg	\$ 930.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
124.1	NP	3-14104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg	\$ 930.00	108,328.15	\$ 100,745,179.00	\$ 866.93	806,244.00	\$ 100,732,094.00	\$ -	
125.0	NP	6		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	\$ 53,433.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
125.1	NP	6-14105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	\$ 53,433.00	8.00	\$ 427,464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
126.0	NP	8		NP73	Asfaltita (material suelo) para actividades de reparcho manual - Mina Las Pabas	m3	\$ 246,858.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
126.1	NP	8-11603		NP73	Asfaltita (material suelo) para actividades de reparcho manual - Mina Las Pabas	m3	\$ 246,858.00	500.00	\$ 123,429,000.00	\$ 15.00	3,702,870.00	\$ 3,702,870.00	\$ -	
127.0	NP	6		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3	\$ 1,363,662.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
127.1	NP	6-11604		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3	\$ 1,363,662.00	1,292.00	\$ 1,761,851,304.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
128.0	NP	6		NP75	Bombos para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	\$ 177,530.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
128.1	NP	6-11604		NP75	Bombos para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	\$ 177,530.00	298.00	\$ 52,903,940.00	\$ 136.85	24,294,981.00	\$ 24,294,981.00	\$ -	
129.0	NP	6		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puentes Las Delicias	m2	\$ 356,390.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
129.1	NP	6-11604		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puentes Las Delicias	m2	\$ 356,390.00	520.00	\$ 185,322,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
130.0	NP	6		NP77	Desmonte Y Demolición Puentes Las Delicias PR38-200 Ruta 6503	m3	\$ 1,673,243.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
130.1	NP	6-14101		NP77	Desmonte Y Demolición Puentes Las Delicias PR38-200 Ruta 6503	m3	\$ 1,673,243.00	180.00	\$ 301,183,740.00	\$ 106.26	177,798,801.00	\$ 177,798,801.00	\$ -	
131.0	NP	3		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puentes Las	m3	\$ 124,027.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
131.1	NP	3-11608		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puentes Las	m3	\$ 124,027.00	180.00	\$ 22,324,860.00	\$ 106.26	13,179,109.00	\$ 13,179,109.00	\$ -	
132.0	NP	6		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	\$ 3,888,479.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
132.1	NP	6-11601		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	\$ 3,888,479.00	2.00	\$ 7,776,958.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
133.0	NP	8		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H 20.01 a 25 METROS	u	\$ 1,231,836.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
133.1	NP	8-11607		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H 20.01 a 25 METROS	u	\$ 1,231,836.00	37.00	\$ 45,577,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
134.0	NP	8		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H 25.01 a 30 METROS	u	\$ 1,515,525.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
134.1	NP	8-11607		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H 25.01 a 30 METROS	u	\$ 1,515,525.00	11.00	\$ 16,670,775.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
135.0	NP	6		NP82	Prueba de Carga Para Puentes	u	\$ 25,159,722.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
135.1	NP	6-14104		NP82	Prueba de Carga Para Puentes	u	\$ 25,159,722.00	1.00	\$ 25,159,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
136.0	NP	6		NP83	Suministro e instalación de Filtro en Geotren Vial ancho=0.5m y Tubería	m	\$ 73,351.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
136.1	NP	6-14105		NP83	Suministro e instalación de Filtro en Geotren Vial ancho=0.5m y Tubería	m	\$ 73,351.00	480.00	\$ 35,208,480.00	\$ 84.40	6,190,824.00	\$ 6,190,824.00	\$ -	
Subtotal							\$ -	\$ 58,872,923,072.00	\$ 84.40	\$ 2,018,682,754.00	\$ 84.40	\$ 20,032,301,469.00	\$ -	
Ajuste al peso												\$ 3.00	\$ -	



FECHA	5	11	2025
-------	---	----	------

CONTRATO No.:	991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PEDIDA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAGUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "GÁS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"				
		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$	399,567,436,436.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$	13,485,528,230.00
					(Según contrato principal)			

CONTRATO DE INTERVENCIÓN	INTERVENCIÓN	CONSORCIO INTERVIA VISIÓN 2030	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C2+A+B)	\$	\$
(A) VALOR TOTAL (F1+H+M+N)			\$ 324,230,582,336.00	\$ 3,787,396,825.00	\$ 413,052,964,666.00
(B) SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)			\$ 334,689,236,546.00	\$ 3,787,396,825.00	\$ 79,531,372,835.00
(C) SUBPROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)			\$ 49,343,566,111.00	\$ 514,229,264,406.00	\$ 17,759,215,010.00
(D) SUBPROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)			\$ 800,000,000.00	\$ 800,000,000.00	\$ -
(E) VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)			\$ 384,832,802,657.00	\$ 394,459,846,742.00	\$ 97,290,587,845.00
(F) VALOR IVA (OBRAS) (E)			\$ 2,812,239,712.00	\$ 2,882,591,187.00	\$ 710,969,681.00
(G) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(E+F)			\$ 387,645,042,369.00	\$ 397,342,437,929.00	\$ 98,001,557,526.00
(H) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)			\$ 1,845,000,000.00	\$ 1,845,000,000.00	\$ -
(I) IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)			\$ 350,550,000.00	\$ 350,550,000.00	\$ 315,495,000.00
(J) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS H+I+H			\$ 2,195,550,000.00	\$ 2,195,550,000.00	\$ 1,975,995,000.00
(K) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (J)			\$ 3,183,304,765.00	\$ 3,183,304,765.00	\$ 85,466,396.00
(L) IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (K)			\$ 604,827,905.00	\$ 604,827,905.00	\$ 1,029,645,951.00
(M) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES L+K+L			\$ 3,788,132,670.00	\$ 3,788,132,670.00	\$ 334,323,724.00
(N) GESTIÓN SOCIAL, PRECIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)			\$ 9,226,844,067.00	\$ 9,226,844,067.00	\$ 209,978,639.00
(O) SUBPROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)			\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 459,524,116.00
(P) VALOR TOTAL (F1+H+M+N)			\$ 399,567,436,436.00	\$ 413,052,964,666.00	\$ 9,906,676.00
(Q) VALOR TOTAL (F1+H+M+N)			\$ 399,567,436,436.00	\$ 413,052,964,666.00	\$ 102,540,963,957.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Utilidad	30	%
Utilidad	5	%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.885.528.230.00	3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 113.621.905.00	1.15%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 2.168.307.096.00	21.93%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 7.717.221.134.00	78.07%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 3,787,396,825.00	\$ 27,677,131.00	\$ 3,815,073,956.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES	\$ 85,496,396.00	\$ 16,238,615.00	\$ 101,705,011.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 3,872,863,221.00	\$ 43,915,746.00	\$ 3,916,778,967.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	3.872.863.221.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	3.759.241.316.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO
E	\$	480,498,752.00	\$ 5,606,706,418.00
SB	\$	294,671,162.00	\$ 12,989,419,149.00
B	\$	-	\$ 7,201,946,791.00
P	\$	652,423,922.00	\$ 17,033,710,675.00
OA	\$	106,912,156.00	\$ 13,486,872,067.00
SCT	\$	86,832,291.00	\$ 631,182,702.00
OV	\$	-	\$ 394,281,458.00
T	\$	147,375,788.00	\$ 2,154,952,083.00
NP	\$	2,018,682,754.00	\$ 20,032,301,489.00
AJUSTE AL PESO			\$ 3.00
TOTAL	\$	3,787,396,825.00	\$ 79,531,372,835.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Exploración	\$ 587,642,635.00	\$ 5,806,706,418.00
2 Sub-bases y bases	\$ 509,979,462.00	\$ 20,191,365,940.00
3 Transporte de materiales	\$ 223,075,537.00	\$ 2,154,952,083.00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 979,349,297.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 328,851,480.00	\$ 34,544,637,716.00
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 1,117,498,414.00	\$ 17,033,710,675.00
AJUSTE AL PESO		\$ 3.00
TOTAL	\$ 3,787,396,825.00	\$ 79,531,372,835.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE 7

FECHA

5112025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

ACTA No.

53

VALOR BÁSICO ACTA:

\$3,872,863,221.00

MES

oct-25

CONTRATO No:

991 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL:

114 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

29/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$399,567,436.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$13,485,628,230.00

(Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$413,052,964,666.00

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías Interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 589,509,481.00	\$ 8,280,558,461.00
Vías Interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	\$ 491,636,306.00	\$ 21,872,070,299.00
Vías Interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ 965,245,058.00	\$ 20,459,665,564.00
Vías Interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	\$ 125,535,971.00	\$ 14,407,948,650.00
Vías Interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ 23,870,276.00
Vías Interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ 20,771,301.00	\$ 5,175,163,744.00
Vías Interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ 139,933,662.00	\$ 624,249,657.00
Vías Interurbanas Transporte y sobre accesos 11608	\$ 222,269,293.00	\$ 3,517,812,473.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	\$ -	\$ 21,540,760.00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ 59,343,156.00	\$ 723,567,941.00
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ 435,959,691.00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	\$ -	\$ 171,817,118.00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$ -	\$ 59,202,000.00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	\$ 177,798,801.00	\$ 177,798,801.00
Puentes Subestructura y cimentación 14102	\$ -	\$ 8,778,470.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	\$ -	\$ 174,872,331.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	\$ 1,016,701,880.00	\$ 2,301,205,397.00
Puentes Drenajes 14105	\$ 20,194,518.00	\$ 149,452,099.00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	\$ 3,787,396,825.00	\$ 79,531,372,835.00
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$3,803,157,062.00

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

ANIBAL OLIVERA CARRIAZO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Matrícula No.: 25202-57327 CND

Firma:

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MBONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI/MN1-IN-4-FR-1					
										VERSIÓN		1					
										PÁGINA			DE	7			
										FECHA		3	12	2025			
												MAY-25					
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		ACTA No. 64		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.137.366.369,00		MES: nov-25	
										ACTA FINAL		U					
CONTRATO No : 901 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE NÚLVA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y el tamaño del alcance del contrato según código vital)										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:					
										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.435,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.485.528.230,00					
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 985 DE 2021										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00							
INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																	
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 11		Última Acta de de fecha OCT/2025		OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO		
EXPLANACIONES																	
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	2.979,00	\$ 337.779.873,00	19,99	\$ 2.266.606,00	-	1.849,20	\$ 209.674.921,00	-
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	559,00	\$ 63.383.333,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	186,00	\$ 21.089.982,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	4.515,00	\$ 314.406.540,00	5,00	\$ 348.180,00	-	315,45	\$ 21.966.676,00	-
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	1.129,00	\$ 78.619.044,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	130.000,00	\$ 581.750.000,00	-	\$ -	-	1.120,00	\$ 5.012.000,00	-
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	30.000,00	\$ 134.250.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	\$ -	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	-
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	454.197,00	\$ 4.640.076.552,00	468,33	\$ 4.784.459,00	-	101.717,84	\$ 1.039.149.482,00	-
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	75.700,49	\$ 773.356.206,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	36.394,00	\$ 2.197.324.144,00	-	\$ -	-	19.549,34	\$ 1.180.311.123,00	-
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	6.065,00	\$ 366.180.440,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
6	E	1	211-13		Remoción de Derumbes	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-	\$ -	-	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-
6,1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derumbes	m3	-	\$ 9.747,00	\$ -	327.739,32	\$ 3.194.475.152,00	17.500,00	\$ 170.572.900,00	-	314.325,59	\$ 3.063.731.487,00	-
7	E	1	220-1		Terrapienes	m3	680.805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
7,1	E	1-11601	220-1		Terrapienes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	160.000,00	\$ 2.015.040.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
7,2	E	1-11701	220-1		Terrapienes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	40.000,00	\$ 503.760.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
8	E	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
8,1	E	1-11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10.300,00	\$ -	300.000,00	\$ 3.090.000.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	240.000,00	\$ 1.805.040.000,00	572,00	\$ 4.302.012,00	-	9.702,30	\$ 72.970.998,00	-
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	60.001,00	\$ 451.267.521,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
10	E	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
10,1	E	1-11606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1.332,00	\$ -	261.070,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
Subtotal									\$ 37.290.981.185,00		\$ 24.530.463.131,00		\$ 182.273.757,00			\$ 5.788.980.175,00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	\$ -	-	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	959.031,00	\$ 889.021.737,00	-	\$ -	-	626.041,18	\$ 580.340.174,00	-
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	139.757,34	\$ 129.555.054,00	-	\$ -	-	-	\$ 1.622.714,00	-
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	145.236,00	\$ 21.059.220.000,00	1.332,31	\$ 193.184.950,00	-	81.586,96	\$ 11.830.108.910,00	-
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	36.308,74	\$ 5.264.767.300,00	-	\$ -	-	115,90	\$ 16.805.500,00	-
13	S	2	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
13,1	S	2-11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	9.840,00	\$ 1.773.610.800,00	172,16	\$ 31.030.979,00	-	937,49	\$ 168.977.885,00	-
13,2	S	2-11702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	2.460,00	\$ 443.402.700,00	-	\$ -	-	142,80	\$ 25.738.986,00	-
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	155.100,00	\$ 24.040.500.000,00	-	\$ -	-	46.445,38	\$ 7.199.033.900,00	-
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	38.775,00	\$ 6.010.125.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	5.712,00	\$ 1.087.479.120,00	-	\$ -	-	15,30	\$ 2.912.891,00	-
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	1.428,00	\$ 271.869.780,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
Subtotal									\$ 57.206.062.400,00		\$ 61.559.592.400,00		\$ 224.215.929,00			\$ 20.415.581.869,00	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	911.324,00	\$ 1.686.038.076,00	7.853,72	\$ 14.521.528	-	339.404,37	\$ 627.558.688,00	-
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	170.873,00	\$ 315.944.177,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	56.958,00	\$ 105.315.342,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
17	P	8	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
17,1	P	8-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	38.456,97	\$ 29.804.154.308,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
17,2	P	8-11703	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.000,00	\$ 9.300.000.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
17,3	P	8-14104	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.000,00	\$ 3.100.000.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
18	P	8	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.700.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
18,1	P	8-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	68.885,00	\$ 53.385.875.000,00	675,79	\$ 523.737.250	-	21.838,59	\$ 16.924.907.645,00	-
18,2	P	8-11703	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.916,00	\$ 10.009.900.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
18,3	P	8-14104	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.305,00	\$ 3.336.375.000,00	-	\$ -	-	-	\$ -	-
19	P	8	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	\$ 856.527,00	\$ 3.261.654.816,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-
19,1	P	8-11603	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 856.527,00	\$ -	3.046,00	\$ 2.608.981.242,00	-	\$ -	-	22,77	\$ 19.503.12	


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEPMN1-IN-4-FR-1 1 7	
												FECHA		3 12 2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETA		ACTA No. 54		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.137.366.359,00		MES nov-25			
CONTRATO No:		991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL:		114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		FECHA			
OBJETO:		RECONSTRUYENDO, GESTIONANDO, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIENDO EL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAQUETA - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		29/05/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/08/2030 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)		FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		(Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.495.628.230,00		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.062.964.666,00					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	\$	32.667,00	\$	260.519.325,00		-		
21.1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	32.667,00	\$	-		-		
21.2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	32.667,00	\$	-		-		
21.3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	32.667,00	\$	-		-		
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	\$	81.882,00	\$	1.896.059.592,00		-		
22.1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.882,00	\$	-		-		
22.2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.882,00	\$	-		-		
22.3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.882,00	\$	-		-		
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	\$	93.098,00	\$	3.367.633.954,00		-		
23.1	OA	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	93.098,00	\$	-		-		
23.2	OA	6-11705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	93.098,00	\$	-		-		
23.3	OA	6-14103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	93.098,00	\$	-		-		
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	\$	176.922,00	\$	6.830.781.496,00		-		
24.1	OA	6-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	176.922,00	\$	-		-		
24.2	OA	6-11705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	176.922,00	\$	-		-		
24.3	OA	6-14103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	176.922,00	\$	-		-		
25	OA	6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	\$	151.702,00	\$	49.454.852,00		-		
25.1	OA	6-11604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	\$	151.702,00	\$	-		-		
25.2	OA	6-11705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	\$	151.702,00	\$	-		-		
25.3	OA	6-14103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	\$	151.702,00	\$	-		-		
26	OA	6	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	\$	2.286.822,00	\$	2.805.930.594,00		-		
26.1	OA	6-11604	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$	2.286.822,00	\$	-		-		
26.2	OA	6-14101	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$	2.286.822,00	\$	-		-		
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	\$	1.232.450,00	\$	5.263.793.950,00		-		
27.1	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	\$	1.232.450,00	\$	-		-		
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	\$	996.330,00	\$	8.745.784.740,00		-		
28.1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$	996.330,00	\$	-		-		
28.2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$	996.330,00	\$	-		-		
28.3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$	996.330,00	\$	-		-		
29	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	2.703,00	\$	1.086.707,00	\$	2.937.369.021,00		-		
29.1	OA	6-14104	630-13		Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	-	\$	1.086.707,00	\$	-		-		
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	\$	687.013,00	\$	9.594.136.545,00		-		
30.1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$	687.013,00	\$	-		-		
30.2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$	687.013,00	\$	-		-		
30.3	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$	687.013,00	\$	-		-		
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	\$	473.683,00	\$	1.631.364.252,00		-		
31.1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$	473.683,00	\$	-		-		
31.2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$	473.683,00	\$	-		-		
31.3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$	473.683,00	\$	-		-		
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclopico	m3	6.348,00	\$	439.711,00	\$	2.791.285.428,00		-		
32.1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclopico	m3	-	\$	439.711,00	\$	-		-		
32.2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclopico	m3	-	\$	439.711,00	\$	-		-		
32.3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclopico	m3	-	\$	439.711,00	\$	-		-		
33	OA	4	641-13		Baranda Metálica	m	1.319,00	\$	544.754,00	\$	718.530.526,00		-		
33.1	OA	4-14104	641-13		Baranda Metálica	m	-	\$	544.754,00	\$	-		-		
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	\$	5.378,00	\$	9.464.661.530,00		-		
34.1	OA	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-		-		
34.2	OA	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-		-		
34.3	OA	4-14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-		-		
34.4	OA	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-		-		
34.5	OA	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-		-		
34.6	OA	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-		-		
35	OA	4	641-13		Acero de Priesfuerzo	Tm	111.740,00	\$	2.237,00	\$	249.962.380,00		-		
35.1	OA	4-14103	641-13		Acero de Priesfuerzo	Tm	-	\$	2.237,00	\$	-		-		
36	OA	6	642-2P		Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	\$	1.583.123,00	\$	134.565.455,00		-		
36.1	OA	6-14104	642-2P		Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	\$	1.583.123,00	\$	-		-		
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	287,00	\$	617.637,00	\$	177.261.819,00		-		
37.1	OA	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	-	\$	617.637,00	\$	-		-		
37.2	OA	6-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	-	\$	617.637,00	\$	-		-		
38	OA	6	670-5P		Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	\$	758.317,00	\$	515.655.560,00		-		
38.1	OA	6-11604	670-5P		Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$	758.317,00	\$	-		-		
38.2	OA	6-11705	670-5P		Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$	758.317,00	\$	-		-		
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	\$	673.653,00	\$	6.467.068.800,00		-		
39.1	OA	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$	673.653,00	\$	-		-		
39.2	OA	6-11705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$	673.653,00	\$	-		-		
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	\$	7.720,00	\$	453.936.000,00		-		
40.1	OA	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$	7.720,00	\$	-		-		
40.2	OA	8-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$	7.720,00	\$	-		-		
40.3	OA	8-14105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$	7.720,00	\$	-		-		
41	OA	6	673-13		Material granular drenante	m3	8.032,00	\$	136.094,00	\$	1.093.107.008,00		-		
41.1	OA	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	-	\$	136.094,00	\$	-		-		
41.2	OA	6-11705	673-13		Material granular drenante	m3	-	\$	136.094,00	\$	-		-		
41.3	OA	6-14105	673-13		Material granular drenante	m3	-	\$	136.094,00	\$	-		-		
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	\$	237.444,00	\$	2.638.477.728,00		-		
42.1	OA	6-11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$	237.444,00	\$	-		-		
42.2	OA	6-11705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$	237.444,00	\$	-		-		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI/MN1-IN-4-FR-1			
VERSION 1												PAGINA DE 7			
FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 54 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.137.366.359,00												MES nov-25			
ACTA FINAL U															
CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: RECONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PEDAGÓGICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.485.628.230,00	
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00			
INTERVENIENTOR: Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase T1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 237.444,00 \$ - \$ 68.087.340.557,00												555,00 \$ 131.781.420,00		\$ - \$ -	
Subtotal												\$ 61.610.339.794,00		\$ 167.788.714,00 \$ 13.654.660.781,00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43 SCT 8 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 220.000,00 \$ 1.794,00 \$ 394.680.000,00												- \$ -		\$ - \$ -	
43,1 SCT 8-11607 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m - \$ 1.794,00 \$ -												526.000,00 \$ 943.644.000,00		10.536,00 \$ 18.901.584,00	
43,2 SCT 8-11710 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m - \$ 1.794,00 \$ -												83.000,00 \$ 148.902.000,00		\$ - \$ 33.000,00	
43,3 SCT 8-14104 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m - \$ 1.794,00 \$ -												13.000,00 \$ 23.322.000,00		\$ - \$ 464,00	
44 SCT 8 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 110.000,00 \$ 22.076,00 \$ 2.428.360.000,00												- \$ -		\$ - \$ -	
44,1 SCT 8-11607 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 - \$ 22.076,00 \$ -												80.000,00 \$ 1.766.080.000,00		\$ - \$ 482,41	
44,2 SCT 8-11710 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 - \$ 22.076,00 \$ -												16.500,00 \$ 364.254.000,00		\$ - \$ -	
44,3 SCT 8-14104 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 - \$ 22.076,00 \$ -												5.500,00 \$ 121.418.000,00		\$ - \$ -	
45 SCT 8 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 375,00 \$ 396.630,00 \$ 148.736.250,00												- \$ -		\$ - \$ -	
45,1 SCT 8-11607 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u - \$ 396.630,00 \$ -												400,00 \$ 158.652.000,00		\$ - \$ 6,00	
45,2 SCT 8-11710 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u - \$ 396.630,00 \$ -												90,00 \$ 35.696.700,00		\$ - \$ -	
46 SCT 8 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 222,00 \$ 503.621,00 \$ 111.803.862,00												- \$ -		\$ - \$ -	
46,1 SCT 8-11607 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u - \$ 503.621,00 \$ -												178,00 \$ 89.644.538,00		\$ - \$ -	
46,2 SCT 8-11710 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u - \$ 503.621,00 \$ -												44,00 \$ 22.159.324,00		\$ - \$ -	
47 SCT 4 720-13 Poste de referencia u 3.500,00 \$ 253.536,00 \$ 887.376.000,00												- \$ -		\$ - \$ -	
47,1 SCT 4-11607 720-13 Poste de referencia u - \$ 253.536,00 \$ -												2.300,00 \$ 583.132.800,00		\$ - \$ -	
47,2 SCT 4-11710 720-13 Poste de referencia u - \$ 253.536,00 \$ -												700,00 \$ 177.475.200,00		\$ - \$ -	
48 SCT 4 730-13 Defensa metálica m 8.000,00 \$ 230.532,00 \$ 1.844.256.000,00												- \$ -		\$ - \$ -	
48,1 SCT 4-11607 730-13 Defensa metálica m - \$ 230.532,00 \$ -												6.400,00 \$ 1.476.404.800,00		\$ - \$ 748,96	
48,2 SCT 4-11710 730-13 Defensa metálica m - \$ 230.532,00 \$ -												1.600,00 \$ 368.851.200,00		\$ - \$ -	
Subtotal												\$ 6.278.636.562,00		\$ 18.901.584,00 \$ 650.084.286,00	
OBRAS VARIAS															
49 OV 6 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 97.500,00 \$ 17.838,00 \$ 1.739.205.000,00												- \$ -		\$ - \$ -	
49,1 OV 6-11605 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m - \$ 17.838,00 \$ -												97.500,00 \$ 1.739.205.000,00		\$ - \$ 1.338,17	
50 OV 6 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 27.500,00 \$ 18.835,00 \$ 517.962.500,00												- \$ -		\$ - \$ -	
50,1 OV 6-11606 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 - \$ 18.835,00 \$ -												27.500,00 \$ 517.962.500,00		\$ - \$ 19.666,11	
Subtotal												\$ 2.257.167.500,00		\$ - \$ 394.281.458,00	
TRANSPORTES															
51 T 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E 1.183.729,00 \$ 1.057,00 \$ 1.251.201.553,00												- \$ -		\$ - \$ -	
51,1 T 3-11608 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E - \$ 1.057,00 \$ -												843.192.306 \$ 891.254.267,00		\$ - \$ 16.461,41	
51,2 T 3-14102 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E - \$ 1.057,00 \$ -												210.799,00 \$ 222.814.543,00		\$ - \$ -	
52 T 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km 11.837.290,00 \$ 1.000,00 \$ 11.837.290.000,00												27.496,20 \$ 27.496.200		\$ - \$ 27.496,20	
52,1 T 3-11608 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km - \$ 1.000,00 \$ -												7.426.510,54 \$ 7.426.510.540,00		1.992,90 \$ 1.992.900,00	
52,2 T 3-14102 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km - \$ 1.000,00 \$ -												1.857.838,23 \$ 1.857.838.230,00		\$ - \$ 8.778,47	
53 T 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 1.650.857,00 \$ 1.175,00 \$ 1.939.756.975,00												112.459,00 \$ 132.139.325,00		\$ - \$ 112.458,30	
53,1 T 3-11608 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km - \$ 1.175,00 \$ -												1.657.174,98 \$ 1.947.180.605,00		86.729,60 \$ 101.907.280,00	
Subtotal												\$ 12.505.233.710,00		\$ 103.900.180,00 \$ 2.258.852.263,00	

		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI/MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 3 DE 7			
												FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No. 54		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.137.366.359,00		MES nov-25							
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIRA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE NÚLVA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/05/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021		INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.485.928.230,00									
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00											
ÍTEM NO PREVISTOS															
54	NP	3		NP1	Transporte de Material Granular (sueldo) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	\$	1.175,00		-	\$	-			
54,1	NP	3-11608		NP1	Transporte de Material Granular (sueldo) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	\$	1.175,00	1.939.934,00	\$	2.279.422.450,00	53.301,60 \$	62.629.380,00	1.345.296,88 \$	1.580.723.834,00
55	NP	8		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$	522.909,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
55,1	NP	8-11603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$	522.909,00	11.120,00	\$	5.814.748.080,00	\$	-	5.158,75 \$	2.697.556.804,00
55,2	NP	8-11703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$	522.909,00	5.486,00	\$	2.868.678.774,00	\$	-	833,72 \$	435.959.691,00
56	NP	1		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$	118.425,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
56,1	NP	1-11601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$	118.425,00	42.000,00	\$	4.973.850.000,00	1.337,72 \$	158.419.491,00	15.513,17 \$	1.837.147.157,00
56,2	NP	1-11701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$	118.425,00	10.500,00	\$	1.243.462.500,00	\$	-	\$	-
57	NP	2		NP4	Suministro e Instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$	78.905,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
57,1	NP	2-11602		NP4	Suministro e Instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$	78.905,00	42.000,00	\$	3.314.010.000,00	224,58 \$	17.720.485,00	13.729,31 \$	1.083.310.819,00
57,2	NP	2-11702		NP4	Suministro e Instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$	78.905,00	10.500,00	\$	828.502.500,00	\$	-	\$	-
58	NP	2		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$	99.544,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
58,1	NP	2-11602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$	99.544,00	4.200,00	\$	418.084.800,00	\$	-	4.151,67 \$	413.273.838,00
58,2	NP	2-11702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$	99.544,00	8.050,00	\$	801.329.200,00	258,45 \$	25.727.147,00	7.083,58 \$	705.127.888,00
59	NP	1		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$	11.303,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
59,1	NP	1-11601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$	11.303,00	300.800,00	\$	3.399.942.400,00	\$	-	83.801,61 \$	947.209.598,00
59,2	NP	1-11701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$	11.303,00	107.260,00	\$	1.212.359.780,00	\$	-	1.905,76 \$	21.540.760,00
60	NP	1		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$	150.333,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
60,1	NP	1-11601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$	150.333,00	4.864,00	\$	731.219.712,00	\$	-	21,08 \$	3.169.020,00
60,2	NP	1-11701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$	150.333,00	1.216,00	\$	182.804.928,00	\$	-	\$	-
61	NP	8		NP8	Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2	\$	17.917,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
61,1	NP	8-11603		NP8	Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2	\$	17.917,00	85.000,00	\$	1.522.945.000,00	\$	-	\$	-
61,2	NP	8-11703		NP8	Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2	\$	17.917,00	20.000,00	\$	358.340.000,00	\$	-	\$	-
62	NP	8		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$	20.929,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
62,1	NP	8-11602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$	20.929,00	170.000,00	\$	3.557.930.000,00	\$	-	\$	-
62,2	NP	8-11702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$	20.929,00	48.000,00	\$	962.734.000,00	\$	-	\$	-
63	NP	6		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$	91.810,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
63,1	NP	6-11604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$	91.810,00	1.152,00	\$	105.765.120,00	\$	-	624,85 \$	57.367.479,00
63,2	NP	6-11705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$	91.810,00	216,00	\$	19.830.960,00	\$	-	\$	-
63,3	NP	6-14105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$	91.810,00	72,00	\$	6.610.320,00	\$	-	\$	-
64	NP	2		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	\$	218.221,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
64,1	NP	2-11602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	\$	218.221,00	17.219,00	\$	3.757.547.399,00	1.489,80 \$	325.105.646,00	5.321,00 \$	1.161.153.941,00
65	NP	8		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$	43.721,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
65,1	NP	8-11603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$	43.721,00	47.440,00	\$	2.074.124.240,00	4.921,60 \$	215.177.274,00	18.340,39 \$	801.860.191,00
66	NP	8		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$	79.973,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
66,1	NP	8-11603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$	79.973,00	268,00	\$	21.432.764,00	\$	-	124,05 \$	9.920.651,00
67	NP	8		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$	46.553,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
67,1	NP	8-11603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$	46.553,00	2.073,00	\$	96.504.369,00	\$	-	247,44 \$	11.519.074,00
68	NP	8		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$	122.472,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
68,1	NP	8-11604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$	122.472,00	181,00	\$	22.167.432,00	\$	-	150,60 \$	18.444.283,00
69	NP	8		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$	33.343,00	-	\$	-	\$	-	\$	-
69,1	NP	8-11603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$	33.343,00	1.166,00	\$	38.877.938,00	\$	-	1.085,00 \$	36.177.155,00
70	NP	8		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$	42.208,00	-	\$	-	\$	-	\$	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI/MN1-IN-4-FR-1					
											VERSIÓN	1					
											PÁGINA	DE	7				
											FECHA						
											3	12	2025				
											(Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ		ACTA No.	54		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 2.137.366.359,00		MES	nov-25		
											ACTA FINAL	L					
CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: RECONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENTIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)											FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.426,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.486.626.230,00				
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.964.666,00						
70,1	NP	8-11606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$	42.208,00	12.590,00	\$	531.398.720,00	\$	-	517,79	\$	21.854.880,00	
71	NP	6		NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$	34.210,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
71,1	NP	6-11604		NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$	34.210,00	47.000,00	\$	1.607.870.000,00	232,00	\$	7.936.720,00	19.050,59	\$	651.720.684,00
72	NP	4		NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=5mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m	\$	4.808.941,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
72,1	NP	4-11606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=5mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m	\$	4.808.941,00	313,87	\$	1.509.382.312,00	\$	-	17,38	\$	83.579.395,00	
73	NP	6		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m	\$	4.719.466,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
73,1	NP	6-11604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m	\$	4.719.466,00	45,00	\$	212.375.970,00	\$	-	-	\$	-	
74	NP	6		NP21	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0,45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m3	\$	1.104.266,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
74,1	NP	6-11604		NP21	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0,45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m3	\$	1.104.266,00	80,75	\$	89.169.480,00	\$	-	19,55	\$	21.588.400,00	
75	NP	6		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$	344.857,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
75,1	NP	6-11604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$	344.857,00	3.070,00	\$	1.058.710.990,00	\$	-	1.570,00	\$	541.425.490,00	
76	NP	6		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$	5.166.106,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
76,1	NP	6-11604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$	5.166.106,00	39,00	\$	201.478.134,00	\$	-	-	\$	-	
77	NP	4		NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=5mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$	2.869.478,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
77,1	NP	4-11606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=5mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$	2.869.478,00	78,00	\$	223.819.284,00	\$	-	-	\$	-	
78	NP	6		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0,45, incluye juntas de dilatación y floraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$	1.596.514,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
78,1	NP	6-11604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0,45, incluye juntas de dilatación y floraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$	1.596.514,00	110,00	\$	175.616.540,00	\$	-	33,54	\$	53.541.380,00	
79	NP	6		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$	129.077,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
79,1	NP	6-11604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$	129.077,00	150,00	\$	19.361.550,00	\$	-	130,74	\$	16.875.527,00	
80	NP	6		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$	192.063,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
80,1	NP	6-11604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$	192.063,00	30,00	\$	5.761.890,00	\$	-	-	\$	-	
81	NP	8		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$	77.947,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
81,1	NP	8-11603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$	77.947,00	350,00	\$	27.281.450,00	\$	-	232,47	\$	18.120.339,00	
82	NP	8		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$	11.267,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
82,1	NP	8-11607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$	11.267,00	12.500,00	\$	140.837.500,00	1.017,00	\$	11.458.539,00	5.730,00	\$	64.559.910,00
82,2	NP	8-11710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$	11.267,00	1.250,00	\$	14.083.750,00	\$	-	-	\$	-	
82,3	NP	8-14104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$	11.267,00	1.250,00	\$	14.083.750,00	\$	-	-	\$	-	
83	NP	8		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	\$	41.960,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
83,1	NP	8-11606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	\$	41.960,00	8.625,35	\$	361.919.686,00	\$	-	7.299,47	\$	306.285.761,00	
84	NP	6		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	\$	491.499,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
84,1	NP	6-11606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	\$	491.499,00	5.695,00	\$	2.799.086.805,00	\$	-	5.340,00	\$	2.624.604.660,00	
85	NP	6		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	\$	113.342,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
85,1	NP	6-11606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	\$	113.342,00	1.650,00	\$	187.014.300,00	\$	-	-	\$	-	
86	NP	6		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	\$	18.784,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
86,1	NP	6-11606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	\$	18.784,00	1.650,00	\$	30.993.600,00	569,95	\$	10.705.941,00	569,95	\$	10.705.941,00
87	NP	6		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	\$	43.129,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
87,1	NP	6-11604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	\$	43.129,00	2.742,66	\$	118.288.097,00	147,60	\$	6.365.840,00	2.032,29	\$	87.650.635,00
88	NP	6		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	\$	8.420,00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1								
		VERSIÓN 1										PÁGINA 3 DE 7								
FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)																				
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 54 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.137.366.359,00 MES: nov-25																				
ACTA FINAL L																				
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)																				
OBJETO: RECONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PRECISAL" SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE Y DEL "CORREDOR NEVA" "SAN VICENTE DEL CAQUETÁ" "PUERTO RICO" "FLORENCIA" EN LOS DEPARTAMENTOS DE PASTA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIAL 2030"																				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)																				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																				
88,1	NP	6-11603		NP35	Corfe de asfalto H=11cm	m	\$	8.420,00		14.534,00	\$	122.376.280,00	\$	325,00	\$	2.736.500,00	\$	7.721,09	\$	65.011.578,00
89	NP	6		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	\$	14.855,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
89,1	NP	6-11606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	\$	14.855,00		11.625,35	\$	172.694.574,00	\$	-	\$	-	\$	7.522,13	\$	111.741.241,00
90	NP	6		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	\$	137.777,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
90,1	NP	6-11601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	\$	137.777,00		163,00	\$	22.457.651,00	\$	-	\$	-	\$	31,00	\$	4.274.087,00
91	NP	6		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	\$	208.545,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
91,1	NP	6-11601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	\$	208.545,00		871,00	\$	181.642.695,00	\$	-	\$	-	\$	212,00	\$	44.211.540,00
92	NP	6		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10.01 a 15 METROS	und	\$	318.587,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
92,1	NP	6-11601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10.01 a 15 METROS	und	\$	318.587,00		314,00	\$	100.036.318,00	\$	-	\$	-	\$	91,00	\$	28.991.417,00
93	NP	6		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15.01 a 20 METROS	und	\$	803.536,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
93,1	NP	6-11601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15.01 a 20 METROS	und	\$	803.536,00		150,00	\$	120.530.400,00	\$	-	\$	-	\$	11,00	\$	8.838.896,00
94	NP	6		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	\$	273.084,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
94,1	NP	6-11606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	\$	273.084,00		1.701,50	\$	464.652.426,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
95	NP	6		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	\$	36.500,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
95,1	NP	6-11606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	\$	36.500,00		500,00	\$	18.250.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
96	NP	4		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	\$	3.080.562,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
96,1	NP	4-11607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	\$	3.080.562,00		30,00	\$	92.416.860,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
97	NP	4		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	\$	12.559,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
97,1	NP	4-11607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	\$	12.559,00		487,00	\$	6.116.233,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
98	NP	8		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	266.961,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
98,1	NP	8-11607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	266.961,00		242,00	\$	64.604.562,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
99	NP	8		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	280.940,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
99,1	NP	8-11607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	280.940,00		860,00	\$	241.608.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
100	NP	8		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	234.413,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
100,1	NP	8-11607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	234.413,00		526,00	\$	123.301.238,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
101	NP	8		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	380.449,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
101,1	NP	8-11607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	380.449,00		102,00	\$	38.805.798,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
102	NP	8		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	351.875,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
102,1	NP	8-11607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	\$	351.875,00		178,00	\$	62.633.750,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
103	NP	8		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	\$	705.649,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
103,1	NP	8-11607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	\$	705.649,00		72,00	\$	50.806.728,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
104	NP	6		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	\$	42.916,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
104,1	NP	6-11601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	\$	42.916,00		3.742,00	\$	160.591.672,00	\$	1,00	\$	42.916,00	\$	3.803,30	\$	154.639.223,00
105	NP	6		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibr de polipropileno Departamento Caquetá	m3	\$	1.463.405,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
105,1	NP	6-11604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibr de polipropileno Departamento Caquetá	m3	\$	1.463.405,00		44,35	\$	64.902.012,00	\$	-	\$	-	\$	30,50	\$	44.633.853,00
106	NP	4		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	\$	5.104.114,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
106,1	NP	4-11606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	\$	5.104.114,00		196,02	\$	1.000.508.426,00	\$	-	\$	-	\$	196,02	\$	1.000.508.426,00
107	NP	6		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	\$	8.932.080,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
107,1	NP	6-14104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	\$	8.932.080,00		17,60	\$	157.204.608,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
108	NP	6		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	\$	10.480.633,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
108,1	NP	6-14104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	\$	10.480.633,00		17,60	\$	184.459.141,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
109	NP	6		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	\$	128.791,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
109,1	NP	6-14104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	\$	128.791,00		17,60	\$	2.266.722,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-



FECHA	3	12	2025
-------	---	----	------

CONTRATO No: _____	09/1 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: _____	114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: _____	114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
--------------------	--	----------------------	--	------------------------	--



OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
	(Indique día/mes/año)	(Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)
	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACION:
	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	(Indique día/mes/año)


CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$	399.567.436.436.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$	13.485.528.230.00
	(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)			(Según contrato principal)			


CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 413.052.964.666,00
--	--	--------------	---------------------------------	---	-----------------------


	10	NP	6		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaduadas (No incluye el acero)	u		\$	21.616,00				-	\$	-		\$	-		\$	-		
110,1	NP	6-11604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaduadas (No incluye el acero)	u		\$	21.616,00					590,00	\$	12.753.440,00		\$	-		543,00	\$	11.737.488,00	
111	NP	6		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaduadas (No incluye el acero)	u		\$	22.571,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
111,1	NP	6-11604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaduadas (No incluye el acero)	u		\$	22.571,00				150,00	\$	3.385.650,00		\$	-			\$	-		
112	NP	4		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Hulla	m		\$	4.808.941,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
112,1	NP	4-11606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Hulla	m		\$	4.808.941,00				90,00	\$	432.804.690,00		\$	-			90,00	\$	432.804.690,00	
113	NP	6		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Hulla	m3		\$	1.104.266,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
113,1	NP	6-11604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Hulla	m3		\$	1.104.266,00				61,20	\$	67.581.079,00		\$	-			61,20	\$	67.581.079,00	
114	NP	6		NP61	Excavaciones varas sin clasificar en material común a mano	m3		\$	56.957,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
114,1	NP	6-11604		NP61	Excavaciones varas sin clasificar en material común a mano	m3		\$	56.957,00				377,12	\$	21.479.624,00		52,54	\$	2.992.521,00		279,91	\$	15.942.834,00	
115	NP	6		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Hulla	m3		\$	1.278.774,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
115,1	NP	6-11604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Hulla	m3		\$	1.278.774,00				30,24	\$	38.670.126,00			\$	-		29,25	\$	37.404.140,00	
116	NP	6		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		\$	122.176,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
116,1	NP	6-11604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		\$	122.176,00					36,00	\$	4.398.336,00		\$	-			\$	-	
117	NP	8		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		\$	79.514,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
117,1	NP	8-11603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		\$	79.514,00				68,40	\$	5.438.758,00			\$	-			\$	-	
118	NP	6		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		\$	91.491,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
118,1	NP	6-14105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		\$	91.491,00				26,00	\$	2.378.766,00		16,28	\$	1.487.644,00		32,52	\$	2.975.287,00	
119	NP	6		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		\$	8.711,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
119,1	NP	6-14105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		\$	8.711,00				288,60	\$	2.513.995,00			\$	-			\$	-	
120	NP	6		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		\$	7.243.323,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
120,1	NP	6-14104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		\$	7.243.323,00					8,00	\$	57.946.584,00			\$	-	8,00	\$	57.946.584,00	
121,0	NP	6		NP68	Relleno De Platinas Base (0.9m x 0.9m x 0.1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		\$	1.049.049,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
121,1	NP	6-14104		NP68	Relleno De Platinas Base (0.9m x 0.9m x 0.1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		\$	1.049.049,00					8,00	\$	8.392.392,00		8,00	\$	8.392.392,00		8,00	\$	8.392.392,00
122,0	NP	4		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg		\$	11.017,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
122,1	NP	6-14104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg		\$	11.017,00				108.328,15	\$	1.193.451.229,00			\$	-		108.314,08	\$	1.193.296.219,00	
123,0	NP	4		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg		\$	8.756,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
123,1	NP	4-14104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg		\$	8.756,00				108.328,15	\$	948.521.281,00			\$	-		108.314,08	\$	948.398.084,00	
124,0	NP	3		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg		\$	930,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
124,1	NP	3-14104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puentes Las Delicias	kg		\$	930,00				108.328,15	\$	100.745.179,00			\$	-		108.314,08	\$	100.732.094,00	
125,0	NP	6		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		\$	53.433,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
125,1	NP	6-14105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		\$	53.433,00					8,00	\$	427.464,00			\$	-		\$	-	
126,0	NP	8		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparacho manual - Mina Las Pabas	m3		\$	246.858,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
126,1	NP	8-11603		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparacho manual - Mina Las Pabas	m3		\$	246.858,00				500,00	\$	123.429.000,00			\$	-			\$	-	
127,0	NP	6		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3		\$	1.363.662,00					-	\$	-		\$	-		15,00	\$	3.702.870,00	
127,1	NP	6-11604		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3		\$	1.363.662,00					1.292,00	\$	1.761.851.304,00			\$	-		\$	-	
128,0	NP	6		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		\$	177.530,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
128,1	NP	6-11604		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		\$	177.530,00					298,00	\$	52.903.940,00			\$	-	136,85	\$	24.294.981,00	
129,0	NP	6		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puentes Las Delicias	m2		\$	356.390,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
129,1	NP	6-11604		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puentes Las Delicias	m2		\$	356.390,00					520,00	\$	185.322.800,00			\$	-		\$	-	
130,0	NP	6		NP77	Desmonte Y Demolición Puentes Las Delicias PR38-200 Ruta 6503	m3		\$	1.673.243,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
130,1	NP	6-14101		NP77	Desmonte Y Demolición Puentes Las Delicias PR38-200 Ruta 6503	m3		\$	1.673.243,00					180,00	\$	301.183.740,00			\$	-	106,26	\$	177.798.801,00	
131,0	NP	3		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puentes Las	m3		\$	124.027,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
131,1	NP	3-11608		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puentes Las	m3		\$	124.027,00					180,00	\$	22.324.860,00			\$	-	106,26	\$	13.179.109,00	
132,0	NP	6		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		\$	3.888.479,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
132,1	NP	6-11601		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		\$	3.888.479,00					2,00	\$	7.776.958,00			\$	-		\$	-	
133,0	NP	8		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H -20.01 a 25 METROS	u		\$	1.231.836,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
133,1	NP	8-11607		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H -20.01 a 25 METROS	u		\$	1.231.836,00					37,00	\$	45.577.932,00			\$	-		\$	-	
134,0	NP	8		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H -25.01 a 30 METROS	u		\$	1.515.525,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
134,1	NP	8-11607		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H -25.01 a 30 METROS	u		\$	1.515.525,00					11,00	\$	16.670.775,00			\$	-		\$	-	
135,0	NP	6		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		\$	25.159.722,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
135,1	NP	6-14104		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		\$	25.159.722,00					1,00	\$	25.159.722,00			\$	-		\$	-	
136,0	NP	6		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		\$	73.351,00					-	\$	-		\$	-		\$	-		
136,1	NP	6-14105		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		\$	73.351,00					480,00	\$	35.208.480,00		126,30	\$	9.264.231,00		210,70	\$	15.455.056,00

[illegible]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO MEP/INVI-IN-4-FR-1	
		VERSIÓN 1		PÁGINA 7	
		FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No. 54 ACTA FINAL	
		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.137.366.359,00		MES: 12/25	
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAJAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 413.052.864.666,00			
RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV					
* Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE.					
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601		\$ 340.736.164,00		\$ 8.621.294.625,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602		\$ 567.042.060,00		\$ 22.439.112.358,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603		\$ 756.172.552,00		\$ 21.215.838.115,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604		\$ 164.840.411,00		\$ 14.572.789.061,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605		\$ -		\$ 23.870.276,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606		\$ 10.705.941,00		\$ 5.185.869.685,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607		\$ 30.360.123,00		\$ 654.609.780,00	
Vías interurbanas Transporte y sobreacarreos 11608		\$ 166.529.560,00		\$ 3.684.342.033,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701		\$ -		\$ 21.540.760,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702		\$ 25.727.147,00		\$ 749.295.088,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703		\$ -		\$ 435.959.691,00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705		\$ -		\$ 171.817.118,00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710		\$ -		\$ 59.202.000,00	
Puentes Preliminares y cimentación 14101		\$ -		\$ 177.798.801,00	
Puentes Subestructura y cimentación 14102		\$ -		\$ 8.778.470,00	
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103		\$ -		\$ 174.872.331,00	
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103		\$ 8.392.392,00		\$ 2.309.597.789,00	
Puentes Drenajes 14105		\$ 30.995.259,00		\$ 180.447.358,00	
AJUSTE AL PESO					
TOTAL ICOCIV		\$ 2.101.501.609,00		\$ 80.687.035.339,00	
TOTAL CTO					
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2.089.844.641,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.					
OBSERVACIONES: Se precisa que el valor total del ICOCIV difiere del valor total del ICCP en \$945.839.105, dado que el índice ICOCIV empezó a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 5, correspondiente al mes de enero de 2022.					
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.					
Para constancia de lo anterior firman					
Firma:  ANIBAL OJEDA CARRIAZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula No.: 25202-67327 CND		Firma:  JORGE ENRIQUE ALFARO DIEZ RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula No.: 25202-44184 CND			
Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14867645953			
				 (415)7707212489984(8020) 000001486764595 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 0 3 4		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		0 0 1	
41. Dirección principal BRR EL CABRERO CR 2 41 612							
42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co							
43. Código postal 1 3 0 0 0 1		44. Teléfono 1 5 6 9 3 9 2 5 5		45. Teléfono 2 3 1 2 4 4 7 8 0 5 5			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 1 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1, 0 2, 0 9	48. Código 4 2 9 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1, 0 2, 0 9	50. Código 1 2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14867645953			
				(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 5 0 3 4 7		7		Impuestos de Cartagena		6	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 2, 0 9				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 3					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 1, 0 2, 0 9					
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14867645953			
				 (415)7707212489984(8020) 000001486764595 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 5 0 3 4		7		Impuestos de Cartagena		6	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 8 0 0 8 3 4 5 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido AVENDAÑO		106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 9 2 5 1 9 7 3 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido OJEDA		105. Segundo apellido CARRIAZO		106. Primer nombre ANIBAL		107. Otros nombres ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 9 0 7 6 3 0 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre EFRAIN		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

Impuestos de Cartagena

6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 3 0 0 9 4 9 2 0	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social KMA CONSTRUCCIONES S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro	


2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 4 0 3 2 3 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CICON SAS				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro	


3	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 6 0 1 4 1 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCTORA EMMA LTDA				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro	


4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141146550654			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114655065 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 9 4 9 2 0		5		Operativa de Grandes Contribuyentes		3 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bolívar		Cartagena		0 0 1	
41. Dirección principal							
BRR EL CABRERO CR 2 41 612							
42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 9 0		2 0 0 1, 1 1, 2 1		4 2 1 0		2 0 1 4, 0 7, 1 7	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
				4 9 2 3, 4 2 2 0			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 9 1 0 1 3 1 4 1 8 1 9 2 6 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 19- Productor de bienes y/o servicios exen 59 - Autorretención especial renta							
07- Retención en la fuente a título de renta 26- Declaración individual precios de tran							
09- Retención en la fuente en el impuesto 41- Declaración anual de activos en el exte							
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad							
13- Gran contribuyente 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrónico							
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 2 2 2 3				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X							
60. No. de Folios: 0							
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO			
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 23 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141155195395			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115519539 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 1 4 1 0 8		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSTRUCTORA EMMA LTDA.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		0 0 1	
41. Dirección principal CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9							
42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		6 0 5 6 4 7 5 9 8 0		45. Teléfono 2 6 0 5 6 4 2 4 5 0 6	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	1
4 2 9 0	2 0 0 3, 0 5, 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3, 0 5, 0 5				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 3 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
03- Impuesto al patrimonio 52- Facturador electrónico							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 2 2 2 3				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre DIAZ GONZALEZ ELAINE 985. Cargo Gestor I			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 7 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141155195395		
 (415)7707212489984(8020) 000014115519539 5					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 1 4 1 0 8		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 0		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento	1. Constitución	2. Reforma			
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %		
72. Número	6 5 6	9 3 9	83. Nacional público 0 . 0 %		
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %		
74. Número de notaría	5	5	85. Extranjero 0 %		
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %		
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %		
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3			
78. Departamento	1 3	1 3			
79. Ciudad/Municipio	9	9			
Vigencia					
80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5				
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5				
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-	
2	1 0 6	2 0 2 5 0 1 1 3		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 7 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141155195395			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115519539 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 6 0 1 4 1 0 8		1		Impuestos de Cartagena		6	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 6 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre EFRAIN		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 6 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 3 3 1 4 7 6 8 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DIAZ		105. Segundo apellido BALLESTAS		106. Primer nombre MARGARITA		107. Otros nombres SOFIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 6 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 2 0 6 6 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido DIAZ		106. Primer nombre EFRAIN		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 6 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido DIAZ		106. Primer nombre SALOMON		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155195395



(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 6 0 1 4 1 0 8 1

Impuestos de Cartagena

6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 2 8 0 1 3 7 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres MARGARITA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 5 0 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 0 0 6 0 1	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 5 5 5 5 9 4 0	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MELISSA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 6 0 1	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 2 0 6 6 4	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre EFRAIN	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 6 0 1	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 4 7 4 3 0 7 9 0	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre SALOMON	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 6 0 1	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 3 1 4 7 6 8 2	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido DIAZ	116. Segundo apellido BALLESTA	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres SOFIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 6 0 1	123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 7 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141155195395			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115519539 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1		1		Impuestos de Cartagena		6	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3		112. Número de identificación 7 3 1 0 9 4 7 5		113. DV		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido YAMAL		116. Segundo apellido BAJAIRE		117. Primer nombre FARID		118. Otros nombres TADEO	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 6 0 1		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3		112. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1		113. DV		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido AMIN		116. Segundo apellido BAJAIRE		117. Primer nombre EFRAIN		118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 6 0 1		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 7 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141155195395				
 (415)7707212489984(8020) 000014115519539 5								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		125. Número de identificación 7 3 1 3 8 2 0 2		126. DV 1 0		127. Número de tarjeta profesional 7 3 7 4 6 T	
	128. Primer apellido ARIAS		129. Segundo apellido HERNANDEZ		130. Primer nombre ANGEL		131. Otros nombres DAMIAN	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 0 4 0 6							
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
	147. Fecha de nombramiento							
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 7 9 3 7 2 1 8		150. DV 6		151. Número de tarjeta profesional 1 6 9 1 6 6 T	
	152. Primer apellido ZAMBRANO		153. Segundo apellido MARTINEZ		154. Primer nombre JESUS		155. Otros nombres MARIA	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 1 0 1							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141155195395			
 (415)7707212489984(8020) 000014115519539 5							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 1 4 1 0 8		6. DV		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0					
162. Nombre del establecimiento CONSTRUCTORA EMA LTDA							
163. Departamento Bolívar 1 3		164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1					
165. Dirección CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9							
166. Número de matrícula mercantil 0 9 1 8 1 7 8 3 0 2				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 6 0 5			
168. Teléfono 6 0 5 6 4 7 5 9 8 0				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141177409219			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 890403235				6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CICON SAS							
36. Nombre comercial CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA							
42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		3157312121		45. Teléfono 2 3182096104	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 19790110		48. Código 4390		49. Fecha inicio actividad 19790110	
50. Código 1 4220		50. Código 2 4210		51. Código		2	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 3578910144248525559							
03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2223				55. Forma 2			
56. Tipo 1				Servicio 1			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141177409219			
				(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 4 0 3 2 3 5		3		Impuestos de Cartagena		6	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase							
0 5				0 1			
6				1			
73. Fecha		1 9 7 9 0 1 1 0		2 0 1 4 0 3 2 5			
74. Número de notaría		1					
75. Entidad de registro		0 3		0 3			
76. Fecha de registro		1 9 7 9 0 2 0 9		2 0 1 4 0 6 1 8			
77. No. Matrícula mercantil		0 9 1 5 1 0 1 1 2		0 9 0 1 5 1 0 1 1 2			
78. Departamento		1 3		1 3			
79. Ciudad/Municipio		9		9			
82. Nacional 1 0 0 %							
83. Nacional público 0 . 0 %							
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %							
85. Extranjero 0 %							
86. Extranjero público 0 . 0 %							
87. Extranjero privado 0 . 0 %							
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
Vigencia							
80. Desde		1 9 7 9 0 2 0 9					
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
92. DV							
1		8 0		2 0 1 5 0 1 0 1		-	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.							
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141177409219			
 (415)7707212489984(8020) 000014117740921 9							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 4 0 3 2 3 5		3		Impuestos de Cartagena		6	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 8				2 0 1 4 0 3 2 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		9 0 7 6 3 0 4					
104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 9				2 0 1 7 0 7 3 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		8 0 1 9 6 1 9 7					
104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido AVENDAÑO		106. Primer nombre CESAR		107. Otros nombres AUGUSTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 9				2 0 1 7 0 7 3 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		8 0 7 1 5 8 4 5					
104. Primer apellido ESPINOSA		105. Segundo apellido BOWERS		106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres MANUEL	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141177409219				
 (415)7707212489984(8020) 000014117740921 9								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
8 9 0 4 0 3 2 3 5		3		Impuestos de Cartagena		6		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		125. Número de identificación 1 9 8 7 3 1 8 2		126. DV		127. Número de tarjeta profesional 8 0 3 7 0 T	
	128. Primer apellido AGUAS		129. Segundo apellido GAMARRA		130. Primer nombre WALTER		131. Otros nombres FRANCISCO	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 4 0 3 6 3 9		133. DV 5		134. Sociedad o firma designada ANAYA & ANAYA S.A.S.			
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 4 2 2							
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		137. Número de identificación 7 3 1 6 1 3 7 9		138. DV 1		139. Número de tarjeta profesional 1 0 5 5 3 2 T	
	140. Primer apellido DE LEON		141. Segundo apellido BRAVO		142. Primer nombre JESUS		143. Otros nombres DAVID	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 4 0 3 6 3 9		145. DV 5		146. Sociedad o firma designada ANAYA & ANAYA S.A.S.			
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 4 2 2							
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		149. Número de identificación 7 3 4 3 0 3 5 1		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 1 3 4 9 4 6 T	
	152. Primer apellido CATALAN		153. Segundo apellido TORRES		154. Primer nombre LUIS		155. Otros nombres ALBERTO	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 0 2							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141177409219			
 (415)7707212489984(8020) 000014117740921 9							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 4 0 3 2 3 5		6. DV		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8		161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0					
162. Nombre del establecimiento CICON S.A							
163. Departamento Bolívar 1 3		164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1					
165. Dirección BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA							
166. Número de matrícula mercantil 0 9 0 1 5 1 0 1 1 2				167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 7 9 0 2 0 9			
168. Teléfono 3 1 8 2 0 9 6 1 0 4				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0					
162. Nombre del establecimiento CONSORCIO VIAS DEL CABRERO							
163. Departamento Bolívar 1 3		164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1					
165. Dirección BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA							
166. Número de matrícula mercantil 0 9 2 2 5 1 6 5 0 2				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 1 2 2 2			
168. Teléfono 3 1 8 2 0 9 6 1 0 4				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



DANE

Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2025

Base Diciembre de 2018 = 100,00					
Mes	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	105.91	113.26	128.27	138.98	146.24
Febrero	106.58	115.11	130.40	140.49	147.90
Marzo	107.12	116.26	131.77	141.48	148.68
Abril	107.76	117.71	132.80	142.32	149.66
Mayo	108.84	118.70	133.38	142.92	150.14
Junio	108.78	119.31	133.78	143.38	150.30
Julio	109.14	120.27	134.45	143.67	150.71
Agosto	109.62	121.50	135.39	143.67	150.99
Septiembre	110.04	122.63	136.11	144.02	151.48
Octubre	110.06	123.51	136.45	143.83	151.76
Noviembre	110.60	124.46	137.09	144.22	
Diciembre	111.41	126.03	137.72	144.88	

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las

Actualizado el 10 de Noviembre de 2025



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alejandro Gómez Bustamante</i> 58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ

Gerente

Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogotá, 14 de febrero 2023

Desubsigned by:
Felipe Trujillo Lopez
73187964DDA347D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
Desubsigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> EE4C1A0FF5D04B0... Juan Carlos Palacios Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	Desubsigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9CE12D53C942E... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CIRCULAR INFORMATIVA CLIENTES ECOPETROL

La Gerencia de Productos y Petroquímicos de Ecopetrol S.A. se permite informar a sus clientes que el precio de venta nacional del asfalto tendrá un incremento del 6% a partir del 1° de enero 2025. Esta medida busca acercar el precio de venta nacional al precio de paridad importación o precio de realización de este producto. La medida aplica para el asfalto 60/70, AC30, y 60/70 carbono compensado entregado en la refinería de Barrancabermeja y asfalto 60/70 entregado en la refinería de Apiay.

Cordialmente

DocuSigned by:
Sandra Patricia Ballen Cruz
9C8AADD785DE404...
Sandra Patricia Ballen Cruz
Gerente Productos y Petroquímicos
Ecopetrol S.A.

Reviso:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> EE4C1AF6F5DD495 Juan Carlos Palacios G. Jefe (e) Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales	DocuSigned by: <i>Alejandro Gomez</i> ED7461382193C Alejandro Gómez Bustamante Abogado Especializado Jefatura Jurídica Downstream y Comercial

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	2025
							Agosto
							Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	133.64
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	135.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	148.80
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	130.82
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	143.10
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	134.71
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	147.38
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	132.81
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	132.27
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subbase	133.06
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos	135.69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambiental	140.76
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, redes	137.41
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias	134.45
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios	137.71
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalización	139.94
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	142.95
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	141.87
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	136.56
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	138.64
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura	136.62
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura	143.61
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	145.73

A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos									
Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Tipología de obra - capítulo constructivo	Grupos de costos	Código de insumos	Insumos	2025
									Agosto
									Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	101	Arena	136.23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	103	Consumibles	139.33
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	104	Malla	107.79
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	105	Alambre	132.15
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	106	Acero corrugado	113.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	107	Cemento	149.48
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	108	Tubería acueducto y alcantarillado	152.69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	109	Acero	134.08
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	110	Cinta	134.85
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	112	Accesorios tubería	124.57
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	113	Concreto común	142.19
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	114	Cable	130.38
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	115	Grava	134.47
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	116	Pintura	155.56
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	117	Accesorios eléctricos	108.24
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	118	Agua	140.14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	119	Elementos prefabricados	146.77
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	120	Asfalto	175.11
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	123	Elementos plásticos	138.30
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	124	Mortero	143.08
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	125	Recebo	135.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	126	Tubería acero	140.00
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	127	Concreto pavimentos	171.83
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	128	Piedra	130.09
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	129	Concreto simple	151.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	130	Textil sintético	133.82
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	131	Tubería PVC	125.83
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	132	Arandela metálica	119.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	133	Concreto lanzado	164.92
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	136	Combustible	157.58
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	137	Elementos metálicos	147.76
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	142	Abono	133.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	146	Bloque	158.13
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	151	Tubería galvanizada	116.03
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	152	Unión tubería	139.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	156	Platina	119.65
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	158	Concreto arquitectónico	135.44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	160	Enchape	113.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	162	Teja	104.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	165	Junta de dilatación	127.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	166	Neopreno	124.13
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	172	Concreto tremie	144.99
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Herramienta menor	201	Herramienta menor	120.92
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	301	Motoniveladora	127.33
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	302	Compactador	135.45
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	304	Maquinaria de excavación	127.12
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	306	Perforadora	140.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	307	Cargadora	132.37
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	308	Grúa	135.62
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	309	Fresadora de pavimento	125.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	310	Finisher	135.81
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	311	Piloteadora	130.33
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	401	Andamio	136.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	402	Compresor	121.39
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	403	Cortadora	120.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	404	Demolidor	116.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	405	Elevador de carga	124.14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	406	Equipo de medición	120.65
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	407	Equipo de soldado u oxígeno	115.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	408	Equipos para concreto	125.56
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	409	Formaleta y accesorios	126.19
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	410	Generador	119.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	411	Seguridad	128.39
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	412	Vibrocompactador	123.32
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	502	Ayudante	155.93
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	503	Cuadrilla	136.78
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	506	Oficial	134.18
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	511	Maestro	129.21
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	512	Capataz	121.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	676	Carrotanque	125.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	677	Volqueta	131.87
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	678	Mixer	107.34
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	679	Camión	126.56
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	681	Transporte interno	128.24
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto ippos especiales para c	Transporte	704	Equipo especial de comun	108.23

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	2025
							Septiembre
							Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	133.59
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	135.51
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	148.44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	130.37
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	142.81
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	134.25
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	146.41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	134.46
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	132.79
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	133.50
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto	135.99
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidra	140.78
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, se	137.03
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructur	134.40
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización v	137.36
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizont	139.74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	142.22
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	141.73
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	136.11
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	137.91
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	135.88
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	142.60
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	145.55

A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos									
Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Tipología de obra - capítulo constructivo	Grupos de costos	Código de insumos	Insumos	2025
									Septiembre
									Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	101	Arena	136.98
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	103	Consumibles	138.80
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	104	Malla	106.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	105	Alambre	131.69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	106	Acero corrugado	112.26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	107	Cemento	151.00
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	108	Tubería acueducto y alcant	152.69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	109	Acero	134.43
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	110	Cinta	135.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	112	Accesorios tubería	124.68
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	113	Concreto común	137.59
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	114	Cable	124.12
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	115	Grava	134.23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	116	Pintura	155.65
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	117	Accesorios eléctricos	107.93
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	118	Agua	141.72
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	119	Elementos prefabricados	146.58
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	120	Asfalto	174.85
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	123	Elementos plásticos	138.34
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	124	Mortero	144.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	125	Recebo	135.79
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	126	Tubería acero	140.14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	127	Concreto pavimentos	174.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	128	Piedra	131.20
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	129	Concreto simple	148.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	130	Textil sintético	133.65
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	131	Tubería PVC	124.32
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	132	Arandela metálica	119.66
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	133	Concreto lanzado	164.92
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	136	Combustible	158.04
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	137	Elementos metálicos	147.66
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	142	Abono	132.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	146	Bloque	160.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	151	Tubería galvanizada	116.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	152	Unión tubería	139.77
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	156	Platina	119.91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	158	Concreto arquitectónico	137.72
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	160	Enchape	113.51
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	162	Teja	103.37
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	165	Junta de dilatación	127.12
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	166	Neopreno	124.13
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	172	Concreto tremie	145.63
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Herramienta menor	201	Herramienta menor	121.09
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	301	Motoniveladora	126.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	302	Compactador	135.21
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	304	Maquinaria de excavación	126.99
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	306	Perforadora	140.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	307	Cargadora	132.29
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	308	Grúa	135.62
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	309	Fresadora de pavimento	125.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	310	Finisher	135.81
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	311	Piloteadora	130.33
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	401	Andamio	137.03
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	402	Compresor	120.54
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	403	Cortadora	120.03
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	404	Demolidor	116.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	405	Elevador de carga	124.14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	406	Equipo de medición	120.72
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	407	Equipo de soldado u oxicc	115.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	408	Equipos para concreto	126.87
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	409	Formaleta y accesorios	126.34
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	410	Generador	119.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	411	Seguridad	127.93
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos	412	Vibrocompactador	123.05
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	502	Ayudante	155.93
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	503	Cuadrilla	136.78
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	506	Oficial	134.18
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	511	Maestro	129.21
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	512	Capataz	121.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	676	Carro tanque	125.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	677	Volqueta	133.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	678	Mixer	105.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	679	Camión	126.30
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	681	Transporte interno	129.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Equipos especiales para c	704	Equipo especial de comun	108.83

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	2025
							Octubre
							Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	133.62
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	135.44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	147.91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	129.67
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	142.28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	133.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	145.09
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	134.48
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	132.79
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	133.53
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto	135.88
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas	140.59
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización	136.53
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras de alcantarillado	133.76
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	136.48
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	139.69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	141.38
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	141.43
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	135.52
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	137.12
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	135.27
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	141.54
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	141.27

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Tipología de obra - capítulo constructivo	Código de insumos	Insumos	2025
								Octubre
								Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	101	Arena	137.11
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	103	Consumibles	139.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	104	Malla	106.67
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	105	Alambre	131.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	106	Acero corrugado	115.23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	107	Cemento	151.29
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	108	Tubería acueducto y alcant	139.40
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	109	Acero	134.11
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	110	Cinta	135.82
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	112	Accesorios tubería	125.00
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	113	Concreto común	133.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	114	Cable	128.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	115	Grava	135.02
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	116	Pintura	155.84
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	117	Accesorios eléctricos	107.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	118	Agua	142.82
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	119	Elementos prefabricados	146.15
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	120	Asfalto	174.86
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	123	Elementos plásticos	138.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	124	Mortero	145.18
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	125	Recebo	135.82
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	126	Tubería acero	143.64
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	127	Concreto pavimentos	174.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	128	Piedra	130.84
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	129	Concreto simple	145.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	130	Textil sintético	133.83
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	131	Tubería PVC	123.00
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	132	Arandela metálica	119.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	133	Concreto lanzado	164.92
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	136	Combustible	158.21
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	137	Elementos metálicos	148.06
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	142	Abono	133.00
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	146	Bloque	161.59
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	151	Tubería galvanizada	116.49
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	152	Unión tubería	130.23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	156	Platina	119.69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	158	Concreto arquitectónico	137.72
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	160	Enchape	112.99
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	162	Teja	103.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	165	Junta de dilatación	127.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	166	Neopreno	125.15
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	172	Concreto tremie	143.69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	201	Herramienta menor	121.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	301	Motoniveladora	126.48
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	302	Compactador	135.15
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	304	Maquinaria de excavación	127.18
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	306	Perforadora	140.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	307	Cargadora	132.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	308	Grúa	135.62
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	309	Fresadora de pavimento	125.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	310	Finisher	135.81
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	311	Piloteadora	130.33
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	401	Andamio	137.12
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	402	Compresor	120.74
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	403	Cortadora	120.52
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	404	Demoleedor	116.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	405	Elevador de carga	124.14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	406	Equipo de medición	119.63
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	407	Equipo de soldado u oxico	115.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	408	Equipos para concreto	127.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	409	Formaleta y accesorios	126.02
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	410	Generador	119.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	411	Seguridad	128.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	412	Vibrocompactador	123.05
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	502	Ayudante	155.93
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	503	Cuadrilla	136.78
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	506	Oficial	134.18
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	511	Maestro	129.21
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	512	Capataz	121.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	676	Carro tanque	125.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	677	Volqueta	133.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	678	Mixer	105.79
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	679	Camión	126.30
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	681	Transporte interno	129.34
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	704	Equipo especial de comuni	108.83

Índices 2021

[illegible]

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2021
								Diciembre
								Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	104.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	109.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	105.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	108.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	102.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	100.89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	13.81	101.97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	12.21	102.07
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / conc	38.21	103.01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras	21.15	107.80
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitaria	10.83	103.44
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estru	0.92	111.97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalizaci	1.25	105.74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalización vertical y hori	0.81	114.10
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0.53	102.30
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0.28	106.31
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	101.57
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	26.65	107.49
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	15.73	102.58
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO PARA CÁLCULO DE ÍNDICE AJUSTADO PARA APLICAR A APU					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ					
CONTRATO No. 991 (Indicar número y año)		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”					
PROYECTO: 132 Y 135							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE							
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030							
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:		3 2 2021 (Día) (Mes) (Año)					
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	UNIDAD	m3			
CASO I - CASO GENERAL							
CÁLCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV							
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPÍTULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado OCTUBRE - 2025	FACTOR DE AJUSTE	VR AJUSTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Vr: UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	Vr: UNITARIO AJUSTADO	
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	\$ 775.000.00	104.35	147.91	1.41744	\$ 1.098.516.08	
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado DIC-2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado OCTUBRE - 2025	FACTOR DE AJUSTE	Vr: UNITARIO AJUSTADO	
I. EQUIPO							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr: UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr: UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -				\$ -
II. MAQUINARIA							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr: UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr: UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310	Terminadora Asfalto		\$ 22.784.97	101.81	135.81	1.33396	\$ 30.394.24
11603 - 302	Compactor Rodado		\$ 9.729.09	101.77	135.15	1.32799	\$ 11.568.16
11603 - 302	Compactor Neumático		\$ 10.455.37	101.77	135.15	1.32799	\$ 13.884.63
SUBTOTAL			\$ 41.969.43				\$ 55.847.03
III. HERRAMIENTAS							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr: UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr: UNITARIO AJUSTADO
11603 - 201	Herramienta Menor		\$ 533.30	105.4	121.95	1.15133	\$ 614.00
SUBTOTAL			\$ 533.30				\$ 614.00
IV. MATERIALES							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr: UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr: UNITARIO AJUSTADO
11603 - 115	Asfalto Líquido 60-70		\$ 230.064.19	1883.12	3329.980	1.76899	\$ 404.680.61
	Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto líquido		\$ 316.756.90	102.10	135.02	1.32243	\$ 418.688.63
SUBTOTAL			\$ 546.821.09	92%			\$ 823.369.24
V. PRECIO DE LISTA DE ECOPETROL							
III. TRANSPORTES							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr: UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr: UNITARIO AJUSTADO
11603 - 677	Transporte de Mezcla Asfáltica		\$ 1.600.02	100.59	133.89	1.33105	\$ 1.996.60
SUBTOTAL			\$ 1.600.02	9%			\$ 1.994.60
IV. MANO DE OBRA							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr: UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr: UNITARIO AJUSTADO
11603 - 502	Obreros (9)		\$ 3.077.87	103.31	129.93	1.50934	\$ 4.645.29
11603 - 506	Rastreros (2)		\$ 1.288.96	102.01	134.18	1.31530	\$ 1.695.45
11603 - 506	Oficial (1)		\$ 966.39	102.01	134.18	1.31530	\$ 1.271.15
SUBTOTAL			\$ 5.333.22	1%			\$ 7.611.85
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 996.163.26				\$ 1.098.698.92
V. COSTOS INDIRECTOS							
DESCRIPCIÓN				I _o (IPC)	I (IPC)	I / I _o	Vr: UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACIÓN %	20%	119.230.77	111.41	129.189	1.30216		152.413.77
IMPREVISTOS %	9%	29.807.69	111.41	101.79	1.36218		40.603.44
UTILIDAD %	9%	29.807.69	111.41	101.79	1.36218		40.603.44
SUBTOTAL			\$ 178.846.15				\$ 243.620.66
Precio Unitario Total Aproximado al peso			\$ 775.000.00				\$ 1.133.280.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO							
			FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.48297		
			I	IA			
			104.35	152.59			
			I	I			
			104.35	147.91			
Firma:							
Representante Legal del Contratista o su Apoderado							
Matrícula Profesional No.:							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA							
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.							
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la Interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los							
Firma:							
Representante Legal del Interventor o su Apoderado							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO PARA CÁLCULO DE ÍNDICE AJUSTADO PARA APLICAR A APU						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
CONTRATO NO. 991 (Indicar número y año)							
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”							
PROYECTO: 132 Y 135							
CONTRATISTA: NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE							
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030							
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021 (Día) (Mes) (Año)							
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	499.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	UNIDAD	m3			
CASO I - CASO GENERAL							
CÁLCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV							
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPÍTULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado AGOSTO - 2025	FACTOR DE AJUSTE	VR AJUSTADO	
ITEM	499.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	Vr UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	Vr UNITARIO AJUSTADO
			\$ 775,000.00	104.35	148.80	1.42597	\$ 1,105,126.79
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año Utilizado DIC-2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado AGOSTO - 2025	FACTOR DE AJUSTE	Vr UNITARIO AJUSTADO	
I. EQUIPO							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr UNITARIO APU	I _{so}	I	I / I _{so}	Vr UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -				\$ -
II. MAQUINARIA							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr UNITARIO APU	I _{so}	I	I / I _{so}	Vr UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310	Terminadora Anillo		\$ 22,784.97	101.81	155.81	1.33396	\$ 30,384.24
11603 - 302	Compactor Rodillo		\$ 8,729.09	101.77	155.45	1.33094	\$ 11,613.93
11603 - 302	Compactor Neumático		\$ 10,455.37	101.77	155.45	1.33094	\$ 13,919.47
SUBTOTAL			\$ 41,969.43				\$ 56,923.61
II. HERRAMIENTAS							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr UNITARIO APU	I _{so}	I	I / I _{so}	Vr UNITARIO AJUSTADO
11603 - 201	Herramienta Menor		\$ 523.30	105.4	109.94	1.14725	\$ 611.83
SUBTOTAL			\$ 523.30				\$ 611.83
II. MATERIALES							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr UNITARIO APU	I _{so}	I	I / I _{so}	Vr UNITARIO AJUSTADO
Precio Lista Ecopetrol	Asfalto Líquido 60-70		\$ 230,064.18	1893.12	3329.980	1.75899	\$ 404,680.81
11603 - 115	Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto líquido		\$ 316,756.90	102.10	154.87	1.31704	\$ 417,181.51
SUBTOTAL			\$ 546,821.09	92%			\$ 821,862.12
PRECIO DE LISTA DE EQUIPOS							
III. TRANSPORTES							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr UNITARIO APU	I _{so}	I	I / I _{so}	Vr UNITARIO AJUSTADO
11603 - 677	Transporte de Mezcla Asfáltica		\$ 1,500.02	100.59	131.87	1.31087	\$ 1,966.48
SUBTOTAL			\$ 1,500.02	0%			\$ 1,966.48
IV. MANO DE OBRA							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr UNITARIO APU	I _{so}	I	I / I _{so}	Vr UNITARIO AJUSTADO
11603 - 502	Obrero (9)		\$ 3,077.67	103.31	155.93	1.50934	\$ 4,645.25
11603 - 506	Rastrero (2)		\$ 1,288.96	102.01	134.19	1.31536	\$ 1,695.45
11603 - 506	Oficial (1)		\$ 968.39	102.01	134.19	1.31536	\$ 1,271.15
SUBTOTAL			\$ 5,335.02	1%			\$ 7,611.85
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 846,140.94				\$ 1,107,975.69
V. COSTOS INDIRECTOS							
DESCRIPCIÓN			I _{so} (IPC)	I (IPC)	I / I _{so}	Vr UNITARIO AJUSTADO	
ADMINISTRACIÓN %	20%	119,230.77	111.41	155.99	1.39526	\$ 161,588.70	
IMPREVISTOS %	5%	29,807.69	111.41	150.99	1.35526	\$ 40,397.17	
UTILIDAD %	5%	29,807.69	111.41	150.99	1.35526	\$ 40,397.17	
SUBTOTAL			\$ 178,846.15			\$ 242,383.04	
Precio Unitario Total Aproximado al peso			\$ 775,000.00			\$ 1,130,358.00	
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO							
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO			1.488539				
I			I _A				
104.35			152.29				
I			I				
104.35			148.8				
Firma:							
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula Profesional No.:							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la Interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para							
Firma:							
Representante Legal del Interventor o su Apoderado							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO PARA CÁLCULO DE ÍNDICE AJUSTADO A PARA APLICAR A APU						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
CONTRATO No. 991 (Indicar número y año)							
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAJÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HULA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"							
PROYECTO: 132 Y 135 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030							
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021 (Día) (Mes) (Año)							
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	460.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19			UNIDAD	m3	
CASO I - CASO GENERAL							
CÁLCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV							
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO				ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado SEPTIEMBRE - 2025	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	VR. UNITARIO AJUSTADO	
460.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	\$ 775.000,00	104.35	148.44	1.42252	\$ 1.102.463,90	
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS				ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado DIC-2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado SEPTIEMBRE - 2025	FACTOR DE AJUSTE	VR. UNITARIO AJUSTADO
I. EQUIPO							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	VR. UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	VR. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -				\$ -
II. MAQUINARIA							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	VR. UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	VR. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310	Terminadora Anillo		\$ 22.764,97	101,81	109,81	1,33396	\$ 30.394,34
11603 - 302	Compactor Rodillo		\$ 9.726,09	101,77	109,21	1,32655	\$ 11.993,31
11603 - 302	Compactor Neumático		\$ 10.455,37	101,77	110,21	1,32858	\$ 13.890,80
SUBTOTAL			\$ 41.946,43				\$ 56.278,44
II. HERRAMIENTAS							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	VR. UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	VR. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 201	Herramienta Menor		\$ 533,30	105,4	120,06	1,14085	\$ 612,69
SUBTOTAL			\$ 533,30				\$ 612,69
II. MATERIALES							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	VR. UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	VR. UNITARIO AJUSTADO
	Precio Lista Escopetrol		\$ 230.064,19	1893,12	3329,980	1,75899	\$ 404.680,61
11603 - 115	Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto líquido		\$ 316.756,90	102,10	134,23	1,31469	\$ 416.437,13
SUBTOTAL			\$ 546.821,09	92%			\$ 821.117,74
III. TRANSPORTES							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	VR. UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	VR. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 677	Transporte de Mezcla Asfáltica		\$ 1.500,02	100,59	133,88	1,33105	\$ 1.996,60
SUBTOTAL			\$ 1.500,02	0%			\$ 1.996,60
IV. MANO DE OBRA							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	VR. UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	VR. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 502	Obrero (9)		\$ 3.077,87	103,31	155,93	1,50934	\$ 4.642,25
11603 - 506	Rastrero (2)		\$ 1.265,96	102,01	134,18	1,31538	\$ 1.655,45
11603 - 506	Oficial (1)		\$ 966,39	102,01	134,18	1,31538	\$ 1.271,15
SUBTOTAL			\$ 5.310,22	1%			\$ 7.611,85
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 896.193,86				\$ 897.219,25
V. COSTOS INDIRECTOS							
DESCRIPCIÓN			I _p (IPC)	I (IPC)	I / I _p	VR. UNITARIO AJUSTADO	
ADMINISTRACIÓN %	20%	119.230,77	111,41	151,48	1,35966	\$ 162.113,31	
IMPUESTOS %	5%	29.807,69	111,41	151,48	1,35966	\$ 40.528,33	
UTILIDAD %	5%	29.807,69	111,41	151,48	1,35966	\$ 40.528,33	
SUBTOTAL			\$ 178.845,15			\$ 243.169,97	
Precio Unitario Total Aproximado al peso			\$ 775.000,00			\$ 1.130.389,00	
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO						1.458564	
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO							
I						148.44	
I _p						104.35	
I / I _p						1.42252	
I						148.44	
I _p						104.35	
I / I _p						1.42252	
Firma:							
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula Profesional No.:							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del							
Firma:							
Representante Legal del Interventor o su Apoderado							
Original: Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.							



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO



Factura electrónica de venta
No. CVNS 138

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 16:31
Expedición	03/12/2025, 16:32
Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTAAJUSTE 53 DEFINITIVA- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030	SERVICIO	1.00	1,136,078,506.68	0 %	0.00	1,136,078,506.68
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	227,215,703.00	0 %	0.00	227,215,703.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	56,803,925.00	0 %	0.00	56,803,925.00
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	56,803,926.32	19 %	10,792,746.00	67,596,672.32

Total items: 4

Valor en Letras: Mil cuatrocientos ochenta y siete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por \$ 1,487,694,807.00

Observaciones: PERIODO: OCTUBRE 2025

IVA 19% EJECUCIÓN OBRA: \$10.792.746

OBSERVACIONES

1#\$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#\$

FAVOR CONSIGNAR A

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034-7

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTEN° 055-9699-98453

INTEGRANTES CONSORCIO

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION 90% 830094920-5

CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: a148093b5421db9bbb1a87bf39981f04d5bf7f6be263c8ee6c67aa7a1d085142aed9a7e3411fd6c1aa84f667798f1963
