

INFORME DE OBRA No.3

19 de noviembre al 18 de diciembre del 2025.

E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS

OBJETO DEL CONTRATO:

*“ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO AMBULATORIO DE LA E.S.E.
CENTRO DE SALUD SAN BLAS, TINJACÁ.”*

**CONTRATO DE OBRA N° 097- 2025
CONINCAG SAS.
2025**

1. INTRODUCCION.

El presente documento corresponde al **Informe de Obra No. 3**, elaborado por el contratista **CONINCAG S.A.S.**, en el marco del seguimiento técnico, administrativo y operativo del **Contrato de Obra No. 097- 2025**, suscrito con la **E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS – TINJACÁ**, para las adecuaciones menores de sus bienes inmuebles donde prestan servicio.

Este informe tiene como finalidad presentar, de manera técnica, ordenada y verificable, el estado de avance del contrato durante el periodo comprendido entre el **17 de noviembre al 18 de diciembre del 2025**, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad contratante. En este sentido, el informe recopila la información necesaria para realizar un análisis riguroso del proceso de ejecución, identificando el progreso alcanzado, la trazabilidad de las intervenciones, y el cumplimiento de los requisitos contractuales y técnicos establecidos.

Durante este periodo, las actividades se han desarrollado en diferentes espacios físicos del Centro de Salud San Blas, ubicado en el municipio de Tinjacá, con el objetivo de garantizar la funcionalidad, seguridad, continuidad y buen estado de los bienes intervenidos. Las labores fueron ejecutadas bajo condiciones de operación institucional activa, por lo cual se implementaron medidas de coordinación técnica y logística que permitieron avanzar con eficiencia, sin interferir con el normal funcionamiento de las sedes.

Este documento incluye aspectos clave como la localización del proyecto, la información contractual relevante, la relación de pólizas que respaldan jurídicamente la ejecución, así como los objetivos que orientan el presente informe. La descripción detallada de las actividades ejecutadas, los avances físicos y las observaciones técnicas se presentan en los capítulos posteriores, permitiendo una lectura integral del estado del proyecto.

De este modo, el informe constituye una herramienta fundamental para el seguimiento y evaluación de la obra, facilitando los procesos de control por parte de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS y garantizando la transparencia y trazabilidad en la gestión del contrato.

2. OBJETIVO GENERAL DEL INFORME


Establecer, de manera técnica, clara y verificable, el estado actual del proceso de ejecución del **Contrato de Obra No. 097- 2025** correspondiente al periodo comprendido entre el **19 de noviembre al 18 de diciembre del 2025**, a través del registro sistemático de las actividades realizadas, el seguimiento de los avances físicos obtenidos y la consolidación de información administrativa, operativa y contractual, que permita a la **E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS** y a la interventoría ejercer un control eficiente y oportuno sobre el desarrollo del proyecto, garantizar la trazabilidad de las intervenciones y respaldar técnicamente la gestión contractual en sus diferentes etapas.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Consolidar, mediante un enfoque técnico y documental, la información relacionada con las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Identificar el avance físico del contrato con relación al cronograma de ejecución, permitiendo establecer el estado de cumplimiento a la fecha del informe.
- Generar un insumo técnico-administrativo que respalde los procesos de supervisión, validación y control que ejerce la entidad contratante.
- Determinar las condiciones logísticas, operativas y técnicas en las que se desarrolló la ejecución contractual, incluyendo aspectos relevantes para la planificación y continuidad de la obra.
- Facilitar la trazabilidad de la ejecución contractual mediante un documento que recopile la información esencial para la toma de decisiones y la evaluación técnica del avance del contrato.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 097- 2025, durante el periodo comprendido entre el **19 de noviembre al 18 de diciembre del 2025**, se llevó a cabo en las instalaciones de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS, ubicada en el municipio de Tinjacá, Boyacá, en la dirección Calle 5 No. 4-70.

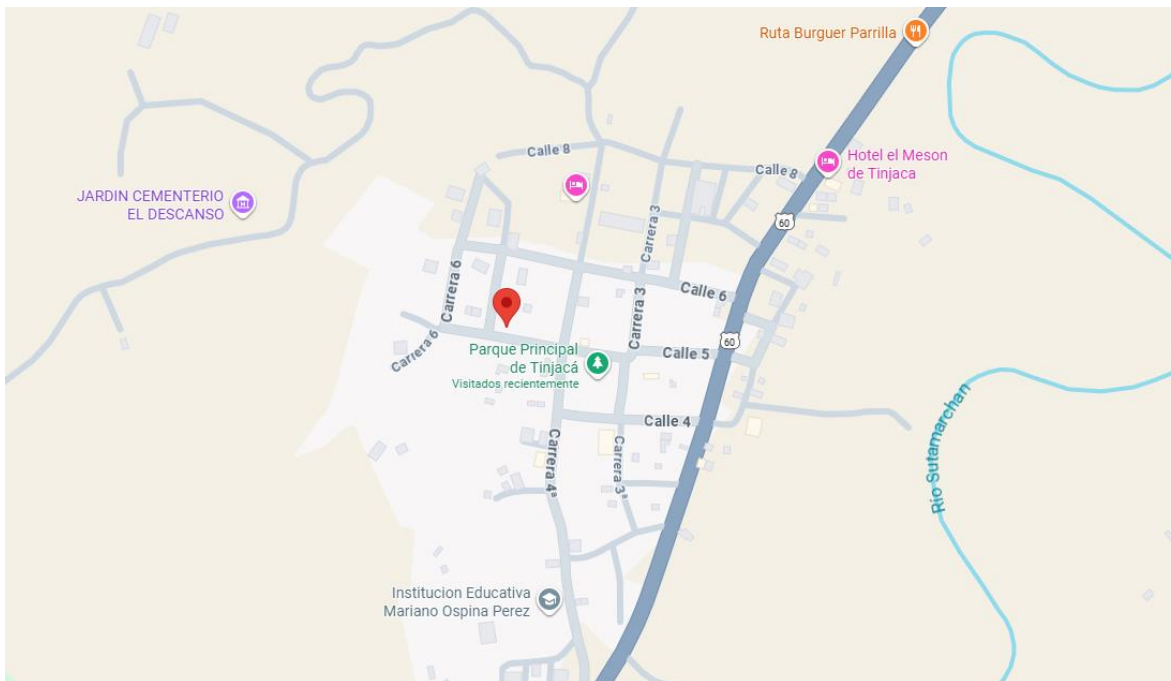

Todas las intervenciones se realizaron bajo lineamientos de coordinación institucional, cumpliendo con los protocolos de ingreso, medidas de seguridad industrial, control de personal y aseguramiento de la continuidad operativa, sin afectar el desarrollo de las funciones misionales de las entidades involucradas.

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

El presente informe se enmarca dentro del seguimiento técnico a las actividades ejecutadas en el contexto del Contrato No. 097- 2025, celebrado entre la E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS y la empresa **CONINCAG S.A.S.**, cuyo objeto es la *ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO AMBULATORIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS, TINJACÁ.*, garantizando la operatividad, funcionalidad, integridad física, técnica y normativa de la infraestructura institucional.

A continuación, se presenta la información contractual consolidada:

Ítem	Detalle
Número del contrato	097- 2025
Objeto contractual	ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO AMBULATORIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS, TINJACÁ.
Tipo de proceso de selección	CONVOCATORIA PÚBLICA RÉGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS
Unidad contratante	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS
Contratista	CONINCAG S.A.S.
NIT del contratista	900.934.461-5
Representante legal	Carlos Andrés Guerra Quiñones
Título de la oferta adjudicada	CONINCAG SAS
Fecha de inicio del contrato	19 de septiembre de 2025
Fecha de terminación del contrato	18 de diciembre de 2025
Duración total del contrato	90 días calendario
Valor total del contrato	\$ 578'559.523,32 COP
Tiempo de adiciones	0 días
Estado actual del contrato	En ejecución
Interventoría externa	ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (UNIGRANADINOS) N.I.T. No. 901.261581-1
Supervisor designado por la E.S.E SAN BLAS TINJACA	YESSICA KATERINE PINILLA ALARCÓN
Rol del supervisor	Supervisión técnica y administrativa de la ejecución contractual, asegurando el cumplimiento de estándares y plazos definidos.

Corte de Obra No. 3

Durante el periodo comprendido entre el **19 de noviembre al 18 de diciembre del 2025**, se radicó ante la interventoría y la supervisión técnica de la entidad el Corte de Obra No. 3, el cual documenta el avance físico y financiero correspondiente a las actividades ejecutadas dentro del alcance contractual. Este corte se encuentra en proceso de revisión y validación por parte de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS, requisito indispensable para continuar con la gestión de pago correspondiente.

Condiciones de ejecución

El contratista CONINCAG S.A.S. se compromete a ejecutar las actividades bajo los criterios técnicos exigidos, cumpliendo con las especificaciones contractuales, normativas vigentes, y las disposiciones en materia de seguridad industrial y gestión ambiental.

El control y seguimiento del contrato es efectuado mediante la interventoría ejercida por la ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (UNIGRANADINOS), a través de visitas, inspecciones, control documental y validaciones periódicas.

5. RELACIÓN DE PÓLIZAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato No. 171 de 2025, la empresa contratista **CONINCAG S.A.S.**, identificada con NIT 900.934.461-5, constituyó las garantías exigidas por la **E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS**, a través de la póliza integral expedida por la compañía **SEGUROS MUNDIAL S.A.**, mediante contrato de seguro identificado con la referencia de garantía No. CHU-100056922, actualmente en estado aceptado.

A continuación, se presenta el detalle de las coberturas y valores asegurados:

Tipo de garantía	Valor asegurado (COP)	Vigencia hasta
Cumplimiento del contrato	\$115.711.904.66	16 de junio de 2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	\$115.711.904.66	16 de marzo de 2026.
Calidad del servicio prestado	\$115.711.904.66	2 de julio de 2026
Responsabilidad civil extracontractual	\$284.700.000	11 de diciembre de 2026.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Entidad aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL S.A.
- **Número de póliza:** CHU-100056922
- **Tomador:** CONINCAG S.A.S.
- **Beneficiario:** E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BLAS

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

- **Entidad aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL S.A.
- **Número de póliza:** CHU-100010759
- **Tomador:** CONINCAG S.A.S.

- **Beneficiario:** TERCEROS AFECTADOS

Estas pólizas fueron expedidas para amparar integralmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo tanto la ejecución del objeto como la garantía de calidad de los bienes y servicios prestados, el cumplimiento de obligaciones laborales y la cobertura ante posibles daños a terceros derivados de la ejecución del contrato.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE CORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01.17	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	\$ 3,130.72	4.88	\$ 15,269.46
1.01.21	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	\$ 32,896.82	16.61	\$ 546,514.87
1.01.24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	\$ 9,548.43	41.08	\$ 392,259.05
1.01.26	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	M	\$ 2,412.49	47.58	\$ 114,786.27
1.01.28	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	\$ 33,374.71	7.22	\$ 240,972.08
1.01.31	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	\$ 35,872.86	6.82	\$ 244,652.91
1.01.34	DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	\$ 6,090.93	1.99	\$ 12,127.04
1.01.36	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	M2	\$ 3,135.04	50.15	\$ 157,225.39
1.01.41	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm.	M2	\$ 41,781.93	2.16	\$ 90,248.97
1.01.50	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	\$ 6,678.14	88.20	\$ 589,006.61
1.01.58	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO	M2	\$ 7,027.49	84.23	\$ 591,905.81
1.01.63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 13,629.00	36.70	\$ 500,217.01
1.01.73	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	\$ 6,150.65	16.02	\$ 98,533.41
2	CIMENTACIÓN Y DESAGUES				
1.02.22	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM	M2	\$ 165,313.60	16.88	\$ 2,902,629.09
1.02.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	M	\$ 30,265.82	5.86	\$ 184,452.01

1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	M	\$ 54,934.97	2.24	\$ 127,976.51
3	ESTRUCTURAS				
1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	\$ 1,518,710.44	0.33	\$ 519,314.07
4	MAMPOSTERIA				
1.04.17	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.10 MTS	M2	\$ 77,551.05	20.51	\$ 1,590,184.28
5	PAÑETES				
1.05.14	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	\$ 25,311.90	39.20	\$ 1,031,886.58
6	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
1.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 6"	UND	\$ 151,711.66	1.00	\$ 159,297.24
1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4"	UND	\$ 52,464.43	2.00	\$ 109,126.01
1.06.24	SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	UND	\$ 46,565.28	1.00	\$ 48,427.89
7	ENCHAPES				
1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	\$ 76,346.39	56.27	\$ 4,467,589.80
8	PISOS BASES Y ACABADOS				
1.11.03	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3	M2	\$ 47,297.97	51.12	\$ 2,514,660.90
1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	\$ 82,398.30	6.35	\$ 544,158.37
1.11.44	PISO CERÁMICA 51*51 CM	M2	\$ 94,652.14	51.12	\$ 5,032,309.75
9	CIELO RASOS				
1.13.06	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	\$ 80,355.64	103.84	\$ 8,677,602.35
10	CARPINTERIA METALICA				
1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	\$ 348,017.13	22.94	\$ 8,302,419.16
1.15.15	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	\$ 346,624.00	11.36	\$ 4,096,416.30
1.15.16	VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE	M2	\$ 218,878.35	13.29	\$ 3,025,180.71
1.15.18	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO	M	\$ 216,020.79	16.65	\$ 3,740,616.00

	INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)				
11	APARATOS SANITARIOS				
1.16.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	\$ 212,329.24	1.00	\$ 220,822.41
1.16.01	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	\$ 819,320.00	2.00	\$ 1,687,799.20
12	OBRAS EXTERIORES				
1.18.03	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	\$ 7,139.00	392.13	\$ 2,799,416.07
13	OTROS				
1.20.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	M	\$ 700,171.32	2.96	\$ 2,072,507.11
14	TUBERÍA PVC - ACUEDUCTO				
2.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L	M	\$ 8,458.91	2.10	\$ 18,474.26
15	ACCESORIOS ACUEDUCTO				
2.04.03	CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 3/4"	UND	\$ 1,772.11	8.00	\$ 14,743.96
2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	\$ 112,576.80	4.00	\$ 468,319.49
16	TUBERÍA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGUE				
2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	\$ 62,336.58	4.00	\$ 129,660.09
2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	\$ 112,957.53	2.00	\$ 234,951.66
2.05.31	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	UND	\$ 5,553.66	8.00	\$ 46,206.45
2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	UND	\$ 14,239.66	1.00	\$ 14,809.25
2.05.66	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	\$ 32,782.43	2.00	\$ 34,093.73
18	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN				
7.01.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP EMPOTRADO	UND	\$ 668,125.90	1.00	\$ 694,850.94
7.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE	ML	\$ 16,713.96	128.00	\$ 2,224,962.36

	COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")				
7.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No. 6 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 1 1/4")	ML	\$ 77,072.13	22.00	\$ 1,763,410.33
7.01.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS	UND	\$ 456,283.50	1.00	\$ 474,534.84
7.01.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE REGULADO MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	\$ 137,746.61	46.00	\$ 6,589,797.82
7.01.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	\$ 97,583.33	13.00	\$ 1,319,326.62
7.01.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	\$ 32,994.70	4.00	\$ 137,257.95
7.01.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	UND	\$ 171,329.05	31.00	\$ 5,523,648.57
7.01.190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 20 AMP.	UND	\$ 24,523.93	17.00	\$ 433,583.08
7.01.219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 60 AMP.	UND	\$ 226,378.77	1.00	\$ 235,433.92
NL	ACTIVIDADES NO LISTADAS				
NL01	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINALES, ESTUFAS, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	\$ 38,785.30	6.00	\$ 232,711.80
NL02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA PISO	ML	\$ 77,675.70	26.46	\$ 2,137,510.98

NL03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN PVC PARA TECHO	ML	\$ 75,452.50	59.53	\$ 4,671,354.82
NL04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES ENTRADA SUPERIOR INCLUYE GRIFERÍA	UND	\$ 677,339.60	1.00	\$ 704,433.18
NL06	PINTURA ANTIBACTERIAL BAJO OLOR, TIPO 1 BASE AGUA , SEMIBRILLANTE , COLOR BLANCO ,ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGO , ALTA RESISTENCIA AL HIPOCLORITO , QUE NO SE MANCHE CON EL YODO , LAVABLE , A 3 MANOS SOBRE PAREDES INTERIORES , INCLUYE RESANES. PINTURA CERTIFICADA PARA LABORATORIOS DONDE SE MANEJE ASEPSIA	M2	\$ 49,600.00	356.66	\$ 18,397,980.39
NL08	MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTAS HASTA 3.30 ML TOTAL (incluye espacio para cantonera)	UND	\$ 231,192.00	14.00	\$ 3,366,155.52
NL11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA EN ALUMINIO PARA LAVAPLATOS	UND	\$ 1,024,771.47	12.00	\$ 12,789,147.95
NL12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN MELAMINA DE HASTA 1.5 M DE ALTO Y CON MESÓN EN PIEDRA NATURAL	ML	\$ 1,619,789.66	50.62	\$ 85,273,502.69
NL13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA RECEPCIÓN DE HASTA 0.6 M DE ANCHO Y 1.5 M DE ALTO	ML	\$ 663,307.00	3.00	\$ 2,069,517.84
NL15	DESINSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UND	\$ 32,016.79	40.00	\$ 1,280,671.60
7.01.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	UND	\$ 118,196.37	35.00	\$ 4,136,872.95
1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	\$ 17,576.11	117.21	\$ 2,060,013.25
1.22.31	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UND	\$ 57,136.35	3.00	\$ 178,265.41
1.09.11	ESTUCO MUROS	M2	\$ 10,155.28	108.85	\$ 1,149,618.32

RESUMEN FINANCIERO

En el **corte N.º 3**, se registra el valor correspondiente al acta parcial de obra por la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE.. (\$239,419,440.15)**.

A la fecha del presente corte, se han ejecutado actividades contractuales por un valor acumulado de **QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$540,056,065.34)**, lo cual evidencia un **avance financiero de (93.34 %)** respecto al valor total del contrato de obra.

El **valor total contratado** asciende a la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$578.559.523,32)**, por lo cual el monto ejecutado refleja una ejecución financiera acorde con la programación establecida y con los compromisos contractuales vigentes, quedando un saldo pendiente por ejecutar correspondiente al **(6.66 %)** del valor contractual, sujeto a la finalización y liquidación de las actividades restantes.

Cordialmente



CARLOS ANDRÉS GUERRA QUIÑONES
CC 1018416174 DE BOGOTÁ D.C.
R/L CONINCAG SAS
NIT 900.934.461-5
