



Página: 1 de 7

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO		PERIODO DEL INFORME	
						DESDE	HASTA
PARCIAL	x	FINAL		3309-2021		01/05/2022	29/06/2022
						01/11/2022	15/11/2022
No. PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SI-SAMC-011-2021			
CONTRATANTE				GOBERNACIÓN DEL CAUCA			
CONTRATISTA				ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS SAS NIT.901.389.503-1			
No. DE IDENTIFICACION				R.L. JORGE LUIS GONZALEZ REYES C.C. 1.085.036.478 del Banco– Magdalena Correo: icons.sas@hotmail.com			
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				3008160425			
CDP No.				5428 del 13 de octubre 2021 187 del 3 de enero de 2022 5928 del 7 de octubre del 2022	CRP No.	11154 29 de diciembre del 2021 6 del 3 de enero de 2022 10779 del 10 de noviembre de 2022	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03 - 2.3.1.02.24.02.10.2.3.2.02.02.05 - 896			
ACTA DE PAGO PARCIAL No.				002			
VALOR A PAGAR				\$ 108.914.019,90			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				\$ 649.832.041,00			
VALOR EJECUTADO						\$ 448.982.887,00	
SALDO POR EJECUTAR						\$ 200.849.154,00	
SEGURIDA	No. PLANILLA		9438317634		TOTAL PAGADO		\$ 2.234.700
D SOCIAL	No. PLANILLA		9438316737		TOTAL PAGADO		\$ 3.330.100
OBJETO DEL CONTRATO							
“BPIN 2021003190061 - Territorial CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CONTENCIÓN EN ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO EN EL PR20+400 DE LA VÍA 1202 EL ESTRECHO - BALBOA - ARGELIA - EL PLATEADO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”							
JUSTIFICACION							
La ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CONTENCIÓN EN ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO EN EL PR20+400 DE LA VÍA 1202 EL ESTRECHO - BALBOA - ARGELIA - EL PLATEADO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA con BPIN 2021003190061”, se inició el 31 de diciembre de 2021 y consiste en la rehabilitación del sitio crítico PR20+400 de la vía que comunica al corregimiento de El Estrecho con el municipio de Balboa en el departamento							



Gobernación del Cauca

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3309-2021

Código: GF-P08-06

Versión: 2

Fecha: 17/05/2022

Página: 2 de 7

del Cauca. Dicho sitio presenta actualmente problemas de pérdida de banca, separación de la berma cuneta con la calzada, hundimiento de la banca, y fracturamiento de la tubería de la alcantarilla que se encuentra en el sitio

Las actividades desarrolladas son:

ACTIVIDADES DE OBRA

- Fundición de los pilotes que amarran las pantallas.
- Armado del acero, formaleta y fundida de la pantalla No. 1, No. 2 y No. 3
- Instalación de geotextil y la capa de arena que soporta el tubo perforado; relleno con material filtrante.
- Fundición de la aleta en concreto reforzado ubicada en la parte izquierda del muro.
- Estabilización de la vía, instalando la sub base, la cual se compacta y se toman las muestras de densidad correspondiente para continuar con la instalación de la base a nivel de la vía para habilitar el paso vehicular en la calzada completa.
- Se acopia la tubería de concreto en el costado derecho de la vía y se señala la salida de la cámara de caída, construida en su totalidad.
- El muro de contención se encuentra construido en su totalidad.
- Se realiza la cámara de caída.
- En el carril derecho se encuentra instalada la tubería en concreto que conecta con la cámara de caída para conectarla con la tubería del carril izquierdo

CONCRETO CLASE C (PARA MUROS Y CAISSON)



Columnas a 3 metros y fundida de pantalla entre columnas



Gobernación del Cauca

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3309-2021

Código: GF-P08-06

Versión: 2

Fecha: 17/05/2022

Página: 3 de 7

ACERO DE REFUERZO $f_y = 4200$ MPA



Armado de acero de refuerzo y formaleta para pantalla

GEOTEXTIL NT 2500 O SIMILAR NO TEJIDO MATERIAL GRANULAR DRENANTE



Instalación de geotextil y material filtrante

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (CON MATERIAL SELECCIONADO)



Relleno y compactación



Gobernación del Cauca

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3309-2021

Código: GF-P08-06

Versión: 2

Fecha: 17/05/2022


Página: 4 de 7

SUBBASE GRANULAR CLASE A BASE GRANULAR CLASE A



Base y subbase clase A para habilitar carril

CONCRETO PARA PILA DE AMARRE DE PANTALLAS DE CONTENCIÓN

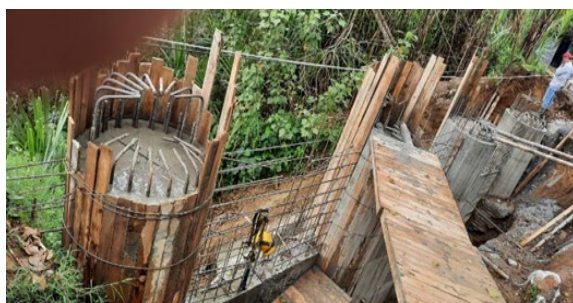

CÁMARA DE CAÍDA PARA DRENAJE DE TUBERÍA 36" (1,70m x 1,70m) EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO (NO INCLUYE ACERO)



Cámara de caída



Gobernación del Cauca

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3309-2021

Código: GF-P08-06

Versión: 2

Fecha: 17/05/2022

Página: 5 de 7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE C, DIÁMETRO 36"



2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Desde el inicio de la obra a la fecha de presentación del presente informe se han ejecutado las siguientes actividades administrativas para el desarrollo del proyecto:

- Trámite y emisión de balance de obra.
- Recepción de hojas de vida del personal de obra.
- Afiliación del personal que labora en la obra a todos los sistemas de seguridad social.
- Archivo de todos los documentos del contrato de obra.
- Comunicación permanente con el interventor, supervisor y la entidad contratante.
- Control de las obras y mantenimiento en ejecución.

3. ACTIVIDADES FINANCIERAS.

Las actividades de carácter financiero ejecutadas son:

- Control de costos del proyecto.
- Manejo y control del presupuesto de la obra.

4. ACTIVIDADES AMBIENTALES.

Entre las actividades ambientales desarrolladas en el transcurso del proyecto se encuentran el Informe Ambiental en el cual se registran la dotación de los elementos de seguridad al personal, afiliación, señalización, manejo y disposición de residuos, comunicación con la comunidad y limpieza de la obra.



Gobernación del Cauca

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3309-2021

Código: GF-P08-06

Versión: 2

Fecha: 17/05/2022

Página: 6 de 7

5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

- Gestión y revisión en todas las fases del proyecto.
- Supervisión del personal.
- Supervisión y control de los materiales, herramientas y máquinas utilizadas para la ejecución de la obra.
- Control de calidad en los trabajos ejecutados.

DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA

La interventoría realizó las siguientes actividades además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato 3303-2021:

- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
- Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.
- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.
- Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
- Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.
- Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato.
- Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
- Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
- Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
- Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
- Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica,

 Gobernación del Cauca	INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3309-2021	Código: GF-P08-06
		Versión: 2
		Fecha: 17/05/2022
		Página: 7 de 7

comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

NOTAS

Durante el periodo de ejecución comprendido entre los meses de mayo y junio se presentaron lluvias moderadas y los primeros 15 días del mes de noviembre las lluvias han sido fuertes provocando que las actividades se retrasen. Además, se han presentado inconvenientes de bloqueo de vías por la comunidad debido a los daños que se presentaron en el acueducto que abastece la población a causa de las lluvias que afectaron el mismo.


DATOS DEL INTERVENTOR

NOMBRE DEL INTERVENTOR	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA CONSEING LTDA NIT. No. 800106925-6 R.L. JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA C.C. No. 91.237.563 de Bucaramanga
-------------------------------	---


DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	OSCAR IVÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA ELABORACION
15 de diciembre de 2022



R.L. JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA
FIRMA DEL INTERVENTOR



Popayán, 20 de diciembre de 2022

Oficio SI-150-2022

Señora:

DIANA ISABEL VALLEJO MORENO

Contadora general del departamento (A de F)

Asunto: Cuenta de cobro de **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02** del contrato 3309-2021.

Reciba un cordial saludo,

De acuerdo con la documentación presentada para la cuenta de cobro del **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02**, se solicita se afecte el RP No. 6 del 3 de enero de 2022 de la siguiente forma:

RP	CONCEPTO	GASTO DE INVERSIÓN	VALOR RP	VALOR COBRADO ACUMULADO	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	SALDO POR EJECUTAR
6 3/01/2022	"BPIN 2021003190061 - Territorial CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CONTENCIÓN EN ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO EN EL PR20+400 DE LA VÍA 1202 EL ESTRECHO - BALBOA - ARGELIA - EL PLATEADO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."	03 - 2.3.1.02. 24.02.10. 2.3.2.02. 02.05 - 896	\$359.299.990,70	\$205.374.001,00	\$108.914.019,90	\$45.011.969,80

Acta de Pago Parcial N° 02

\$ 108.914.019,90

Atentamente,



ÓSCAR IVÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Ana Ofelia Pino Joaquín- Profesional de Apoyo

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	3309 - 2021
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	ICONS – INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S
INTERVENTOR	CONSEING LIMITADA
OBJETO	BPIN 2021003190061 - Territorial CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CONTENCIÓN EN ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO EN EL PR20+400 DE LA VÍA 1202 EL ESTRECHO - BALBOA - ARGELIA - EL PLATEADO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 513.285.701
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO OTROSI No. 3	\$ 136.546.340
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 649.832.041
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
PRORROGA No. 1	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN No. 1	29 de junio de 2022
OTROSI No. 3	UN (1) MES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2022, se reunieron **JORGE LUIS GONZALEZ REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. No. 1.085.036.478 del Banco – Magdalena**, en calidad de Representante Legal de **ICONS – INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S** NIT 901.389.503-1 firma contratista y el ingeniero **JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** identificado con cedula de ciudadanía No. C.C. No. **91.237.563 de Bucaramanga - Santander**, en calidad de representante legal de **CONSEING LTDA** NIT 800.106.925-6 firma interventora, con el fin de elaborar la presenta **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 02** del contrato mencionado anteriormente, la cual comprende el periodo desde el **01 de mayo de 2022** hasta el **29 de junio de 2022** y desde el **1 de noviembre de 2022** hasta el **15 de noviembre de 2022**

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	29 de diciembre de 2021
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 de diciembre de 2021
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	30 de abril de 2022
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	02 de diciembre de 2022

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO N° 3309-2021	\$	513.285.701
VALOR ADICIONAL	\$	136.546.340
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	\$	649.832.041

NP 1	630	-		CONCRETO PARA PILA DE AMARRE DE PANTALLAS DE CONTENCIÓN	M3	24,65
NP 2	661-13	661.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE C, DIÁMETRO 36"	ML	3,00
NP 3	-	-		CÁMARA DE CAÍDA PARA DRENAJE DE TUBERÍA 36" (1,70m x 1,70m) EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO (NO INCLUYE ACERO)	UND	1,00
NP 4	663 - 13	-		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 36" DE DIÁMETRO.	ML	0,00
				OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (inmodificable)		29,2%
				Implementación Protocolo de Bioseguridad (inmodificable)		60%

Para constancia se firma por los que intervienen.



JORGE LUIS GONZALEZ REYES
C.C. No. 1.085.036.478 del Banco – Magdalena
Representante Legal
ICONS – INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S
Nit: 901389503-1
CONTRATISTA



JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA
C.C. No. 91.237.563 de Bucaramanga – Santander
Representante Legal
CONSEING LIMITADA
Nit: 800106925-6
INTERVENTOR

<div><div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div><div></div><div>Gobernación del Cauca</div><div>Secretaría de Infraestructura</div></div>	CONTRATO DE OBRA No. 3309 - 2021	BPIN 2021003190061 - Territorial CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CONTENCIÓN EN ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO EN EL PR20+400 DE LA VÍA 1202 EL ESTRECHO - BALBOA - ARGELIA - EL PLATEADO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 513.285.701	
		VALOR ADICIONAL No. 1 (OTROSI No. 3)	\$ 136.546.340	
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 649.832.041	
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES	
		PRORROGA No. 1	2 MESES	
		OTROSI No. 3	1 MES	
		FECHA DE INICIO	31 de diciembre de 2021	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de junio de 2022	
		FECHA DE REINICIO No. 1	1 de noviembre de 2022	
FECHA DE TERMINACION	02 de diciembre de 2022			
CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES		MODIFICATORIO No.1		
CONTRATISTA:	ICONS – INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S	OBRA EJECUTADA		
INTERVENTORIA	CONSEING LIMITADA	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADA

42

Motivos

para avanzar

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2

PERIODO FACTURADO: Desde el 01 de mayo de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 y desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 15 de noviembre de 2022

FECHA PRESENTE ACTA: 17 de noviembre de 2022

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	201.P	-	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (POR SITIO CRÍTICO)	UND	1,00	\$ 601.151,49	\$ 601.151,49	3,00	\$ 1.803.454,00	1,00	\$ 601.151,49	0,00	\$ -	1,00	\$ 601.151,49
2	201.7	201-13	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	6,72	\$ 113.324,63	\$ 761.541,00	14,00	\$ 1.586.545,00	4,77	\$ 540.558,47	0,00	\$ -	4,77	\$ 540.558,47
3	201.15	201-13	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	12,00	\$ 36.756,72	\$ 441.081,00	12,00	\$ 441.081,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4	201.16	201-13	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	ML	17,20	\$ 2.879,85	\$ 49.533,00	9,20	\$ 26.495,00	9,20	\$ 26.494,63	0,00	\$ -	9,20	\$ 26.494,63
5	320.1	320-13	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	17,28	\$ 112.805,97	\$ 1.949.287,00	61,00	\$ 6.881.164,00	0,00	\$ -	24,35	\$ 2.746.768,97	24,35	\$ 2.746.768,97
6	330.1	330-13	BASE GRANULAR CLASE A	M3	11,52	\$ 130.847,76	\$ 1.507.366,00	46,00	\$ 6.016.997,00	0,00	\$ -	16,23	\$ 2.124.051,71	16,23	\$ 2.124.051,71
7	420.2	420-13	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	57,48	\$ 5.808,21	\$ 333.856,00	230,00	\$ 1.335.888,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8	450.2	450-13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	5,76	\$ 625.491,04	\$ 3.602.828,00	22,00	\$ 13.760.803,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9	465.1	465-13	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	M2	57,43	\$ 37.491,79	\$ 2.153.154,00	190,00	\$ 7.123.440,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10	600.1.1	600-13	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	96,24	\$ 7.951,49	\$ 765.252,00	223,00	\$ 1.773.183,00	74,02	\$ 588.567,01	11,41	\$ 90.758,34	85,43	\$ 679.325,35
11	610.1	610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (CON MATERIAL SELECCIONADO)	M3	204,03	\$ 77.640,30	\$ 15.840.950,00	280,00	\$ 21.739.284,00	23,75	\$ 1.843.957,09	205,04	\$ 15.919.677,37	226,79	\$ 17.763.634,46
12	621.P		PILOTE PRE EXCAVADO TIPO CAISSON (EXCAVACIÓN ANILLO Y NÚCLEO EN CONCRETO CLASE C, NO CONTIENE ACERO)	M3	103,80	\$ 1.640.320,90	\$ 170.265.309,00	89,60	\$ 146.972.752,00	86,01	\$ 141.085.189,13	0,00	\$ -	86,01	\$ 141.085.189,00
13	630.3	630-13	CONCRETO CLASE C (PARA MUROS Y CAISSON)	M3	21,37	\$ 623.654,48	\$ 13.327.496,00	45,00	\$ 28.064.451,00	0,00	\$ -	15,83	\$ 9.870.267,59	15,83	\$ 9.870.267,59
14	630.4	630-13	CONCRETO CLASE D (PARA OBRAS DE DRENAJE)	M3	12,43	\$ 604.349,25	\$ 7.512.061,00	10,98	\$ 6.635.752,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
15	630.6	630-13	CONCRETO CLASE F (PARA SOLADO)	M3	0,60	\$ 344.505,97	\$ 206.704,00	5,00	\$ 1.722.530,00	0,00	\$ -	0,94	\$ 322.457,59	0,94	\$ 322.457,59
16	630.7	630-13	CONCRETO CLASE G (PARA REMATE DE DISIPADORES)	M3	1,87	\$ 281.041,04	\$ 525.547,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
17	640.1	640-13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 MPA	KG	15.684,07	\$ 5.631,34	\$ 88.322.382,00	17.000,00	\$ 95.732.836,00	10.479,92	\$ 59.016.027,10	2.663,38	\$ 14.998.418,34	13.143,30	\$ 74.014.445,44
18	663.1	663-13	TUBERIA DE PLÁSTICO DE DIÁMETRO 900 MM	ML	12,00	\$ 1.062.900,00	\$ 12.754.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19	671.1	671-13	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	4,37	\$ 517.712,69	\$ 2.262.404,00	6,29	\$ 3.256.413,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20	673.1.1	673-13	GEOTEXTIL NT 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	161,28	\$ 5.761,94	\$ 929.286,00	236,00	\$ 1.359.818,00	0,00	\$ -	139,92	\$ 806.210,69	139,92	\$ 806.210,69
21	673.2	673-13	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	47,64	\$ 104.566,42	\$ 4.981.544,00	49,22	\$ 5.146.621,00	0,00	\$ -	41,98	\$ 4.389.279,96	41,98	\$ 4.389.279,96
22	800.1	800-13	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	ML	20,64	\$ 10.412,69	\$ 214.918,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23	900.2	900-13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100M).	M3-KM	142,42	\$ 1.550,00	\$ 220.751,00	254,80	\$ 394.940,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

<div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> <div></div> <div>Gobernación del Cauca</div> <div>Secretaría de Infraestructura</div>		<div>CONTRATO DE OBRA No. 3309 - 2021</div> <div>BPIN 2021003190061 - Territorial CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CONTENCIÓN EN ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO EN EL PR20+400 DE LA VÍA 1202 EL ESTRECHO - BALBOA - ARGELIA - EL PLATEADO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA</div>		<div>VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 513.285,701</div> <div>VALOR ADICIONAL No. 1 (OTROSI No. 3) \$ 136.546,340</div> <div>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 649.832,041</div> <div>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 4 MESES</div> <div>PRORROGA No. 1 2 MESES</div> <div>OTROSI No. 3 1 MES</div> <div>FECHA DE INICIO 31 de diciembre de 2021</div> <div>FECHA DE SUSPENSION: 29 de junio de 2022</div> <div>FECHA DE REINICIO No. 1 1 de noviembre de 2022</div> <div>FECHA DE TERMINACION 02 de diciembre de 2022</div>				<div></div> <div>ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2</div> <div>PERIODO FACTURADO: Desde el 01 de mayo de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 y desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 15 de noviembre de 2022</div> <div>FECHA PRESENTE ACTA: 17 de noviembre de 2022</div>							
CONTRATISTA: ICONS – INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S		CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES		MODIFICATORIO No.1		OBRA EJECUTADA									
INTERVENTORIA CONSEING LIMITADA						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA					
ÍTEMS NO PREVISTOS															
NP 1	-	630	CONCRETO PARA PILA DE AMARRE DE PANTALLAS DE CONTENCIÓN	M3	0,00	\$ 1.175.026,00	\$ -	24,85	\$ 28.959.927,00	0,00	\$ -	24,65	\$ 28.960.503,00	24,65	\$ 28.960.503,00
NP 2	661,8	661-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE C, DIÁMETRO 36"	ML	0,00	\$ 826.769,40	\$ -	11,00	\$ 9.094.470,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 2.480.308,20	3,00	\$ 2.480.308,00
NP 3	-	-	CÁMARA DE CAÍDA PARA DRENAJE DE TUBERÍA 36" (1,70m x 1,70m) EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO (NO INCLUYE ACERO)	UND	0,00	\$ 15.004.392,00	\$ -	1,00	\$ 15.004.392,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 15.004.392,00	1,00	\$ 15.004.392,00
NP 4	-	663 - 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 36" DE DIÁMETRO.	ML	0,00	\$ 1.477.456,72	\$ -	18,00	\$ 26.594.221,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
VALOR TOTAL OBRAS A COSTO DIRECTO						\$ 329.629.201,49	\$ 431.429.457,00	\$ 203.701.944,92	\$ 97.713.093,76	\$ 301.415.038,35					
ADMINISTRACIÓN						30%	\$ 98.858.760,00	30%	\$ 129.428.837,10	30%	\$ 61.110.583,48	30%	\$ 29.313.928,00	30%	\$ 61.110.583,48
IMPREVISTOS						2%	\$ 6.590.584,00	2%	\$ 8.628.589,14	2%	\$ 4.074.038,90	2%	\$ 1.954.262,00	2%	\$ 4.074.038,90
UTILIDAD						2%	\$ 6.590.584,00	2%	\$ 8.628.589,00	2%	\$ 4.074.038,90	2%	\$ 1.954.262,00	2%	\$ 4.074.038,90
VALOR AUI						\$ 112.039.928,00	34%	\$ 146.686.015,24	34%	\$ 69.258.661,27	34%	\$ 33.222.452,00	34%	\$ 69.258.661,27	
VALOR TOTAL OBRAS						\$ 441.569.132,49	\$ 578.115.472,24	\$ 272.960.606,20	\$ 130.935.545,76	\$ 370.673.699,62					
OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (inmodificable)						\$ 59.603.956,00	\$ 59.603.956,00	34,3%	\$ 20.430.823,40	29,2%	\$ 17.388.343,44	63,5%	\$ 37.819.166,84		
Implementación Protocolo de Bioseguridad (inmodificable)						\$ 12.112.613,00	\$ 12.112.613,00	\$ -	60%	\$ 7.267.567,80	60%	\$ 7.267.567,80			
VALOR TOTAL						\$ 513.285.701,49	\$ 649.832.041,24	\$ 293.391.429,60	\$ 155.591.457,00	\$ 415.760.434,26					
ESTADO DEL ANTICIPO						ESTADO DEL CONTRATO									
VALOR ANTICIPO INICIAL						\$ 153.985.710,00	VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 513.285.701,00						
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 1 30%						\$ 88.017.428,88	ADICIONAL OTROSI No. 03		\$ 136.546.340,00						
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA 30%						\$ 46.677.437,10	VALOR DEL CONTRATO		\$ 649.832.041,00						
SALDO POR AMORTIZAR						\$ 19.290.844,02	VALOR ACTA No. 1		\$ 293.391.430,00						
							VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		\$ 155.591.457,00						
							VALOR EJECUTADO INCLUYE PRESENTE ACTA		\$ 448.982.887,00						
							VALOR POR EJECUTAR		\$ 200.849.154,00						
VALOR PRESENTE ACTA						\$ 155.591.457,00	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.								
VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA						\$ 108.914.019,90	CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE.								

 GOBIERNO DEL CAUCA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	REPUBLICA DE COLOMBIA CONTRATO DE OBRA No. 3309 - 2021	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 513.285.701 VALOR ADICIONAL No. 1 (OTROSI No. 3) \$ 136.546.340 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 649.832.041		 ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2	
	BPIN 2021003190061 - Territorial CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CONTENCIÓN EN ATENCIÓN DEL SITIO CRÍTICO EN EL PR20+400 DE LA VÍA 1202 EL ESTRECHO - BALBOA - ARGELIA - EL PLATEADO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 4 MESES PRORROGA No. 1 2 MESES OTROSI No. 3 1 MES		PERIODO FACTURADO: Desde el 01 de mayo de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 y desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 15 de noviembre de 2022	
CONTRATISTA: ICONS – INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S INTERVENTORIA: CONSEING LIMITADA		CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES	MODIFICATORIO No.1	FECHA DE INICIO 31 de diciembre de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de junio de 2022 FECHA DE REINICIO No. 1 1 de noviembre de 2022 FECHA DE TERMINACIÓN 02 de diciembre de 2022	
				FECHA PRESENTE ACTA: 17 de noviembre de 2022	
				OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADA	
NOTAS: 1)- Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente. 2)- El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento 3)- La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 4)- El interventor certifique que revisó, verificó y constató el pago y afiliación activa al sistema de Seguridad Social del personal al servicio de la obra y de los Parafiscales de ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por el contratista de obra.					
Para constancia se firma por los que intervienen:					
 JORGE LUIS GONZALEZ REYES Representante Legal ICONS – INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S Nit: 901389503-1 CONTRATISTA		 JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA Representante Legal CONSEING LIMITADA Nit: 800106925-6 INTERVENTOR		 OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ Supervisor del Contrato de Interventoría DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
				 JOSÉ RODRIGO ASTAIZA GALLESO Secretaria de Infraestructura DEPARTAMENTO DEL CAUCA	

Revisó matemáticamente: Ana Ofelia Pino Joaqui - Profesional de apoyo a la Supervisión - Secretaria de Infraestructura

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1583916331	9438316737	E	2022/06/02	2022/08/02	BANCO DE BOGOTA	61	\$3,330,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	
----------------------------------	--

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	igo	lma	vac	avp	vct	irl	rip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF			
SUCURSAL: OBRAS CAUCA (11 Afiliados)																									\$10,733,336	\$1,717,600			\$10,733,336	\$429,600			\$10,733,336	\$429,600			\$10,733,336	\$747,200		\$0	\$0		\$3,324,000
Centro de Trabajo: OBRAS CAUCA CONTENCION (11 Afiliados)																									\$10,733,336	\$1,717,600			\$10,733,336	\$429,600			\$10,733,336	\$429,600			\$10,733,336	\$747,200		\$0	\$0		\$3,324,000
Ciudad: BALBOA Depto: CAUCA (11 Afiliados)																									\$10,733,336	\$1,717,600			\$10,733,336	\$429,600			\$10,733,336	\$429,600			\$10,733,336	\$747,200		\$0	\$0		\$3,324,000
1	CC	1105061315	ALDANA JEISSON																	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
2	CC	1002836056	ALYEAR KAROL																	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
3	CC	10258821	COTAZO NELSON																	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
4	CC	1063813522	DEJESUS WILMER	X																23020	28	\$933,334	\$149,400	EPS037	28	\$933,334	\$37,400	CCF14	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	6.960%	\$65,000	28	\$0	\$0	Si	\$289,200		
5	CC	1063811644	DIAZ JULIAN	X																23030	28	\$933,334	\$149,400	ESSC62	28	\$933,334	\$37,400	CCF14	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	6.960%	\$65,000	28	\$0	\$0	Si	\$289,200		
6	CC	1004593429	GOMEZ DAVID																	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSIC3	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
7	CC	10694969	GOMEZ JORGE																	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSIC3	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
8	CC	4739985	MARTINEZ RIGOBERTO	X																23030	28	\$933,334	\$149,400	ESSC62	28	\$933,334	\$37,400	CCF14	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	6.960%	\$65,000	28	\$0	\$0	Si	\$289,200		
9	CC	1061748034	MESA DEISY																	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
10	CC	16836102	MORENO JOSE	X																23030	28	\$933,334	\$149,400	EPS037	28	\$933,334	\$37,400	CCF14	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	6.960%	\$65,000	28	\$0	\$0	Si	\$289,200		
11	CC	1061789219	ORDOÑEZ STEFANY																	23020	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
Total Afiliados (11)																									\$10,733,336	\$1,717,600			\$10,733,336	\$429,600			\$10,733,336	\$429,600			\$10,733,336	\$747,200		\$0	\$0		\$3,324,000

J. Alejandro Trujillo S.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-05	2022-06	1583916331	9438316737	E	2022/06/02	2022/08/02	BANCO DE BOGOTA	61	\$3,330,100	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	\$1,717,600	\$3,100	\$0	\$1,720,700		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,408,200	\$2,500	\$0	\$1,410,700		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$309,400	\$600	\$0	\$310,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$747,200	\$1,300	\$0	\$748,500		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$747,200	\$1,300	\$0	\$748,500		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$429,600	\$800	\$0	\$430,400		
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	\$429,600	\$800	\$0	\$430,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$429,600	\$900	\$0	\$430,500		
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$80,000	\$200	\$0	\$80,200		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$194,800	\$400	\$0	\$195,200		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$114,800	\$200	\$0	\$115,000		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100		
TOTAL				11	\$3,324,000	\$6,100	\$0	\$3,330,100		

Vo.Bo.

 J Alejandro Tineo S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2072-06	2072-07	1583826539	9438317634	E	2022/07/05	2022/08/02	BANCO DE BOGOTA	28	\$2,234,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	lee	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lir	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA y KCBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$66,667	\$10,700			\$66,667	\$2,700			\$66,667	\$2,700			\$66,667		\$4,700		\$0	\$0	\$20,800	
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						\$66,667	\$10,700			\$66,667	\$2,700			\$66,667	\$2,700			\$66,667		\$4,700		\$0	\$0	\$20,800	
1	CC	1085036478	GONZALEZ REYES JORGE LUIS	X	X															230301	2	\$66,667	\$10,700	EPS037	2	\$66,667	\$2,700	CCF33	2	\$66,667	\$2,700	14-11	2	\$66,667	6.960%	\$4,700	2	\$0	\$0	Si	\$20,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ins	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lga	lma	vac	avp	vct	lrv	lvp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Terifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: OBRAS CAUCA (11 Afiliados)																									\$7,133,336	\$1,141,600			\$7,133,336	\$285,600			\$7,133,336	\$285,600			\$7,133,336	\$496,800		\$0	\$0			\$2,209,600
Centro de Trabajo: OBRAS CAUCA CONTENCION (11 Afiliados)																									\$7,133,336	\$1,141,600			\$7,133,336	\$285,600			\$7,133,336	\$285,600			\$7,133,336	\$496,800		\$0	\$0			\$2,209,600
Ciudad: BALBOA Depto: CAUCA (11 Afiliados)																									\$7,133,336	\$1,141,600			\$7,133,336	\$285,600			\$7,133,336	\$285,600			\$7,133,336	\$496,800		\$0	\$0			\$2,209,600
2	CC	1105061315	ALDANA PRADA JEISSON FABIAN																	23030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600			
3	CC	1002836056	ALVEAR LOPEZ KAROL BRILLIT																	23030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600			
4	CC	10298821	COTAZO ANDELA NELSON FABIAN																	23030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600			
5	CC	1063813522	DEJESUS DIAZ WILMER FABIAN																	23020 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600			
6	CC	1063811644	DIAZ MARTINEZ JULIAN BOLIVAR																	23030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600			
7	CC	1004593429	GOMEZ ORTIZ DAVID ESTIVEN		X															23030 1	1	\$33,334	\$5,400	EPSHC3	1	\$33,334	\$1,400	CCF14	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	6.960%	\$2,400	1	\$0	\$0	Si	\$10,600			
8	CC	10694969	GOMEZ TAQUEZ JORGE ENRIQUE		X															23030 1	1	\$33,334	\$5,400	EPSHC3	1	\$33,334	\$1,400	CCF14	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	6.960%	\$2,400	1	\$0	\$0	Si	\$10,600			
9	CC	4739985	MARTINEZ MONTERO RIGOBERTO		X															23030 1	1	\$33,334	\$5,400	ESSC62	1	\$33,334	\$1,400	CCF14	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	6.960%	\$2,400	1	\$0	\$0	Si	\$10,600			
10	CC	1061748034	MESA VELASCO DEISY SOFIA																	23030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600			
11	CC	16836102	MORENO ALEGRIA JOSE OSNEYDER																	23030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600			
12	CC	1061789219	ORDONEZ MENESES STEFANY ALEXANDRA		X															23020 1	1	\$33,334	\$5,400	ESSC62	1	\$33,334	\$1,400	CCF14	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	6.960%	\$2,400	1	\$0	\$0	Si	\$10,600			
Total		Afiliados(12)																					\$7,200,003	\$1,152,300			\$7,200,003	\$288,300			\$7,200,003	\$288,300			\$7,200,003	\$501,500		\$0	\$0		\$2,230,400			

Va. So.
178
J. ALEJANDRO TAVIRA S

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-06	2022-07	1583926539	9438317634	E	2022/07/05	2022/08/02	BANCO DE BOGOTA	28	\$2,234,700	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$1,152,300	\$2,000	\$0	\$1,154,300		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$986,900	\$1,700	\$0	\$988,600		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$165,400	\$300	\$0	\$165,700		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$501,500	\$900	\$0	\$502,400		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$501,500	\$900	\$0	\$502,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$288,300	\$600	\$0	\$288,900		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$2,700	\$100	\$0	\$2,800		
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	\$285,600	\$500	\$0	\$286,100		
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$288,300	\$800	\$0	\$289,100		
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$2,800	\$100	\$0	\$2,900		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$122,800	\$300	\$0	\$123,100		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$122,700	\$300	\$0	\$123,000		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100		
TOTAL				12	\$2,230,400	\$4,300	\$0	\$2,234,700		

Va. Bo.
M.
J. Alejandro Tulea S.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR:

Que la empresa contratista ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S., identificada con Nit. 901389503, ha cancelado aportes parafiscales del 4%, con destino al régimen de Subsidio Familiar, por el periodo comprendido de Febrero del 2022 a Junio del 2022.

VALOR NOMINA: \$ 38.462.500

VALOR 4%: \$ 1.538.500

Por concepto: CONTRATO DE OBRA N° 3309 DE 2021; SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El documento es válido para liquidación del presente Contrato

"LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION NO IMPIDE QUE COMFACAUCA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE APORTES Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR VIGENCIAS O PERIODOS ANTERIORES."

Se expide en Popayán, a los 10 días del mes de Agosto de 2022



JEFE DE PROMOCION Y CONTROL DE APORTES



Ingeniería & Contratos S.A.S

DC-SI-SAMC-011-2021

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, KATERINE BARROS PEREZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1082894582 de SANTA MARTA en mi condición de contadora de **ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S** identificada con NIT. **901389503-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente factura. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en El Banco - Magdalena, a los ocho (16) días del mes de diciembre de 2022.

KATERINE BARROS PEREZ

T.P 173266-T

CONTADOR PUBLICO

icons.sas@hotmail.com



Calle 9 No. 4 - 47 - El Banco Magd.



301 755 1067



KATERINE BARROS PEREZ

CONTADOR PÚBLICO



Katerine Barros Pérez
Contador Público
T.P. 173266-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

56443E64A76FA91F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATERINE BARROS PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1082894582 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 173266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
