



INFICALDAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-2
VERSIÓN	1
FECHA	13/06/2019
PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°:

252014

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

☐☒

DEL 29 DE
SEPTIEMBRE A 30
DE NOVIEMBRE DE
2025

ANTICIPO

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO

RUBRO No. 340

RECURSO No. 212020200503

VALOR AFECTADO \$ 95.280.953,00

No. COMPROMISO

RUBRO No. 340

RECURSO No. 232020200502

VALOR AFECTADO \$ 195.137.928,00

No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

\$ 290.418.881,00

Nombre: JHON JAIRÓ GÓMEZ ARIAS
Supervisor del Contrato

Matricula No.: 17202-54237 CLD



INFICALDAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-3
VERSIÓN	1
FECHA	13/06/2019
PÁGINA	1 DE 1

Contrato N° : 252014 Contratista: INCIVILPRO S.A.S

Objeto del Contrato

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

Acta N° 1 Valor basico \$ 290.418.881,00

Valor Incluido Iva \$ 290.418.881

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		AEROPUERTO LA NUBIA MANIZALES			\$ 290.418.881,00	\$ 290.418.881,00
2						
3						
4						
TOTALES			\$	\$	\$ 290.418.881,00	\$ 290.418.881,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CALDAS	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MANIZALES	CALDAS	\$ 290.418.881,00	\$ 290.418.881,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 290.418.881,00	\$ 290.418.881,00
NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			


CONTRATISTA
Nombre: ALEXANDER PATIÑO TORRES
Representante Legal INCIVILPRO S.A.S
Matricula No. 17202-147490 CLD


INTERVENTOR
Nombre: SEBASTIAN BALLESTEROS LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO SBP
Matricula No.: 17202-340982 CLD



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INCIVILPRO SAS

Identificado con NI 9006040101

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina GILBERTO ALZATE, con las siguientes características:


Cuenta Corriente


Número:	21004197167
Fecha de apertura:	25 de Abril de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 06 de Noviembre de 2025.


Cordialmente,


Vicepresidencia de Banca Masiva

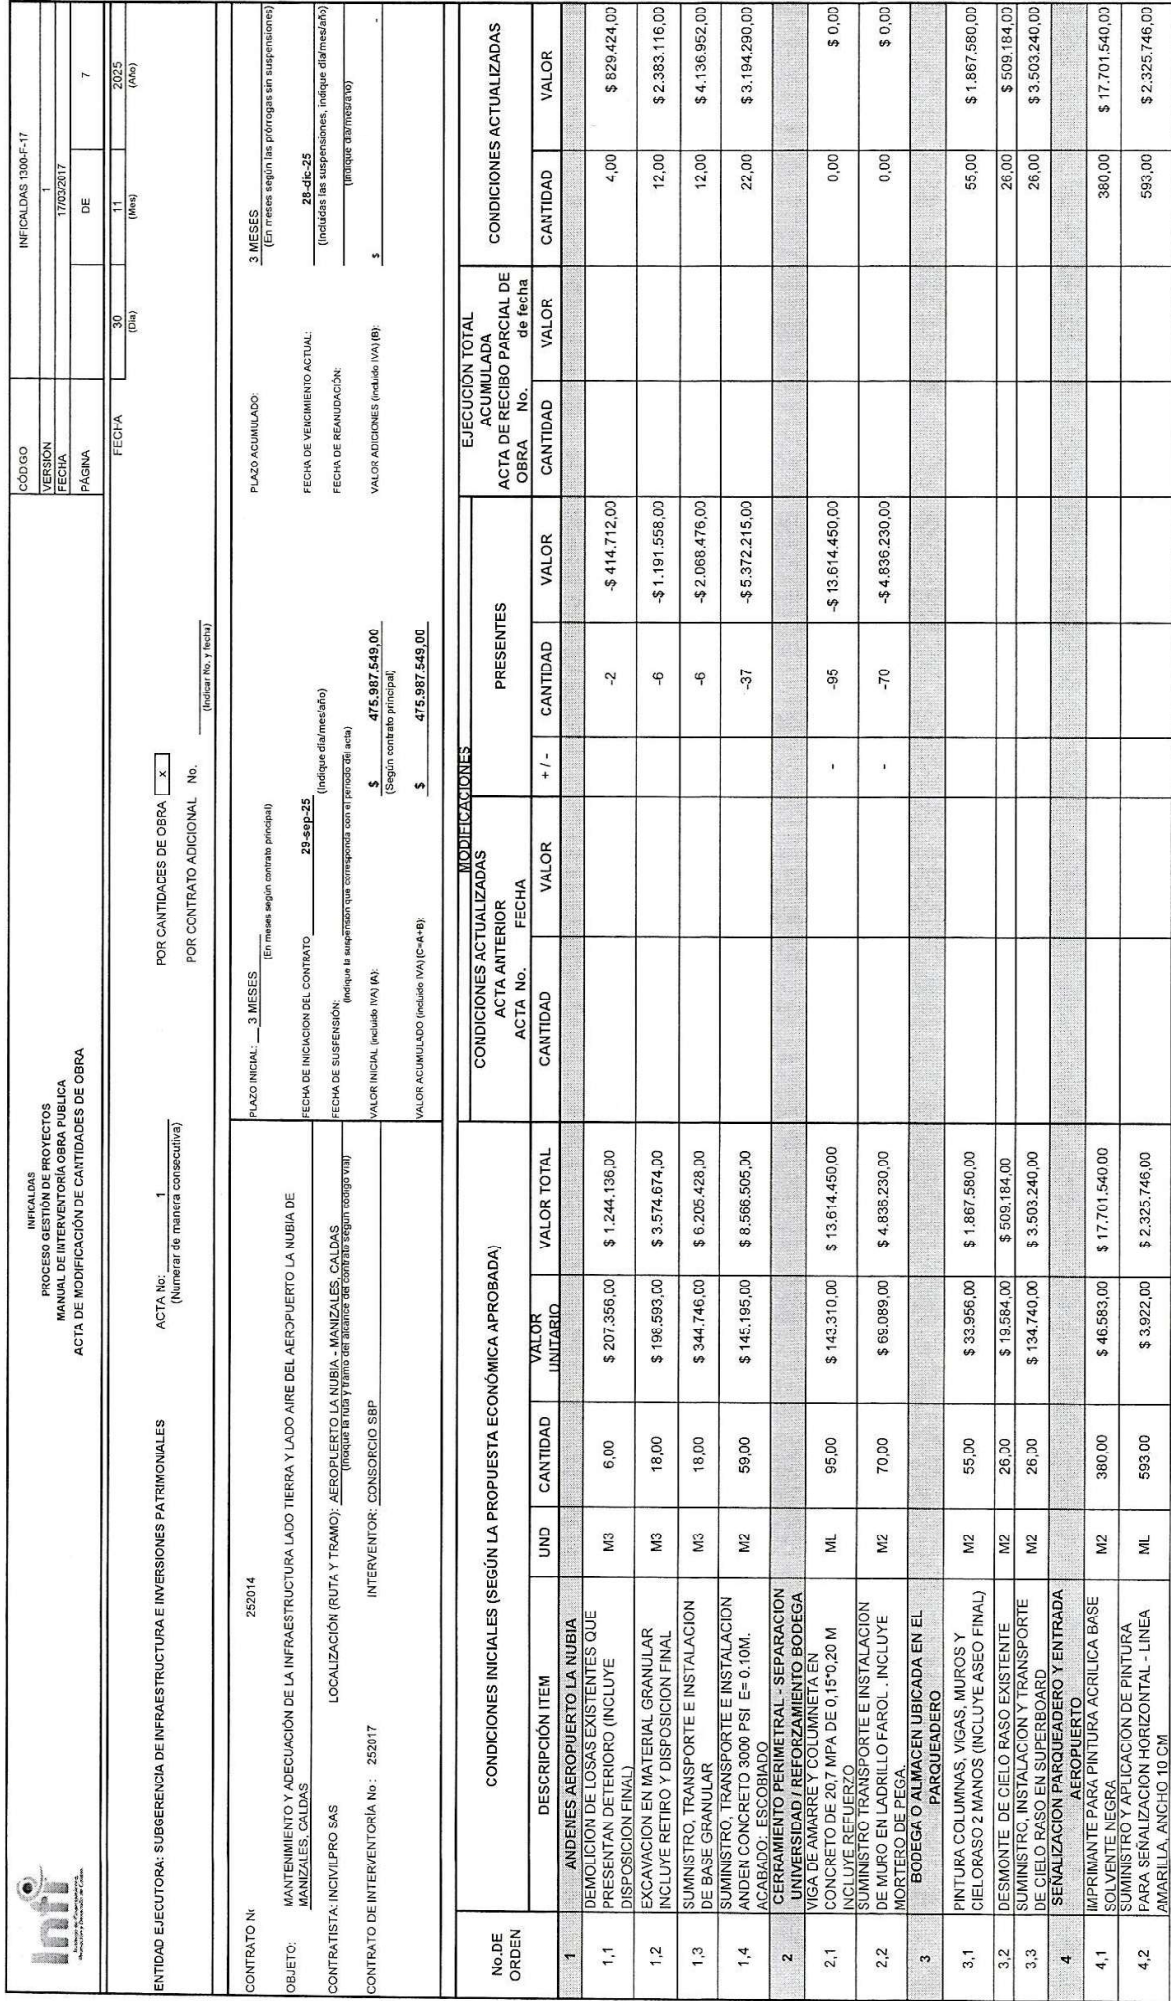

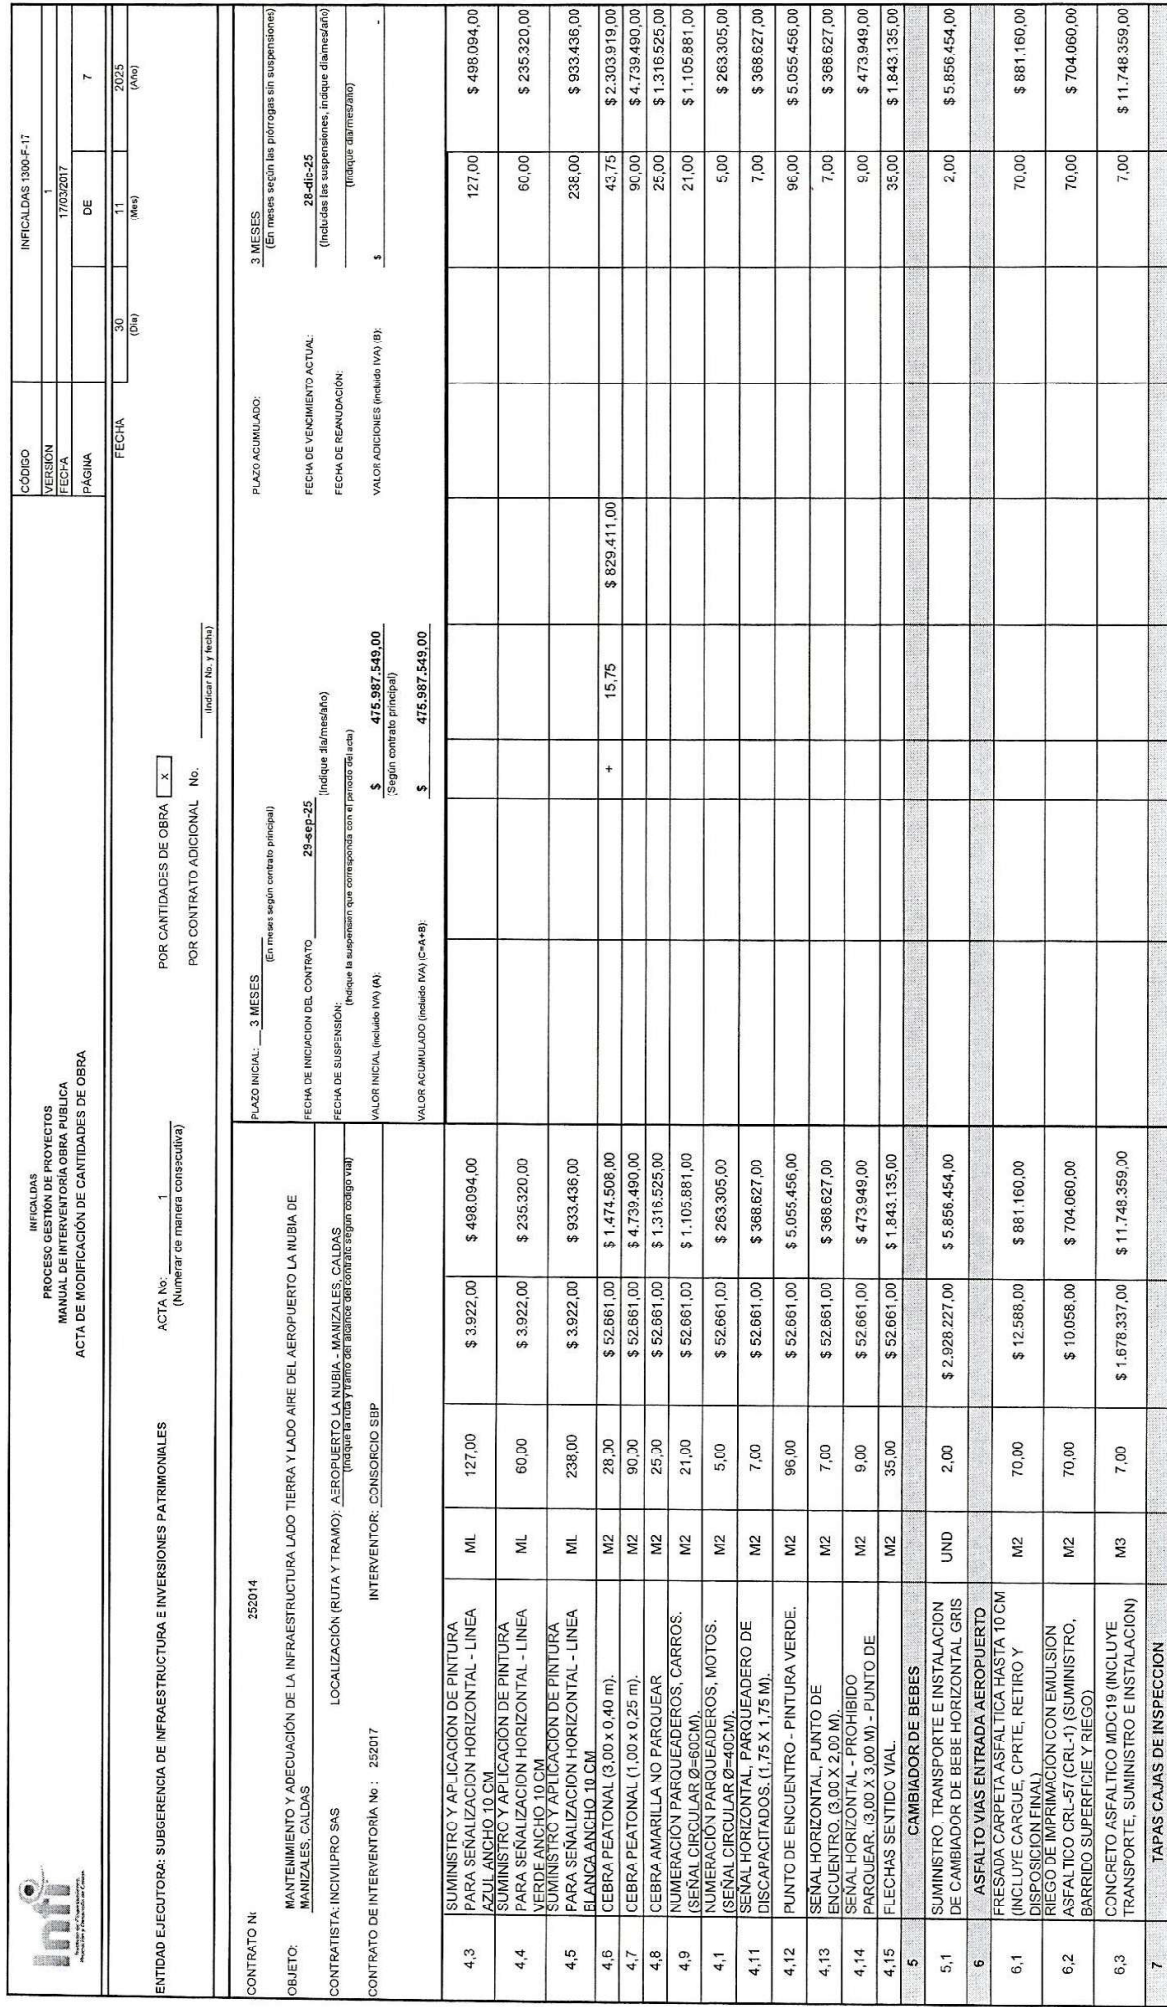

<div><div><div>INFCALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA</div></div><div><div>CÓDIGO VERSION FECHA PÁGINA</div><div>INFCALDAS 13004-17 1 17/03/2017 7</div></div></div>										<div><div>ENTIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES</div><div>ACTA No. 1 (Numerar de manera consecutiva)</div><div>POR CANTIDADES DE OBRA ☒ X</div><div>POR CONTRATO ADICIONAL No. <div></div></div></div>										<div>FECHA</div> <div><div>30 (Día)</div><div>11 (Mes)</div><div>2025 (Año)</div></div>									
<div>CONTRATO No. 252014</div> <div>OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS</div> <div>CONTRATISTA: INCIVUPRO SAS</div> <div>LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): AEROPUERTO LA NUBIA - MANIZALES, CALDAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código VOT)</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 252017</div> <div>INTERVENTOR: CONSORCIO SBP</div>										<div>PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)</div> <div>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 29-sep-25 (Indique día/mes/año)</div> <div>FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 475.987.549,00 (Según contrato principal)</div> <div>VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (A+B): \$ 475.987.549,00</div>										<div>PLAZO ACUMULADO</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28-dic-25 (Inclúyala las suspensiones, indique día/mes/año)</div> <div>FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)</div> <div>VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 1</div>									
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA PICAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (1.2X1.2X0.1 M) CONCRETO CLASE II	UND	15,00	\$ 537.815,00	\$ 8.067.225,00	-	-15		-\$ 8.067.225,00		0,00	\$ 0,00																	
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA PICAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (1.7X0,8X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1,00	\$ 508.256,00	\$ 508.256,00	-	-1		-\$ 508.256,00		0,00	\$ 0,00																	
8	TANQUE DE ACPM																												
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ACPM 80 GALONES VERTICAL CON DIQUE ANTIDERRAME	UND	2,00	\$ 2.719.420,00	\$ 5.438.840,00						2,00	\$ 5.438.840,00																	
9	CENTRO DE ACOPIO RECICLAJE																												
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILAS Y DILATACIONES).	M2	14,00	\$ 18.200,00	\$ 254.800,00	-	-14		-\$ 254.800,00		0,00	\$ 0,00																	
10	OFICINA PARQUEADERO																												
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARA CASETA DE PARQUEADERO DE 2,25 * 0,77 * 0,49 ACUERDO A DISEÑO EN MATERIAL MDP CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO Y PROTECCION ANTIBACTERIAL DE 15 MM DE ESPESOR CON CERRADURAS, BISAGRAS Y ZOCALOS EN PVC	UND	1,00	\$ 4.906.432,00	\$ 4.906.432,00						1,00	\$ 4.906.432,00																	
10,2	DESMONTE DE MUEBLE Y REPISAS EXISTENTES.	UND	1,00	\$ 268.127,00	\$ 268.127,00						1,00	\$ 268.127,00																	
11	CERRAMIENTO PERIMETRAL - LADO AIRE																												
11,1	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	1200,00	\$ 20.544,00	\$ 24.652.800,00	-	-958		-\$ 19.681.152,00		242,00	\$ 4.971.648,00																	
11,2	CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO 0,10*1,1 MALLA ESBONADA GAL 10 2*2" INCLUYE CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE, EXCAVACION Y MACHONES EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI)	ML	400,00	\$ 335.594,00	\$ 134.237.600,00	-	-15		-\$ 5.033.910,00		385,00	\$ 129.203.690,00																	
11,3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 20,7 MPA DE 0,15*0,20 M INCLUYE REFUERZO	ML	400,00	\$ 143.310,00	\$ 57.324.000,00	-	-15		-\$ 2.149.650,00		385,00	\$ 55.174.350,00																	
11,4	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	31,29	\$ 198.593,00	\$ 6.214.595,00	+	30		\$ 5.957.790,00		61,29	\$ 12.172.385,00																	

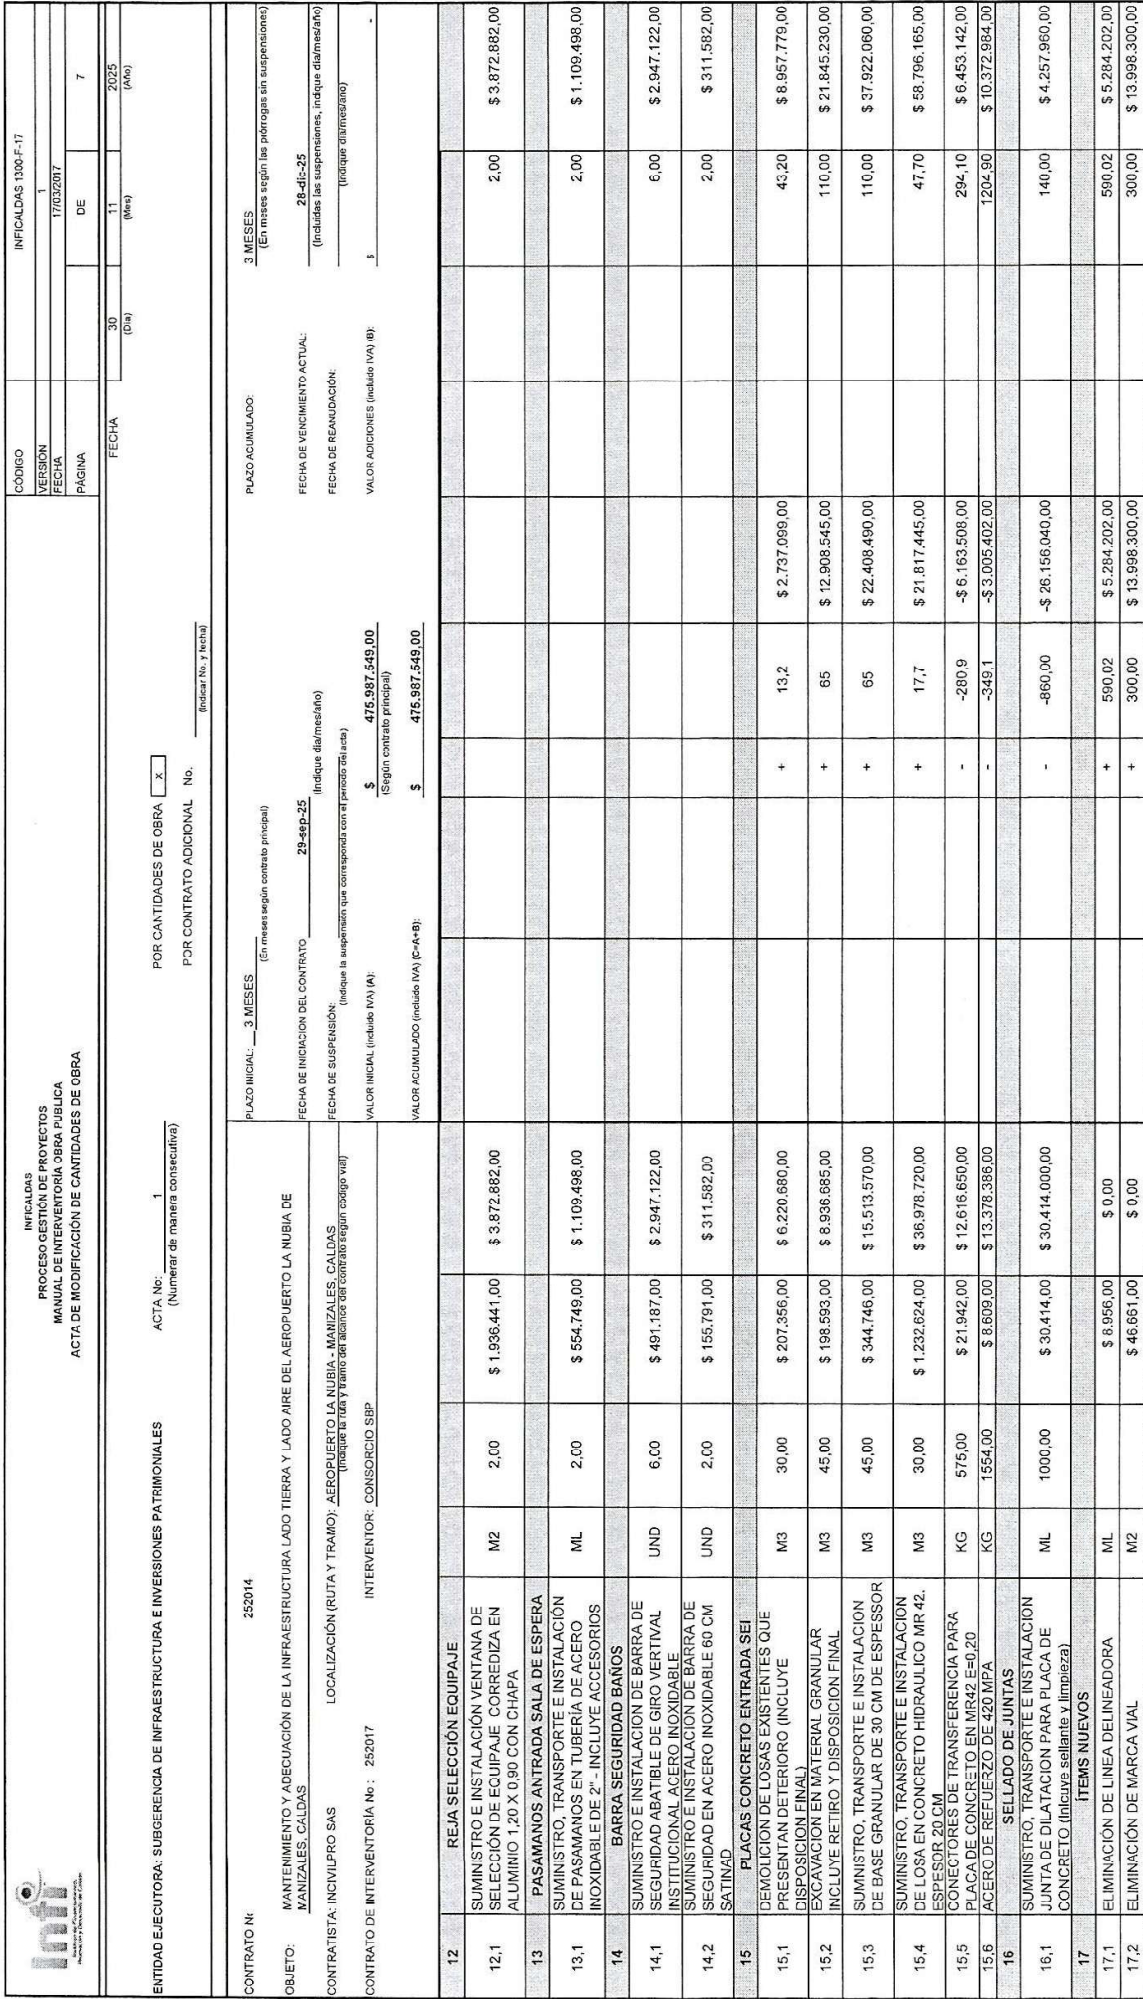


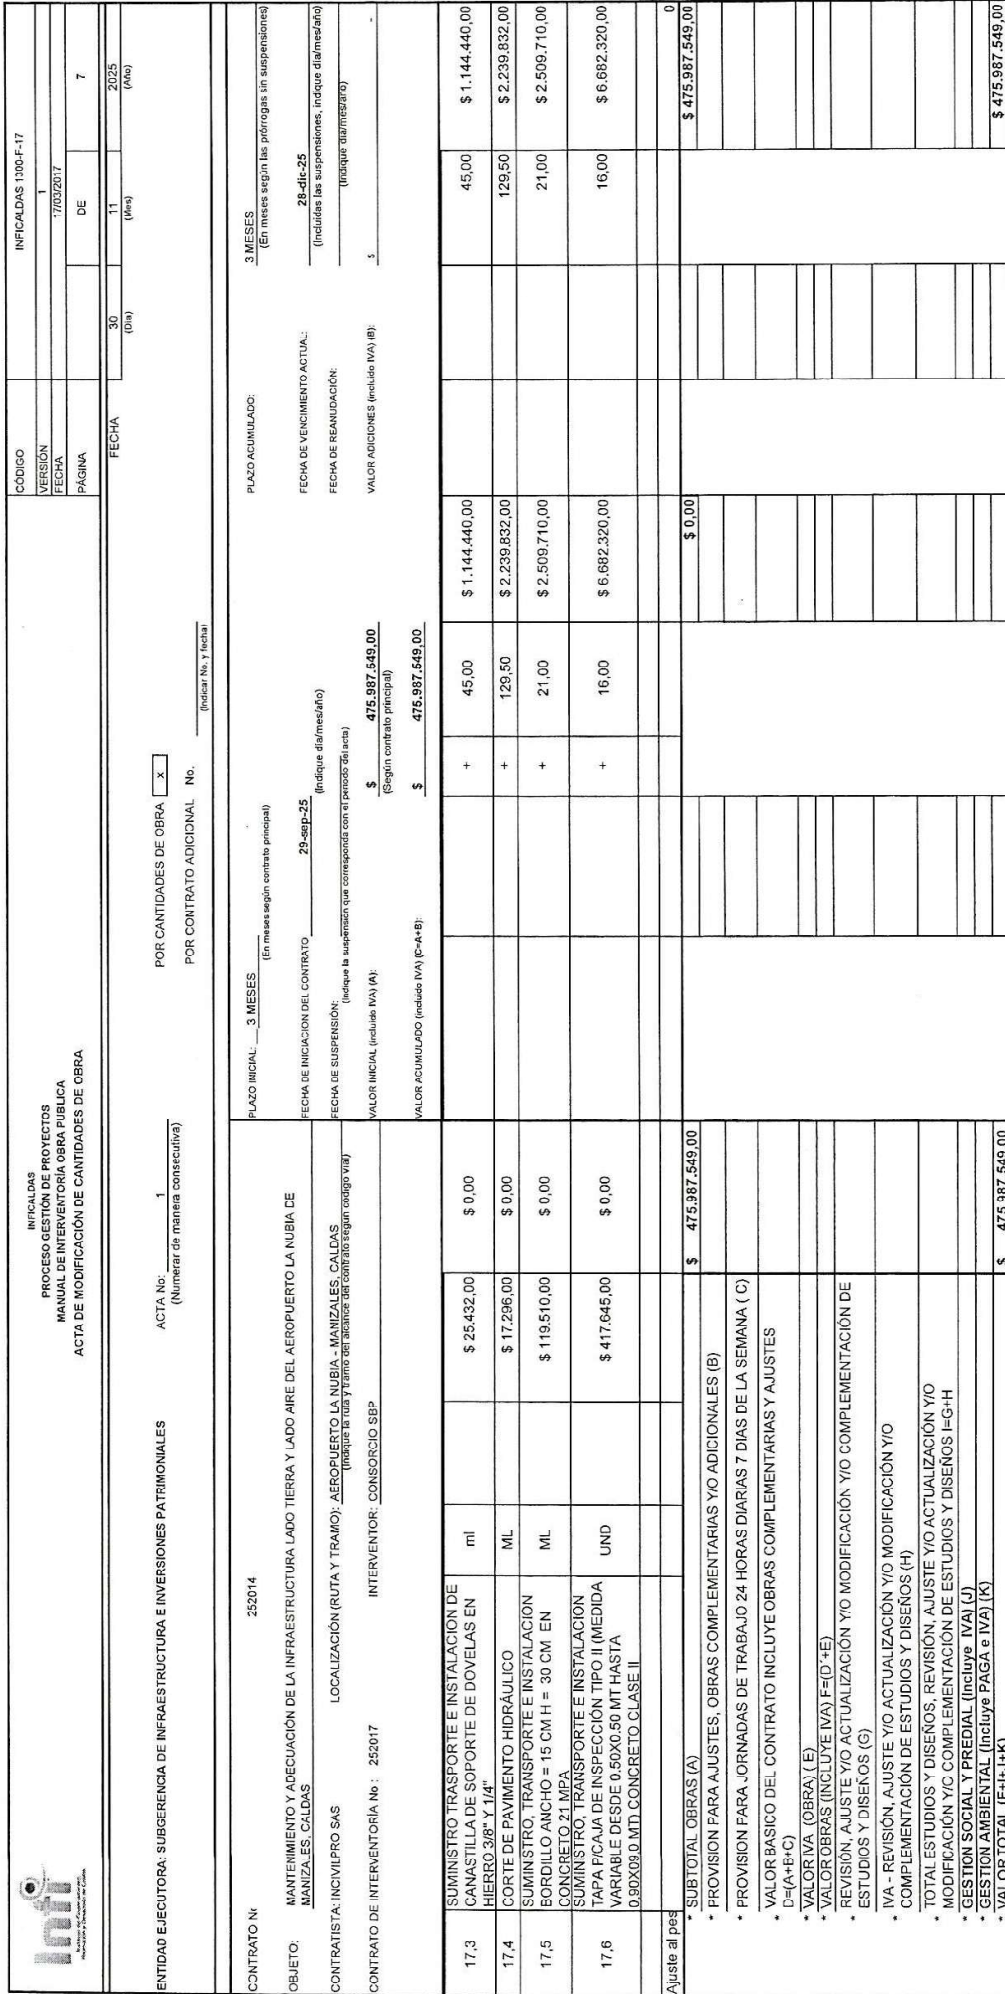

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): La presente acta de modificación se realiza, de acuerdo a la redistribución de cantidades necesarias a ejecutar de modo que se garantice el cumplimiento de las metas físicas del proyecto, incluyendo los ítems nuevos justificados más adelante.

4

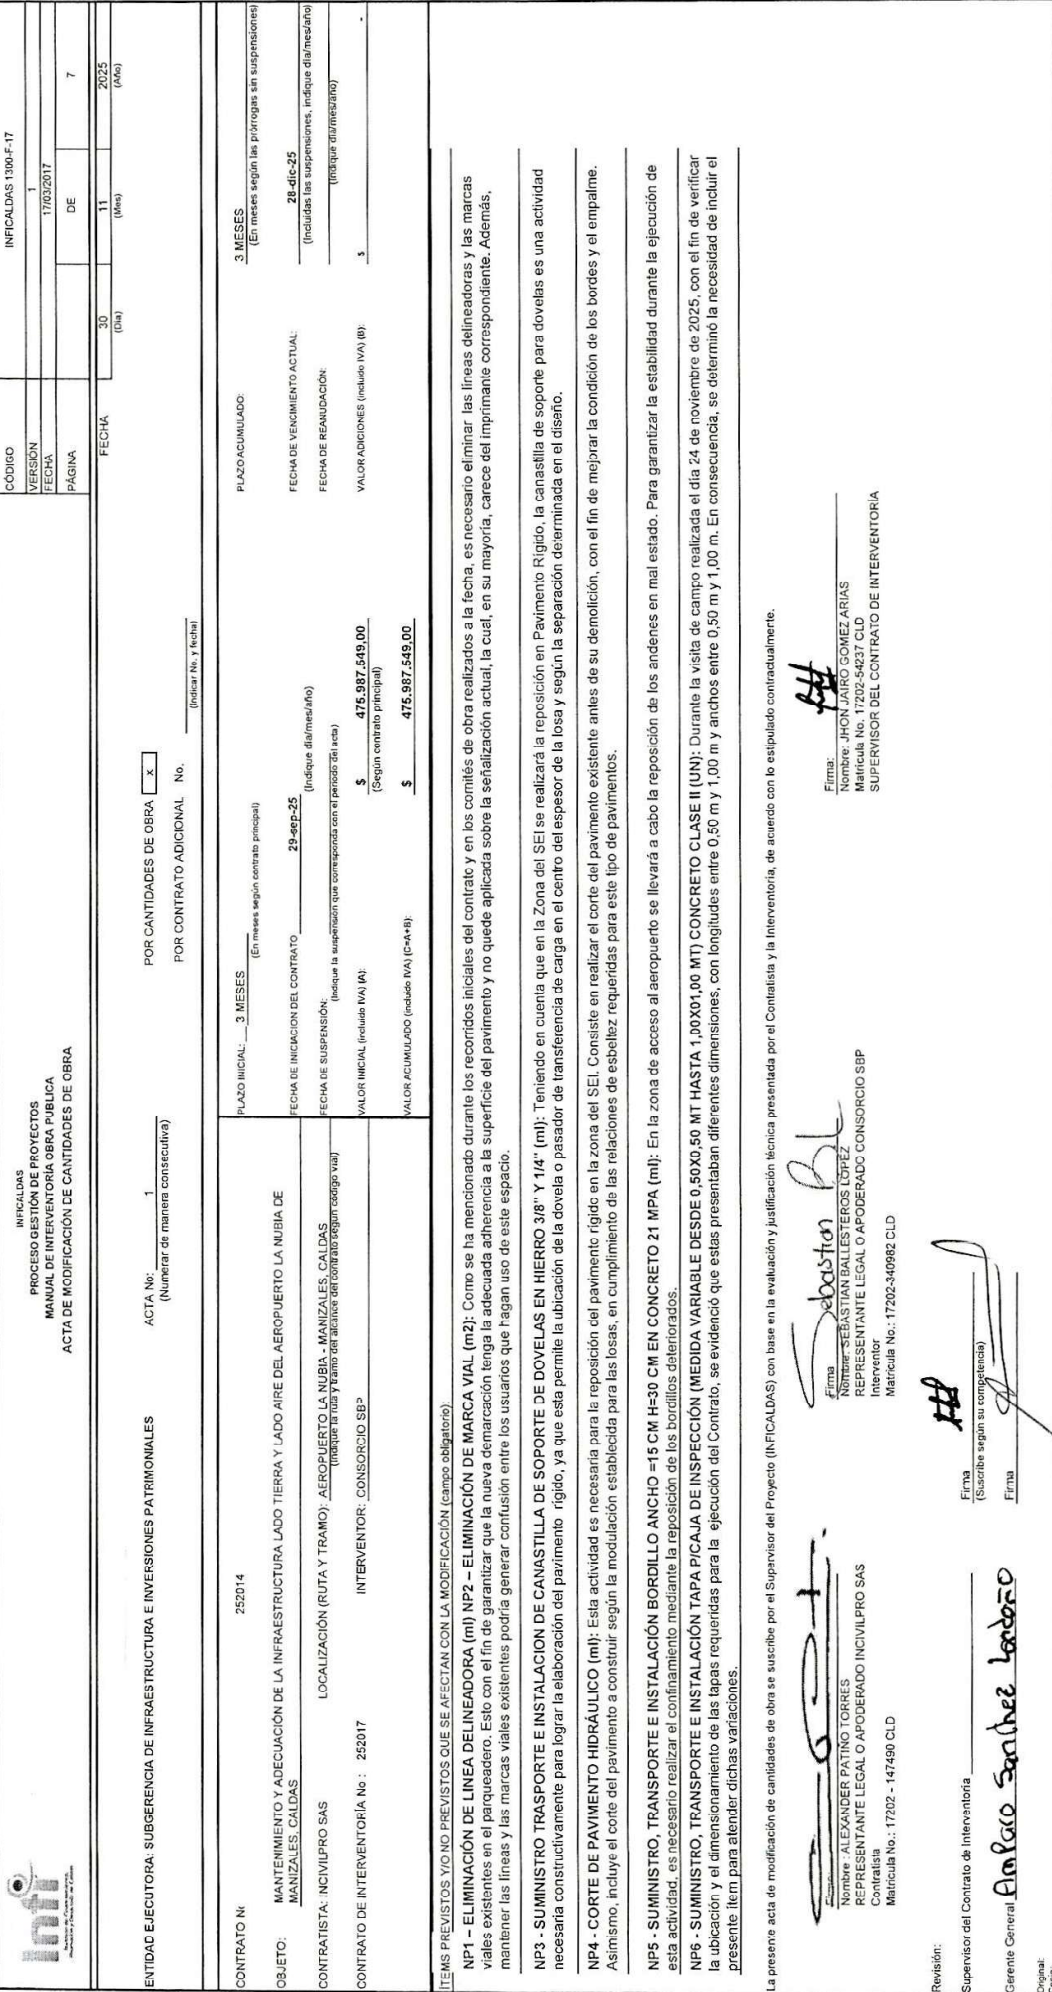

Manizales, 29 de Noviembre de 2025

Señor

ING. JHON JAIRO GÓMEZ ARIAS

**SUBGERENTE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, INVERSIONES PATRIMONIALES E
INFRAESTRUCTURA
INFICALDAS**

SBP-INFI-036

Referencia: Contrato de Interventoría No. 252017 cuyo Objeto es "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al mantenimientos y adecuación de la infraestructura lado tierra y lado aire del Aeropuerto La Nubia de Manizales, Caldas"

Asunto: Remisión Acta de Fijación de Ítems No Previstos y Justificación.

Por medio del presente y según el Comité de Obra No. 8 del día 26 de Noviembre de 2025 en el que se solicito adicionar al acta de Fijación de Precios las Actividades adicionales requeridas durante la visita de campo realizada el 24 de Noviembre de 2025, se remiten los Formatos INFICALDAS 1300-F-22 COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS y INFICALDAS 1300-F-24 ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS para los siguientes ítems requeridos en la Ejecución del Contrato No.252014 cuyo Objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS":

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP1	ELIMINACIÓN DE LINEA DELINEADORA	ml
NP2	ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL	m2
NP3	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml
NP4	CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	ml
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO =15 CM H=30 CM EN CONCRETO 21 MPA	ml
NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN (MEDIDA VARIABLE DESDE 0,50X0,50 MT HASTA 1,00X01,00 MT) CONCRETO CLASE II	Un

A continuación, se realiza el debido análisis y justificación para cada uno de los ítems:

1. NP1 – ELIMINACIÓN DE LINEA DELINEADORA (ml)
2. NP2 – ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL (m2)

Como se ha mencionado durante los recorridos iniciales del contrato y en los comités de obra realizados a la fecha, es necesario eliminar las líneas delineadoras y las marcas viales existentes en el parqueadero. Esto con el fin de garantizar que la nueva demarcación tenga la adecuada adherencia a la superficie del pavimento y no quede aplicada sobre la señalización actual, la cual, en su mayoría, carece del imprimante correspondiente. Además, mantener las líneas y las marcas viales existentes podría generar confusión entre los usuarios que hagan uso de este espacio.

Teniendo en cuenta que la actividad no se encuentra contemplada dentro de las Bases de Datos del Municipio, para el convenio de precio de la Actividad o Ítem se tuvo en cuenta cotizaciones de empresas de la Región y/o que cuentan con experiencia en la ejecución de dicha actividad:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO - COTIZACIÓN			PROMEDIO	PROMEDIO + AU CONTRATO
		GRUPODEVAL	INGEVIAL	CONSTRUCTORA GAF		
BORRADO DE LINEA	ML	\$ 7.512,00	\$ 6.537,00	\$ 6.200,00	\$ 6.750,00	\$ 9.248,00
BORRADO DEMARCACIÓN	M2	\$ 86.678,00	\$ 34.059,00	\$ 35.000,00	\$ 51.912,00	\$ 71.119,00

Comparación de Precios Unitarios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		
			Contratista	Interventoria	Precio Acordado
NP1	ELIMINACIÓN DE LINEA DELINEADORA	ml	\$ 8.956,00	\$ 9.248,00	\$ 8.956,00
NP2	ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL	m2	\$ 46.661,00	\$ 71.119,00	\$ 46.661,00

La presente interventoría del proyecto aprueba el valor de los ítems NP1 y NP2 presentado por el contratista ya que se encuentran dentro del promedio de los precios del mercado.

3. NP3 - SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" (ml)

Teniendo en cuenta que en la Zona del SEI se realizará la reposición en Pavimento Rígido, la canastilla de soporte para dovelas es una actividad necesaria constructivamente para lograr la elaboración del pavimento rígido, ya que esta permite la ubicación de la dovela o pasador de transferencia de carga en el centro del espesor de la losa y según la separación determinada en el diseño.

Para el convenio de precio de la Actividad o Ítem se tuvo en cuenta la Base de Datos Urna Crystal y Base de datos de Aguas de Manizales para el año 2025 del Municipio de Manizales:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR URNA CRYSTAL MANIZALES	VALOR AGUAS DE MANIZALES	PROMEDIO	PROMEDIO + AU CONTRATO
SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	\$ 16.503,00	\$ 27.890,00	\$ 22.197,00	\$ 30.410,00

Comparación de Precios Unitarios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				Contratista	Interventoría	Precio Acordado
NP3	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	45,00	\$ 25.432,00	\$ 30.409,00	\$ 25.432,00

La presente interventoría del proyecto aprueba el valor del ítem NP3 presentado por el contratista ya que se encuentran dentro del promedio de los precios del mercado.

4. NP4 - CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (ml)

Esta actividad es necesaria para la reposición del pavimento rígido en la zona del SEI. Consiste en realizar el corte del pavimento existente antes de su demolición, con el fin de mejorar la condición de los bordes y el empalme. Asimismo, incluye el corte del pavimento a construir según la modulación establecida para las losas, en cumplimiento de las relaciones de esbeltez requeridas para este tipo de pavimentos.

Para el convenio de precio de la Actividad o Ítem se tuvo en cuenta la Base de Datos Urna Crystal y Base de datos de Aguas de Manizales para el año 2025 del Municipio de Manizales:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR URNA CRYSTAL MANIZALES	VALOR AGUAS DE MANIZALES	PROMEDIO	PROMEDIO + AU CONTRATO
CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	ML	\$ 12.842,00	\$ 19.474,00	\$ 16.158,00	\$ 22.136,00

Comparación de Precios Unitarios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				Contratista	Interventoría	Precio Acordado
NP4	CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	ml	129,50	\$ 17.296,00	\$ 22.136,00	\$ 17.296,00

La presente interventoría del proyecto aprueba el valor del ítem NP4 presentado por el contratista ya que se encuentran dentro del promedio de los precios del mercado.

5. NP5 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO =15 CM H=30 CM EN CONCRETO 21 MPA (ml)

En la zona de acceso al aeropuerto se llevará a cabo la reposición de los andenes en mal estado. Para garantizar la estabilidad durante la ejecución de esta actividad, es necesario realizar el confinamiento mediante la reposición de los bordillos deteriorados.

Para el convenio de precio de la Actividad o Ítem se tuvo en cuenta la Base de Datos Urna Crystal y Base de datos de Aguas de Manizales para el año 2025 del Municipio de Manizales:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR URNA CRYSTAL MANIZALES	VALOR AGUAS DE MANIZALES	PROMEDIO	PROMEDIO + AU CONTRATO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO =15 CM H=30 CM EN CONCRETO 21 MPA	ML	\$ 66.940,00	\$ 107.525,00	\$ 87.233,00	\$ 119.509,00

Comparación de Precios Unitarios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				Contratista	Interventoría	Precio Acordado
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO =15 CM H=30 CM EN CONCRETO 21 MPA	ml	20,00	\$ 171.138,00	\$ 119.509,00	\$ 119.509,00

La presente interventoría del proyecto realizó la respectiva verificación del Análisis de Precios Unitarios Presentados por el Contratista y se solicitó el Ajuste al Valor del Promedio obtenido para dicha actividad según los precios de la Región. El Contratista realizó el respectivo ajuste por lo que se aprueba el valor del ítem NP5.

6. NP6 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN (MEDIDA VARIABLE DESDE 0,50X0,50 MT HASTA 1,00X01,00 MT) CONCRETO CLASE II (UN)

Durante la visita de campo realizada el día 24 de noviembre de 2025, con el fin de verificar la ubicación y el dimensionamiento de las tapas requeridas para la ejecución del Contrato, se evidenció que estas presentaban diferentes dimensiones, con longitudes entre 0,50 m y 1,00 m y anchos entre 0,50 m y 1,00 m. En consecuencia, se determinó la necesidad de incluir el presente ítem para atender dichas variaciones.

Al no existir un Análisis de Precios Unitarios de Referencia dentro de las Bases de Datos de la Región, se realizó un Análisis y Ajuste de cantidades partiendo de los Análisis de precios Unitarios de los Ítem Contractuales:

7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (1,2X1,2X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	\$ 537.815,00
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (1,7X0,8X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	\$ 508.256,00

Comparación de Precios Unitarios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				Contratista	Interventoría	Precio Acordado
NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN (MEDIDA VARIABLE DESDE 0,50X0,50 MT HASTA 1,00X01,00 MT) CONCRETO CLASE II	Un	16,00	\$ 496.495,00	\$ 373.600,00	\$ 417.615,00

Después de realizado dicho ajuste en dimensiones y su revisión, se obtuvo una conciliación por parte del Contratista e Interventoría, por lo cual se aprueba el Valor del Ítem NP6.

En conclusión, la presente interventoría aprueba el valor de los siguientes ítems no previstos, sin embargo, se remite a la entidad para la respectiva revisión y/o aprobación


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
NP1	ELIMINACIÓN DE LINEA DELINEADORA	ml	\$ 8.956,00
NP2	ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL	m2	\$ 46.661,00

NP3	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	\$ 25.432,00
NP4	CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	ml	\$ 17.296,00
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO =15 CM H=30 CM EN CONCRETO 21 MPA	ml	\$ 119.509,00
NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN (MEDIDA VARIABLE DESDE 0,50X0,50 MT HASTA 1,00X01,00 MT) CONCRETO CLASE II	Un	\$ 417.615,00

Anexo Archivos:

- Cotización GRUPODEVAL
- Cotización INGEVIAL
- Cotización CONSTRUCTORA GAF S.A.S
- Formatos INFICALDAS 1300-F-22 COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS
- INFICALDAS 1300-F-24 ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS
- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS ITEMS NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 Y NP6.

Cordialmente,


SEBASTIAN BALLESTEROS LÓPEZ
C.C. 1.053.831.041 DE MANIZALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SBP



GRUPO DELVA S.A.S

NIT. 900.957.088-1

Ibagué, noviembre 4 de 2025

**SEÑORES
CONSORCIO SBP
CIUDAD**

Ref. Borrado De Pintura Trafico

En atención a su solicitud, para GRUPO DELVA S.A.S, es muy grato presentar la propuesta de los siguientes productos:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BORRADO DE PINTURA TRAFICO E IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES	m²	235	\$ 75.000	\$ 17.625.000
2	BORRADO DE PINTURA TRAFICO E IMPRIMANTE	ml	620	\$ 6.500	\$ 4.030.000
VALOR EN LETRAS	SON: VEINTICINCO MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 21.655.000
			A = 7%		\$ 1.515.850
			I = 5%		\$ 1.082.750
			U =3%		\$ 649.650
			SUB TOTAL		\$ 24.903.250
			VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE LA UTILIDAD DE 3%)		\$ 123.434
			COSTO TOTAL		\$ 25.026.684

NOTA: Nuestros productos y servicios se encuentran apoyados bajo las normas INVIAS y normas NTC; asegurando calidad y garantía.

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago: anticipo del 50% y saldo restante contra entrega.

Plazo de entrega: A convenir.

Validez de la oferta: ocho (8) días.

Atentamente,

EDUARDO DELGADO GUZMAN
GRUPO DELVA S.A.S
CEL. 3153631929-3125468331

📍 Av. 1 N26_78 B/ San Pedro Alejandrino (Ibagué-Tolima Colombia)
☎ 315 363 1929- 312 546 8331
✉ grupodelvasas@gmail.com

www.grupodelva.com



NIT 900.985.618 – 2
 Bogotá - Calle 36 Sur No 70 B – 57
 Eje Cafetero y Tolima Cra. 1 No 15 - 102
 Villaplaza – entrada a Villamaría - Caldas
 PBX: (8) 8774100 CEL 316 472 60 28
 gerenciaingeval@gmail.com
 www.ingeval.com

Manizales, 13 de noviembre de 2025

Señores:
INFICALDAS
 L.C

Cordial saludo,

Con base en su solicitud, ponemos a su consideración la siguiente cotización para la obra de borrado mecanizado por escarificación de la demarcación existente en el aeropuerto la Nubia de Manizales.

No.	DESCRIPCIÓN	UIND	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1	OBRA DE BORRADO MECANIZADO DE PINTURA VIAL DE LINEAS NO SUPERIORES A 15 cm DE ANCHO.	m	1	\$ 5.756	\$ 6.537
2	OBRA DE BORRADO MECANIZADO DE PINTURA VIAL. PICTOGRAMAS, PASOS PEATONALES, FECHAS, ETC.	m2	1	\$ 29.989	\$ 34.059
COSTO TOTAL					\$ 40.596
ADMINISTRACIÓN 10%					
UTILIDAD 3%					
I.V.A SOBRE UTILIDAD 19%					

CONDICIONES COMERCIALES:

Las cantidades contratadas pueden disminuir o aumentar, en todo caso se facturará con base en las cantidades realmente ejecutadas.

Tiempo de entrega: A convenir.

Anticipo a convenir consignación cuenta ahorros BANCOLOMBIA N° 85966262546 a nombre de INGEVIAL PyM S.A.S NIT 900.985.618 – 2 saldo corte obra.

ALGUNOS DE NUESTRO CLIENTES





NIT 900.985.618 – 2
Bogotá - Calle 36 Sur No 70 B – 57
Eje Cafetero y Tolima Cra. 1 No 15 - 102
Villaplaza – entrada a Villamaría - Caldas
PBX: (8) 8774100 CEL 316 472 60 28
gerenciaingeval@gmail.com
www.ingeval.com

OBSERVACIONES:

CONTAMOS CON EQUIPOS PROPIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL PROYECTO

Cualquier inquietud con gusto les será atendida.

Cordialmente;

Ing Civil. ALEXANDER GARCIA OROZCO
INGEVIAL PyM S.A.S

ALGUNOS DE NUESTRO CLIENTES



Secretaría de Movilidad





Constructora GAF

Manizales, 05 de noviembre de 2025

Señores: CONSORCIO SBP

Interventoría – Mantenimiento Aeropuerto la Nubia

Asunto: Cotización para el Borrado de las líneas y Demarcaciones Viales del Parqueadero ubicado en el Aeropuerto la Nubia de la Ciudad de Manizales.

Cordial Saludo;

De acuerdo con su solicitud presentamos la cotización para el desarrollo del Borrado de las líneas y Demarcaciones Viales del Parqueadero ubicado en el Aeropuerto la Nubia de la Ciudad de Manizales


CONSTRUCTORA GAF S.A.S cuenta con una sólida trayectoria, sustentada en la ética profesional, la imparcialidad y la amplia experiencia de nuestro equipo de trabajo. Estas cualidades nos posicionan como un aliado estratégico ideal para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente propuesta económica. A lo largo de los años, hemos colaborado exitosamente con entidades públicas y privadas a nivel nacional, lo que respalda nuestra capacidad para afrontar proyectos con eficiencia, compromiso y altos estándares de calidad.

A continuación, se presenta el presupuesto estimado según el plano y la información suministrada:

PROPUESTA ECONOMICA PARA: "BORRADO DE LAS LÍNEAS Y DEMARCACIONES VIALES DEL PARQUEADERO UBICADO EN EL AEROPUERTO LA NUBIA DE LA CIUDAD DE MANIZALES"					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BORRADO DE LINEAS VIALES	ML	620,00	\$ 5.347,13	\$ 3.315.221,00
2	BORRADO DE DEMARCACIONES VIALES	M2	235,00	\$ 30.185,42	\$ 7.093.574,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA				\$ 10.408.795,00
	ADMINISTRACIÓN			10%	\$ 1.040.880,00

Calle 64 A N° 17-70 Oficina 201 – Barrio la Toscana - Manizales

E-mal: Constructoragafs.a.s@gmail.com



Constructora GAF

UTILIDAD			5%	\$ 520.440,00
IVA/UTILIDAD			19%	\$ 98.883,60
COSTO TOTAL DE LA OBRA				\$ 12.068.998,60

SON: DOCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS Y SESENTA CENTAVOS MCTE

Nota Aclaratoria: Se considera un AU estimado teniendo en cuenta los requerimientos comunes en estos tipos de obras. Sin embargo, este puede variar de acuerdo a las exigencias de la Entidad Contratante en cuanto a Personal Administrativo y su Dedicación, Pago de Impuestos y estampillas.

Tiempo estimado de ejecución: 1 Semana.

Vigencia de la Oferta: 1 Mes.

Forma de Pago: 50% Anticipo y 50% al realizar la Entrega de la Obra.

Atentamente,



LUZ LOPEZ FRANCO

C.C. 24.273.796 DE MANIZALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GAF SAS
NIT.900.519.162-9

Calle 64 A N° 17-70 Oficina 201 – Barrio la Toscana - Manizales

E-mal: Constructoragafs.a.s@gmail.com



INFICALDAS
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-22		
VERSION	1		
FECHA	17/03/2017		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	29	11	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES

CONTRATO No. 252014 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

CARRETERA: N/A SECTOR: N/A

CONTRATISTA: INCIVILPRO S.A.S

INTERVENTOR: CONSORCIO SBP CTO No. 252017 DE 2025

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIACIÓN: 29 Septiembre 2025 VALOR INICIAL: \$ 475.987.549,00
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 Diciembre 2025 VALOR ACUMULADO: \$ 475.987.549,00
(Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				Contratista	Interventoría	Precio Acordado
NP1	ELIMINACIÓN DE LINEA DELINEADORA	ml	1018,00	\$ 8.956,00	\$ 9.248,00	\$ 8.956,00
NP2	ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL	m2	323,00	\$ 46.661,00	\$ 71.119,00	\$ 46.661,00
NP3	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	45,00	\$ 25.432,00	\$ 30.409,00	\$ 25.432,00
NP4	CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	ml	129,50	\$ 17.296,00	\$ 22.136,00	\$ 17.296,00
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO =15 CM H=30 CM EN CONCRETO 21 MPA	ml	20,00	\$ 171.138,00	\$ 119.509,00	\$ 119.509,00
NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN (MEDIDA VARIABLE DESDE 0,50X0,50 MT HASTA 1,00X01,00 MT) CONCRETO CLASE II	Un	16,00	\$ 496.495,00	\$ 373.600,00	\$ 417.615,00

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CESAR SENA OSORIO
Directo de obra
Matrícula No. 17202167977 CLD

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 17202-118843 CLD

	INFICALDAS PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS		CÓDIGO		INFICALDAS 1300-F-24	
			VERSIÓN		1	
			FECHA		17/03/2017	
			PÁGINA		1	DE

	FECHA	29	11	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES ACTA No: 1

CONTRATO No. 252014 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: _____
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

CARRETERA: N/A SECTOR: N/A

CONTRATISTA: INCIVILPRO S.A.S

INTERVENTOR: CONSORCIO SBP CTO No. 252017 DE 2025

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE INICIACIÓN: 29 Septiembre 2025 VALOR INICIAL: \$ 475.987.549,00
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ FECHA DE REANUDACIÓN: _____
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 Diciembre 2025 VALOR ACUMULADO: \$ 475.987.549,00
(Día) (Mes) (Año)

A.I.U : 37% A 32% I % U 5%

Se establecen los precios que se resumen a continuación:



ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP1		ELIMINACIÓN DE LINEA DELINEADORA	ml	1018,00	\$ 8.956,00	\$ 9.117.208,00
NP2		ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL	m2	323,00	\$ 46.661,00	\$ 15.071.503,00
NP3		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	45,00	\$ 25.432,00	\$ 1.144.440,00
NP4		CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	ml	129,50	\$ 17.296,00	\$ 2.239.832,00
NP5		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO =15 CM H=30 CM EN CONCRETO 21 MPA	ml	20,00	\$ 119.509,00	\$ 2.390.180,00
NP6		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN (MEDIDA VARIABLE DESDE 0,50X0,50 MT HASTA 1,00X0,50 MT) CONCRETO CLASE II	Un	16	\$ 417.615,00	\$ 6.681.840,00

NOTAS :

- Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los ítem no previstos están referidos al origen del contrato (lo) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
- Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
- Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo INFICALDAS 1410-PR-10 del presente formato .
- Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
- Es responsabilidad de la Interventoría el análisis del precio unitario y la justificación técnica, económica y jurídica presentada al Instituto, recomendando su aprobación por parte de la Entidad.
- La presente Acta se suscribe por el Director Territorial y el Jefe de la Unidad Ejecutora, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES: _____

<p></p> <p>Firma Nombre: INCIVILPRO S.A.S Representante Legal: ALEXANDER PATIÑO TORRES Contratista Matrícula No.: 17202-147490 CLD</p>	<p></p> <p>Firma Nombre: CONSORCIO SBP Representante Legal: SEBASTIAN BALLESTEROS LÓPEZ Interventoría Matrícula No.: 17202-340982 CLD</p>
---	---

<p></p> <p>Firma Nombre: JHON JAIRÓ GÓMEZ ARIAS Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.: 17202-54237 CLD (Suscribe según su competencia)</p>	<p></p> <p>Firma Nombre: GABRIEL FERNANDO CARDENAS Apoyo Supervisor Técnico Matrícula No.: 17202-29067 CLD (Suscribe según su competencia funcional)</p>
--	--

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS INFI LP 002-2025 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-21	
					VERSIÓN	1	
					FECHA		
					PAGINA		

		FECHA	29 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)
--	--	-------	-------------	-------------	---------------

ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:	I	ÍTEM NO PREVISTO:	☒	ÍTEM APU PARTICULAR:	☐
---------------------------------	---	-------------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	INFICALDAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	
-------------------	------------	------------------------	--

CONTRATO No.	252014	FECHA:	13/08/2025
--------------	--------	--------	------------

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

CARRETERA:	AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS	SECTOR:	
------------	--	---------	--

CONTRATISTA:	INCIVILPRO SAS
--------------	----------------

INTERVENTOR:	CONSORCIO SBP	CONTRATO No.	252017	FECHA:	2025
--------------	---------------	--------------	--------	--------	------

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO:	5 (Día)	8 (Mes)	2025 (Año)
--	------------	------------	---------------

DATOS ESPECÍFICOS				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP1	ELIMINACIÓN DE LINEA DELINEADORA		ml	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
C00105010	Fresadora para eliminación de Pintura Vial		\$ 35.000,00	15,000	\$ 2.333,33
C00105020	Sopladora		\$ 15.000,00	50,000	\$ 300,00
	HERRAMIENTA MENOR				\$ 42,00
SUBTOTAL \$					2.675,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$							-

IV. MANO DE OBRA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
A0030010	Obrero	\$ 54.116,67	185	\$ 100.115,83	70,000	\$ 1.430,23
A0040010	Oficial	\$ 91.998,33	185	\$ 170.196,92	70,000	\$ 2.431,38
SUBTOTAL \$						3.862,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$	6.537,00
-------------------------------	-----------------

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	32%	\$ 2.092,00
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ 327,00
SUBTOTAL \$		2.419,00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$	8.956
--	--------------


 Firma
 Nombre: ALEXANDER PATIÑO TORRES
 Representante Legal del Contratista o su Apoderado
 Matricula No.: 17202-147490 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a Ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de Ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.


 Firma
 Nombre: SEBASTIAN BALLESTEROS LÓPEZ
 Representante Legal INTERVENTORIA CONSORCIO SBP
 Matricula No.: 17202-340989 CLD

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS INFI LP 002-2025 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-21	
			VERSIÓN	1	
			FECHA		
			PÁGINA		

ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: <u>I</u>	ÍTEM NO PREVISTO: ☒	ÍTEM APU PARTICULAR: ☐	FECHA: <u>29</u> <u>11</u> <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
UNIDAD EJECUTORA: <u>INFICALDAS</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____		

CONTRATO No. <u>252014</u>	FECHA: <u>13/09/2025</u>
----------------------------	--------------------------

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

CARRETERA: <u>AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS</u>	SECTOR: _____
--	---------------

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS

INTERVENTOR: <u>CONSORCIO SBP</u>	CONTRATO No. <u>252017</u>	FECHA: <u>2025</u>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: 5 8 2025
(Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP2	ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL		m2	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
C00105010	Fresadora para eliminación de Pintura Vial		\$ 35.000,00	2,000	\$ 17.500,00
C00105020	Sopladora		\$ 15.000,00	10,000	\$ 1.500,00
	HERRAMIENTA MENOR				\$ 42,00
SUBTOTAL \$					\$ 19.042,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					\$ -

III. TRANSPORTES


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$							\$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
A0030010	Obrero	\$ 54.116,67	185	\$ 100.115,83	18,000	\$ 5.561,99
A0040010	Oficial	\$ 91.998,33	185	\$ 170.196,92	18,000	\$ 9.455,38
SUBTOTAL \$						\$ 15.017,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 34.059,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	32%	\$ 10.899,00
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ 1.703,00
SUBTOTAL \$		\$ 12.602,00
Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$		\$ 46.661


 Firma
 Nombre: ALEXANDER PATIÑO TORRES
 Representante Legal del Contratista o su Apoderado
 Matricula No.: 17202-147490 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.


 Firma
 Nombre: SEBASTIAN BALLESTEROS LÓPEZ
 Representante Legal INTERVENTORIA CONSORCIO SBP
 Matricula No.: 17202-340982 CLD

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS INFI LP 002-2025 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-21	
			VERSION	1	
			FECHA		
			PAGINA		

		FECHA	29	11	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)	

ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: ☐ ÍTEM NO PREVISTO: ☐ ÍTEM APU PARTICULAR: ☐

UNIDAD EJECUTORA: INFICALDAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____

CONTRATO No. 252014 FECHA: 13/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

CARRETERA: AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS SECTOR: _____

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS

INTERVENTOR: CONSORCIO SBP CONTRATO No. 252017 FECHA: 2025

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: 5 8 2025
(Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP3	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"		ml	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR				\$ 1.200,00
SUBTOTAL \$					\$ 1.200,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
B0020003	Acero de refuerzo PDR-60, Fy. 4200 kg/cm2	kg	1,300	\$ 4.750,00	\$ 6.175,00
R0073230	Alambra negro para amarre calibre 18	kg	0,038	\$ 9.900,00	\$ 376,20
SUBTOTAL \$					\$ 6.551,00

III. TRANSPORTES


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							\$ -
SUBTOTAL \$							\$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
A0030010	Obrero	\$ 54.116,67	185	\$ 100.115,83	25,000	\$ 4.004,63
A0040010	Oficial	\$ 91.998,33	185	\$ 170.196,92	25,000	\$ 6.807,88
SUBTOTAL \$					\$ 10.813,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 18.584,00	

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	32%	\$ 5.940,00
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ 928,00
SUBTOTAL \$		\$ 6.868,00
Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$		\$ 25.432

Firma: 

Nombre: ALEXANDER PATIÑO TORRES
 Representante Legal del Contratista o su Apoderado
 Matricula No.: 17202-147490 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma: 

Nombre: SEBASTIAN BALLESTEROS LÓPEZ
 Representante Legal INTERVENTORIA CONSORCIO SBP
 Matricula No.: 17202-340982 CLD

		INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS INFI LP 002-2025 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CÓDIGO INFICALDAS 1300-F-21			
		VERSIÓN 1		FECHA			
		PÁGINA					
		FECHA 29 11 2025 (Día) (Mes) (Año)					
ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: I		ÍTEM NO PREVISTO: ☒		ÍTEM APU PARTICULAR: ☐			
UNIDAD EJECUTORA: INFICALDAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL:					
CONTRATO No. 252014 FECHA: 13/08/2025							
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS							
CARRETERA: AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS SECTOR:							
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS							
INTERVENITOR: CONSORCIO SBP CONTRATO No. 252017 FECHA: 2025							
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: 5 8 2025 (Día) (Mes) (Año)							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD			
NP4	CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO		ML				
I. EQUIPO							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
C0010290	Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm, capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro		\$ 18.000,00	7,000	\$ 2.571,43		
	HERRAMIENTA MENOR				\$ 42,00		
SUBTOTAL \$					\$ 2.613,00		
II. MATERIALES							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
SUBTOTAL \$					\$ -		
III. TRANSPORTES							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							\$ -
							\$ -
							\$ -
SUBTOTAL \$					\$		\$ -
IV. MANO DE OBRA							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
A0030020	Obrero (2)	\$ 108.233,33	185	\$ 200.231,67	20,000	\$ 10.011,58	
SUBTOTAL \$					\$	10.012,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$	12.625,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
DESCRIPCIÓN			Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION			32%	\$ 4.040,00			
IMPREVISTOS			0%	\$ -			
UTILIDAD			5%	\$ 631,00			
SUBTOTAL \$				\$ 4.671,00			
Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$				\$ 17.296			
Firma:							
Nombre: ALEXANDER PATIÑO TORRES							
Representante Legal del Contratista o su Apoderado							
Matricula No. : 17202-147490 CLD							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA							
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.							
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.							
Firma:							
Nombre: SEBASTIAN BALLESTEROS LOPEZ							
Representante Legal INTERVENTORIA CONSORCIO SBP							
Matricula No. : 17202-340982 CLD							

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS INFI LP 002-2025 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-21	
				VERSIÓN	1	
				FECHA		
				PÁGINA		

			FECHA	29 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)
--	--	--	-------	-------------	-------------	---------------

ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: <u>I</u>	ÍTEM NO PREVISTO: ☒	ÍTEM APU PARTICULAR: ☐
--	---	---

UNIDAD EJECUTORA: <u>INFICALDAS</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____
-------------------------------------	------------------------------

CONTRATO No. <u>252014</u>	FECHA: <u>13/08/2025</u>
----------------------------	--------------------------

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

CARRETERA: <u>AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS</u>	SECTOR: _____
--	---------------

CONTRATISTA: <u>INCIVILPRO SAS</u>	
------------------------------------	--

INTERVENTOR: <u>CONSORCIO SBP</u>	CONTRATO No. <u>252017</u>	FECHA: <u>2025</u>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO:	<u>5</u> <u>8</u> <u>2025</u> (Día) (Mes) (Año)
--	--

DATOS ESPECÍFICOS				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 30 CM EN CONCRETO 21 MPA		ML	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
C0010922	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros		\$ 12.000,00	8,000	\$ 1.500,00
	HERRAMIENTA MENOR				\$ 400,80
SUBTOTAL \$					\$ 1.901,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
B0123850	Concreto resistencia 21 Mpa - Producción	m3	0,047	\$ 598.681,00	\$ 28.287,68
B021000	Formaleta de madera para concreto	m2	0,500	\$ 38.000,00	\$ 19.000,00
SUBTOTAL \$					\$ 47.288,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							\$ -
							\$ -
							\$ -
SUBTOTAL \$							\$ -

IV. MANO DE OBRA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
A0030040	Obrero (4)	\$ 218.486,67	185	\$ 400.483,33	15,000	\$ 26.697,56
A0040010	Oficial	\$ 91.998,33	185	\$ 170.196,92	15,000	\$ 11.349,46
SUBTOTAL \$						\$ 38.044,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$	\$ 87.233,00
-------------------------------	---------------------

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	32%	\$ 27.915,00
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ 4.362,00
SUBTOTAL \$		\$ 32.277,00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$	\$ 119.510
--	-------------------



Firma
Nombre: ALEXANDER PATIÑO TORRES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No.: 17202-147490 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.


Firma
Nombre: SEBASTIAN BALLESTEROS LOPEZ
Representante Legal INTERVENTORIA CONSORCIO SBP
Matricula No.: 17202-340982 CLD

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS INFI LP 002-2025 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-21	
				VERSIÓN	1	
				FECHA		
				PÁGINA		

FECHA		29	11	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: ☐	ITEM NO PREVISTO: ☒	ITEM APU PARTICULAR: ☐
UNIDAD EJECUTORA: <u>INFICALDAS</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____	

CONTRATO No. <u>252014</u>	FECHA: <u>13/08/2025</u>
----------------------------	--------------------------

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

CARRETERA: <u>AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS</u>	SECTOR: _____
--	---------------

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS

INTERVENTOR: CONSORCIO SBP CONTRATO No. 252017 FECHA: 2025

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: 5 8 2025
 (Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN (MEDIDA VARIABLE DESDE 0,50X0,50 MT HASTA 1,00X0,01 MT) CONCRETO CLASE II		UN	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
C0010431	Formaleta metálica para Camara de Inspección Circular		\$ 2.100,00	0,100	\$ 21.000,00
	HERRAMIENTA MENOR				\$ 2.387,67
SUBTOTAL \$					23.388,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
B0123650	Concreto resistencia 21 Mpa - Producción	m3	0,125	\$ 598.681,00	\$ 74.835,13
B0020003	Acero de refuerzo PDR-60, Fy 4200 kg/cm2	kg	19,000	\$ 4.750,00	\$ 90.250,00
B0073230	Alambre negro para amarre calibre 18	kg	0,150	\$ 9.900,00	\$ 1.881,00
SUBTOTAL \$					166.966,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
T0010017	Acarreo Interno	m3-Dem	0,125	12,000	1,500	\$ 1.800,00	\$ 2.700,00
SUBTOTAL \$							2.700,00

IV. MANO DE OBRA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
A0030050	Obrero (5)	\$ 270.563,33	185	\$ 500.579,17	6,000	\$ 83.429,86
A0040010	Oficial	\$ 91.998,33	185	\$ 170.198,92	6,000	\$ 28.366,15
SUBTOTAL \$						111.796,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 304.850,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	32%	\$ 97.552,00
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ 15.243,00
SUBTOTAL \$		112.795,00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$ 417.645

Firma 


Nombre: ALEXANDER PATIÑO TORRES
 Representante Legal del Contratista o su Apoderado
 Matricula No.: 17202-147490 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA: _____

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma 

Nombre: SEBASTIAN BALLESTEROS LÓPEZ
 Representante Legal INTERVENTORIA CONSORCIO SBP
 Matricula No.: 17202-340962 CLD

ACTA N° _____ 1
ACTA FINAL S ☐ NO ☐
(Indicar con

MES nov-25

CONTRATO No : 752014 DEL 2025
(Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LAZO TIERRA Y LAZO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES	3 MESES
(En meses según contrato principal)	(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
PLAZO ACUMULADO:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	29 DE SEP 2025

CONTRATISTA:	INCUMPRO SAS	MANIZALES, CALDAS	CONSORCIO SEP
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º:	200417	INTERVENCIÓN:	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): AEROPUERTO LA NEUBA			
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vigente)			

FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
(Indique la suspensión que corresponda con el período de inicio del acta)		(Indique días/año)	
VALOR ORIGINAL (incluido IVA) (A):	\$ 275.987.549,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 275.987.549,00

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º:	202017	INTERVENIOR:	CONSORCIO SEP
-------------------------------	--------	--------------	---------------

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 475,987,549.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	
(Según contrato principal)			
	\$		475,987,549.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):			

[illegible]

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	INICIALS 1000-F-11	VERSION 1/03/2017 PAGINA 3
		CÓDIGO	
		FECHA	S 12 2025 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA _____	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES _____	ACTA Nº _____ ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)	VALOR BÁSICO ACTA: _____ MES NOV-25
------------------------	--	---	---

CONTRATO No : _____ (Indique número y año) OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS	PLAZO ACUMULADO: (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28 DE SEP 2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) \$ 475.987.549,00 \$ 475.987.549,00
--	--	--

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS	INTERVENIOR: CONSORCIO SBP	CONDICIONES ACTUALIZADAS Último día de fecha 20 de noviembre de 2025
-----------------------------	----------------------------	---

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
17.1				ELIMINACIÓN DE LINEA DELINEADORA	ML		\$ 8.956,00	\$ -	590,02	\$ 5.284.202,00	-	\$ -		
17.2				ELIMINACIÓN DE MARCA VAL	M2		\$ 48.661,00	\$ -	300,00	\$ 13.998.300,00	-	\$ -		
17.3				SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVEAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m		\$ 25.432,00	\$ -	45,00	\$ 1.144.440,00	45,00	\$ 1.144.440,00	45,00	\$ 1.144.440,00
17.4				CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	ML		\$ 17.296,00	\$ -	129,50	\$ 2.239.832,00	-	\$ -		
17.5				SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H= 30 CM EN CONCRETO 21 MPa.	ML		\$ 119.510,00	\$ -	21,00	\$ 2.508.710,00	-	\$ -		
17.6				SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA PICAJA DE INSPECCION TIPO II MEDIDA VARIABLE DESDE 0,30X0,50 MT HASTA 0,90X0,90 MT CONCRETO CLASE II	UND		\$ 417.645,00	\$ -	16,00	\$ 6.682.320,00	-	\$ -		
17.7				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)			\$ 475.987.549,00	\$ -		\$ 475.987.549,00		\$ 290.418.881,00		\$ 290.418.881,00
* Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (B) * Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana (C) * Valor básico del contrato incluye obras complementarias y ajustes D=(A+B+C) * Valor IVA (OBRA) (E) * Valor obras (incluye IVA F)=(D+E) * Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños (G) * IVA - Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños (H) * Total estudios y diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños I=H+G * Gestión ambiental, social y predial (incluye IVA) (J) VALOR TOTAL (F+I+J) \$ 475.987.549,00														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AU	37 %
Unidad	5 %

Valor Anticipo Otorgado	\$ -
Valor Amortizado Presente Acta	\$ -
Valor Amortizado Acumulado	\$ -

Resumen presente mes para pago	
OBRA	\$ 290.418.881,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	\$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 290.418.881,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	\$ -
Valor Amortizado Presente Acta	\$ -
Valor Amortizado Acumulado	\$ -

Registro Presupuesto No.	340	de Fecha	8/09/2025
Dato del Registro:	\$ 475.987.549,00		

INICIALDAS 1300-F-1		CÓDIGO VERIFICAR		17020217		PAGINA DE 3	
PRECISO GESTIÓN DE PROYECTOS MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		PRECISO GESTIÓN DE PROYECTOS MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		PRECISO GESTIÓN DE PROYECTOS MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		PRECISO GESTIÓN DE PROYECTOS MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	
UNIDAD EJECUTORA		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES		ACTA N° 1		VALOR BÁSICO ACTA:	
CONTRATO No : 252014 DEL 2025		OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AERODUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO) AEROPUERTO LA NUBIA MANIZALES, CALDAS		CONTRATISTA: INCVILPRO SAS		INTERVENIOR: 252017	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 252017		CONTRATISTA: INCVILPRO SAS		INTERVENIOR: 252017		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 252017	
GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		PART.		VALOR	
No. DE ORDEN		GRAL.		DESCRIPCIÓN ITEM		VALOR	
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPIUESTA ECONOMICA APROBADA)		CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPIUESTA ECONOMICA APROBADA)		CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPIUESTA ECONOMICA APROBADA)		CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPIUESTA ECONOMICA APROBADA)	
CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Última Acta de Modificación No. 01		Última Acta de Modificación No. 01		Última Acta de Modificación No. 01		Última Acta de Modificación No. 01	
de fecha 30 de nov de 2025		de fecha 30 de nov de 2025		de fecha 30 de nov de 2025		de fecha 30 de nov de 2025	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)	
\$ 475.987.549,00		\$ 475.987.549,00		\$ 475.987.549,00		\$ 475.987.549,00	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C-A-B)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C-A-B)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C-A-B)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C-A-B)	
\$ 475.987.549,00		\$ 475.987.549,00		\$ 475.987.549,00		\$ 475.987.549,00	
OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA	
PRESENTA ACTA		PRESENTA ACTA		PRESENTA ACTA		PRESENTA ACTA	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
VALOR							

		INFI CALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		CÓDIGO INFI CALDAS 1300-F-100
		VERSIÓN 2		
		FECHA 11/08/2022		
		PÁGINA 1		DE 1

PREACTA DE OBRA				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS				
No. PREACTA: 1		PERIODO: al		
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS		CONTRATO No. 252014		
INTERVENTOR: CONSORCIO SBP		CONTRATO No. 252017		

ITEM - ESPECIF.	4.2	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS DE EJECUCIÓN		DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	Long.	Cantidad	Total	Acumul.
				Latitud	Longitud					
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 1 al 5	long	4.70	3.00	14.10	14.10	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 1 al 5	respaldo	12.10	1.00	26.20	26.20	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 6 al 12	long	4.70	4.00	18.80	45.00	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 13 al 21	long	4.70	5.00	23.50	68.50	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 22 al 29	respaldo	23.40	1.00	23.40	91.90	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 30 al 39	long	4.70	2.00	9.40	101.30	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 40 al 46 Y del 64 al 70	respaldo	5.00	1.00	5.00	106.30	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 47 al 51	long	4.70	3.00	14.10	120.40	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 52 al 58	respaldo	7.30	1.00	7.30	127.70	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 59 al 63	long	4.70	6.00	28.20	155.90	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 64 al 70	respaldo	24.30	1.00	24.30	180.20	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 40 al 46 Y del 64 al 70	long	4.70	8.00	37.60	217.80	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 47 al 51	respaldo	21.70	1.00	21.70	239.50	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 52 al 58	long	4.70	3.00	14.10	253.60	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 59 al 63	respaldo	7.30	1.00	7.30	260.90	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 64 al 70	long	4.70	2.00	9.40	270.30	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 40 al 46 Y del 64 al 70	respaldo	7.30	1.00	7.30	277.60	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 47 al 51	long	2.00	8.00	15.00	293.60	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 52 al 58	respaldo	5.10	1.00	5.10	298.70	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 59 al 63	long	9.70	1.00	9.70	308.40	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 64 al 70	respaldo	2.50	1.00	2.50	310.90	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 40 al 46 Y del 64 al 70	long	4.70	3.00	14.10	325.00	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 47 al 51	respaldo	12.10	1.00	12.10	337.10	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 52 al 58	long	6.72	1.00	6.72	343.82	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 59 al 63	triángulos	5.30	1.00	5.30	349.12	
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 64 al 70	arco	6.70	1.00	6.70	355.82	
TOTAL								355.80	355.82	

Lucero Galindo Posada

Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
 Residente de Obra
 Matricula No.: 141037-0011627 RIS
 INCIVILPRO S.A.S

Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
 Residente de Interventoria
 Matricula No.: 17202-130145 CLD
 CONSORCIO SBP

	INICALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA				CÓDIGO	INICALDAS 1300-F-100	
					VERSIÓN	2	
					FECHA	11/08/2022	
					PÁGINA	1	DE 1

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

No. PREACTA:	1	PERIODO:	al
CONTRATISTA:	INCIVILPRO SAS		
INTERVENTOR:	CONSORCIO SBP		


ITEM - ESPECIF.	4.3	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - LINEA AZUL ANCHO 10 CM	UNIDAD:	ML
------------------------	-----	--------------------	--	----------------	----

Fecha	Abcisas de ejecución	Coordenadas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Cantidad	Total	Acumul.
		Latitud	Longitud						
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos motos del 1 al 22	long	2.00	11.00	22.00	22.00
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos motos del 1 al 10	respaldo	10.10	1.00	10.10	32.10
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos motos del 11 al 22	respaldo	12.30	1.00	12.30	44.40
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos motos del 1 al 22	laterales	5.05	1.00	5.05	50.45
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 52 al 55	long	4.70	3.00	14.10	64.55
30-nov	PARQUEADERO	5°01'44.5"N	75°28'10.7"W	Parqueaderos del 52 al 55	respaldo	10.60	1.00	10.60	75.15
TOTAL								75.20	

Lucero Galindo Posada

Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
 Residente de Obra
 Matrícula No.: 141037-0611627 RIS
 INCIVILPRO S.A.S

Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
 Residente de Interventoría
 Matrícula No.: 17202-130145 CLD
 CONSORCIO SBP



No. PREACTA:	1	PERIODO:	al
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS			
CONTRATO No. :252014			
INTERVENIOR: CONSORCIO SBP			
CONTRATO No. :252017			

ITEM.- ESPECIF.	4.7	DESCRIPCIÓN	CEBRA PEATONAL (1,00 x 0,25 m).				UNIDAD:	M2		
Fecha	Abscisas de ejecución	Coordenadas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Cantidad	Total	Acumml.
		Latitud	Longitud							
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	CASETA	1,00	0,25	10,00	2,50	2,50
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ ENTRE (1-5) Y (6 - 12)	1,00	0,25	25,00	6,30	8,80
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	CAFETERIA	1,00	0,25	14,00	3,50	12,30
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ ENTRE CAFETERIA Y (23 -	1,00	0,25	27,00	6,80	19,10
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ 22	1,00	0,25	8,00	2,00	21,10
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ 63	1,00	0,25	9,00	2,30	23,40
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ 25 - 26 - 27	1,00	0,25	13,00	3,30	26,70
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ MOTOS 1	1,00	0,25	5,00	1,30	28,00
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ (40 - 46)	1,00	0,25	27,00	6,80	34,80
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ (47 - 48)	1,00	0,25	15,00	3,80	38,60
30-nov	PARQUEADERO	5°0'144.5"N	75°28'10.7"W	CEBRA PEATONAL	PARQ DISCAPACITADOS	1,00	0,25	6,00	1,50	40,10
									0,00	40,10
									0,00	40,10
							TOTAL		40,10	

Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
Residente de Obra


Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
Residente de Interventoría

Matricula No.: 141037-0611627 RIS

Matricula No.: 17202-130145 CLD

CONSORCIO SBP

CONCIVIL PRO S A S




No. PREACTA:	1	PERIODO:	al
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS			
CONTRATO No. 252014			
INTERVENTOR: CONSORCIO SBP			
CONTRATO No. 252017			

[illegible]

Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
Residente de Interventoría
Matricula No.: 17202-130145 CLD
CONSORCIO SBP

Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
Residente de Obra
Matricula No.: 141037-0611627 RIS
INCIVILPRO S.A.S



PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS


No. PREACTA:	1	PERIODO:	a1
CONTRATISTA: INCIVILFRO SAS			
CONTRATO No. :252014			
INTERVENTOR: CONSORCIO SBP			
CONTRATO No. :252017			

[illegible]

Lucero Galindo Posada.

Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
Residente de Obra
Matricula No.: 141037-0611527 RIS
INCIVILPRO S.A.S


Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
Residente de Interventoria
Matricula No.: 17202-130145 CLD
CONSORCIO SBP



No. PREACTA:	1	PERIODO:	29/09/2025	al	30/11/2025
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS					
CONTRATO No. 252014					
INTERVENIOR: CONSORCIO SBP					
CONTRATO No. 252017					

[illegible]

Nombre: LUCERO GALINCO POSADA	Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
Residente de Obra	Residente de Interventoria
Matricula No.: 141037-061-627 RIS	Matricula No.: 17202-130145 CLD
CIVIL PRO S.A.S	CONSORCIO SBP



CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-100
VERSIÓN	2
FECHA	11/08/2022

PÁGINA	1
--------	---

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

30/11/2025

UNIDA

	TOTAL
Ancho	8.00 7.76 3.00
Prof.	0.41 0.21 0.21

Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
Residente de Interventoria
Matricula No.: 17202-130145 CLD
CONSORCIO SBP

Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
Residente de Obra
Matricula No.: 141037-0611627 RIS
INCIVILPRO S.A.S

		INICALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA				CÓDIGO INICALDAS 1300-F-100
		VERSIÓN 2				
		FECHA 11/08/2022				
		PÁGINA 1				DE 1
PREACTA DE OBRA						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS						
No. PREACTA: 1		PERIODO: 29/09/2025 al 30/11/2025				
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS		CONTRATO No.: 252014				
INTERVENTOR: CONSORCIO SBP		CONTRATO No.: 252017				
ITEM - ESPECIF.	17,3	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"		UNIDAD:	ml
Fecha	30-nov	SEI	Canastillas		Longitud	3,75
					Latitud	5°01'47,4"N
					Longitud	75°28'10,0"W
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	
					Abcisas de ejecución	
					Longitud	
					Latitud	
					Observaciones	
					Descripción	
					Coordenadas de ejecución	



INICALDAS

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

INICALDAS 13004-38

1

17/03/2017

1 DE 1

CÓDIGO

FECHA

12

25

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: nov-25

CONTRATO DE OBRA No. 252014

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 252017

INTERVENTOR: CONSORCIO SBP

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE

SECTOR: AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LUCERO GALINDO POSADA	INGENIERA RESIDENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VICTORIA FERNANDA SUAREZ PAVA	RESIDENTE SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IVAN DARIO CORTES CASTAÑEDA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JULIO CESAR SERNA OSORIO	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LEYDY ESTEFANY CORTES LLANOS	RESIDENTE AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BRYAN CUADRADO ARANGO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JHON EDIER CANDELO	CONDUCTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS HERNAN BARON	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WILLIAM FERNANDO ZAPATA	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELIERMAN GARCIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DAVID GIRALDO	AUXILIAR SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS ALBERTO MEJIA CASTAÑEDA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALEXANDER AGUDELO	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YON EDISON DUQUE DUQUE	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GORGE ARMANDO BOTERO URIBE	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALEXANDER MONCADA	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SANTIAGO MARIN BAYONA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Lucero Galindo Posada

Nombre: LUCERO GALINDO POSADA

Residente de Obra

Matricula No.: 141037-0611627 RIS



Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS

Residente de Interventoria

Matricula No.: 17202-130145 CLD

NOTA:

Es responsabilidad de la Interventoria que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

	INICALDAS PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO INICALDAS 1300-F-38
VERSION 1		FECHA 17/03/2017	PÁGINA 1 DE 1
FECHA 5 11 2025 (Día) (Mes) (Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES			
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS.			
CARRETERA Y/O PROYECTO: AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS			
SECTOR:			
CONTRATO DE OBRA No. 252014			
INTERVENIOR: CONSORCIO SBP			
CONTRATISTA: INCVILPRO SAS			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 252017			
MES DEL INFORME: OCTUBRE DE 2025			
NOMBRE CARGO			
DÍAS DEL MES			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
JULIO CESAR SERNA DIRECTOR DE OBRA			
VICTORIA FERNANDA SUAREZ PAVA RESIDENTE SST			
LUCERO GALINDO POSADA INGENIERA RESIDENTE			
LEIDY ESTEFANY CORTES INGENIERA AMBIENTAL			
JHON JAIR PEREZ GONZALEZ MAESTRO			
WILSON FERNANDEZ HERNANDEZ MAESTRO			
ALEXANDER AGUDELO OFICIAL			
CARLOS ALBERTO MEJIA CASTAÑEDA AYUDANTE DE OBRA			
MANUEL FERNANDO LOPEZ OPERARIO			
IVAN DARIO CORTES CASTAÑEDA AYUDANTE DE OBRA			
JULIAN ANDRES AGUIRRE AYUDANTE DE OBRA			
CESAR AUGUSTO LARGO PAPADA CONDUCTOR			
ALBERTO DE JESUS RENDON OFICIAL			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: EL PERSONAL ADMINISTRATIVO HA CUMPLIDO CON SU DEDICACIÓN CONTRACTUAL DESDE EL MOMENTO DE SU APROBACIÓN, SE PRESENTAN DIFICULTADES DURANTE EL PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL DEBIDO A LOS REQUISITOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES, PROCURADURIA, CONTRALORIA Y DE MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA LA SOLICITUD DE INGRESO A ZONAS RESTRIGIDAS DEL AEROPUERTO			
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.			
Firma: Nombre: LUCERO GALINDO POSADA Residente de Obra Matrícula No.: 141037-0611627 RIS			
Firma: Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS Residente de Interventoría Matrícula No.: 17202-130145 CLD			

	INIPIALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO INIFICALDAS 1300-F-36	VERSIÓN 1 FECHA 17/02/2017 PÁGINA 1 DE 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES		FECHA 5 11 2025 (Día) (Mes) (Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS.		AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS (Abreviada alcance del contrato)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CARRETERA Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 252014		SECTOR: (Abreviada alcance del contrato)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MES DEL INFORME MENSUAL: 1		CONTRATO No. 252014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS		DÍAS DEL MES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MAQUINARIA Y EQUIPO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th> </tr> <tr> <td>ANDAMIO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>CAMIONETA DE ESTACAS 4X4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO DE PINTURA</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPRESOR EQUIPO DE SOLDADURA</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>FRESADORA</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>CARGADOR</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>BARRIDORA</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>MECANICA</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPRESOR</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>TORRE</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>ILUMINACIÓN</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>VOLQUETA DOBLE</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>																												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ANDAMIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CAMIONETA DE ESTACAS 4X4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EQUIPO DE PINTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COMPRESOR EQUIPO DE SOLDADURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FRESADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARGADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BARRIDORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MECANICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TORRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ILUMINACIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VOLQUETA DOBLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ANDAMIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CAMIONETA DE ESTACAS 4X4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EQUIPO DE PINTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COMPRESOR EQUIPO DE SOLDADURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FRESADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CARGADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
BARRIDORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MECANICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TORRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ILUMINACIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VOLQUETA DOBLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENCIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SE PRESENTA LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO POR MEDIO DEL OFICIO IP-AER-252014-001-2025 DOCUMENTOS INICIO, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EL USO DE LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS EQUIPOS SEGÚN LA NECESIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Firma: Lucero Galindo Posada
 Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
 Residente de Obra
 Matricula No.: 141037-0611627 RIS

Firma: [Firma]
 Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
 Residente de Intervención
 Matricula No.: 17202-130145 CLD

	INICIALIAS PROCESO GESTION DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTION OBRA PUBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO INFCALDAS 1300-F-36
	VERSION 1	INICIALIAS 1300-F-36	
	FECHA 17/03/2017	17/03/2017	
	PAGINA 1 DE 1	1 DE 1	

FECHA 5 12 2025 (Dia) (Mes) (Año)	
---	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES	
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS.	CARRETERA Y/O PROYECTO:
AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS (Abreviatura del contrato)	SECTOR:

MES DEL INFORME MENSUAL: 2	CONTRATO No. 252014
----------------------------	---------------------

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS	SECTOR:
-----------------------------	---------

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ANDAMIO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CERTIFICADO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA DE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CONCRETO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CAMIONETA DE	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ESTACAS 4X4	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PINTURA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COMPRESOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EQUIPO DE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SOLDADURA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRESADORA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARGADOR	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BARREDORA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MECANICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COMPRESOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TORRE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ILUMINACIÓN	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: SE PRESENTA LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO POR MEDIO DEL OFICIO IP-AER-252014-001-2025 DOCUMENTOS INICIO, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EL USO DE LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS EQUIPOS SEGÚN LA NECESIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma: <u>Lucero Galinde Posada</u> Nombre: LUCERO GALINDE POSADA Residente de Obra Matrícula No.: 141037-0611627 RIS	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: JUAN PABLO OSORIO ROS Residente de Interventoría Matrícula No.: 17202-130145 CLD
--	---



	INFICALDAS PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO				INFICALDAS 1300-F-42	
					CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					FECHA	
					FECHA	
				1	17/03/2017	
				1	DE	1
				FECHA		
				5	11	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No: 252014

CARRETERA Y/O PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y
LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA
DE MANIZALES CALDAS.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025

SECTOR: CALDAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

[illegible]

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA BASE DE DATOS DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO LA NUBIA DEL CDIAC MANIZALES.UNAL

Firma: Lucero Galindo Posada.
Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
Residente de Obra
Matrícula No.: 147037-0611627 RIS

Firma  Nombre: JUAN PABLO
Residente de Interv
Matrícula No.: 1720



INICALDAS

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO

INICALDAS 1300-F-42

VERSIÓN

1

FECHA

17/03/2017

FECHA

1 DE 1

FECHA

5 12 2025

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES

CONTRATO DE OBRA No: 252014

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS.

CARRETERA Y/O PROYECTO: AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

SECTOR: CALDAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																								Total						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30
Seco	24	24	24	20	24	24	23	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	20	22	23	22	24	23	24	22	24	22	23	22	24
Lluvias moderadas							1			2								1	2	1		2		1			2		1		
Lluvias intensas				4														3			1						2		2		
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA BASE DE DATOS DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO LA NUBIA DEL CDIA. MANIZALES, UNAL Y A LOS PLUVIOMETROS INSTALADOS EN CAMPO EN LA ZONA DEL CERRAMIENTO LADO AIRE Y SEI

Firma

Lucero Galindo Posada

Nombre: LUCERO GALINDO POSADA

Residente de Obra

Matrícula No.: 141037-0611627 RIS

Firma

Juan Pablo Osorio Rios

Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS

Residente de Interventoría

Matrícula No.: 17202-130145 CLD

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND



PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MIXTO
INTERESADO: TRITURADOS MPS SAS
LOCALIZACION: PLANTA CASCARERO - MANIZALES
PROCEDENCIA: MIXTO 3/4" DEL RIO GUACAICA
FECHA: OCTUBRE 26 DE 2025

MEZCLA PARA: **3000 psi**

CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m ³ Kg	Masa unitaria de los agregados	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	162,0	Ton/m ³	162,0 Litros
Cemento **	303,9		303,9 Kg
Mixto	1978,4	1,786	1,108 m³

Consumo de cemento estructural en bultos de 42,5Kg/m³ de concreto **7,15**

PROPORCIONES EN PESO DE MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales
Agua	0,53	(20-23) Litros
Cemento	1,00	42,5 Kg (1 bulto)
Mixto	6,51	277 Kg


AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

CUBICACION DE MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	---	0,53	(20-23)	Litros
Cemento	32,7	1,00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	154,9	4,74	4	40cm x 40cm x 24,2 cm de alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,53	(20-23)	Litros
Cemento	32,7	1,00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	154,9	4,74	7 1/2	Cuñetes rasos

Volumen medido del cuñete de pintura : 20.6Lt

CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,53	(20-23)	Litros
Cemento	32,7	1,00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	154,9	4,74	18	Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en la construcción; volumen= 8,5 Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba: **ARGOS, CEMEX y/o HOLCIM Uso Estructural 42,5Kg**

** La cantidad de agua se toma **siempre** con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre de los agregados petreos. El agua de la mezcla está calculada para un Slump normal de hasta 2" sin aditivo,

Para un Slump mayor a 3", mejorar la manejabilidad y otras propiedades de la mezcla se debe utilizar aditivos tipo sikaplast MO en un porcentaje del 0,5% o sea 200ml por saco de cemento


Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

		INICALDAS PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO			CÓDIGO	INICALDAS 1300-F-43			
		VERSIÓN			1				
		FECHA			17/03/2017				
		PAGINA			1 DE 1				
		FECHA			5 12 2025 (Día) (Mes) (Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES							
CONTRATO DE OBRA No:		25207/4							
		CONTRATISTA: INCVILPRO SAS							
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Noviembre de 2025							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL CARRETERA Y/O PROYECTO: AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS. SECTOR: AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS.							
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	24-nov	METODO DEL CONO DE ARENA, NORMA	INVIAS E. 161	RIO GUACAICA	1	98%	101,1%	SI	
2	24-nov	METODO DEL CONO DE ARENA, NORMA	INVIAS E. 161	RIO GUACAICA	1	98%	97,6%	SI	Se recomienda una compactación extra en esta primera capa.
3	5-nov	RELACIONES DE PESO UNITARIO HUMEDAD EN LOS SUELOS	INVIAS E - 142	RIO GUACAICA	1		2,238	SI	Proctor Base Granular
4	4-nov	DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS ANGELES 500 REV.	INVIAS E-218	RIO GUACAICA	1	30%	13,50%	SI	
5	3-nov	FRAGMENTACIÓN DE CARAS	INVIAS E-227	RIO GUACAICA	1	50%	96,00%	SI	
6	1-nov	FICHA TÉCNICA POSTES		PREPENIEL SAS	1			SI	FT-PC-901001-V001
7	20-feb	CERTIFICADO CALIDAD CONCERTINA		COMERCIALIZADOR A INVERMALLAS	1			SI	COVIMVIMHY0044
8	10-jul	CERTIFICADO CALIDAD MALLA ELSABONADA		COMERCIALIZADOR A INVERMALLAS	1			SI	CSKU 359712-9
9	1-nov	REPORTE CALIDAD CEMENTO ARGOS DE USO GENERAL POR 50 KG		ARGOS	1			SI	REPORTE CALIDAD PLANTA RIO CLARO
10	1-nov	REPORTE DE CALIDAD DE ACERO DE REFUERZO		TERNIUM	1			SI	1
OBSERVACIONES:									
NOTA:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
Firma		Firma							
Nombre: JULIO CESAR SERNA OSORIO		Nombre: MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ							
Director de Obra		Director de Interventoría							
Matrícula No.: 17202-167977 CLD		Matrícula No.: 17202-118843 CLD							

PLANTA CASCARERO	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	
PRODUCCIÓN DE AGREGADOS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS		
TEL: 606 8885832		
RELACIONES DE PESO UNITARIO - HUMEDAD EN LOS SUELOS		
EQUIPO MODIFICADO		
NORMA I.N.V. E - 142		

TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR
PROCEDENCIA:	RIO GUACAICA
FECHA ENSAYO:	5/11/2025
LOCALIZACIÓN:	PLANTA CASCARERO

PRUEBA	1	2	3	4	5
Nº. de golpes	56	56	56		
Peso de la Tara + Suelo Húmedo	446,7	477,8	495,2		
Peso de la Tara + Suelo Seco	429,6	450,4	457,6		
Peso de la Tara	0,0	0,0	0,0		
% de Humedad (Horno)	3,98	6,08	8,22		
Molde Nº.	1	1	1		
Peso de la Muestra Húmeda y Molde (gr)	7.699	7.957	7.872		
Peso del Molde (gr)	2.937,0	2.937,0	2.937,0		
Peso de la Muestra Húmeda (gr)	4.762,0	5.020,0	4.935,0		
Peso de la Muestra Seca (gr)	4.579,7	4.732,1	4.560,3		
Volumen del Molde (cm ³)	2.114,0	2.114,0	2.114,0		
% de Humedad (X)	3,98	6,08	8,22		
Densidad de la Muestra Seca (kg/m ³) (Y)	2.166	2.238	2.157		

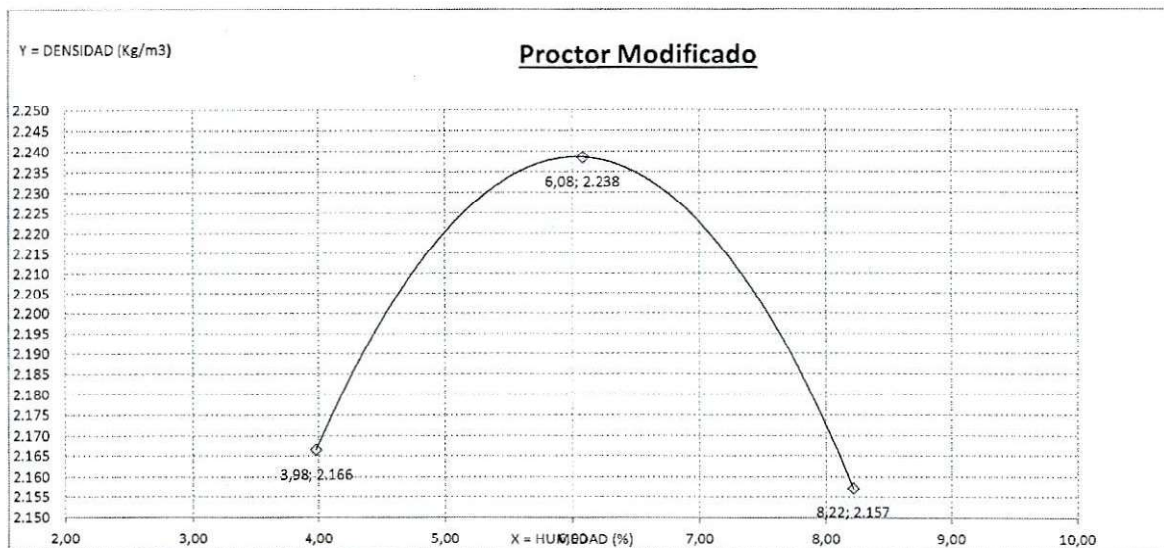

Densidad (Kg/m ³):	2.238
Humedad óptima :	6,08%

OBSERVACIONES:

Elaboró



Laboratorista
Jose Grisales V.

Revisó



Ingeniero Mecánico
Luis Daniel Meza B

PLANTA CASCARERO	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	
PRODUCCION DE		
AGREGADOS Y MEZCLAS		
TEL: 606 8885832		
SANIDAD DE AGREGADOS POR ATAQUE CON SULFATO DE SODIO Y/O MAGNESIO		
NORMA I.N.V. - E - 220		

TIPO DE MATERIAL	BASE GRANULAR
PROCEDENCIA:	RIO GUACAICA
FECHA DE ENSAYO	5/11/2025
LOCALIZACION:	PLANTA CASCARERO

Solucion utilizada	Sulfato de Magnesio
2,1 Peso de la probeta g	184,7
2,2 peso de la probeta + solucio	834,2
2,3 Peso de la solucion g	649,5
2,4 Volumen del picnometro	500
2,5 G _s de la solucion	1,299

Datos del Ensayo														
ANALISIS CUANTITATIVO														
Abertura Tamiz mm.				Granulometria Usada		P . I	P . R	P . R	P . R	P . R	P . R	P	P . T	
Pasa mm	pulg	Retiene mm	pulg	Original	Corregida		1 ^{er} Dia	2 ^{do} Dia	3 ^{er} Dia	4 ^{to} Dia	5 ^{to} Dia			
63,0	2.1/2"	50,0	2.0"	0,0%	0,00 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
50,0	2.0"	37,5	1.1/2"	0,0%	0,00 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
37,5	1.1/2"	25,0	1.0"	9,6%	9,49 %	1000,0	975,7	966,4	943,1	935,6	921,6	7,84%	0,74%	
25,0	1.0"	19,0	3/4"	10,3%	10,18 %	1000,0	967,5	953,5	933,6	922,8	912,4	8,76%	0,89%	
19,0	3/4"	12,5	1/2"	19,6%	19,4 %	900,0	891,2	886,6	873,3	865,2	856,7	4,81%	0,93%	
12,5	1/2"	9,5	3/8"	10,7%	10,6 %	800,0	786,8	771,3	768,4	765,3	763,6	4,55%	0,48%	
9,5	3/8"	4,75	N° 4	16,5%	16,3 %	650,0	642,5	638,2	634,2	623,4	618,7	4,82%	0,79%	
4,75	N° 4	2,36	N° 8	10,3%	10,2 %	350,0	345,7	338,6	341,5	338,7	332,6	4,97%	0,51%	
2,36	N° 8	1,18	N° 16	9,3%	9,2 %	220,0	218,6	216,8	215,7	214,3	210,5	4,32%	0,40%	
1,180	N° 16	0,600	N° 30	6,7%	6,6 %	120,0	119,3	118,5	116,3	114,6	110,5	7,92%	0,52%	
0,600	N° 30	0,300	N° 50	5,4%	5,3 %	123,0	118,7	113,7	112,6	110,5	109,7	10,81%	0,58%	
0,300	N° 50	0,150	N° 100	2,8%	2,8 %	107,0	103,5	100,7	97,4	94,2	93,2	12,90%	0,36%	
TOTALES				101,2%	100,0%		1,49%	1,07%	1,19%	1,04%	1,06 %		6,2 %	

ESPECIFICACION:		
Material	Sulfato de sodio	Sulfato de magnesio
MEJORAMIENTO	12,0%	18,0%
SUBBASE	12,0%	18,0%
BASE GRANULAR	12,0%	18,0%
MDC-2	12,0%	18,0%
MDC-1	12,0%	18,0%
MDC-3	12,0%	18,0%


Observaciones :

Elaboró



Laboratorista
Jose Grisales V.

Revisó



Ingeniero Mecánico
Luis Daniel Meza B

PLANTA CASCAREROS	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	
PRODUCCIÓN DE AGREGADOS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS		
TEL: 606 8885832		

TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR
PROCEDENCIA:	CASCARERO
FECHA ENSAYO:	4/11/2025

Tabla Utilizada:	1	Peso de las esferas (g):	5000 g	Tiempo (min):	105
------------------	---	--------------------------	--------	---------------	-----

Pasante Tamiz, mm	Retenido Tamiz, mm	Masa, g
19,1	16,0	375,0
16,0	12,5	375,0
12,0	9,5	750,0
Total		1500,0

Peso muestra seca antes de ensayo (g):	1500,0
Peso muestra seca despues de ensayo(g):	1297,0
Pérdida en el ensayo (g):	203,0
% de desgaste	13,5%
Valor Especificación	Max - 30 %

TABLA N° 1		
Pasante Tamiz, mm	Retenido Tamiz, mm	Masa, g
19,1	16,0	375,0
16,0	12,5	375,0
12,5	9,5	750,0

TABLA N° 2		
Pasante Tamiz, mm	Retenido Tamiz, mm	Masa, g
12,5	9,5	750,0
9,5	6,3	375,0
6,3	4,75	375,0

TABLA N° 3		
Pasante Tamiz, mm	Retenido Tamiz, mm	Masa, g
9,5	6,3	750,0
6,3	4,75	750,0

TABLA N° 4		
gadación	Tiempo Rotación (min)	Número de Revoluciones
Tabla N° 1	120 ± 1	12000 ± 100
Tabla N° 2	105 ± 1	10500 ± 100
Tabla N° 3	95 ± 1	9500 ± 100


OBSERVACIONES:

Elaboró





Laboratorista
Jose Grisales V.

Revisó



Ingeniero Mecánico
Luis Daniel Meza B

PLANTA CASCAREROS		LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD																						
PRODUCCION DE AGREGADOS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS																								
TEL: 606 8885832																								
PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS																								
NORMA I.N.V. - E-227																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">TIPO DE MATERIAL:</td> <td>BASE GRANULAR</td> </tr> <tr> <td>PROCEDENCIA:</td> <td>PLANTA CASCARERO</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ENSAYO:</td> <td>3/11/2025</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CRITERIO DE FRACTURA PARA EVALUAR</td> <td>UNA CARA</td> </tr> <tr> <td>TAMIZ QUE PRESENTA PRIMER RETENIDO</td> <td>3/4"</td> </tr> </table>						TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR	PROCEDENCIA:	PLANTA CASCARERO	FECHA DE ENSAYO:	3/11/2025	CRITERIO DE FRACTURA PARA EVALUAR	UNA CARA	TAMIZ QUE PRESENTA PRIMER RETENIDO	3/4"									
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR																							
PROCEDENCIA:	PLANTA CASCARERO																							
FECHA DE ENSAYO:	3/11/2025																							
CRITERIO DE FRACTURA PARA EVALUAR	UNA CARA																							
TAMIZ QUE PRESENTA PRIMER RETENIDO	3/4"																							
TAMAÑO DEL AGREGADO		PESO DE LA MUESTRA	PESO MATERIAL CON CARAS FRACTURADAS	PESO PARTICULAS EN CATEGORIA DE FRONTERA	PESO DE PARTICULAS NO FRACTURADAS	% DE PARTICULAS CON UNA CARA FRACTURADA $P = \frac{(F + (Q/2))}{(F + Q + N)} \times 100$																		
PASA TAMIZ	RETENIDO EN TAMIZ	g	g	g	g	P																		
1 1/2"	1"	2500	2418	67,8	14,2	98%																		
1"	3/4"	2500	2378	76,7	45,3	97%																		
3/4"	1/2"	2000	1886	78,5	35,5	96%																		
1/2"	3/8"	1000	912,3	62,8	24,9	94%																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 50%; text-align: center; background-color: #d3d3d3;">96%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">CON UNA CARA</th> <th style="width: 35%;">CON DOS CARAS</th> </tr> <tr> <td>BASE GRANULAR:</td> <td>50 % minimo</td> <td style="text-align: center;">---</td> </tr> <tr> <td>MDC-19:</td> <td>75 % minimo</td> <td style="text-align: center;">---</td> </tr> <tr> <td>CONCRETO HIDRAULICO:</td> <td>50 % minimo</td> <td style="text-align: center;">---</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 10px;"></div>							PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS:	=	96%	ESPECIFICACIONES				CON UNA CARA	CON DOS CARAS	BASE GRANULAR:	50 % minimo	---	MDC-19:	75 % minimo	---	CONCRETO HIDRAULICO:	50 % minimo	---
PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS:	=	96%																						
ESPECIFICACIONES																								
	CON UNA CARA	CON DOS CARAS																						
BASE GRANULAR:	50 % minimo	---																						
MDC-19:	75 % minimo	---																						
CONCRETO HIDRAULICO:	50 % minimo	---																						
Elaboró  Laboratorista Jose Grisales V.		Revisó  Ingeniero Mecánico Luis Daniel Meza B																						

	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL CAMPO
	METODO DEL CONO DE ARENA, NORMA I.N.V.E. 161

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS
MATERIAL:	BASE GRANULAR

FECHA	24-nov-25	24-nov-25				
Abscisa	SEI	SEI LI				
Estructura	Primera Capa Base Granular	Primera Capa Base Granular				
Costado	Lado Izq	Lado Der				
Peso del Frasco+Arena Inicial (gr) (1)	6141.00	6049.00				
Peso del Frasco+Arena Restante (gr) (2)	2850.00	2944.00				
Peso Arena total usada (gr) (3)=(1)-(2)	3291.00	3105.00				
Constante del cono (4)	1495.10	1495.10				
Peso arena en el hueco (5)=(3)-(4)	1795.90	1609.90				
Densidad de la arena (gr / cm3) (6)	1.350	1.350				
Volumen del Hueco (cm3) (7)=(5)/(6)	1330.30	1192.52				
Peso del material extraído húmedo (gr) (8)	3230	2838				
% de humedad del material (9)	7.30%	8.90%				
Peso del material extraído seco (gr) (10)=(8)/(1+[9]/100)	3010.25	2606.06				
Densidad del material (gr / cm3) (11)=(10)/(7)	2.263	2.185				
Densidad máxima del laboratorio (gr / cm3) (12)	2.238	2.238				
% humedad optimo de laboratorio (13)						
COMPACTACION DEL TERRENO = (11)/(12) * 100	101.10%	97.60%				

OBSERVACIONES:

WILSON FERNEY HIGINIO MONTOYA
ELABORÓ

ING. JULIO CESAR SERNA OSORIO
APROBÓ

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3

Calibration Certificate

NÚMERO

Number

BL - 4310

MAGNITUD

Magnitude

MASA Y BALANZA

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

20 de octubre de 2025

SOLICITANTE:

Customer

Ingeval PYM S.A.S.

DIRECCIÓN:

Address

Av. Centenario Calle 10 # 3 0 -58

CIUDAD:

City

Manizales - Caldas

INSTRUMENTO:

Instrument

Balanza

MARCA:

Brand

Trumax

MODELO:

Model

Fenix

SERIE:

Serial

YS251326

TIPO:

Type

Digital

CAPACIDAD:

Capacity

30 kg

NÚMERO DE PAGINAS:

Number of Pages

TRES (3)

PATRÓN DE REFERENCIA:

Reference Standard

MASAS

Juego de pesas

Serie: S. I.

Código: 76

CERTIFICADO No. IM-OF40419-LP-932-19

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente

This certificate is an accurate record of the performed measurements results. This certificate may not be partially or totally reproduced,

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

MÉTODO:

COMPARACIÓN

TEMPERATURA:

28,8°C

Carrera 20 D # 67-12 Sur TEL.: (1) 471 1981 – 316 691 1237 - Email: comercial@meisteringenieria.com

www.meisteringenieria.com

Bogotá - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Página 2 de 3

Calibration Certificate

NÚMERO
BL - 4310
MAGNITUD
MASA Y BALANZA
Number
Magnitude
División de Escala: 0,001 kg

HUMEDAD RELATIVA: 76%

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN

MEDICIÓN EN ASCENSO Y DESCENSO					
PATRÓN	INSTRUMENTO	ERROR	PATRÓN	INSTRUMENTO	ERROR
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
0	0,000	0,000	0	0,000	0,000
0,02	0,020	0,000	0,02	0,020	0,000
0,1	0,100	0,000	0,1	0,100	0,000
0,5	0,500	0,000	0,5	0,500	0,000
1	1,000	0,000	1	1,000	0,000
5	5,000	0,000	5	5,000	0,000
10	10,000	0,000	10	10,000	0,000
15	15,000	0,000	15	15,000	0,000
30	30,000	0,000	30	30,000	0,000

ERROR POR REPETICIÓN					
PATRÓN	INSTRUMENTO	PATRÓN	INSTRUMENTO	PATRÓN	INSTRUMENTO
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
0,5	0,500	5	5,000	30	30,000
0,5	0,500	5	5,000	30	30,000
0,5	0,500	5	5,000	30	30,000
0,5	0,500	5	5,000	30	30,000
0,5	0,500	5	5,000	30	30,000

PUNTO	CARGA	INDICACIÓN	ERROR
	(kg)	(kg)	(kg)
1	10	10,000	0,000
2	10	10,000	0,000
3	10	10,000	0,000
4	10	10,000	0,000
5	10	10,000	0,000

5		2
	1	
4		3

La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar

Carrera 20 D # 67-12 Sur TEL.: (1) 471 1981 – 316 691 1237 - Email: comercial@meisteringenieria.com

www.meisteringenieria.com

Bogotá - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Página 3 de 3

Calibration Certificate

NÚMERO

Number

BL - 4310

MAGNITUD

Magnitude

MASA Y BALANZA

combinada, por el factor de cubrimiento $k = 2$, con el cual se logra un nivel de confianza del 95,45 %, aproximadamente.

TRAZABILIDAD


ASINCAL CONSULTORES S.A.S., asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo, utilizados en las mediciones, los cuales han sido certificados por el laboratorio Industria y Metrología Ltda.

OBSERVACIONES

Una nueva calibración se deberá llevar a cabo cuando el instrumento sea sometido a reparaciones, ajustes ó uso inapropiado; independientemente del tiempo transcurrido desde la presente calibración.

Calibro:

Aprobó:


Ing. JUAN CARLOS ARÉVALO CH.
Director de Gestión y Calidad
Tec. JEFERSON VERGARA
Metrologo

FIN DE CERTIFICADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 2

Calibration Certificate

NÚMERO
Number

PR - 2406

MAGNITUD
Magnitude

PRESIÓN

FECHA DE CALIBRACIÓN: 20 de octubre de 2025
Date of Calibration

SOLICITANTE: Ingeval PYM S.A.S.
Customer

DIRECCIÓN: Av. Centenario Calle 10 # 3 0 -58
Address

CIUDAD: Manizales - Caldas
City

INSTRUMENTO: Manómetro - Speedy
Instrument

MARCA: Ritherm
Brand

MODELO: Type D1
Model

SERIE: 2510007
Serial

TIPO: Análogo
Type

CAPACIDAD: 0 A 30 psi
Capacity

NÚMERO DE PAGINAS: DOS (2)
Number of Pages

PATRÓN DE REFERENCIA: MANOMETRO DE CARATULA
Reference Standard

SERIE: 23/LD052
CERTIFICADO NoP-082-23

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente

This certificate is an accurate record of the performed measurements results. This certificate may not be partially or totally reproduced,

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Página 2 de 2

Calibration Certificate

NÚMERO
Number

PR - 2406

MAGNITUD
Magnitude

PRESIÓN

MÉTODO:

COMPARACIÓN

TEMPERATURA:

18,8 °C

MEDIO USADO:

AIRE SECO

HUMEDAD RELATIVA:

55%

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN

LECTURA PATRÓN (psi)	INSTRUMENTO A PRUEBA			
	ASCENSO (psi)	ERROR (psi)	DESCENSO (psi)	ERROR (psi)
0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
8,0	8,0	0,00	8,0	0,00
15,0	15,0	0,00	15,0	0,00
18,0	18,0	0,00	18,0	0,00
25,0	25,0	0,00	25,0	0,00
29,0	29,0	0,00	29,0	0,00

ERROR MAX. PERMITIDO: $\pm 2,5 \%$

% ERROR DEL INSTRUM.: $\pm 0,10 \%$


La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cubrimiento $k = 2$, con el cual se logra un nivel de confianza del 95 %, aproximadamente.

TRAZABILIDAD

ASINCAL CONSULTORES S.A.S., asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo, utilizados en las mediciones, los cuales han sido certificados por INDUSTRIA Y METROLOGIA

Calibro:

Aprobó:


JEFFERSON VERGARA
Metrologo


Ing. JUAN CARLOS ARÉVALO CH.
Director de Gestión y Calidad

FIN DE CERTIFICADO

CALIBRACION DE ARENA Y CONO

DENSIDADES DE CAMPO

NORMA I.N.V.E. - 161-07



PROYECTO: OBRAS CIVILES

INTERESADO: INGEVIAL PYM S.A.S. - NIT 900.985.618-2

PROCEDENCIA: ARENA CUARZOSA DE ITAGUI - ANTIOQUIA

FECHA: NOVIEMBRE 22 DE 2025



CONSTANTE ARENA

PESO 1 -g	PESO 2 -g	DIFERENCIA -g
5915,5	1520,5	4395,0
5924,0	1518,0	4406,0
5896,0	1517,0	4379,0
5908,0	1526,0	4382,0
5914,0	1523,0	4391,0
5921,5	1519,0	4402,5
PROMEDIO DIF. G		4392,6
PROMEDIO DIF-CONO SICON		2897,5
VOLUMEN MOLDE cm ³		2147,0
K ARENA CONSUAS		1,350


CONSTANTE CONO INGEVIAL

PESO 1 -g	PESO 2 -g	DIFERENCIA -g
5863,5	4373,0	1490,5
4373,0	2882,0	1491,0
4400,5	2907,5	1493,0
2907,5	1410,5	1497,0
5909,0	4419,0	1490,0
4419,0	2918,5	1500,5
2918,5	1412,5	1506,0
5903,5	4410,5	1493,0
K CONO MPS		1495,1

AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

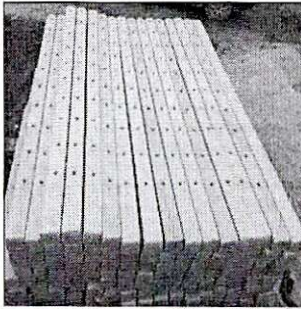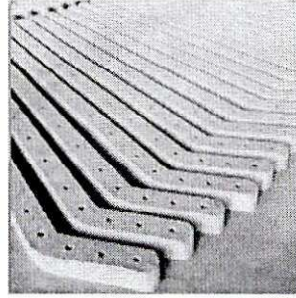

FT-PC-901001-V001



PREPENIEL S.A.S.

Ficha Técnica Bloque Poste de Cemento

DIMENSIONES NOMINALES			TOLERANCIAS			PESO	CLASE
LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	KG	
1500mm	80mm	80mm	+/- 5mm	+/-3	+/-3	30	RECTO
1800mm	110mm	110mm	+/- 5mm	+/-3	+/-3	40	RECTO
2100mm	100mm	100mm	+/- 5mm	+/-3	+/-3	50	RECTO
2400mm	110mm	110mm	+/- 5mm	+/-3	+/-3	70	RECTO
2500mm	100mm	100mm	+/- 5mm	+/-3	+/-3	62	RECTO
2800mm	110mm	110mm	+/- 5mm	+/-3	+/-3	72	RECTO
3000mm	100mm	100mm	+/- 5mm	+/-3	+/-3	75	RECTO/CURVO
3500mm	110mm	110mm	+/- 5mm	+/-3	+/-3	92	RECTO/CURVO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Refuerzo	Si aplica
Textura	Liso con textura
Color	Gris

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Módulo de rotura 28 días		Absorción de Agua % máximo
BLOQUE POSTE	3.500 PSI	No aplica

APLICACIONES:

El poste de concreto para cerramiento se utiliza como elemento estructural vertical para soportar sistemas de cercado en áreas residenciales, industriales o rurales. Su función principal es brindar estabilidad y resistencia a mallas, alambres o paneles, delimitando espacios de forma segura y duradera. Gracias a su composición reforzada, es ideal para condiciones climáticas variables y terrenos irregulares, garantizando una larga vida útil con bajo mantenimiento.

ACABADOS

* El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o despotilladuras, no mayores 15 mm en cualquiera de sus aristas diferentes a la cara de desgaste.

* Los bloques son fabricados con mezclas compuestas por agregados petros las cuales pueden presentar pequeños cambios que pueden afectar la apariencia, que después de instalados deja de ser perceptible.


ALMACENAMIENTO

Los postes de concreto para cerramiento deben almacenarse en superficies planas, firmes y libres de humedad para evitar fisuras o deformaciones. Se recomienda apilarlos horizontalmente en estibas con separadores de madera entre cada unidad, permitiendo ventilación y evitando el contacto directo entre postes.

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine 4520 cm ² /g	Retenido 325 6.2 %	Fraguado inicial 127 min	Fraguado final 262 min
Resistencia 1 día 8.8 MPa	Resistencia 3 días 16.8 MPa	Resistencia 7 días 20.9 MPa	Resistencia 28 días (Blank) MPa


Edad ● R 1 día (MPa) ● R 3 días (MPa) ● R 7 días (MPa)



* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221 2.95 g/cm ³	Contenido de Aire NTC 224 2.8 %	Expansión en autoclave NTC 107 0.024 %	Expansión barras de mortero NTC 4927 0.012 %
--	------------------------------------	---	---

PARÁMETROS QUÍMICOS
Óxidos


- Fe₂O₃(%)
- Al₂O₃(%)
- SiO₂(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición

10.81 %

Equivalente alcalino

0.75 %

SO₃

2.04 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm ² /g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/11/2025	4511	6.4	126	250	7.8	15.0	19.4	
2/11/2025	4428	5.4	128	260	8.0	15.7	20.2	
4/11/2025	4434	5.6	127	260	7.1	14.8	19.0	
5/11/2025	4389	6.6	130	280	7.7	15.0	18.9	
6/11/2025	4241	7.3	130	280	7.3	14.2	17.9	
7/11/2025	4460	7.9	133	260	8.2	15.9	18.4	
8/11/2025	4544	5.2	120	270	8.6	15.7	19.6	
9/11/2025	4405	5.1	127	270	8.9	16.9	22.0	
10/11/2025	4432	5.6	136	280	7.8	14.9	18.5	
11/11/2025	4861	5.1	128	280	7.9	15.4	20.5	
12/11/2025	4855	4.7	132	260	9.0	19.9	21.0	
13/11/2025	4643	5.0	127	260	10.1	18.3	23.4	
14/11/2025	4219	3.0	126	250	15.2	25.0	30.5	
15/11/2025	4498	8.9	128	250	8.7	17.3	20.6	
16/11/2025	4502	6.0	126	250	10.9	19.4	23.6	
18/11/2025	4571	5.6	113	250	8.2	16.3		
19/11/2025	4564	7.2	130	270	8.8	16.7		
20/11/2025	4458	6.2	129	240	9.1	16.2		
21/11/2025	4474	6.0	120	270	8.2			
22/11/2025	4586	5.7	132	250	8.5			
23/11/2025	4835	7.2	120	270	8.7			

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

QUALITY CERTIFICATE (MTC)													
TO		COMERCIALIZADORA INVERMALLAS S.A.S.											
CERTIFICATE NO:		COIVMIVMHX0044		BUENAVENTURA, COLOMBIA									
GOODS:		RAZOR WIRE CBT 65		13519 BUNDLES, 50.020MTS									
STEEL GRADE: (STAINLESS STEEL 430 CBT 65,													
THIS IS TO CERTIFY THAT THE PRODUCTS HAVE BEEN INSPECTED AS PER RELEVANT SPECIFICATION AS STIPULATED IN THE ORDER AND QUALIFIED WITH ALL THE DATA IN COMPLIANCE WITH SPECIFICATION													
SHIPPING MARKS	Heat No.	SIZE (MM)	QUANTITY		Chemical Composition %				Mechanical Properties				
			BUNDELS	QUANTITY (MTS)	C	Si	Mn	P	S	Y.S (Mpa)	T.S (Mpa)	EL. (%)	HV
N/M	A250212A202-3	CBT 65	13519	50.020	0.021	0.30	0.27	0.02	0.0031	288	489	30	149
TOTAL			13519	50.020									
INSPECTOR: ZHANG, [Signature] DATE: FEB 20, 2025													
BEIJING SINOPEC [Signature] 北京华信石油有限公司													
Authorized Signature(s)													

CERTIFICATE OF TEST & ANALYSIS	CONTAINER	CSKU 359712-9
	CERTIFICATE	920785


CLIENT	COMERCIALIZADORA INVERMALLAS SAS		
CITY	BOGOTÁ, COLOMBIA		
TEST DATE	10/07/2025	RELEASE DATE	10/09/2025
PRODUCT CODE	728063	LOTS NUMBER	G2522011-G2522021- G2522022-G2522032- G2522111-G2522112- G2522121-G2522122- G2522131-G2522132- G2522211-G2522012- G2522012-G2521932- G2917821-G2918411

MECHANICAL TESTS								
TEST	BWG	DIAMETER (mm)		TENSILE STRENGTH (kgf/mm ²)		OVALITY	ELONGATION %	
				MIN	MAX		MIN	MAX
SPECIFICATION	10	3.4	±0.08	40	55	0.02	N/A	N/A
	10	3.4		47.03		N/A	N/A	

WIRE TESTS									
TEST	ZINC LAYER (g/m ²)		TWIST	ADHESION	DUCTILITY	CAST (mm)		HELIX (cm)	
	MIN	MAX				MIN	MAX	MIN	MAX
SPECIFICATION	50	60	N/A	C – NC	> 8 turns	N/A	N/A	N/A	N/A
RESULTS	60.58		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	

Additional details:

Approved by:


Quality area

DEFINICIÓN

Material para cerramientos fabricado con alambre de acero galvanizado enrollado helicoidalmente y tejido de manera que forma una malla continua sin nudos ni ataduras. Los bordes de la malla se cierran mediante dobleces en los extremos del alambre.

ASPECTOS TÉCNICOS

BWG	Diámetro		Tolerancia	Resistencia	Long	Recub. Zinc	Recub. Zinc	Recub. Zinc
	mm.	Pulg.	Exterior (mm)	Tracción	m/kg	Clase 1A (g/m ²)	Clase 1 (g/m ²)	Clase 3 (g/m ²)
8.0	4.19	0.165	±0.10	49	9.19	70	115	275
9.0	3.76	0.148	±0.10	49	11.23	65	100	270
10.0	3.40	0.134	±0.08	49	14.03	65	100	260
10.5	3.10	0.128	±0.08	49	15.36	65	100	260
11.0	3.00	0.120	±0.08	49	17.44	60	85	240
12.0	2.70	0.109	±0.08	49	20.69	60	85	230
12.5	2.50	0.102	±0.08	49	23.99	60	85	230
13.0	2.41	0.095	±0.08	52	28.16	60	85	220
13.5	2.20	0.089	±0.08	52	30.66	55	75	220
14.0	2.11	0.083	±0.06	52	36.78	55	75	220
14.5	2.00	0.078	±0.06	52	40.24	55	75	220

TIPO DE ACERO


Acero Norma SAE

1004 - 1005 - 1006 - 1008 - 1010 - 1011 - 1012 Bajo carbono

PRESENTACIÓN

Tipo	Longitud	Altura
Premium	10 m	1.20, 1.50, 1.80, 2.00 m
Estándar	20 m	1.20, 1.50, 1.80, 2.00 m
	Según requerimiento	Según requerimiento

TAMAÑO DE LA ABERTURA




Figura	Abertura		
	Pulg.	mm.	Tolerancia
	1"	25	± 2,5 mm.
	1.1/4"	30	± 2,5 mm.
	1.1/2"	40	± 2,5 mm.
	2"	50	± 2,5 mm.
	2.1/4"	60	± 2,5 mm.
	2.1/2"	70	± 2,5 mm.
	3"	80	± 2,5 mm.

USOS GENERALES

Cerramientos industriales
 Cerramientos urbanos
 Cerramientos de divisiones

PRODUCTO

- **NTC 3315: 2006:** Esta norma abarca la malla de acero con revestimiento de zinc para cerramientos, ya sea antes o después de ser tejida.

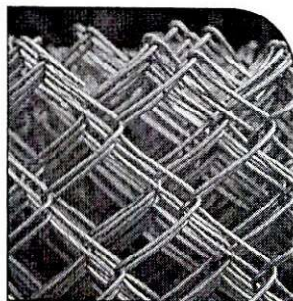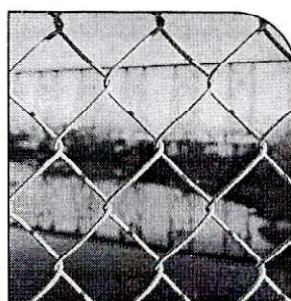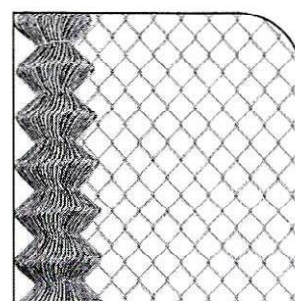

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS									
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS									
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA									
BALANCE FINANCIERO									
CÓDIGO 1300-F-101									
VERSIÓN 1									
VIGENCIA 23-10-17									
CONTRATO No. 252014 CONSTRUCCIÓN X INTERVENTORÍA									
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS									
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS									
INTERVENIOR: CONSORCIO SBP									
SUPERVISOR DE CONTRATO: JHON JAIRO GOMEZ ARIAS									
FECHA: 5 de diciembre de 2025 0 PERIODO: 29 de Septiembre de 2025 A 30 de Noviembre de 2025									
VALOR INICIAL \$ 475.987.549,00									
VALOR TOTAL ACUM. 1RA ADICIÓN -									
VALOR TOTAL ACUM. 2DA ADICIÓN -									
VALOR TOTAL ACUM. 3RA ADICIÓN -									
VALOR TOTAL ACUM. 4RA ADICIÓN -									
VALOR TOTAL ACUM. 5TA ADICIÓN -									
VALOR ANTICIPO No.1 (0 %) -									
VALOR ANTICIPO No.2 (0 %) -									
VALOR TOTAL ANTICIPO (0 %) -									
VALOR ANTICIPO No.3 (00 %) -									
VALOR TOTAL ANTICIPO POR ADICIONES 1 Y 2 -									
VALOR ANTICIPO No.4 (0 %) -									
VALOR TOTAL ANTICIPO ADICIONES 1 Y 2 -									
VALOR TOTAL ACUMULADA 290.418.881,00									
VALOR ACTA 230.418.881,00									
SALDO POR FACTURAR 185.568.668,00									
ANTICIPO AMORTIZADO -									
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO -									
SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR -									
NETO ACTA (BASICO-AMORT) 290.418.881,00									
TOTALES \$ 290.418.881,00 \$ 185.568.668,00 \$ - \$ - \$ 290.418.881,00									
LIQUIDACION TOTAL DEL ACTA									
VALOR TOTAL LIQUIDADO PRESENTE ACTA \$ 290.418.881,00									
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0,00 %) \$ -									
VALOR TOTAL A PAGAR A FAVOR DE \$ 290.418.881,00									
Letras: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE									
ALEXANDER PATIÑO TORRES REPRESENTANTE LEGAL INCIVILPRO SAS Matricula No.: 147490 CLD									
SEBASTIAN BALLESTEROS LOPEZ Interventoria: CONSORCIO SBP Matricula No.: 17202-340982 CLD									
JHON JAIRO GOMEZ ARIAS SUPERVISOR INFINICALDAS Matricula No.: 17202-54237 CLD									

3 MESES	
IVA	
\$	-
\$	-

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
-----------	--------	--------------------

Construcción	ML	0
Pavimentación	M2	0
Puentes		
Otros		

VICENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor

2025	\$ 50,407,817.00
2025	\$ 50,407,817.00

EL PERIODO INFORMADO

11. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2696.

NA

—

GÓMEZ ARIAS

CUTADA

[illegible]

--

100

1000

--	--

--

10

--

1000

10



INICIALDAS
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	INICIALDAS 1300-F-49		
VERSIÓN	1		
FECHA	17/03/2017		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA 5 11 2025
(Día) (Mes) (Año)

6. INDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	1	DISEÑO DE MEZCLA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO CON RESISTENCIA ESPERADA DE 3,000 PSI O 21 MPA
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: JULIO CESAR SERNA
Director de Obra
Matrícula No.: 17202167977 CLD

Firma:
Nombre: LUCERO GALINDO POSADA
Residente de Obra
Matrícula No.: 141037-0611627 RIS

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 17202-118843

Firma:
Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 17202-130145 CLD

INFORME DE CALIDAD #1

CONTRATO No. 252014

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y
LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDA.**

**INCIVILPRO S.A.S
NIT. 900.604.010-1
R.L ALEXANDER PATIÑO TORRES**

FECHA CORTE (29 DE SEPTIEMBRE A 29 DE OCTUBRE 2025)

MANIZALES, CALDAS

	INCIVILPRO S.A.S
	CONTRATO No:252014: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS"

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

INFORME MENSUAL No. 1

OBRA EJECUTADA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2025

Contenido

DISEÑO DE MEZCLA.....	3
------------------------------	----------

CONTRATO No:252014

**OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y
LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS"**

DISEÑO DE MEZCLA

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND



PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MIXTO
INTERESADO: TRITURADOS MPS SAS
LOCALIZACION: PLANTA CASCARERO - MANIZALES
PROCEDENCIA: MIXTO 3/4" DEL RIO GUACAICA
FECHA: OCTUBRE 26 DE 2025

MEZCLA PARA: 3000 psi


CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m ³ Kg	Masa unitaria de los agregados Ton/m ³	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	162,0	Ton/m ³	162,0 Litros
Cemento **	303,9		303,9 Kg
Mixto	1978,4	1,786	1,108 m ³

Consumo de cemento estructural en bultos de 42,5Kg/m³ de concreto **7,15**

PROPORCIONES EN PESO DE MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales
Agua	0,53	(20-23) Litros
Cemento	1,00	42,5 Kg (1 bulto)
Mixto	6,51	277 Kg


AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

CUBICACION DE MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	---	0,53	(20-23)	Litros
Cemento	32,7	1,00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	154,9	4,74	4	40cm x 40cm x 24,2 cm de alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,53	(20-23)	Litros
Cemento	32,7	1,00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	154,9	4,74	7 1/2	Cuñetes rasos

Volumen medido del cuñete de pintura : 20.6Lt

CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,53	(20-23)	Litros
Cemento	32,7	1,00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	154,9	4,74	18	Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en la construcción; volumen= 8,5 Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba: **ARGOS, CEMEX y/o HOLCIM Uso Estructural 42,5Kg**

** La cantidad de agua se toma **siempre** con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre de los agregados petreos. El agua de la mezcla está calculada para un Slump normal de hasta 2" sin aditivo,

Para un Slump mayor a 3", mejorar la manejabilidad y otras propiedades de la mezcla se debe utilizar aditivos tipo sikaplast MO en un porcentaje del 0,5% o sea 200ml por saco de cemento

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

	INFICALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-49	
			VERSIÓN	1	
			FECHA	17/03/2017	
			PÁGINA	1 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES</u>	FECHA: <u>5</u> / <u>12</u> / <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
---	---

CONTRATO DE OBRA No. 252014 DEL 2025
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

CONTRATISTA: INCIVILPRO S.A.S

FECHA DE INICIO: 29/09/2025 (Indicar día, mes y año) PLAZO INICIAL: 3 MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/2025 (Incluir prórrogas y sus extensiones)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 252017
(Indicar número y año)

INTERVENIOR: CONSORCIO SBP

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 1/10/2025

OBSERVACIONES: SE PRESENTA PLAN DE CALIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025 EN CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO PARA EL INICIO DEL CONTRATO

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: 1 FECHA ULTIMA AUDITORIA: 1/12/2025
 PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: 1 FECHA PROXIMA AUDITORIA: 28/12/2025

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTA PROGRAMA DE AUDITORIA, SIN EMBARGO SE REALIZA LA RESPECTIVA AUDITORIA DEL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO, CON EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE ENSAYOS A MATERIALES Y PRODUCTOS ENTREGADOS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN: 1/10/2025

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 1 No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 1

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: SE REALIZAN ENSAYOS DE DENSIDAD DE COMPACTACIÓN A LAS SUSTITUCIONES REALIZADAS DE BASE GRANULAR EN EL SEI, SE VERIFICAN FICHAS TECNICAS DE POSTES, MALLA ESLABONADA Y SE VERIFICA LA CALIDAD DEL ACERO DE REFUERZO INSTALADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
 No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
 No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
 No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
 No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0


OBSERVACIONES: Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. INDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un Índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	1	SE REALIZAN DOS ENSAYOS DE DENSIDAD DE COMPACTACIÓN POR EL METODO DE CONO DE ARENA. FORMULA = (ENSAYOS QUE CUMPLEN Y (NO ENSAYOS REALIZADOS))
IG2: Índice de gestión 2 =	1	SE PRESENTA PROCTOR DE LA BASE GRANULAR
IG3: Índice de gestión 3 =	1	SE PRESENTAN ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR
IG4: Índice de gestión 4 =	1	FICHA TECNICA DE LOS POSTES. FORMULA= CUMPLE ESPECIFICACIÓN (1), NO CUMPLE ESPECIFICACIÓN (0)
IG5: Índice de gestión 5 =	1	CERTIFICADO DE CALIDAD DE CONCRETINA. FORMULA= CUMPLE ESPECIFICACIÓN (1), NO CUMPLE ESPECIFICACIÓN (0)
IG3: Índice de gestión 6 =	1	CERTIFICADO DE CALIDAD DE MALLA ESLABONADA. FORMULA= CUMPLE ESPECIFICACIÓN (1), NO CUMPLE ESPECIFICACIÓN (0)
IG4: Índice de gestión 7 =	1	CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CEMENTO. FORMULA= CUMPLE ESPECIFICACIÓN (1), NO CUMPLE ESPECIFICACIÓN (0)
IG4: Índice de gestión 8 =	1	REPORTE DE CALIDAD DEL ACERO. FORMULA= CUMPLE ESPECIFICACIÓN (1), NO CUMPLE ESPECIFICACIÓN (0)
IG4: Índice de gestión 9 =	1	
IGn: Índice de gestión n =	1	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: _____

	INFICALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CODIGO VERSION FECHA PAGINA	INFICALDAS 1300-F-49 1 17/03/2017 1 DE 2				
			FECHA 5 12 2025 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
	UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES</u>						
	CONTRATO DE OBRA No. <u>252014 DEL 2025</u> <small>(Indicar número y año)</small>						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS</u>							
CONTRATISTA: <u>INCMILPRO S.A.S.</u>							
FECHA DE INICIO: <u>29/09/2025</u> <small>(Indicar día, mes y año)</small>		PLAZO INICIAL: <u>3 MESES</u>					
		FECHA DE VENCIMIENTO: <u>28/12/2025</u> <small>(Indicar día, mes y año)</small>					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: <u>252017</u> <small>(Indicar número y año)</small>							
INTERVENTOR: <u>CONSORCIO SBP</u>							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	BALANZA	TRUMAX	YS251326	20/10/2025	BL-4310	18/01/2026	MAGNITUD: MASA Y BALANZA
2	MANOMETRO - SPEEDY	RITHERM	2510C07	20/10/2025	PR-2406	18/01/2026	MAGNITUD: PRESIÓN
3	CALIBRACION DE ARENA Y CONO	ARENA CAURZOSA DE ITAGUI ANTIOQUIA	N/A	22/11/2025	CONSUIAS	20/02/2026	CONSTRANTE: K ARENA
OBSERVACIONES:							
NOTAS: 1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
 <small>Firma</small> Nombre: JULIO CESAR SERNA Director de Obra Matricula No.: 17202107877 CLD		 <small>Firma</small> Nombre: LUCERO GALINDO POSADA Residente de Obra Matricula No.: 141037 0611627 RIS		 <small>Firma</small> Nombre: MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ Director de Interventoria Matricula No. 17202-118843		 <small>Firma</small> Nombre: JUAN PABLO OSORIO RIOS Residente de Interventoria Matricula No.: 17202-130145 CLD	

	INFICALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-47		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	17/03/2017		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	5	12	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES PATRIMONIALES

CONTRATO DE OBRA No. 252014 CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AERÓPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

FECHA DE INICIO: 29/09/2025

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/12/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 475.987.549,00

VALOR ACUMULADO: \$ 475.987.549,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 252017 INTERVENTOR: CONSORCIO SBP

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
				Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 95.197.509,80		29	9	2025	29	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -		N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 95.197.509,80		29	9	2025	30	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	0%	\$ -		N/A			N/A		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 95.197.509,80		29	9	2025	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101163394

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
				Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00		29	9	2025	30	12	2025
Otros				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 42-40-101-050141 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

	INFICALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	INFICALDAS 1300-F-47		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	17/03/2017		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	5	12	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma 

Nombre: MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ

Director de Interventoría

Matrícula No. 17202-118843



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 960.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-44-101163394	ANEXO 1
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS
29	09	2025	22	08	2025	00:00	22 11 2030	23:59
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INCIVILPRO SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TÉLEFONO: 8801501

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.806.006-3
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TÉLEFONO 8845639
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0105, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 252014 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS.
NOTA : LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AMPARA EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 252014, SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *(1.851,056.00)	\$ ****(20,000.00)	\$ *** (355,500.00)	\$ ***** (2,226,557.00)	\$ **** (285,592,530.00)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELEFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-44-101163394

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olada - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF019957D

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			CÓD. SUC 42		Nº. PÓLIZA 42-44-101163394		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 08 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 11 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCIVILPRO SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1	
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8801501	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.806.006-3	
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8845639	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELÉFONO: (606) 8813200 - MANIZALES

42-44-101163394

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF019357D

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-44-101163394	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
29 09 2025	29	09	2025	00:00	30 12 2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCIVILPRO SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TÉLEFONO: 8801501

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.806.006-3
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TÉLEFONO 8845639

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUS108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 252014 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS.

NOTA: LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AMPARA EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/09/2025	29/04/2026	\$95,197,510.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/09/2025	30/12/2028	\$95,197,510.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$95,197,510.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 252014, SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****1,851,056.00	\$ *****20,000.00	\$ *****355,500.00	\$ *****2,226,557.00	\$ *****285,592,530.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELÉFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-44-101163394

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF019957D

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			CÓD.SUC 42		Nº.PÓLIZA 42-44-101163394		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 09 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCIVILPRO SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1	
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8801501	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.806.006-3	
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8845639	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELÉFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-44-101163394

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF019957D

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101050141	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
29 09 2025	22 08 2025		00:00	22 11 2025		23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INCIVILPRO SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO: 8801501

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.806.006-3
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO 8845639
BENEFICIARIO: 890806006 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 252014 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS.

COBERTURA BASICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)

MODALIDAD DE OCURRENCIA

ASEGURADO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS-INFICALDAS NIT 890.806.006-3 E INCIVILPRO SAS NIT 900.604.010-1

BENEFICIARIOS : TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS-INFICALDAS NIT 890.806.006-3

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
---------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 252014, SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

VALOR PRIMA NETA \$ ***(179,400.00)	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****(3,000.00)	IVA \$ *****(34,656.00)	TOTAL A PAGAR \$ ***** (217,056.00)	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****(284,700,000.00)	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	CLAVE 19957	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELEFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-40-101050141

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olea - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF019957D

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101050141		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 08 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 11 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCIVILPRO SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1	
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8801501	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.806.006-3	
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8845639	
BENEFICIARIO: 890806006 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS			

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELÉFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-40-101050141

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF019857D

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101050141	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	29	09	2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO	29	09	2025	A LAS HORAS 00:00
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	29	09	2025	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	30	12	2025	A LAS HORAS 23:59
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCIVILPRO SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TÉLEFONO: 8801501

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.806.006-3
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
BENEFICIARIO: 890806006 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS	TÉLEFONO 8845639

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 252014 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS.

COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)

MODALIDAD DE OCURRENCIA

ASEGURADO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS-INFICALDAS NIT 890.806.006-3 E INCIVILPRO SAS NIT 900.604.010-1

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS-INFICALDAS NIT 890.806.006-3

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	29/09/2025	30/12/2025	\$284,700,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	29/09/2025	30/12/2025	\$284,700,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	29/09/2025	30/12/2025	\$284,700,000.00	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 252014, SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****179,400.00	\$ *****3,000.00	\$ *****34,656.00	\$ *****217,056.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELEFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-40-101050141

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF019957D



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101050141		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 09 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCIVILPRO SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1	
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8801501	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.806.006-3	
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8845639	
BENEFICIARIO: 890806006 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/09/2025	30/12/2025	\$284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/09/2025	30/12/2025	\$284,700,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/09/2025	30/12/2025	\$284,700,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELÉFONO: (606) 8613280 - MANIZALES

42-40-101050141

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF019957D

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES						SUCURSAL MANIZALES						COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101050141		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
29 09 2025			29 09 2025			00:00	30 12 2025			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCIVILPRO SAS						IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.010-1					
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 23-22 LOCAL 2						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8801501		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS			IDENTIFICACIÓN		NIT: 890.806.006-3			
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 23 - 22 EDIF SEGUROS					CIUDAD:		MANIZALES, CALDAS		TELÉFONO: 8845639	
BENEFICIARIO:		890806006 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS								

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELÉFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-40-101050141

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF019957D

3

CARRETERA Y/O PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS

DE MANIZALES CALDAS

VOTA:

- El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INFIUCADAS suscribió el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
- El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma 
Nombre: JUAN ALBERTO GIRALDO DIAZ
Director de Interventoria



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-13, 04:07:55 PM Tipo Planilla: Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS Número Planilla: 1077256619

Periodo Cotización: octubre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 13/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INCIVILPRO SAS	Dirección	CL 62CRA #23 - 22
Documento	NI900604010	Teléfono	3204552654
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	JURIDICA	Departamento	CALDAS
Ciudad	MANIZALES	Identificación	CC 16077530
Representante Legal	PATINO TORRES ALEXANDER	ARL SURA	
Total Afiliados	2		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	DT	CT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 949,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66,200	\$ 3,000	\$ 66,500



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 9977335		SERNA OSORIO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 17 62 35 LA TOSCANA	MANIZALES-CALDAS	8842364	SI					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor							
Pensión Salud		Planilla		Limite									
2025-10	185833176	9492320304	I	2025/11/11	2025/10/17	\$230,000							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO																				
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	ExantTemp. jeto Ext.	Fecha Radicación en el Cuorrier	Ing	ret	fecha	Ing	ret	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS(1 Afiliados)																				
1	CC	9977335	SERNA OSORIO JULIO CESAR	Independiente	0	No	No	X	2025/10/14											
Total Afiliados(1)																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 9977335		SERNA OSORIO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 17 62 35 LA TOSCANA	MANIZALES-CALDAS	8842364	SI					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor							
Pensión Salud		Planilla		Limite									
2025-10	185833176	9492320304	I	2025/11/11	2025/10/17	\$230,000							

RESUMEN DE PAGO													
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$129,100	\$0	\$0	\$129,100					
PROTECCION	230201	800,225,739	0	1	\$129,100	\$0	\$0	\$129,100					
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100,900	\$0	\$0	\$100,900					
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,086,702	2	1	\$100,900	\$0	\$0	\$100,900					
TOTAL				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000					

2025/10/16 09:05 p. m.

C	EPS Destino	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
		Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
	\$100,000					\$0						\$0						\$0					\$0	
	\$100,000					\$0						\$0						\$0					\$0	
	\$100,000					\$0						\$0						\$0					\$0	
\$0	\$100,000		0		\$0	\$0			\$0	0	1	\$0	0		\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$100,000					\$0						\$0						\$0					\$0	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NIT: 908694010 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANIZALES DEPARTAMENTO CALLE 82 23 22 TELÉFONO: 01 EMPLEADOR C.A.S. RAMIREZ DE SERVICIOS DE SALUD TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SUFICIAL SUCURSAL APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA L. C.I.F. (REFORMA TRIBUTARIA)		NÚMERO PLANILLA: 7795071457 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2025 FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2025/11/13 MIS: noviembre AÑO: 1928510111	
NIT: 908694010 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANIZALES DEPARTAMENTO CALLE 82 23 22 TELÉFONO: 01 EMPLEADOR C.A.S. RAMIREZ DE SERVICIOS DE SALUD TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SUFICIAL SUCURSAL APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA L. C.I.F. (REFORMA TRIBUTARIA)		NÚMERO PLANILLA: 7795071457 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2025 FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2025/11/13 MIS: noviembre AÑO: 1928510111	

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR
23001	23001-PORTENIR	3	\$ 250.000	1	1	1	1	\$ 1.200	\$ 360.000
23001	23001-PROTECCION	1	\$ 35.224	1	1	1	1	\$ 300	\$ 300.000
SUBTOTAL:									\$ 360.000

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA INACTIVIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACIÓN		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR
23001	23001-PORTENIR	3	\$ 1.200	1	1	1	\$ 1.200	1	\$ 1.200
23001	23001-PROTECCION	1	\$ 300	1	1	1	\$ 300	1	\$ 300
SUBTOTAL:									\$ 1.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR		LICUACIÓN		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR
23001	23001-PORTENIR	3	\$ 1.200	1	1	1	\$ 1.200	1	\$ 1.200
23001	23001-PROTECCION	1	\$ 300	1	1	1	\$ 300	1	\$ 300
SUBTOTAL:									\$ 1.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR		LICUACIÓN		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR
23001	23001-PORTENIR	3	\$ 1.200	1	1	1	\$ 1.200	1	\$ 1.200
23001	23001-PROTECCION	1	\$ 300	1	1	1	\$ 300	1	\$ 300
SUBTOTAL:									\$ 1.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		AFP		PAPAS	
Nº	NOMBRES	TIPO	TIPO DE	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
1	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR
2	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION
3	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR
4	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION	23001-PROTECCION
SUBTOTAL:									

TOTAL PAGADO: \$ 591.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION						TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	APORTES VOLUNTARIOS		MORA		MORA		VALOR PAGADO	
		EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACION	MORA		
230301	230301-PORVENIR		4	\$ 114,306	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114,306	
25-14	25-14 COL.PENSIONES		1	\$ 108,306	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 108,806	
230201	230201 - PROTECCION		2	\$ 12,200	\$ 0	\$ 15,200	\$ 0	\$ 27,400	
231001	231001-COL.FONDOS		1	\$ 7,600	\$ 0	\$ 102	\$ 0	\$ 7,702	
TOTAL				\$ 242,412	\$ 0	\$ 16,702	\$ 0	\$ 259,114	

[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																				
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN		INCAPACIDAD RP		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LÍQUIDACIÓN		APORTES		MOVA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	B			VALOR	VALOR		P. ANELA	VALOR			COTIZACIÓN			\$ 118.300	\$ 118.300	\$ 900	\$ 0		
14-11						\$ 0		\$ 0	\$ 0			\$ 0			\$ 118.300	\$ 118.300	\$ 900	\$ 0		
	14-11 - ARL SUBA														\$ 118.300	\$ 118.300	\$ 900	\$ 0		
SUB-TOTALES:																\$ 118.300	\$ 118.300	\$ 900	\$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
ADMINISTRADORA		NOMBRE	
CÓDIGO		No. COTIZANTES	TOTALES
COF11	COF11-GCF DECALDAS	8	
		APORTES	MOBIA
		\$ 66,500	\$ 300
		\$ 66,500	\$ 300
		VALOR PAGADO	
		\$ 66,800	
		\$ 66,800	
SUB-TOTALES:			

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 517.700
---------------	------------

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION							TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COLTANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP*	MORA	FSP	MORA	VALOR PAGADO
				EMPLEADOR	COTIZANTE					
23001	23001-PORTUENIR	10	\$ 714.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 716.70
23001	23001-PROTECCION	7	\$ 440.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.800
25-14	25-14-CAPENSIONES	5	\$ 331.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332.70
TOTAL:										\$ 1.491.200

[illegible][illegible]


TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
CÓDIGO	NOMBRE	No COLIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES
ECEH1	ECEH1-CGF DE CALONS	22	\$ 305'100	\$ 1'403	\$ 306'508
			\$ 305'100	\$ 1'403	\$ 306'508
					\$ 307'910
					\$ 1'000

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 2.790.700
---------------	--------------



Fecha creación reporte: 2025-12-09 09:34:57 AM

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:	Periodo de 2025
noviembre de 2025	noviembre de 2025	noviembre de 2025

PAGADO 09/12/2025

Razón Social	INCIVIL PRO SAS		
Documento	N1900604010	Dirección	CL 62CRA #23 - 22
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	3204552654
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	Departamento	CALDAS
Representante Legal	PATÍÑO TORRES ALEXANDER	Identificación	CC 16077530
Total Afiliados	2	ARP	ARL SUPA

[illegible]

III. TOTALES																
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sera	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes M/in Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 2.847.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199.200	\$ 600	\$ 199.000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Total	Afiliados(1)
-------	---------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1033750048		CORTES ILLANOS LEYDY ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 4 4 c 02	VILLAMARIA-CALDIAS	3106552034	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1943325489	9493746749	I	2025/12/11	2025/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	\$513,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
TOTAL				1	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: 900004010 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOCHU CALDAS DIRECCIÓN: MANIZALES DEPARTAMENTO: CALLE 62 23 22 TELEFONO: 01-EMPLEADOR: CLASE APORTANTE: BIENES DE 200 COTIZANTES FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 900004010 NOMBRE: NOCHU CALDAS DIRECCIÓN: MANIZALES DEPARTAMENTO: CALLE 62 23 22 TELEFONO: 01-EMPLEADOR: CLASE APORTANTE: BIENES DE 200 COTIZANTES FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 7995199445 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 12/09 FECHA PAGO (masivamente): 2025 12/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2025 12/09		MIS: noviembre AÑO: 2025 MIS: diciembre AÑO: 2025		E-EMPLEADOS: 2025 190333449	
--	--	---	--	---	--	--	--	--------------------------------	--

TOTAL APORTES A PENSION									
APORTES VOLUNTARIOS									
CÓDIGO	FECHA	PROTECCIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD	FSP	MORA
20001	20001-1	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-2	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-3	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-4	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-5	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
TOTAL APORTES A SALUD									
LIQUIDACIÓN									
SALDO A FAVOR									
CÓDIGO	FECHA	PROTECCIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
20001	20001-1	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-2	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-3	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-4	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-5	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES									
LIQUIDACIÓN									
SALDO A FAVOR									
CÓDIGO	FECHA	PROTECCIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
20001	20001-1	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-2	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-3	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-4	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-5	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES									
LIQUIDACIÓN									
SALDO A FAVOR									
CÓDIGO	FECHA	PROTECCIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
20001	20001-1	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-2	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-3	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-4	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-5	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
LIQUIDACIÓN									
SALDO A FAVOR									
CÓDIGO	FECHA	PROTECCIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
20001	20001-1	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-2	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-3	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-4	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-5	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
LIQUIDACIÓN									
SALDO A FAVOR									
CÓDIGO	FECHA	PROTECCIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
20001	20001-1	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-2	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-3	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-4	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-5	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
LIQUIDACIÓN									
SALDO A FAVOR									
CÓDIGO	FECHA	PROTECCIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
20001	20001-1	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-2	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-3	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-4	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20001	20001-5	PROTECCIÓN	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	NOCHU CALDAS	\$ 1.032.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200
SUBTOTAL:									\$ 5.187.200



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: 01-EMPLEADOR	MANUALES: 01-EMPLEADOR	NÚMERO PLANILLA: 799519945	TIPO DE PLANILLA: 2025
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ	DEPARTAMENTO: BOGOTÁ	PERÍODO AUTOLIQUIDACIÓN SALUD: 2025	PERÍODO AUTOLIQUIDACIÓN SALUD: 2025
DIRECCIÓN: CALLE 62 23 22	TELÉFONO: 871832	FECHA PAGO: (aaaa/mm/aa): 2025/12/09	FECHA PAGO: (aaaa/mm/aa): 2025/12/09
FORMA DE PRESENTACIÓN: 01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: 01-EMPLEADOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 199283349	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 199283349
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑALE ICIF (REFORMA TRIBUTARIA):			
SUCURSAL: 17-AEROPUERTO			
SUCURSAL / DEPENDENCIA: SI			

TOTAL PAGADO: \$ 3.260.900



[illegible]



IncivilPro

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

ALEXANDER PATIÑO TORRES identificado con cedula de ciudadanía No. **16.077.530** en mi condición de Representante Legal de **INCIVILPRO SAS** identificada con NIT **900.604.010-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MIGUEL GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. **19.189.793** y con tarjeta profesional No. 26824-T de la Junta central de Contadores de Colombia representante legal de **REVISORES FISCALES ASOCIADOS S.A** identificada con NIT **810.003.102-5** en mi condición de Revisor Fiscal de **INCIVILPRO SAS** identificada con NIT **900.604.010-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales a los 9 días del mes de diciembre de 2025.

Alexander Patiño Torres
Representante legal
Incivilpro SAS
Nit. 900.604.010-1
c.c. 16.077.530

Miguel Gustavo Jimenez Velasquez
Revisor Fiscal
Incivilpro SAS
c.c. 19.189.793
TP. 26824-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.189.793**

JIMENEZ VELASQUEZ
APELLIDOS

MIGUEL GUSTAVO
NOMBRES

[Signature]
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **08-JUL-1952**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-ENE-1974 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS DELINDO VARGAS



A-0600100-35184493-M-0019189793-20071128 0049307331M 02 225846670

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

26824-T

MIGUEL GUSTAVO
JIMENEZ VELASQUEZ
C.C. 19189793
RESOLUCION INSCRIPCION 773
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 1890/04/95



PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PENA **14381**

FIRMA DEL TITULAR **1051**


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2020B1B10809B159

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19189793 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 26824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

[illegible][illegible]

FIRMADO: 
 Representante legal a sueldo del Contralor
 Matricula No. 17923-44749 CLD

Firmado: 
 Representante de Contralor de Inspeccion
 Matricula No. 17923-44737 CLD

