

# INFORME CONTRATISTA DE OBRA

---

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

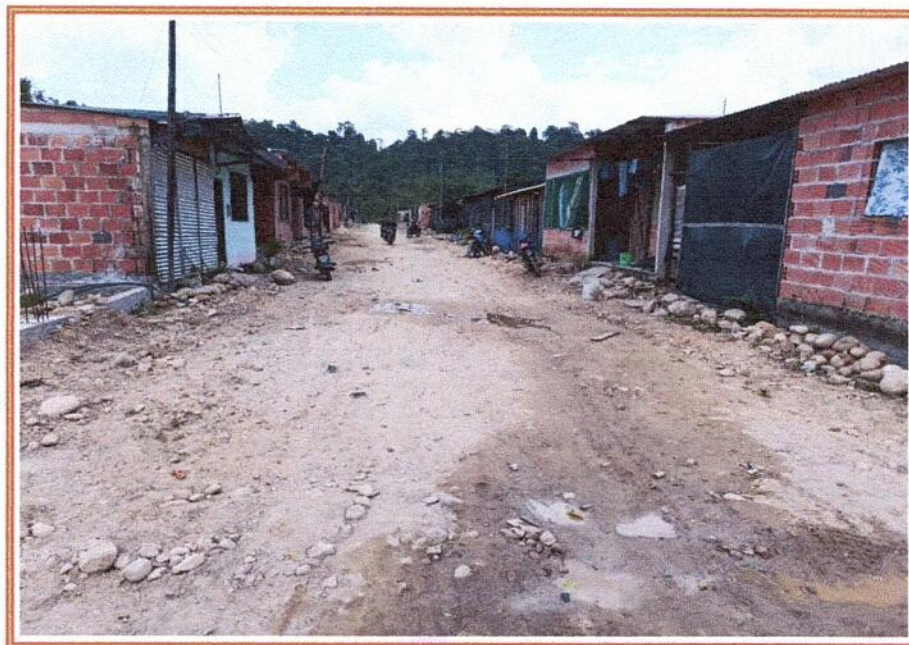
Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca

**INFORME FINAL DE OBRA**

**CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

**OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ,  
BOYACÁ"**



**CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS  
TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**

**SUPERVISOR: JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS**

**UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CUBARÁ  
CUBARÁ BOYACÁ**

## Contenido

1.0 INTRODUCCIÓN.....	5
2.0 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	6
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	6
2.3 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO.....	6
2.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....	7
2.5 INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC – 032 – 2025.....	9
Tabla 1 – Aspectos generales del contrato de obra No. SAM – 032 - 2025.....	9
2.5.1 POBLACIÓN BENEFICIADA.....	10
2.5.2 BENEFICIOS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO.....	10
3.0 INFORMACIÓN JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC – 032 – 2025.....	11
3.1 CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS.....	11
3.1.1 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4:.....	11
Tabla – 2 Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales. ....	11
3.1.2 POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.....	12
Tabla – 3 Póliza seguro de responsabilidad civil extracontractual.....	12
3.1.3 AMPLIACIÓN DE POLIZAS.....	12
3.1.3.1 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4.....	12
Tabla – 4 Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales. ....	12
3.1.3.2 POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.....	13
Tabla – 5 Póliza seguro de responsabilidad civil extracontractual.....	13
3.2 CONTROL DE ADICIONALES AL PLAZO.....	13
3.3 CONTROL CONTRATO ADICIONALES AL VALOR.....	13
3.4 ACCIONES LEGALES.....	13
3.4.1 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES.....	14
4.5 ACTAS TRAMITADAS.....	14
Tabla – 6 Actos Administrativos, Contrato de obra No. SAMC-032-2025.....	14

4.0 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA.....	15
4.1 CONTROL DEL PERSONAL.....	15
4.1.1 PERSONAL VINCULADO EN PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA.....	15
PERSONAL ADMINISTRATIVO.....	15
Tabla – 7 Personal administrativo del contrato de obra No. SAMC-032-2025. ....	15
PERSONAL OPERATIVO.....	15
Tabla – 8 Personal operativo del contrato de obra No. SAMC-032-2025. ....	16
4.2 CONTROL DE EQUIPOS.....	17
Tabla – 9 Equipos y herramientas de obra, contrato No. SAMC-032-2025.....	18
4.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA.....	18
4.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA.....	18
5.0 INFORMACIÓN TECNICO DE OBRA.....	19
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	19
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA.....	19
5.2 RESUMEN DE LAS CANTIDADES DE OBRA.....	26
Tabla - 10 Cantidades iniciales del contrato de obra No. SAMC-032-2025.....	26
5.2.1 CANTIDADES SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL.....	27
Tabla – 11 Cantidades de obra según acta recibo final contrato obra No. SAMC-032-2025 ....	27
6.0 INFORMACIÓN FISICA Y FINANCIERA DE OBRA No. SAMC-032-2025.....	28
6.1 RELACIÓN AVANCE FINANCIERO DE OBRA No. SAMC-032-2025.....	28
Tabla – 12 Cuadro de avance físico y financiero.....	28
6.1.1 GRAFICO AVANCE OBRA No. SAMC.032-2025, CONTRACTUAL VS EJECUTADO.....	30
6.2 AVANCE FINANCIERO GENERAL DE OBRA No. SAMC-032-2025.....	30
6.2.1 GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL DE OBRA CON PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR CAPITULO.....	30
6.3 RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO.....	31
Tabla – 13 Tabla de resumen de tiempo contractual.....	31
7.2 SEGUIMIENTO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.....	32
7.3 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO.....	32
7.4 INFORME DE IMPREVISTOS.....	32




---

7.5 RELACIÓN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO FIRMADO POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL .....	33
7.6 COPIA DE ANTECEDENTES, TARJETA PROFESIONAL Y CÉDULA DEL CONTADOR(A) PÚBLICO(A) .....	33
7.7 SOPORTES DE JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO .....	33
7.8 COPIA DE EXTRACTOS BANCARIOS.....	33
7.9 SOPORTE DE PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	33
7.10 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.....	33
8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	34
8.1 RECOMENDACIONES .....	35



## 1.0 INTRODUCCIÓN

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE, celebró el contrato de obra No. SAM-032-2025, con la alcaldía municipal de cubará, el cual tiene por objeto la "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ", según estudios previos y diseños, el contrato contempla las cantidades de obra requeridas para realizar la optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Cubará.

Para el desarrollo de su ejecución el contratista ha desplazado la herramienta y mano de obra exigidos por el ente contratante, asegurando la calidad de los trabajos realizados.

En el presente informe se realiza una descripción general de las diferentes actividades realizadas en el desarrollo de la obra en el periodo comprendido desde el 11 de diciembre del 2025 hasta el 22 de diciembre del 2025, cuando se firmó el acta de recibo final.

## 2.0 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

### 2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Cubará, Boyacá, presenta actualmente limitaciones en la cobertura del sistema de acueducto en el barrio seis de febrero, zona en proceso de consolidación urbanística, donde un número importante de viviendas que aún no dispone de conexión formal al sistema de distribución de agua potable. Esta situación obliga a los habitantes a recurrir a medios alternativos poco seguros para su abastecimiento, afectando las condiciones de salubridad y bienestar de la comunidad. Además, se evidencia la necesidad de reforzar la red en sectores como Puerto Nuevo (Parte alta), Caserío Gualanday y la calle 2 entre carrera 1 y carrera 2, donde la presión y capacidad del sistema actual resultan insuficientes para atender la demanda existente.

La ejecución de estas obras permitirá optimizar el sistema hidráulico del casco urbano, mejorar la presión y calidad del suministro, y garantizar el acceso formal al servicio de acueducto a nuevas familias del municipio.

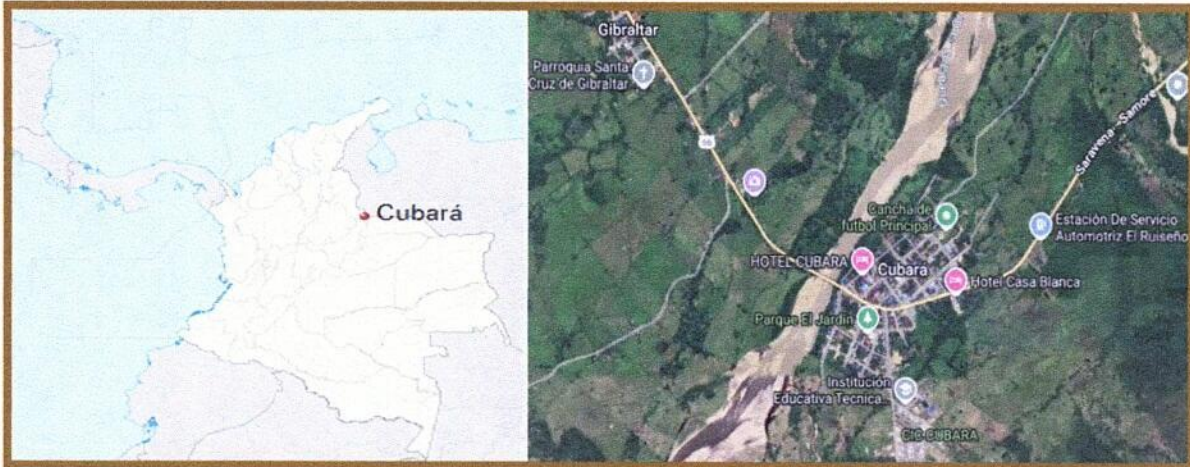
### 2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Cubará es un municipio situado en el extremo nororiental del departamento de Boyacá, en la región del Sarare, en la subregión del Piedemonte Llanero de la Orinoquía colombiana, a una altitud de 357 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 25 °C, lo que lo sitúa en un clima cálido fresco. Se extiende sobre la planicie en la ribera del río Cobraría (afluente del río Arauca).

### 2.3 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló en el municipio de cubará en el departamento de Boyacá con coordenadas 7°00'03" N, 72°06'29" O, específicamente en los barrios barrio seis de febrero, sector de Puerto Nuevo parte alta, Caserío Gualanday, calle 2 entre carreras 1 y 2.

Imagen 1 – Localización general del proyecto



Fuente: Contratista

## 2.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Constitución Política señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Por ende, toda actuación del Estado y de los particulares debe estar encaminada al cumplimiento de estas como lo señala el artículo 209 Constitucional el cual dispone que la "función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

Que, como parte de la organización del Estado Colombiano, los municipios adquieren relevancia, toda vez que materializan la descentralización y se convierten en un instrumento para el cumplimiento progresivo de los fines esenciales, al respecto la Constitución indica:

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

De lo anterior se entiende que es responsabilidad del municipio de Cubará garantizar el acceso a servicios públicos, en especial en lo que respecta al acueducto. En cumplimiento de dicho mandato constitucional, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas adelantó diferentes visitas en el sector urbano del municipio e identificó cuatro sectores que requieren de atención y son: Barrio seis de febrero, Puerto Nuevo parte alta, caserío Gualanday, calle 2 entre carreras 1 y 2.

Para atender esta necesidad, el municipio ha proyectado la ampliación y optimización del sistema de acueducto urbano, mediante la instalación de 467,33 metros de tubería de 2 pulgadas de diámetro y 57 acometidas domiciliarias en el barrio seis de febrero. Complementariamente, se ejecutará la instalación de 211,50 metros en el sector de Puerto Nuevo parte alta, 250 metro en el Caserío Gualanday y 186,80 metros sobre la calle 2 entre carrera 1 y carrera 2. Estas intervenciones buscan fortalecer la red de distribución existente, ampliando su alcance y garantizando un servicio continuo y eficiente.

Fundamentados en esta necesidad, se adelantó el proceso contractual que dio lugar a la firma del contrato de obra No. SAMC-032-2025, Celebrado entre la alcaldía municipal de Cubará y CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S., cuyo objeto es: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

Las cantidades contempladas en contrato son:

1 OBRAS PRELIMINARES

1.01 CONTROL TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

2.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO

2.02 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)

2.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC, D = 2" RDE 21 / 200 PSI (UNIÓN MECÁNICA).

2.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DE DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO).

2.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.

2.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21 – 200 PSI UNIÓN PLATINO D = 2"

2.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RADI CORTO 90° PVC REDE 21 – 200 PSI UNIÓN PLATINO D = 2"

2.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21 – 200 PSI D= 2"

2.09 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70 X 70 X 70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA).

El valor del contrato es de \$148.152.179,83 m/cte., con un tiempo contractual de quince (15) días contados a partir de la fecha de inicio del contrato de obra.

## 2.5 INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC – 032 – 2025

**Tabla 1 – Aspectos generales del contrato de obra No. SAM – 032 - 2025**

CONTRATO DE OBRA No. SAM – 032 – 2025	
Fecha de legalización:	10 DE OCTUBRE DE 2025
Objeto del contrato:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ
Valor del contrato:	\$148.152.179,83 M/CTE
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
NIT:	901878498-0
Plazo inicial:	QUINCE (15) DIAS
Acta de inicio:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Acta de recibo final:	22 DE DICIEMBRE 2025
Supervisor:	ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Unidad responsable:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CUBARÁ

Fuente: Contratista

### 2.5.1 POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiada con esta obra es del área urbana del municipio de cubará, especialmente la de los barrios seis de febrero, Puerto Nuevo parte alta, caserío Gualanday, calle 2 entre carreras 1 y 2.

### 2.5.2 BENEFICIOS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecución de estas obras permitirá optimizar el sistema hidráulico del casco urbano, mejorar la presión y calidad del suministro, y garantizar el acceso formal al servicio de acueducto a nuevas familias del municipio.

La optimización del sistema hidráulico del casco urbano, no solo mejora la presión y calidad del suministro, sino que actúa como un motor de desarrollo para toda la comunidad.

La optimización de un sistema de acueducto genera beneficios que impactan la salud pública, la economía local y la sostenidad ambiental.

El proyecto genera impacto social y ambiental, en cuanto a salud pública, el acceso a agua segura reduce drásticamente la mortalidad infantil y las consultas médicas por parásitos o infecciones.

Tiene impacto en la valoración de predios, las viviendas en sectores con servicios públicos optimizados tienden a aumentar su valor comercial.

Con la ejecución de este proyecto se realiza la protección del recurso hídrico, al perder menos agua por fugas y optimizar la captación, se ejerce una menor presión sobre los ríos y fuentes hídricas, permitiendo su conservación para futuras generaciones.

### 3.0 INFORMACIÓN JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC – 032 – 2025

#### 3.1 CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS

De acuerdo con las garantías exigidas por la Alcaldía municipal de Cubará en el contrato de obra No. SAMC – 032 – 2025, se suscribe con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías, teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLAUSULA 18 del contrato así:

#### 3.1.1 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

##### ESTATALES- DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4:

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 10 de diciembre del 2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomadas por CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S. y como beneficiario LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CUBARA.

**Tabla – 2 Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales.**

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	10 / 12 / 2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 - 47 - 994000075022	\$ 14.815.218,00	10 / 12 / 2025	10 / 04 / 2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			\$ 59.260.872,00	10 / 12 / 2025	25 / 04 / 2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEPNIZACIONES			\$ 7.407.609,00	10 / 12 / 2025	25 / 12 / 2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA			\$ 29.630.436,00	VER NOTA ACLARATORIA	

Fuente: Contratista

#### OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. SAMC-032 DEL 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

### NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (02) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

### 3.1.2 POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

**Tabla – 3 Póliza seguro de responsabilidad civil extracontractual**

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	10 / 12 / 2025	PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 - 74 - 994000013080	\$ 284.700.000,00	10 / 12 / 2025	26 / 12 / 2025

### 3.1.3 AMPLIACIÓN DE POLIZAS

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según acta de inicio el 17 de diciembre del 2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomadas por CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S. y como beneficiario LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CUBARÁ

#### 3.1.3.1 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4

**Tabla – 4 Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales.**

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	17 / 12 / 2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 - 47 - 994000075022	\$ 14.815.218,00	11 / 12 / 2025	10 / 04 / 2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			\$ 59.260.872,00	11 / 12 / 2025	25 / 04 / 2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEPNIZACIONES			\$ 7.407.609,00	11 / 12 / 2025	25 / 12 / 2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA			\$ 29.630.436,00	VER NOTA ACLARATORIA	

Fuente: Contratista

### NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (02) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

### 3.1.3.2 POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

**Tabla – 5 Póliza seguro de responsabilidad civil extracontractual**

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	17 /12 / 2025	PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 - 74 - 994000013080	\$ 284.700.000,00	26 /12 / 2025	27 / 12 / 2025

Fuente: Contratista

### 3.2 CONTROL DE ADICIONALES AL PLAZO

NO APLICA

### 3.3 CONTROL CONTRATO ADICIONALES AL VALOR

NO APLICA

### 3.4 ACCIONES LEGALES

El contratista deberá ejecutar el objeto contractual en cumplimiento de las especificaciones, condiciones y características técnicas establecidas mediante resolución No. 0486 del 2025 en el cual la entidad abrió proceso de contratación número SAMC-032-2025 y adjudicado al contratista mediante resolución No. 0518 de 2025.

### 3.4.1 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del presente contrato no se presentaron ni se inició ningún proceso de multa o sanción al contratista CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.

### 4.5 ACTAS TRAMITADAS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la pecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

**Tabla – 6 Actos Administrativos, Contrato de obra No. SAMC-032-2025**

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO	PARTES INTERVINIENTES
11/12/2025	ACTA DE INICIO	Suscripción de acta de inicio del contrato No. SAMC-032-2025. Actualización de pólizas de garantías en los términos establecidos en la minuta del contrato.	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S. Contratista.  JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Supervisor.
22/12/2025	ACTA DE RECIBO FINAL	Suscripción de acta de recibo final del contrato No. SAMC-032-2025. Actualización de pólizas de garantías en los términos establecidos en la minuta del contrato y según acta final.	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S. Contratista.  JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Supervisor.  GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde del municipio de Cubara

Fuente: Contratista

#### 4.0 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA

##### 4.1 CONTROL DEL PERSONAL

El contratista CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S., vinculo el personal administrativo, técnico, auxiliar y operativo, requerido para la ejecución de la obra, de acuerdo al alcance de la misma. Realizando con anterioridad las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y riesgo laboral. Los respectivos aportes de seguridad social, riesgo laboral y parafiscales fueron verificados por la supervisión de obra.

##### 4.1.1 PERSONAL VINCULADO EN PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA

###### PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal profesional y administrativo que laboro en obra durante el periodo de ejecución, se encuentra relacionado en la siguiente tabla:

**Tabla – 7 Personal administrativo del contrato de obra No. SAMC-032-2025.**

SEGURIDAD SOCIAL – MES: DICIEMBRE DE 2025										
DATOS GENERALES							AFILIADO A:			No. PLANILLA
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSI ON	ARL	
1	HENRY BORRERO MERCHAN	88255608	ING. RESIDENTE DE OBRA	11/12/2025	22/12/2025	12	X	X	X	9496675702

###### PERSONAL OPERATIVO

La mano de obra no calificada, fue realizada por personal del sitio de influencia, se vinculó personal con idoneidad para realizar las actividades con acompañamiento profesional, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

El personal operativo contratado para el desarrollo de la obra fue personal de la región dando cumplimiento a los compromisos sociales adquiridos con la entidad contratante y la comunidad. El personal operativo se relaciona en la siguiente tabla:

**Tabla – 8 Personal operativo del contrato de obra No. SAMC-032-2025.**

SEGURIDAD SOCIAL – MES: DICIEMBRE DE 2025										No. PLANILLA
DATOS GENERALES							AFILIADO A:			
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	ARL	
1	JUAN CARLOS ARIAS ANGARITA	1193562874	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
2	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	1094268169	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
3	CRISTIAN CAMILO BOTELLO BOTELLO	1116495975	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
4	JOSE JOAQUIN BUITREGO TORRES	9467091	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
5	ISLEY XIMENA CANO CASTELLA	1002300321	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
6	JOSE ELMER CAPACHO SANTIAGO	96168446	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
7	BRYAN CARRENO CARRILLO	1005540444	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
8	LUIS ALFREDO CARRENO FLOREZ	1094243847	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
9	LIBARDO CARRILLO GEREDA	88305094	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
10	RIQUELME CASTELLANOS ROJAS	1049393798	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
11	JOSE LUIS CASTRO SEPULVEDA	1007545309	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
12	JOHAN SEBASTIAN CONTRERA SANGARITA	1090252140	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
13	ESTENGEL SOLVEN FLOREZ GUTIERREZ	1049395011	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
14	LUIS ALBERTO GAMBOA MARTINEZ	1049393965	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
15	JOSE ELADIO	9466847	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca

	HERNANDEZ SUAREZ									
16	JORGE ELIECER LOZANO MEDINA	1116869139	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
17	RUBEN DARIO MENDEZ RINCON	1094370153	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
18	ADENAWER MENDOZA HERNANDEZ	1049634979	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
19	ELKIN YOHANY QUINONEZ VERA	1007406486	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
20	DEINER ARMANDO RODRIGUEZ RUBIO	1049397270	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
21	JOSE GONZALO SANTAFA CASTELLANOS	1049395560	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
22	JESUS ADRIAN SANTAFA ESTEVEZ	1002300325	AYUDANTE	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
23	YERLEY URIEL SANTOS SOLANO	1007228814	OFICIAL	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702
24	LUIS FRANCISCO TOROZONA COBARIA	9467070	OFICIAL	11/12/2025	19/12/2025	12	X	X	X	9496675702

En el tiempo de ejecución de la obra, al personal vinculado tanto administrativo como operativo, se le realizó el pago de los salarios conforme a lo acordado mediante contrato laboral (verbal o escrito) y así mismo se realizó la liquidación conforme a la ley, una vez se desvincularon laboralmente.

#### 4.2 CONTROL DE EQUIPOS

Durante la ejecución del contrato No. SAMC-032-2025, se hizo necesario la utilización de equipos o maquinaria pesada, como Rana (vibro compactador), las demás actividades a ejecutar requerían de personal, mano de obra y herramienta menor. Todos los procesos constructivos se llevaron a cabo de manera manual, utilizando herramienta menor como palas, picas, barras, pisón manual, nivel de mano, entre otras herramientas similares categorizadas como herramienta menor.

**Tabla – 9 Equipos y herramientas de obra, contrato No. SAMC-032-2025**

HERRAMIENTAS O EQUIPOS	UNIDAD	CANTIDAD
HERRAMIENTA MENOR (PALAS, PICAS, BARRAS, PALINES, PISIONES MANUALES, NIVEL DE MANO...)	GLB	1
RANA (VIBRO COMPACTADOR)	UND	1

#### 4.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA

En esta obra se hizo necesario la utilización de una Rana para la compactación de terreno, las demás actividades se realizaron con herramienta menor

#### 4.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA



Fuente: Contratista

## 5.0 INFORMACIÓN TECNICO DE OBRA

### 5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de obra No. SAMC-032-2025, se inició el 11 de diciembre de 2025 y terminó con acta de recibo final el 22 de diciembre de 2025.

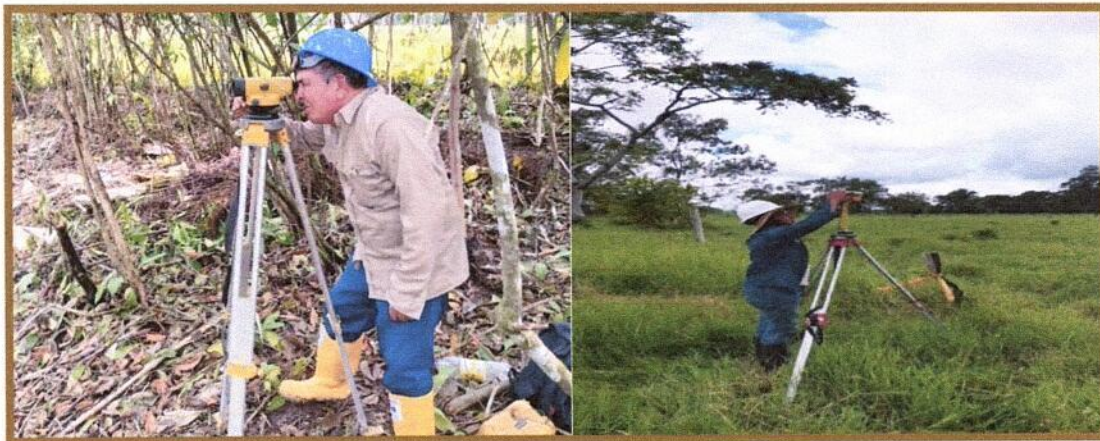
#### 5.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

##### 1 OBRAS PRELIMINARES

Las obras preliminares comprenden el conjunto de actividades iniciales necesarias para preparar el área de intervención, garantizar condiciones adecuadas de seguridad, acceso y control técnico, y permitir la correcta ejecución de las obras del acueducto urbano conforme a los diseños aprobados y la normatividad vigente.

##### 1.01 CONTROL TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA

El control topográfico y replanteo general de la obra corresponde al conjunto de actividades técnicas necesarias para materializar en campo el diseño del acueducto urbano, garantizando que la ejecución se realice conforme a los planos aprobados, especificaciones técnicas y normas vigentes. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



## 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las actividades necesarias para la excavación, conformación y relleno de zanjas y áreas requeridas para la instalación del sistema de acueducto urbano, así como el suministro e instalación de la red de acueducto urbano, garantizando la hermeticidad, alineación y correcta operación hidráulica del sistema.

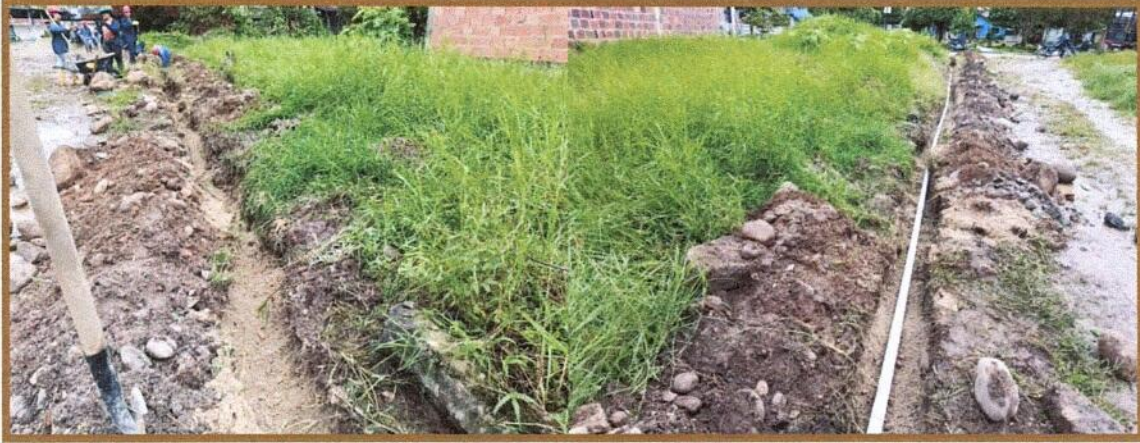
### 2.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO

Correspondiente a la excavación realizada manualmente en terreno compuesto por material conglomerado (mezcla natural de grava, arena y finos parcialmente cementados), para la conformación de zanjas y excavaciones requeridas en la instalación de redes de acueducto urbano, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas vigentes. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



### 2.2 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)

comprende el suministro, transporte, colocación, extendido y compactación de arena limpia y seleccionada, destinada a la protección y soporte de la tubería instalada en zanjas del sistema de acueducto urbano, conforme a los planos, especificaciones técnicas y normas vigentes. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



### 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).

comprende el suministro, transporte, acopio, instalación y puesta en servicio de tubería en PVC de 2 pulgadas de diámetro nominal, relación diámetro–espesor RDE 21, con presión nominal de trabajo de 200 PSI, utilizando unión mecánica, para la conducción de agua potable en redes de acueducto urbano, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normatividad vigente. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



**2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO).**

comprende el suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de la acometida domiciliaria desde la red principal de acueducto de 2 pulgadas hasta la conexión domiciliaria de 1/2 pulgada, garantizando el adecuado suministro y control del consumo de agua potable, conforme a los planos, especificaciones técnicas y normatividad vigente. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



**2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.**

comprende el suministro, colocación, extendido y compactación de material seleccionado proveniente de la excavación, destinado al relleno de zanjas y áreas intervenidas durante la construcción del sistema de acueducto urbano, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normatividad vigente. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



## 2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"

comprende el suministro, transporte, acopio, instalación y puesta en funcionamiento de una TEE en PVC de 2 pulgadas de diámetro nominal, relación diámetro–espesor RDE 21, con presión nominal de 200 PSI, equipada con unión tipo platino, destinada a la derivación de la red de acueducto urbano, conforme a los planos, especificaciones técnicas y normatividad vigente. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



## 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RADIO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"

comprende el suministro, transporte, acopio, instalación y puesta en funcionamiento de un codo de radio corto a 90° en PVC, de 2 pulgadas de diámetro nominal, RDE 21, con presión nominal de 200 PSI, provisto de unión tipo platino, destinado a cambios de dirección en la red de acueducto urbano, conforme a los planos, especificaciones técnicas y normatividad vigente. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



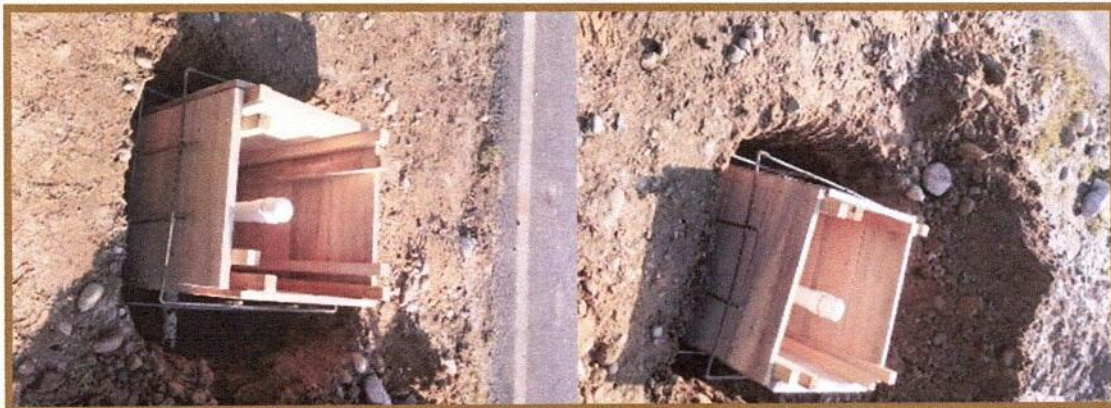
## 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"

comprende el suministro, transporte, acopio, instalación y puesta en funcionamiento de un tapón de lavado en PVC, de 2 pulgadas de diámetro nominal, RDE 21, con presión nominal de 200 PSI, destinado a labores de purga, lavado y mantenimiento de la red de acueducto urbano, conforme a los planos, especificaciones técnicas y normatividad vigente. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



### **2.9 CAJAS DE INSPECCION DE 70 X 70 X 70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)**

comprende la construcción, suministro e instalación de cajas de inspección en concreto reforzado, con dimensiones internas de 70 × 70 × 70 cm, destinadas a la protección, acceso y operación de válvulas, accesorios, medidores u otros elementos del sistema de acueducto urbano, conforme a los planos, especificaciones técnicas y normatividad vigente. Actividad realizada con personal idóneo y acompañamiento profesional de obra.



## 5.2 RESUMEN DE LAS CANTIDADES DE OBRA

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las cantidades de obra ejecutadas en el contrato No. SAMC-032-2025, desde el 11 de diciembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, donde se firma el acta de recibo final y las actividades se encuentran 100% terminadas.

**Tabla - 10 Cantidades iniciales del contrato de obra No. SAMC-032-2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)
1.	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.1	CONTROL TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA	ML	1.201,13	\$ 3.169,00	\$ 3.806.380,97
2.	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	231,22	\$145.758,00	\$ 33.702.164,76
2.2	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	101,87	\$ 147.025,00	\$ 14.977.436,75
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	1.115,63	\$ 47.229,00	\$ 52.690.089,27
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO).	UND	57,00	\$ 505.582,00	\$ 28.818.174,00
2.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	126,12	\$ 53.559,00	\$ 6.754.861,08
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UND	5,00	\$ 193.010,00	\$ 965.050,00
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RADIO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UND	13,00	\$ 138.323,00	\$ 1.798.199,00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

NIT 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca

2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	UND	8,00	\$ 40.776,00	\$ 326.208,00
2.9	CAJAS DE INSPECCION DE 70 X 70 X 70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)	UND	8,00	\$ 539.202,00	\$ 4.313.616,00
<b>Subtotal</b>					<b>\$148.152.179,83</b>

## 5.2.1 CANTIDADES SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL

Tabla – 11 Cantidades de obra según acta recibo final contrato obra No. SAMC-032-2025

CONDICIONES CONTRACTUALES FINALES						CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA FINAL		TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)
1.	OBRAS PRELIMINARES								
1.1	CONTROL TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA	ML	1.201,13	\$ 3.169,00	\$ 3.806.380,97	1.201,13	\$ 3.806.381,00	1201,13	\$ 3.806.380,97
2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS								
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	231,22	\$ 145.758,00	\$ 33.702.164,76	231,22	\$ 33.702.164,76	231,220	\$ 33.702.164,76
2.2	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	101,87	\$ 147.025,00	\$ 14.977.436,75	101,87	\$ 14.977.436,75	101,870	\$ 14.977.436,75
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	1.115,63	\$ 47.229,00	\$ 52.690.089,27	1.115,63	\$ 52.690.089,27	1115,630	\$ 52.690.089,27
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF = UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO).	UND	57,00	\$ 505.582,00	\$ 28.818.174,00	57,00	\$ 28.818.174,00	57,000	\$ 28.818.174,00
2.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	126,12	\$ 53.559,00	\$ 6.754.861,08	126,12	\$ 6.754.861,08	126,120	\$ 6.754.861,08
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UND	5,00	\$ 193.010,00	\$ 965.050,00	5,00	\$ 965.050,00	5,000	\$ 965.050,00
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RADIO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UND	13,00	\$ 138.323,00	\$ 1.798.199,00	13,00	\$ 1.798.199,00	13,000	\$ 1.798.199,00
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	UND	8,00	\$ 40.776,00	\$ 326.208,00	8,00	\$ 326.208,00	8,000	\$ 326.208,00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

NIT 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca

2.9	CAJAS DE INSPECCION DE 70 X 70 X 70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)	UND	8,00	\$ 539.202,00	\$ 4.313.616,00	8,00	\$ 4.313.616,00	8,000	\$ 4.313.616,00
<b>Subtotal</b>					<b>\$148.152.179,83</b>		<b>\$148.152.160,00</b>		<b>\$148.152.179,83</b>

## 6.0 INFORMACIÓN FISICA Y FINANCIERA DE OBRA No. SAMC-032-2025

Durante la ejecución del contrato de obra No. SAMC-032-2025, desde el 11 de diciembre de 2025 hasta 22 de diciembre de 2025, se llevo a cabo un seguimiento continuo al avance físico y financiero, presentando en este informe el 100% de las actividades contractuales ejecutadas. No se presentan modificaciones ni adiciones en tiempo y ni en valor.

### 6.1 RELACIÓN AVANCE FINANCIERO DE OBRA No. SAMC-032-2025

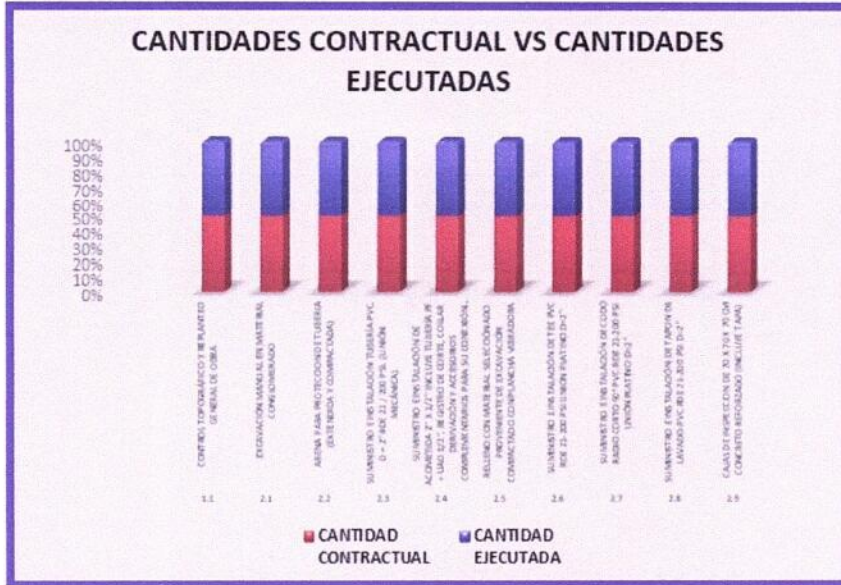
A continuación, se detalla la relación entre el avance físico y financiero de cada una de las actividades ejecutadas, según las condiciones contractuales.

**Tabla – 12 Cuadro de avance físico y financiero**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	% AVANCE
1.	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>					
1.1	CONTROL TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA	ML	1.201,13	\$ 3.169,00	\$ 3.806.380,97	100%
2.	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	231,22	\$145.758,00	\$ 33.702.164,76	100%
2.2	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	101,87	\$ 147.025,00	\$ 14.977.436,75	100%
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	1.115,63	\$ 47.229,00	\$ 52.690.089,27	100%

2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO).	UND	57,00	\$ 505.582,00	\$ 28.818.174,00	100%
2.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	126,12	\$ 53.559,00	\$ 6.754.861,08	100%
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UND	5,00	\$ 193.010,00	\$ 965.050,00	100%
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RADIO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UND	13,00	\$ 138.323,00	\$ 1.798.199,00	100%
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	UND	8,00	\$ 40.776,00	\$ 326.208,00	100%
2.9	CAJAS DE INSPECCION DE 70 X 70 X 70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)	UND	8,00	\$ 539.202,00	\$ 4.313.616,00	100%
<b>Subtotal</b>					<b>\$148.152.179,83</b>	<b>100%</b>

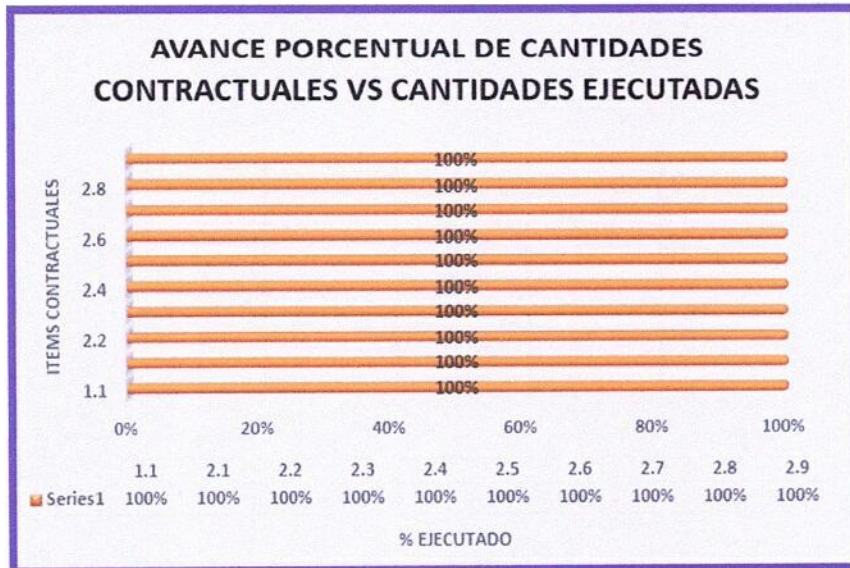
## 6.1.1 GRAFICO AVANCE OBRA No. SAMC.032-2025, CONTRACTUAL VS EJECUTADO



## 6.2 AVANCE FINANCIERO GENERAL DE OBRA No. SAMC-032-2025

El valor ejecutado del contrato, corresponde al valor contractual presente en la Minuta del contrato con un valor de \$ 148.152.179,83, siendo este el 100% del valor de obra, no se presentaron adicionales ni sobrecostos a lo presente en el contrato.

### 6.2.1 GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL DE OBRA CON PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR CAPITULO.



### 6.3 RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

El contrato cuenta con un plazo inicial de ejecución de quince (15) días, contados a partir del 11 de diciembre de 2025. Durante su desarrollo no se presentaron prórrogas, suspensiones, ni ampliaciones de plazo. A la fecha del presente informe final de obra, con acta de recibo final a 22 de diciembre de 2025.

**Tabla – 13 Tabla de resumen de tiempo contractual**

CONCEPTO	DETALLE / VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$148.152.179,83
VALOR ANTICIPOS	N/A
VALOR ACTA FINAL	\$148.152.179,83
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
NÚMERO DE ACTAS DE PAGO	UNO (1) SOLO PAGO ACTA DE RECIBO FINAL

## 7.0 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

### 7.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el balance financiero del contrato, que resume los ingresos, egresos y saldos del proyecto. Este incluye el detalle de pagos realizados, valores ejecutados, saldos pendientes y conclusiones sobre la gestión financiera del contrato.

A continuación, se presenta la tabla resumen del control financiero del contrato No. SAMC-032-2025, en la cual se detallan los valores consignados, el porcentaje de avance y acumulado, así como el valor efectivamente pagado. Esta información permite verificar el cumplimiento presupuestal del contrato en su totalidad.

Tabla – 14 Cuadro resumen informe financiero

CONCEPTO	FECHA DEL ACTA	VALOR ACTA / AVANCE EJECUCIÓN	% DE AVANCE DEL INFORME	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR A PAGAR (O PAGADO)
ANTICIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTA RECIBO FINAL	22 / 12 / 2025	\$148.152.179,83	100%	100%	\$148.152.179,83
TOTALES		\$148.152.179,83	100%	100%	\$148.152.179,83

### 7.2 SEGUIMIENTO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El contrato No. SAMC-032-2025, NO TUVO ANTICIPO, se generó un pago único del 100% del contrato. Por tal razón no genero rendimientos financieros.

### 7.3 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

No aplica. No hubo anticipo, solo pago único al concluir la obra.

### 7.4 INFORME DE IMPREVISTOS

NO APLICA

---

**7.5 RELACIÓN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO FIRMADO POR CONTADOR PÚBLICO Y**

**REPRESENTANTE LEGAL**

NO APLICA, NO HUBO ANTICIPO

**7.6 COPIA DE ANTECEDENTES, TARJETA PROFESIONAL Y CÉDULA DEL CONTADOR(A)  
PÚBLICO(A)**

NO APLICA

**7.7 SOPORTES DE JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO**

NO APLICA

**7.8 COPIA DE EXTRACTOS BANCARIOS**

NO APLICA

**7.9 SOPORTE DE PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7.10 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

NO APLICA

## 8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ De acuerdo con la ejecución del contrato de obra No. SAMC-032-2025, a la fecha de corte del presente informe 22 de diciembre de 2025, se presenta el siguiente avance en tiempo 100%, avance físico 100%, correspondiente a las actividades contractuales.
- ❖ EL avance de ejecución de la obra al corte del presente informe 22 de diciembre de 2025 es de \$148.152.179,83 y representa el 100% del valor del contrato y un avance en tiempo de 100%.
- ❖ La ejecución del contrato de obra se desarrolló conforme a las condiciones establecidas en el contrato y sus documentos anexos, cumpliendo con los parámetros de calidad, cantidad, oportunidad y seguridad exigidos por la Entidad contratante.
- ❖ Se completaron satisfactoriamente todas las actividades del objeto contractual, contribuyendo al bienestar de la comunidad y al desarrollo regional.
- ❖ Las obras ejecutadas, tales como excavaciones, instalación de tubería, rellenos y demás actividades asociadas, cumplen con los estándares de calidad requeridos y han sido verificadas mediante supervisión técnica en campo.
- ❖ El avance físico registrado evidencia un progreso acorde con el cronograma de obra, sin que se presenten retrasos significativos que afecten el cumplimiento del plazo contractual.
- ❖ Los materiales empleados en la ejecución del acueducto cumplen con las normas técnicas exigidas (tuberías, accesorios, arena de soporte, entre otros), garantizando la funcionalidad y durabilidad del sistema.
- ❖ Las actividades realizadas contribuyen de manera directa al mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable para la comunidad beneficiaria.

## 8.1 RECOMENDACIONES

- ✦ Hacer uso responsable del acueducto, así como mantenimientos preventivos y optimización del mismo.
- ✦ Realizar control de fugas, esto con el fin de detectar y reparar fugas en la red y minimizar el desperdicio.
- ✦ Realizar monitoreo y seguimiento constante a la calidad del agua y el rendimiento del sistema, realizando programas de mantenimiento, según sean necesarios.

Elaboro,



  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
ING. RESIDENTE  
M.P. 54202188036 NTS  
CONTRATO OBRA No SAMC-032-2025



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS  
**TRUJILLO**  
De La Fuente

---

---

# VALLA INFORMATIVA

---

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

NIT 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca

VALLA INFORMATIVA

**CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
**OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

NIT 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca

# NOMINAS DEL PERSONAL UTILIZADO



**CONTRATO DE OBRA SAMC-032-2025**  
**PERIODO DE PAGO: 11 DE DICIEMBRE DE 2025 - 22 DE DICIEMBRE 2025**  
**OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ**

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	DL	VALOR D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO	DESCUENTOS			FIRMA DEL TRABAJADOR
													EPS	PEN	T. DEB.	
1 HENRY ESCOBEDO MERICANI	86254608	RESECURITE DE OBRA	100.000,00	14	1.400.000			21.875		15.625	0		56.000	112.000	1.288.000	<i>Henry Escobedo</i>
2 YERLEY LUREL SANTOS SOLANO	1.007.228.814	OFICIAL	85.767,00	9	771.903			18.762		13.401	0		30.876	61.752	710.151	<i>Yerley Solano</i>
3 LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARRA	94.670.070	OFICIAL	85.767,00	9	771.903			18.762		13.401	0		30.876	61.752	710.151	<i>Luis Francisco Cobarra</i>
4 ADEMARHER MEDICOZA HERNANDEZ	1.045.634.973	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Ademar Hernandez</i>
5 JOSE LUIS CASTRO SEPALVEA	100.754.399	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Jose Luis Castro</i>
6 ELIURY YOHANY OLIVERA VERA	1.007.498.486	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Eliury Olivera</i>
7 CRISTIAN BOTELLO BOTELLO	1.118.495.975	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Cristian Botello</i>
8 BRAVANO CARRERO CARRERO	1.095.546.444	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Bravano Carrero</i>
9 JOSE ELADIO HERNANDEZ SUAREZ	9.465.847	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Jose Eladio Suarez</i>
10 LUIS ALBERTO GAMBORA MARTINEZ	1.040.393.965	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Luis Alberto Gambora</i>
11 RUBEN DARIO MENDEZ RINCON	1.094.370.153	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Ruben Dario Rincon</i>
12 ISLEY XIMENA CAMO CASTELLANOS	1.003.300.321	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Isley Ximena Camo</i>
13 JOSE ELMER CAPACHO SANTIBAGO	96.198.446	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Jose Elmer Capacho</i>
14 DENNER ARMANDO RODRIGUEZ RUBIO	1.049.397.270	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Denner Armand Rodriguez</i>
15 LUIS ALFREDO CARRERO FLOREZ	1.094.243.847	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Luis Alfredo Carrero</i>
16 JUAN CARLOS ANIAS ANGARITA	1.193.562.874	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Juan Carlos Anias</i>
17 LEONARDO CARRERO GARCIA	88.305.954	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Leonardo Carrero</i>
18 ESTENEL FLOREZ GUTIERREZ	1.049.395.011	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Estenel Florez</i>
19 JORGE ELECCEL LOZANO MEDINA	1.116.699.139	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Jorge Eleccel Lozano</i>
20 JOHAN SEBASTIAN CONTRERAS ANGARITA	1.099.252.140	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785			13.970		9.979	0		22.991	45.983	528.802	<i>Johan Sebastian Contreras</i>

21	JOSE JOAQUIN BUITRAGO TORRES	9.467.991	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785	13.970	9.979	0	22.991	22.991	45.983	528.802	Jose Joaquin B.
22	RICHELME CASTELLANOS ROJAS	1.046.292.798	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785	13.970	9.979	0	22.991	22.991	45.983	528.802	Reynold C.
23	JOSE GONZALO SANTIAGO CASTELLANOS	1.046.395.960	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785	13.970	9.979	0	22.991	22.991	45.983	528.802	Jose Carlos S.
24	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	1.004.268.169	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785	13.970	9.979	0	22.991	22.991	45.983	528.802	CRISTIAN FABIAN B.
25	HERLEY GAMBOA ANGARITA	1.046.292.812	AYUDANTE	63.865,00	9	574.785	13.970	9.979	0	22.991	22.991	45.983	528.802	Herley Gamboa A.

<b>TOTALES</b>				<b>12.070.485</b>	<b>0</b>	<b>45.983</b>	<b>45.883</b>	<b>91.966</b>	<b>13.053.950</b>
----------------	--	--	--	-------------------	----------	---------------	---------------	---------------	-------------------

APORTES		TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL + PARAFISCALES		PROVISIONES		PAGOS TOTALES			
SENA	2%	241.409,70		CESANTIAS	8,33%	0	EPS	12,5%	1.508.810,63
I.C.B.F	3%	362.114,55		PRIMA	8,33%	0	PENSION	16%	1.931.277,60
CAJA DE COMPENSACION	4%	482.819,40	5.366.538	VACACIONES	4,17%	0	ARP	6,960%	840.105,76
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>1.086.343,65</b>		<b>INTERESES</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.280.194</b>

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
 R/L - DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA  
 NIT: 901878498-0

# SEGURIDAD SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

---

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca



# SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL UTILIZADO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca



Centro de Trabajo: ACUDUCTO CUBARA 2025 (25 Afiliados)		CUBARA Depto: BOYACA (25 Afiliados)		\$18,445,006	\$2,933,400	\$18,445,006	\$740,100	\$19,213,538	\$769,300	\$18,445,006	\$1,284,100	\$0	\$0	\$5,747,100
				\$18,445,006	\$2,933,400	\$18,445,006	\$740,100	\$19,213,538	\$769,300	\$18,445,006	\$1,284,100	\$0	\$0	\$5,747,100
				\$702,515	\$112,500	\$702,515	\$26,200	\$731,786	\$29,300	\$702,515	\$48,900	\$0	\$0	\$218,900
1	CC	119356234	JUAN ANGARITA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			JUAN CARLES											
			BOCOTA BOCOTA											
			CHRISTIAN FABIAN											
2	CC	1094248189	BORRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			MERCAN HENRY											
3	CC	88255608	BOTELLO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			CHRISTIAN CAMILO											
4	CC	1116495975	BUTRAGO TORRES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			JOSE JOAQUIN											
5	CC	9467091	CANO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			CASTELLANOS											
			SLEY AMEDIA											
6	CC	1002300321	CAPACHO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			SANTIMO JOSE											
7	CC	96168446	ELMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	CC	100550444	CARRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			CARRILLO BRYAN											
9	CC	1094248147	CARRERO FLOREZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			LUIS ALFREDO											
10	CC	86305094	CARRILLO GEREDES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			LIBARDO											
11	CC	1049393798	CASTELLANOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ROJAS RIQUELME											
12	CC	1007545309	CASTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			SEPULVEDA JOSE											
			LUIS											
13	CC	1090252140	CONTRERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ANGARITA JOHAN											
			SEBASTIAN											
14	CC	1049395011	FLOREZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			GUTIERREZ											
			ESTERCEL SOLVEN											
15	CC	1049393965	CAMERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			MARTINEZ LUIS											
			ALBERTO											
16	CC	9466847	HERNANDEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ELADIO											
17	CC	1116669139	LOZANO MEDINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			JORGE ELIECER											
18	CC	1094370153	MENDEZ RINCON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			RUBEN DARIO											
19	CC	10494534979	MENDOZA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			HERNANDEZ											
			ADENAWER											
20	CC	1007406486	QUIROZ VERBA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ELKIN YOHANY											
21	CC	1049397270	RODRIGUEZ RUBIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			JOHNER AMARILLO											
22	CC	1002300325	SANTAFE ESTEVEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			JESUS ADRIAN											
23	CC	1049395560	SANTAFE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			CASTELLANOS											
			JOSE GONZALO											
24	CC	100728814	SANTOS SOLANO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			YEBLEY URIEL											
25	CC	9467070	TARAZONA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			LUIS											
			FRANCISCO											
<b>Total Afiliados( 25)</b>						\$18,445,006	\$740,100	\$19,213,538	\$769,300	\$18,445,006	\$1,284,100	\$0	\$0	\$5,747,100

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				25	\$2,953,400	\$0	\$0	\$2,953,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$713,500	\$0	\$0	\$713,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$2,014,900	\$0	\$0	\$2,014,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,284,100	\$0	\$0	\$1,284,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	\$1,284,100	\$0	\$0	\$1,284,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$769,500	\$0	\$0	\$769,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	25	\$769,500	\$0	\$0	\$769,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	\$740,100	\$0	\$0	\$740,100
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	1	\$28,200	\$0	\$0	\$28,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	\$298,600	\$0	\$0	\$298,600
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$103,100	\$0	\$0	\$103,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	10	\$282,000	\$0	\$0	\$282,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$28,200	\$0	\$0	\$28,200
<b>TOTAL</b>				<b>25</b>	<b>\$5,747,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,747,100</b>

# CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

---

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca

## CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: FERRETERIA LA CAMPANA SARARE S  
Producto: TB ACU 2 UM RDE21 200PSI 6M  
Trazabilidad: 9251021041

Fecha: 23.12.2025  
Nro: 2601-25

Norma de referencia: NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC)  
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
<b>DIMENSIONES</b>				
Diámetro Exterior Promedio	mm	60.17	60.47	60.26
Ovalamiento Diámetro	mm		1.52	0.55
Espesor de Pared -P	mm	2.87	3.38	3.04
Presión de Rotura 23°C	MPa	4.34		4.95
Resistencia al Impacto	J	40.7		108.8
<b>ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS</b>				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
<b>ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)</b>				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
<b>INSPECCIÓN VISUAL</b>				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE
<b>UNIÓN MECÁNICA - NTC 2295</b>				
Presión Interna 50% PN		No debe presentar goteo,perdida presión		CUMPLE
Presión Interna 2.5 Veces PN		No debe presentar goteo,perdida presión		CUMPLE
Presión de Rotura 23°C		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
Ensayo de Vacío		No debe presentar fuga durante el ensayo		CUMPLE

### CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



# BITACORA DE OBRA

---

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

NIT 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca



## CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Jueves 11/12/2025

Localización: MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ

Hoja Número: 03

Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARÁ

contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA

Contrato N° SAMC-032-2025

Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ingeniero	1	Topógrafo		Tuberos		Soleado		X
Maestro		Cadeneros		Almacenista		Seco		
Oficial	2	Operarios		Ornamentador		Nublado	X	
Ayudantes	22	HSE		Electricista		Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	X	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet
						Conos	Cintas reflectivas	X
							Señales preventivas	X

## Actividades Desarrolladas

Se realiza defa de inicio, realizan localizaciones, recorrido y replanteo general de obra e inician las excavaciones manuales.

Jueves 11/12/2025 → Continúan con las excavaciones manuales en material conglomerado e instalación de arena para protección de tubería (extendida y compactada), descarga de materiales en sitio.

- Suministro e instalación de tubería PVC. D = 2" RDE 21/200 PSI (unión mecánica), tubería instalada con arena para protección.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
Herramienta menor (pallas, picas, barras, palines...)	Varios	3	Si		No	X
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	
EXCELENTE.... 1	BUENO .... 2	DEFICIENTE.... 3				

Residente de Obra

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S  
ING. HENRY BORRERO MERCHAN  
INGENIERO RESIDENTE  
M.P. 54202-188036NTS

Supervisor de Obra

ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Otro Ente



CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 12 / 12 / 2025 Localizacion: MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ Hoja Número: 04

Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARÁ contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA

Contrato N° SAMC-032-2025 Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "

Table with columns: Personal en Obra (Cargo, Cantidad), Estado del Tiempo / Duración (a.m., p.m.), seguridad industrial (Casco, Botas, Guantes, Gafas, Carnet), señalizacion (Conos, Cintas reflectivas, Señales preventivas)

Actividades Desarrolladas: Viernes 12 / 12 / 2025 - Se continua con la excavación manual, la instalación de arena para protección de tubería y el suministro e instalación de tubería pvc 2" RPE 21 / 200 PSI. (union mecanica), se realiza suministro e instalación de acometida 2" x 1/2" incluye tubería PF + UAD 1/2", registro de corte, collarín derivación y accesorios complementarios para su conexión (incluye caja de inspección y medidor volumétrico)

Table with columns: Equipos en Obra (Descripción, Cant., Estado), Accidentes en Obra (Ocurrió Algun Accidente?, Hubo Lesión?)

Residente de Obra: ING. HENRY BORRERO MERCHAN, INGENIERO RESIDENTE, M.P. 54202-188036NTS

Supervisor de Obra: ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Otro Ente



**CONTROL DE OBRA**

**BITACORA DIARIA DE OBRA**

<b>Fecha:</b> 13 / 12 / 2025	<b>Localización:</b> MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ	<b>Hoja Número:</b> 05
<b>Entidad Contratante:</b> ALCALDIA DE CUBARÁ	<b>contratista:</b> CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA	
<b>Contrato N° SAMC-032-2025</b>	<b>Objeto:</b> "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "	

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ingeniero	1	Topógrafo		Tuberos		Soleado	X	
Maestro		Cadeneros		Almacenista		Seco		
Oficial	2	Operarios		Ornamentador		Nublado		
Ayudantes	22	HSE		Electricista		Lluvia Pasajera		X
						Lluvioso		

seguridad industrial					señalización										
Cascos	X	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet		Conos		Cintas reflectivas	X	Señales preventivas	X

**Actividades Desarrolladas**

Sábado 13 / 12 / 2025 → - Continúa el suministro e instalación de acometidas 2" x 1/2" incluye tubería PF + UAD 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios para su conexión (incluye caja de inspección y medidor volumétrico).  
 - Se realiza suministro e instalación de tee PVC RPE 21-2000 PSI unión platino D=2"



Equipos en Obra				Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?			
Herramienta menor (palas, picas, barros, palines...)	Varios	3.		Si		No	X
				Hora:			
				Nombre:			
				Cargos:			
				Actividad que Desempeñaba:			
				Hubo Lesión?			
				Si		No	



EXCELENTE.... 1                      BUENO .... 2                      DEFICIENTE..... 3



Residente de Obra  
 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S  
 ING. HENRY BORRERO MERCHAN  
 INGENIERO RESIDENTE  
 M.P. 54202-188036NTS



Supervisor de Obra  
 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Otro Ente

		CONTROL DE OBRA						
		BITACORA DIARIA DE OBRA						
Fecha: 14 / 12 / 2025		Localización: MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ			Hoja Número: 06			
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARÁ			contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA					
Contrato N° SAMC-032-2025		Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ingeniero	1	Topógrafo		Tuberos		Soleado		
Maestro		Cadeneros		Almacenista		Seco		
Oficial	2	Operarios		Ornamentador		Nublado		
Ayudantes	22	HSE		Electricista		Lluvia Pasajera	x	x
						Lluvioso		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	X	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet
						Conos		Cintas reflectivas
								Señales preventivas
							X	X
Actividades Desarrolladas								
Día Domingo → No se realizaron labores.								
Equipos en Obra						Accidentes en Obra		
Descripción		Cant.	Estado			Ocurrió Algun Accidente?		
						Si	No	X
						Hora:		
						Nombre:		
						Cargo:		
						Actividad que Desempeñaba:		
						Hubo Lesión?		
						Si	No	
EXCELENTE.... 1		BUENO .... 2		DEFICIENTE..... 3				
 Residente de Obra CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S ING. HENRY BORRERO MERCHAN INGENIERO RESIDENTE M.P. 54202-188036NTS				Supervisor de Obra ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS				
Otro Ente								

		CONTROL DE OBRA						
		BITACORA DIARIA DE OBRA						
Fecha: 15 / 12 / 2025		Localización: MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ			Hoja Número: 07			
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARÁ			contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA					
Contrato N° SAMC-032-2025		Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ingeniero	1	Topógrafo		Tuberos		Soleado		
Maestro		Cadeneros		Almacenista		Seco		
Oficial	2	Operarios		Ornamentador		Nublado		X
Ayudantes	22	HSE		Electricista		Lluvia Pasajera	X	
						Lluvioso		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	X	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet
						Conos		Cintas reflectivas X
								Señales preventivas X
Actividades Desarrolladas								
<p>Lunes 15 / 12 / 2025 → Continúa el suministro e instalación de tee pvc RDE 21 - 200 PSI unión platino D=2"</p> <p>- se termina el suministro e instalación de tubería pvc .D=2" RDE 21/200 PSI (Unión mecánica)</p> <p>- se termina el suministro e instalación de acometida 2"x 1/2" incluye tubería PE 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios para su conexión (incluye caja de inspección y medidor volumétrico)</p> <p>- se realiza relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado con plancha vibradora (Ranex).</p>								
Equipos en Obra						Accidentes en Obra		
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?			
Herramientas menor (pala, picas, barros, palines ...)		Varios	3		Si	No		X
Ranex		1	3		Hora:			
					Nombre:			
					Cargo:			
					Actividad que Desempeñaba:			
					Hubo Lesión?			
					Si	No		
EXCELENTE.... 1		BUENO .... 2		DEFICIENTE.... 3				
 Residente de Obra CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S ING. HENRY BORRERO MERCHAN INGENIERO RESIDENTE M.P. 54202-188036NTS				Supervisor de Obra ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS				
Otro Ente								

		CONTROL DE OBRA						
		BITACORA DIARIA DE OBRA						
Fecha: 16/12/2025		Localización: MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ			Hoja Número: 08			
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARÁ		contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA						
Contrato N° SAMC-032-2025		Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ingeniero	1	Topógrafo		Tuberos		Soleado	X	X
Maestro		Cadeneros		Almacenista		Seco		
Oficial	2	Operarios		Ornamentador		Nublado		
Ayudantes	22	HSE		Electricista		Lluvia Pasajera		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	X	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet
		Conos		Cintas reflectivas	X	Señales preventivas	X	
Actividades Desarrolladas								
<p>Martes 16/12/2025 → se termina el suministro e instalación de fee PVC RDE 21-200 PSI unión platino D=2"</p> <p>- se realiza suministro e instalación de codo radio corto 90° PVC RDE 21-200 PSI unión platino D=2"</p> <p>- Continúa el relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactada con plancha vibradora (Rama)</p>								
Equipos en Obra						Accidentes en Obra		
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?			
Herramienta menor		Varios	3		Si	No		X
Plancha Vibradora (Kraier)		1	3					
					Hora:			
					Nombre:			
					Cargo:			
					Actividad que Desempeñaba:			
					Hubo Lesión?			
					Si	No		
EXCELENTE.... 1		BUENO .... 2		DEFICIENTE..... 3				
 Residente de Obra CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S ING. HENRY BORRERO MERCHAN INGENIERO RESIDENTE M.P. 54202-188036NTS				Supervisor de Obra ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS				
Otro Ente								

		CONTROL DE OBRA						
		BITACORA DIARIA DE OBRA						
Fecha: 17/12/2025		Localización: MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ			Hoja Número: 09			
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARÁ		contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA						
Contrato N° SAMC-032-2025		Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ingeniero	1	Topógrafo		Tuberos		Soleado		
Maestro		Cadeneros		Almacenista		Seco		
Oficial	2	Operarios		Ornamentador		Nublado		
Ayudantes	22	HSE		Electricista		Lluvia Pasajera	X	X
seguridad industrial						señalización		
Cascos	X	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet
Conos		Cintas reflectivas	X	Señales preventivas	X			
Actividades Desarrolladas								
<p>Miércoles 17/12/2025 → se terminó el suministro e instalación de codo radio corto 90° PVC RDE 21-200 PSI unión platino D=2"</p> <p>- se realizó el suministro e instalación de tapon de lavadero PVC RDE 21-200 PSI D=2"</p> <p>- Continúa el relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora (rana)</p>								
Equipos en Obra					Accidentes en Obra			
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?			
Herramienta menor		varios	3		Si	No		X
plancha vibradora (rana)		1	3		Hora:			
					Nombre:			
					Cargo:			
					Actividad que Desempeñaba:			
					Hubo Lesión?			
					Si	No		
EXCELENTE.... 1		BUENO .... 2		DEFICIENTE.... 3				
 Residente de Obra CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S ING. HENRY BORRERO MERCHAN INGENIERO RESIDENTE M.P. 54202-188036NTS				Supervisor de Obra ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS				
Otro Ente								



CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 18/12/2025 Localizacion: MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ Hoja Número: 10

Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARÁ contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA

Contrato N° SAMC-032-2025 Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "



Table with columns: Personal en Obra (Cargo, Cantidad), Estado del Tiempo / Duración (a.m., p.m.), seguridad industrial, señalizacion

Actividades Desarrolladas
Jueves 18/12/2025 -> Se termina el suministro e instalación de fapon de lavado PVC RPE 21-200 PSI D=2"
- Se realiza la instalación de cajas de inspección de 70x70x70 cm. concreto reforzado (incluye fapon)
- Se continua el relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora (Rama)

Table with columns: Equipos en Obra (Descripción, Cant., Estado), Accidentes en Obra (Ocurrió Algun Accidente?, Hubo Lesión?)

Residente de Obra
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S
ING. HENRY BORRERO MERCHAN
INGENIERO RESIDENTE
M.P. 54202-188036NTS

Supervisor de Obra
ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

		CONTROL DE OBRA							
		BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 19/12/2025			Localización: MUNICIPIO DE CUBARÁ - BOYACÁ				Hoja Número: 11		
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARÁ			contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA						
Contrato N° SAMC-032-2025		Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA "							
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
Ingeniero	1	Topógrafo		Tuberos		Soleado	X	X	
Maestro		Cadeneros		Almacenista		Seco			
Oficial	2	Operarios		Ornamentador		Nublado			
Ayudantes	21	HSE		Electricista		Lluvia Pasajera			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	X	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet	
		Conos		Cintas reflectivas	X	Señales preventivas	X		
Actividades Desarrolladas									
<p>Viernes 19/12/2025 -&gt; se termina la instalación de captos de inspección de 70x70x70cm concreto reforzado (incluye tapa)</p> <p>- Se termina el relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora (Rana)</p> <p>- Orden y aseo general de obra.</p>									
Equipos en Obra				Accidentes en Obra					
Descripción		Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?					
Herramienta menor		Varios	3	Si		No	X		
Rana		1	3	Hora:					
				Nombre:					
				Cargo:					
				Actividad que Desempeñaba:					
				Hubo Lesión?					
				Si		No			
EXCELENTE.... 1		BUENO .... 2		DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S ING. HENRY BORRERO MERCHAN INGENIERO RESIDENTE M.P. 54202-188036NTS				Supervisor de Obra ARQ. JESUS IVAN QUIÑONE RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS					
Otro Ente									

# REGISTRO FOTOGRAFICO

---


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498


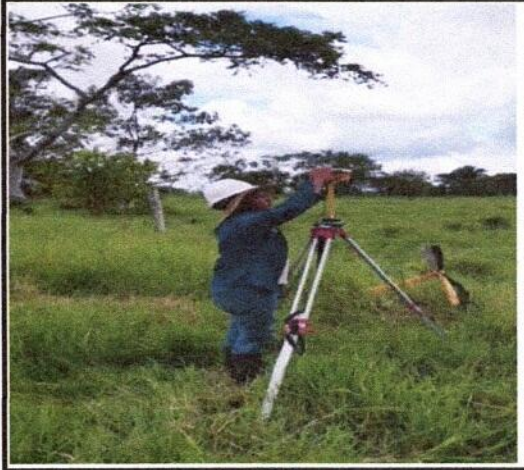
[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca

	<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025
<b>CONTRATO No.:</b>	<b>SAMC-032-2025</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>	
<b>OBJETO:</b>	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>	
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>	

**REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025**

<b>1</b>	<b>1 OBRAS PRELIMINARES</b> <b>1.1 CONTROL TOPOGRAFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA</b>	<b>2</b>	<b>1 OBRAS PRELIMINARES</b> <b>1.1 CONTROL TOPOGRAFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA</b>
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	

<b>3</b>	<b>1 OBRAS PRELIMINARES</b> <b>1.1 CONTROL TOPOGRAFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA</b>	<b>4</b>	<b>1 OBRAS PRELIMINARES</b> <b>1.1 CONTROL TOPOGRAFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA</b>
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	



# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

## REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

<b>5</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	<b>6</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	

<b>7</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	<b>8</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	



# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	SAMC-032-2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
UBICACIÓN:	BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.

## REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>9</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>10</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO
					

<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>11</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>12</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO
					



## REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE  
OBRA No.SAMC-  
032-2025

CONTRATO No.:	SAMC-032-2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
UBICACIÓN:	BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

13	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.2 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	14	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.2 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)
	FOTOGRAFÍA No. 		FOTOGRAFÍA No. 
15	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.2 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	16	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.2 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)
	FOTOGRAFÍA No. 		FOTOGRAFÍA No. 



## REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE  
OBRA No.SAMC-  
032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

### REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

<b>17</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.2 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	<b>18</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.2 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	
<b>19</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.2 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	<b>20</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.2 ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	



**REGISTRO FOTOGRAFICO**

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025**

<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>21</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" RDE 21/200PSI (UNIÓN MECÁNICA)	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>22</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" RDE 21/200PSI (UNIÓN MECÁNICA)
					
<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>23</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" RDE 21/200PSI (UNIÓN MECÁNICA)	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>24</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" RDE 21/200PSI (UNIÓN MECÁNICA)
					



# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

## REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

<b>25</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" RDE 21/200PSI (UNIÓN MECÁNICA)	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	
<b>26</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" RDE 21/200PSI (UNIÓN MECÁNICA)	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	
<b>27</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" RDE 21/200PSI (UNIÓN MECÁNICA)	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	
<b>28</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" RDE 21/200PSI (UNIÓN MECÁNICA)	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	



## REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE  
OBRA No.SAMC-  
032-2025

CONTRATO No.:	SAMC-032-2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
UBICACIÓN:	BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.

### REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

29	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO)	30	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO)
	FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.
31	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO)	32	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO)
	FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.







## REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE  
OBRA No.SAMC-  
032-2025

CONTRATO No.:	SAMC-032-2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
UBICACIÓN:	BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.

### REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

<b>33</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO)	<b>34</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO)
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	

<b>35</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO)	<b>36</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO)
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	



# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

## REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

**37**

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

FOTOGRAFÍA No.

**38**

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

FOTOGRAFÍA No.

**39**

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

FOTOGRAFÍA No.

**40**

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

FOTOGRAFÍA No.







# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

## REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

<b>41</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	<b>42</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
<b>FOTOGRAFÍA No.</b>		<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	

<b>43</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	<b>44</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
<b>FOTOGRAFÍA No.</b>		<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	





## REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE  
OBRA No.SAMC-  
032-2025

CONTRATO No.:	SAMC-032-2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
UBICACIÓN:	BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

45	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	FOTOGRAFÍA No.	
	46		2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"
47	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	FOTOGRAFÍA No.	
	48		2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"



# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

## REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>49</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>50</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"
<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>51</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>52</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"



## REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE  
OBRA No.SAMC-  
032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

### REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

53	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	FOTOGRAFÍA No.	
54	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	FOTOGRAFÍA No.	
55	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	FOTOGRAFÍA No.	
56	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	FOTOGRAFÍA No.	







**REGISTRO FOTOGRAFICO**

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

**REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025**

<b>57</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	<b>58</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	

<b>59</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	<b>60</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"
FOTOGRAFÍA No.		FOTOGRAFÍA No.	



# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	SAMC-032-2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
UBICACIÓN:	BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

61	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"		62	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	
	FOTOGRAFÍA No.			FOTOGRAFÍA No.	

63	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"		65	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	
	FOTOGRAFÍA No.			FOTOGRAFÍA No.	

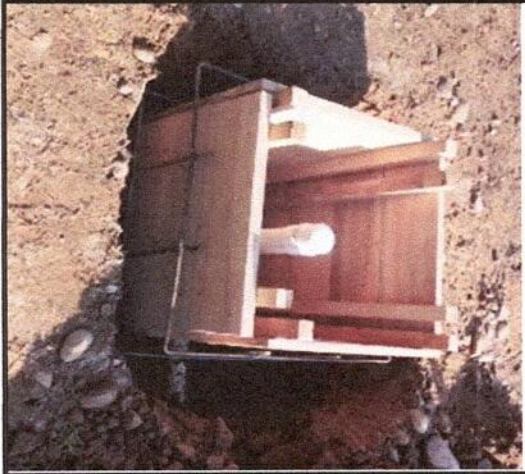
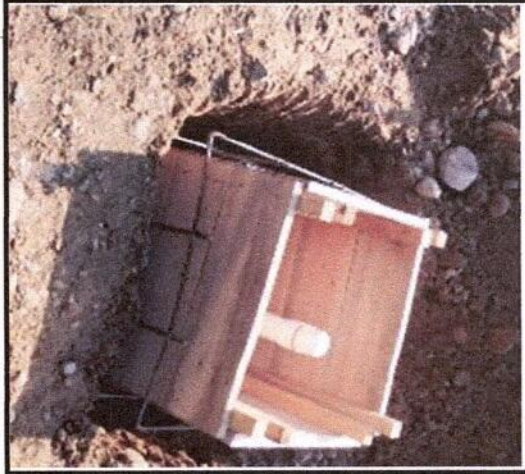


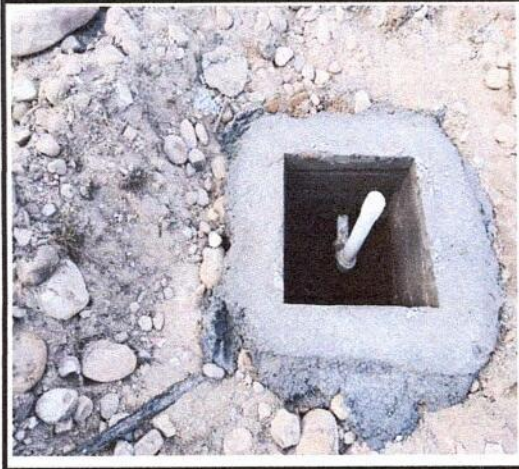
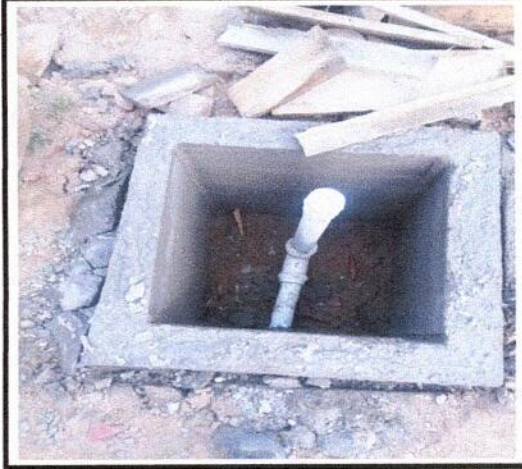
# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No.SAMC-032-2025

CONTRATO No.:	<b>SAMC-032-2025</b>
CONTRATISTA:	<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S. R/L. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA</b>
OBJETO:	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA</b>
CONTRATANTE:	<b>MUNICIPIO DE CUBARÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>
UBICACIÓN:	<b>BARRIO SEIS DE FEBRERO, SECTOR DE PUERTO NUEVO PARTE ALTA, CASERIO GUALANDAY, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2.</b>

## REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO OBRA No. SAMC-032-2025

<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>66</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.9 CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70X70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>67</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.9 CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70X70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)
					

<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>68</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.9 CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70X70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)	<b>FOTOGRAFÍA No.</b>	<b>69</b>	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.9 CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70X70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)
					

# MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
 R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA



**FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

**MEMORIAS DE CÁLCULO**  
**OBRAS PRELIMINARES**

1,00 ÍTEM	CONTROL TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA	UNIDAD:	ML	Localización de los elementos	Formula de Cálculo	MEDIDAS (m)				Metro Lineal (m)	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial	
						Largo	Ancho	Alto	Área				Perímetro
<b>SECTOR SEIS DE FEBRERO</b>													
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Cantidad de elementos	467,33					467,33	1,00	467,33
				ACOMETIDAS DE 2" X 1/2"	Largo x Cantidad de elementos	1,50					1,50	57,00	85,50
<b>SECTOR PUERTO NUEVO PARTE ALTA</b>													
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Cantidad de elementos	211,50					211,50	1,00	211,50
<b>SECTOR CASERIO GUALANDAY</b>													
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Cantidad de elementos	250,00					250,00	1,00	250,00
<b>SECTOR CALLE 2 ENTRE CARRERA 1 Y 2</b>													
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Cantidad de elementos	186,80					186,80	1,00	186,80
CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:													
CANTIDAD POR EJECUTAR:													
CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:													
0,00													
1201,13													



*Henry Borrero Merchan*  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
 R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA



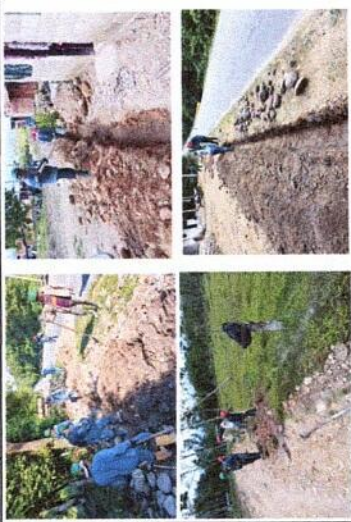
**FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ALCALDIA DE CUBARÁ, BOYACÁ

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

**MEMORIAS DE CALCULO**

**MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UNIDAD:	M3	Localización de los elementos	Formula de Cálculo	MEDIDAS (m)				Metro Cubico (m3)	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial		
						Largo	Ancho	Alto	Perimetro					
2,00														
2,01														
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	467,33	0,35	0,55		89,96	1,00	89,96		
				ACOMETIDAS DE 2" X 1/2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	1,50	0,35	0,55		0,29	57,00	16,46		
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	211,50	0,35	0,55		40,71	1,00	40,71		
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	250,00	0,35	0,55		48,13	1,00	48,13		
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	186,80	0,35	0,55		35,96	1,00	35,96		
				CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:										
				CANTIDAD POR EJECUTAR:										
				CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:										231,22

*Henry Borrero Merchan*  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA



**FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

**MEMORIAS DE CALCULO**

**MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

2.00 ITEM	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	UNIDAD:	M3	Localización de los elementos	Formula de Cálculo	MEDIDAS (m)				Metro Cubico (m3)	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
						Largo	Ancho	Alto	Area de Tubería			
<b>SECTOR SEIS DE FEBRERO</b>												
				RED DE TUBERIA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos - Area de tubería	467,33	0,35	0,25	0,00286	39,56	1,00	39,56
				ACOMETIDAS DE 2" X 1/2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos - Area de tubería	1,50	0,35	0,25	0,00051	0,13	57,00	7,44
<b>SECTOR PUERTO NUEVO PARTE ALTA</b>												
				RED DE TUBERIA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos - Area de tubería	211,50	0,35	0,25	0,00286	17,90	1,00	17,90
<b>SECTOR CASERIO GUALANDAY</b>												
				RED DE TUBERIA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos - Area de tubería	250,00	0,35	0,25	0,00286	21,18	1,00	21,18
<b>SECTOR CALLE 2 ENTRE CARRERA 1 Y 2</b>												
				RED DE TUBERIA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos - Area de tubería	186,80	0,35	0,25	0,00286	15,81	1,00	15,81
CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:												
											CANTIDAD POR EJECUTAR:	
											CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:	
											101,87	



*Henry Borrero Merchan*  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
RESIDENTE DE OBRA  
M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA**  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
SUPERVISOR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
 RIL: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA



**FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

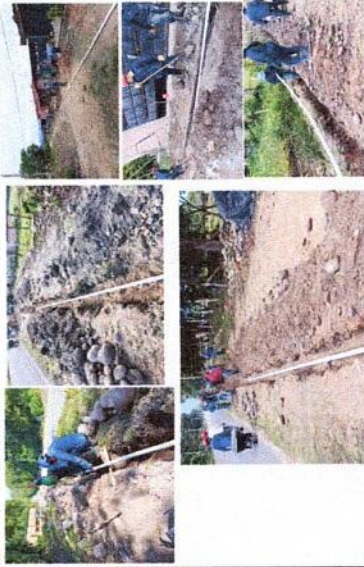
ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

**MEMORIAS DE CÁLCULO**

**MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

ITEM	UNIDAD:	ML	Localización de los elementos	Formula de Cálculo	MEDIDAS (m)			Perímetro	Metro Lineal (m)	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
					Largo	Ancho	Alto				
2,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2"										
2,03	RDE21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).										
			RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Cantidad de elementos	467,33				467,33	1,00	467,33
			RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Cantidad de elementos	211,50				211,50	1,00	211,50
			RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Cantidad de elementos	250,00				250,00	1,00	250,00
			RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Largo x Cantidad de elementos	186,80				186,80	1,00	186,80
				CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:							
				CANTIDAD POR EJECUTAR:							
				CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:							1115,63



*Henry Borrero Merchan*  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVAN QUIJONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA

**FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

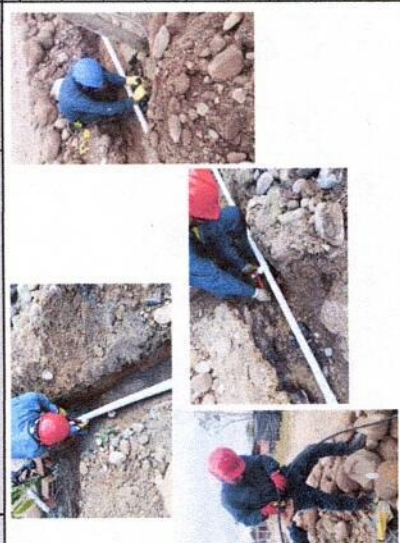
ALCALDIA DE CUBARÁ, BOYACÁ

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

**MEMORIAS DE CALCULO**

**MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

ITEM	UNIDAD:	UND	Localización de los elementos	Formula de Cálculo	MEDIDAS (m)				Unidad	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
					Largo	Ancho	Alto	Área			
2,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO).										
2,04			Acometida por Vivienda (57 viviendas en total)	Unidad x Cantidad de elementos					57,00	1,00	57,00
SECTOR SEIS DE FEBRERO											
CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:											
CANTIDAD POR EJECUTAR:											
CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:											
<b>57,00</b>											



*Henry Borrero*  
**HENRY BORRERO MIERCHAN**  
RESIDENTE DE OBRA  
M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA**  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
SUPERVISOR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
 R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA



**FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

**MEMORIAS DE CALCULO**

**MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

ITEM	2,00	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	UNIDAD:	M3	Localización de los elementos	Formula de Cálculo	MEDIDAS (m)				Metro Cubico (m3)	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial	
							Largo	Ancho	Alto	Volumen				Perimetro
<b>SECTOR SEIS DE FEBRERO</b>														
					RED DE TUBERIA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	467,33	0,35	0,30			49,07	1,00	49,07
					ACOMETIDAS DE 2" X 1/2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	1,50	0,35	0,30			0,16	57,00	8,98
<b>SECTOR PUERTO NUEVO PARTE ALTA</b>														
					RED DE TUBERIA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	211,50	0,35	0,30			22,21	1,00	22,21
<b>SECTOR CASERIO GUALANDAY</b>														
					RED DE TUBERIA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	250,00	0,35	0,30			26,25	1,00	26,25
<b>SECTOR CALLE 2 ENTRE CARRERA 1 Y 2</b>														
					RED DE TUBERIA PVC. D = 2"	Largo x Ancho x Alto x Cantidad de elementos	186,80	0,35	0,30			19,61	1,00	19,61
CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:														
CANTIDAD POR EJECUTAR:														
CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:														
<b>126,12</b>														



*Henry Borrero*  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
 R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA



**FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

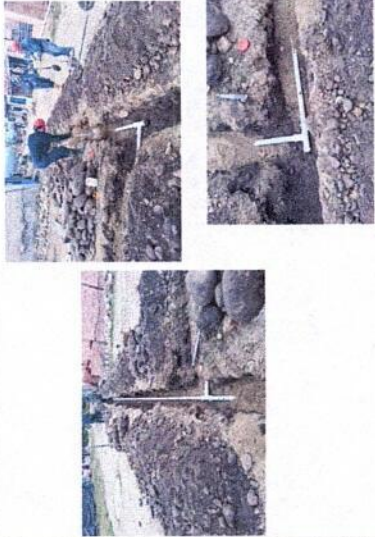
ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

**MEMORIAS DE CALCULO**


**MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

ITEM	2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC RDE 21- 200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UNIDAD:	UND	Localización de los elementos	Formula de Calculo	MEDIDAS (m)			Unidad	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial	
							Largo	Ancho	Alto				Volumen
2,06					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos					3,00	1,00	3,00
SECTOR SEIS DE FEBRERO													
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos					0,00	1,00	0,00
SECTOR PUERTO NUEVO PARTE ALTA													
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos					1,00	1,00	1,00
SECTOR CASERIO GUALANDAY													
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos					1,00	1,00	1,00
SECTOR CALLE 2 ENTRE CARRERA 1 Y 2													
CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:													
CANTIDAD POR EJECUTAR:													
CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:													
											5,00		



*Henry Borrero Merchan*  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 M.P. 54202-188038NTS





**JESUS IVAN QUINONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR

		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S. R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA										
<b>FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</b>												
ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA												
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.												
<b>MEMORIAS DE CALCULO</b>												
MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS												
ITEM	2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RADIO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2".	UNIDAD:	UND	Localización de los elementos	Formula de Cálculo	MEDIDAS (m)			Unidad	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
							Largo	Ancho	Alto			
2,07							SECTOR SEIS DE FEBRERO					
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos				5,00	1,00	5,00
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos	SECTOR PUERTO NUEVO PARTE ALTA					
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos				3,00	1,00	3,00
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos	SECTOR CASERIO GUALANDAY					
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos				1,00	1,00	1,00
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos	SECTOR CALLE 2 ENTRE CARRERA 1 Y 2					
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos				4,00	1,00	4,00
CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:												
CANTIDAD POR EJECUTAR:												
CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:												
<b>13,00</b>												



  
**HENRY BORRERO MERCHÁN**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR

		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S. R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA												
		<b>FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</b> ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA												
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.														
MEMORIAS DE CÁLCULO														
MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS														
ITEM	2,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	UNIDAD:	UND	Localización de los elementos	Formula de Cálculo	MEDIDAS (m)				Unidad	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial	
							Largo	Ancho	Alto	Volumen				Perímetro
2,08		  			RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos					4,00	1,00	4,00	
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos						1,00	1,00	1,00
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos						1,00	1,00	1,00
					RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos						2,00	1,00	2,00
CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:														
CANTIDAD POR EJECUTAR:														
CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:														
8,00														

  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.  
 R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA



**FORMATO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

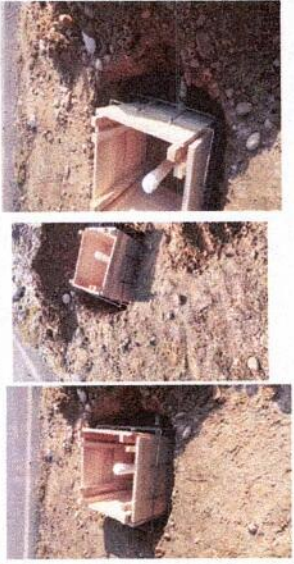
ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

**MEMORIAS DE CALCULO**

**MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

ITEM	UNIDAD:	UNIDAD:	UND	Localización de los elementos	Formula de Calculo	MEDIDAS (m)				Unidad	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial		
						Largo	Ancho	Alto	Volumen				Perimetro	
2,00	CAJAS DE INSPECCION DE 70 X 70 X 70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)													
2,08				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos	SECTOR SEIS DE FEBRERO						4,00	1,00	4,00
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos	SECTOR PUERTO NUEVO PARTE ALTA						1,00	1,00	1,00
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos	SECTOR CASERIO GUALANDAY						1,00	1,00	1,00
				RED DE TUBERÍA PVC. D = 2"	Unidad x Cantidad de elementos	SECTOR CALLE 2 ENTRE CARRERA 1 Y 2						2,00	1,00	2,00
CANTIDAD PARCIAL EJECUTADA:														
CANTIDAD POR EJECUTAR:														
CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA:														
<b>8,00</b>														



*Henry Borrero Merchan*  
**HENRY BORRERO MERCHAN**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 M.P. 54202-188036NTS

**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR

# PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

---

---

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

NIT 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31


Saravena Arauca

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **HERLEY GAMBOA ANGARITA** Identificado con C.C. **1.049.392.812** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.



**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal




C.C. **1.049.392.812**

Huella

### CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA

Yo **CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA** Identificado con C.C **1.094.268.169** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal


**CRISTIAN FABIAN BOCOTA B.**  
**CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA**  
 C.C **1.094.268.169**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **RIQUELME CASTELLANOS ROJAS** Identificado con C.C **1.049.393.798** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal


  
**RIQUELME CASTELLANOS ROJAS**  
 C.C **1.049.393.798**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **JOSE JOAQUIN BUITRAGO TORRES** Identificado con C.C **9.467.091**  
acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la  
correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista  
**COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos  
al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de  
La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos  
los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus  
trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún  
empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de  
todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar  
laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de  
que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa  
que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado  
su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones  
de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal


  
**JOSE JOAQUIN BUITRAGO TORRES**  
C.C **9.467.091**


Huella

### CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA

Yo **JOHAN SEBASTIAN CONTRERAS ANGARITA** Identificado con C.C. **1.090.252.140** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal

  
**JOHAN SEBASTIAN CONTRERAS ANGARITA**  
 C.C. **1.090.252.140**

Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **JOSE GONZALO SANTAFE CASTELLANOS** Identificado con C.C **1.049.395.560** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal

  
**JOSE GONZALO SANTAFE CASTELLANOS**  
C.C **1.049.395.560**


Huella


**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **JORGE ELIECER LOZANO MEDINA** Identificado con C.C **1.116.869.139** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal

  
**JORGÉ ELIECER LOZANO MEDINA**  
C.C **1.116.869.139**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **ESTENGEL FLOREZ GUTIERREZ** identificado con C.C. **1.049.395.011** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025** empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal


  
**ESTENGEL FLOREZ GUTIERREZ**  
C.C. **1.049.395.011**

Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **LIBARDO CARRILLO GEREDA** Identificado con C.C **88.305.094**  
 acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la  
 correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista  
**COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos  
 al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de  
 La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos  
 los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus  
 trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún  
 empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de  
 todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar  
 laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de  
 que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa  
 que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado  
 su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones  
 de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal

  
**LIBARDO CARRILLO GEREDA**  
 C.C **88.305.094**


Huella


**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **JUAN CARLOS ARIAS ANGARITA** Identificado con C.C **1.193.562.874**  
 acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la  
 correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista  
**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos  
 al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de  
 La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos  
 los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus  
 trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún  
 empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de  
 todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar  
 laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de  
 que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa  
 que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado  
 su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones  
 de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal

  
**JUAN CARLOS ARIAS ANGARITA**  
 C.C **1.193.562.874**


Huella

### CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA

Yo **LUIS ALFREDO CARREÑO FLOREZ** Identificado con C.C. **1.094.243.847** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal


  
**LUIS ALFREDO CARREÑO FLOREZ**  
 C.C. **1.094.243.847**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **DEINER ARMANDO RODRIGUEZ RUBIO** Identificado con C.C **1.049.397.270** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025** empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025** declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal

  
**DEINER ARMANDO RODRIGUEZ RUBIO**  
C.C **1.049.397.270**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **JOSE ELMER CAPACHO SANTIAGO** Identificado con C.C. **96.168.446** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal

  
**JOSE ELMER CAPACHO SANTIAGO**  
 C.C. **96.168.446**


Huella


**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **ISLEY XIMENA CANO CASTELLANOS** Identificado con C.C **1.002.300.321** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal


  
**ISLEY XIMENA CANO CASTELLANOS**  
C.C **1.002.300.321**

Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **RUBEN DARIO MENDEZ RINCON** Identificado con C.C **1.094.370.153** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025** empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025** declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal


**RUBEN DARIO MENDEZ R.**  
**RUBEN DARIO MENDEZ RINCON**  
 C.C **1.094.370.153**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **LUIS ALBERTO GAMBOA MARTINEZ** Identificado con C.C **1.049.393.965** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal

  
**LUIS ALBERTO GAMBOA MARTINEZ**  
 C.C **1.049.393.965**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **JOSE ELADIO HERNANDEZ SUAREZ** Identificado con C.C **9.466.847** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal


  
**JOSE ELADIO HERNANDEZ SUAREZ**  
C.C **9.466.847**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **BRAYAN CARREÑO CARRILLO** Identificado con C.C. **1.005.540.444** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal


  
**BRAYAN CARREÑO CARRILLO**  
C.C. **1.005.540.444**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **JOSE LUIS CASTRO SEPULVEDA** Identificado con C.C. **100.754.309** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal


  
**JOSE LUIS CASTRO SEPULVEDA**  
 C.C. **100.754.309**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **YERLEY URIEL SANTOS SOLANO** Identificado con C.C. **1.007.228.814** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**OFICIAL** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal

  
**YERLEY URIEL SANTOS SOLANO**  
C.C. **1.007.228.814**


Huella

### CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA

Yo **LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA** Identificado con C.C. **94.670.070** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**OFICIAL** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal


  
**LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA**  
 C.C. **94.670.070**


Huella

### CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA

Yo **ADENAWER MENDOZA HERNANDEZ** Identificado con C.C. **1.049.634.973** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**  
 declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal


  
**ADENAWER MENDOZA HERNANDEZ**  
 C.C. **1.049.634.973**


Huella

**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **ELKIN YOHANY QUIÑONEZ VERA** Identificado con C.C **1.007.406.486** acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista **COSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025** empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025** declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
Representante Legal

  
**ELKIN YOHANY QUIÑONEZ VERA**  
C.C **1.007.406.486**

Huella


**CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO DE LA OBRA**

Yo **CRISTIAN BOTELLO BOTELLO** Identificado con C.C **1.116.495.975**  
 acepto y soy consciente de que recibí el pago de mis salarios completos, junto con la  
 correspondiente liquidación de mis prestaciones sociales, por parte de la empresa contratista  
**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE**. Así mismo, confirmo que se realizaron los pagos  
 al sistema de seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 153 de  
 La Ley 100 de 1993 (La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos  
 los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus  
 trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún  
 empleador o de capacidad de pago). La firma contratista de igual manera cumplió con la entrega de  
 todos los elementos de protección personal. En relación con el trabajo realizado como:

**AYUDANTE** desde el **11/12/2025** hasta **21/12/2025**  
 empleado en la ejecución de actividades del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-032-2025**

declaro que estoy a paz y salvo con la empresa por todo concepto laboral. En caso de no continuar  
 laborando, este documento será válido para la terminación del contrato. Así mismo, se deja constancia de  
 que el empleado tiene el derecho de realizar sus exámenes ocupacionales de egreso en la misma empresa  
 que ejecutó el examen de ingreso para las operaciones en obra, contados tres días después de terminado  
 su contrato. Si la persona no se presenta durante este periodo, se asume que salió en óptimas condiciones  
 de salud. Solo se podrá hacer alguna petición bajo evidencia.

  
**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**  
 Representante Legal

  
**CRISTIAN BOTELLO BOTELLO**  
 C.C **1.116.495.975**

Huella

# COPIA DEL ACTA DE RECIBO FINAL

---

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca



**GESTIÓN JURÍDICA**

**ACTA DE RECIBO FINAL**

Código: JUR-02-P06-F08  
Versión: 03

Fecha: 02/07/2024  
Pagina:

CONTRATO DE OBRA No:	SAMC-032-2025	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	11/12/2025	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$148.152.179,83
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS	VALOR DEL ADICIONAL No. 01	N/A
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S NIT 907.979.938-0 R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA CC No. 53.544.293 Bucaramanga - Santander	PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO	N/A	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$148.152.179,83
INTERVENTORIA:	N/A	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS	VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL	\$148.152.179,83
SUPERVISOR:	JESUS IVAN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas	PLAZO DEL CONTRATO EJECUTADO	DOCE (12) DIAS	VALOR DEL ANTICIPO (40%)	\$ 0,00
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	80,00%	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	100,0000%
PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	11/12/2025 - 22/12/2025	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:	100%	ESTADO DEL CONTRATO:	FINALIZADO

**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**

En el Municipio de Cubará, a los veintidos (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, GILVARDO MURCIA BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionario del Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Circuito de Cubará, JESUS IVAN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. SAMC-032-2025, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y la señora DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Representante Legal de CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S con Nit. No. 901.878.498-0 en calidad de contratista, en la cual se consignan las siguientes cantidades finales del Contrato de Obra No. SAMC-032-2025, ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Municipio de Cubará.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA FINAL			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>									
1	CONTROL TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA	ML	1201,13	\$ 1.201,13	\$ 3.806.380,97	1201,13	\$ 1.442.713,28	1201,13	\$ 1.442.713,28
				Subtotal	\$ 3.806.380,97	Subtotal	\$ 3.806.380,97	Subtotal	\$ 3.806.380,97
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>									
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	231,22	\$ 145.750,00	\$ 33.702.164,76	231,22	\$ 33.702.164,76	231,22	\$ 33.702.164,76
2.02	ARENA PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	101,87	\$ 14.977.436,75	\$ 14.977.436,75	101,87	\$ 14.977.436,75	101,87	\$ 14.977.436,75
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D = 2" RDE 21 / 200 PSI (UNIÓN MECANICA)	ML	1115,63	\$ 47.229,00	\$ 52.650.089,27	1115,63	\$ 52.650.089,27	1115,63	\$ 52.650.089,27
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION (INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y MEDIDOR VOLUMETRICO)	UND	57,00	\$ 595.582,00	\$ 28.818.174,00	57,00	\$ 28.818.174,00	57,00	\$ 28.818.174,00
2.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	126,12	\$ 53.559,00	\$ 6.754.861,08	126,12	\$ 6.754.861,08	126,12	\$ 6.754.861,08
2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UND	5,00	\$ 193.010,00	\$ 965.050,00	5,00	\$ 965.050,00	5,00	\$ 965.050,00
2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RADIO CORTO 90° PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=2"	UND	13,00	\$ 138.323,00	\$ 1.798.199,00	13,00	\$ 1.798.199,00	13,00	\$ 1.798.199,00
2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE LAVADO PVC RDE 21-200 PSI D=2"	UND	8,00	\$ 40.776,00	\$ 326.208,00	8,00	\$ 326.208,00	8,00	\$ 326.208,00
2.09	CAJAS DE INSPECCION DE 70 X 70 X 70 CM CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA)	UND	8,00	\$ 539.202,00	\$ 4.313.616,00	8,00	\$ 4.313.616,00	8,00	\$ 4.313.616,00
	Subtotal			\$144.346.798,96	\$144.346.798,96		\$144.346.798,96		\$144.346.798,96

**GESTIÓN JURÍDICA**  
**ACTA DE RECIBO FINAL**

Código: JUR-02-P06-F08  
 Versión: 03  
 Fecha: 02/07/2024  
 Página:

CONTRATO DE OBRA No: SAMC-032-2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: 11/12/2025  
 VALOR DEL CONTRATO INICIAL: \$ 148.152.179,83

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: N/A  
 VALOR DEL ADICIONAL No. 01: N/A

CONTRATISTA: R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA  
 NIT: 90187453-0  
 CC No. 63.544.293 Bucaramanga, Santander

PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO: N/A  
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 148.152.179,83

INTERVENTORIA: N/A  
 VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL: \$ 148.152.179,83

SUPERVISOR: JESUS IVAN QUINONES RUEDA  
 Secretario de Planeación y Obras Públicas

VALOR DEL ANTIPO (40%): \$ 0,00

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CUBARÁ

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 100,00%

PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL: 11/12/2025 - 22/12/2025

ESTADO DEL CONTRATO: FINALIZADO

**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**

En el Municipio de Cubará, a los veintidos (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron GILDA MURCIA BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Circuito de Cubará, JESUS IVAN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. SAMC-032-2025, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y la señora DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Representante Legal de CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S. con Nit. No. 901.878.498-0 en calidad de contratista, en la cual se consignan las siguientes cantidades finales del Contrato de Obra No. SAMC-032-2025 ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Municipio de Cubará.

TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO	\$ 111.392.616,41	\$ 111.392.616,41	\$ 111.392.616,41
COSTO INDIRECTO DE OBRA (ADMINISTRACIÓN 24%)	\$ 26.734.227,94	\$ 26.734.227,94	\$ 26.734.227,94
COSTO INDIRECTO DE OBRA (IMPREVISTOS 2%)	\$ 2.227.852,33	\$ 2.227.852,33	\$ 2.227.852,33
COSTO INDIRECTO DE OBRA (UTILIDAD 7%)	\$ 7.797.483,15	\$ 7.797.483,15	\$ 7.797.483,15
VALOR TOTAL DE OBRA	\$ 148.152.179,83	\$ 148.152.179,83	\$ 148.152.179,83
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 148.152.179,83		
VALOR ANTIPO (40%)	\$ 0,00		
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL:	\$ 148.152.179,83		
VALOR ACTA FINAL CON AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO:	\$ 148.152.179,83		
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00		
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	100,00%		
VALOR NETO A PAGAR ACTA FINAL:	\$ 148.152.179,83		

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los veintidos (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)

*Diana Carolina Fuentes Mojica*  
 DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA  
 Representante Legal

*Gilda Murcia Buitrago*  
 GILDA MURCIA BUITRAGO  
 Alcalde Municipal

*Jesús Ivan Quinones Rueda*  
 JESUS IVAN QUINONES RUEDA  
 Secretario de Planeación y Obras Públicas  
 Supervisor

# FACTURA

---

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16<sup>a</sup> - 31

Saravena Arauca

**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS  
TRUJILLO DE LA FUENTE SAS**  
NIT 901.878.498-0  
CRA 5 7 40 BRR EL PROGRESO  
Tel: 3115894460  
Cubará - Colombia  
OFITRUJILLODELAFUENTE@GMAIL.COM

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica  
18764093403122 aprobado en 20250521 prefijo  
CSTF desde el número 1 al 5000000 Vigencia: 24  
Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 -  
Construcción de edificios no residenciales

**FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA NO. CSTF 6**

**Fecha y hora Factura**

Generación: 23/12/2025,  
16:07

Expedición: 23/12/2025, 16:45

**Nombre del Cliente**  
MUNICIPIO DE CUBARA

**Nit ó C.C.**  
800.099.196-2

**Fecha de Vencimiento**

--

**Razón Social**  
MUNICIPIO DE CUBARA

**Dirección**  
CALLE 4 No 4 - 43

**Teléfono**  
(608) 3102574494

**Correo**  
sechacienda@cubara-boyaca.gov.co

**Vendedor**  
CONSTRUCCIONES Y  
SUMINISTROS

**Centro de Costo**  
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA SAMC-032-2025 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA	1.00	111,392,616.41	0 %	0.00	111,392,616.41
2	ADMINISTRACION	1.00	26,734,227.94	0 %	0.00	26,734,227.94
3	IMPREVISTOS	1.00	2,227,852.33	0 %	0.00	2,227,852.33
4	UTILIDAD	1.00	7,797,483.15	0 %	0.00	7,797,483.15

**Total items:** 4

<b>Total Bruto</b>	148,152,179.83
<b>Total a Pagar</b>	148,152,179.83

**OBSERVACIONES:**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$148.152.179.83  
 VALOR EJECUTADO ACTA FINAL: \$148.152.179.83  
 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 100%  
 VALOR NETO A PAGAR ACTA FINAL: \$ 148.152.179.83

**Valor en Letras:**

Ciento cuarenta y ocho millones ciento cincuenta y dos mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con ochenta y tres cent.

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Consignación bancaria - \$ 148,152,179.83  
 Consignación

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

a253437bdd8112e4a4ff94140d121a28b193016029ba6152aa7e454530ec2feb67c2148691e9e4b08e689f7db7b1cc83

# CERTIFICACION BANCARIA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

[ofitrujillodelafuentes@gmail.com](mailto:ofitrujillodelafuentes@gmail.com)

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca



### CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: CONTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9018784980 de CUBARA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-151-03-00820-1, fecha de apertura: 10/08/2025.

Se expide en CUBARA, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2025, con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO

  
**Banco Agrario de Colombia**  
Of. Cubara - Boyacá  
FIRMA AUTORIZADA  
DIRECTOR (A) OFICINA
