

|                                                                                   |                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b><br>PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISOR | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                   |                                                                                                             | Versión: V1       |
|                                                                                   |                                                                                                             | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                             | Página 1 de 16    |

Villavicencio, 12/12/2025

Doctor(a):  
**Maristella Santana Torres**  
 Secretaria de Infraestructura  
 Ciudad.

**Ref.: CONTRATO N°. 3214 DE 2025, N°. DEL PROCESO EN SECOP SMC-135 DE 2025  
 PERIODO No. 2 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2025 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.**

**OBJETIVO DEL INFORME:** Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

#### 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

|                                                                                                              |                                                                                                              |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)                                            | 3214 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                |        |     |
| PUBLICADO EN (Marque con X)                                                                                  | SECOP I: _____ Ó SECOP II: <b>X</b> _____                                                                    |        |     |
| CLASE DE CONTRATO:                                                                                           | SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA                                                                                  |        |     |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:                                                                                      | CIVILCONTROL S.A.S                                                                                           |        |     |
| No. DE IDENTIFICACIÓN                                                                                        | 900678888-8                                                                                                  |        |     |
| OBJETO:                                                                                                      | PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |        |     |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente) | DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE<br>C.c: 1121838448 de Villavicencio                                        |        |     |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)             | 16 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                        |        |     |
| <b>CONDICIONES INICIALES</b>                                                                                 |                                                                                                              |        |     |
| VALOR DEL CONTRATO (letras y número):                                                                        | CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$120.000.000)                                                        |        |     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                                   |        |     |
| FECHA DE INICIO:                                                                                             | 16/10/2025                                                                                                   |        |     |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                                        | 31/12/2025                                                                                                   |        |     |
| <b>MODIFICACIONES:</b>                                                                                       |                                                                                                              |        |     |
| CESIÓN:                                                                                                      | N/A                                                                                                          | FECHA: | N/A |
| VALOR DE ADICIÓN:                                                                                            | N/A                                                                                                          | FECHA: | N/A |
| NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)                                                                | N/A                                                                                                          |        |     |
| PRORROGAS                                                                                                    | N/A                                                                                                          | FECHA: | N/A |

|                                                                                  |                                   |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> |  | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  | PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN |  | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                   |  | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE SUPERVISOR     |  | Página 2 de 16    |

|                                                   |            |        |     |
|---------------------------------------------------|------------|--------|-----|
| TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN<br>(INICIAL + PRÓRROGAS) | N/A        |        |     |
| SUSPENSIONES:                                     | FECHA: N/A |        |     |
| REINICIOS:                                        | N/A        | FECHA: | N/A |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN<br>DEL CONTRATO:       | N/A        |        |     |

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 16/10/2025, notificado personalmente con fecha 16/10/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N° 2 del 14/11/2025 al 12/12/2025 con un porcentaje del 34.06%, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 99.8% el valor restante del contrato queda a favor del municipio, para efectos de pago parcial se tendrá en cuenta el 20.0% del valor total del contrato:

#### **ACTIVIDAD No. 1.**

**ESTABLECER LA OBLIGACIÓN:** Estudios Geotécnicos para Cimentaciones para puentes vehicular y/o peatonal. (1 sondeo hasta 15 metros lineales) en cumplimiento de la CCP - 14).

**Descripción del avance:** El contratista ejecutó cuatro (4) sondeos con una profundidad máxima de 15m sobre el trazado actual de la vía, exploraciones proyectadas a una distancia promedio de 20.0m, distancias donde se localizarán los apoyos de la estructura diseñar, el proyecto civil se encuentra ubicado en el municipio de Villavicencio vía que conecta el barrio la azotea con el barrio mesetas bajo en las coordenadas 4° 8'37.68"N 73°39'8.21"O, la investigación del terreno se ejecutó mediante la realización de cuatro (4) sondeos con equipo de perforación mecánico por rotación y percusión con una profundidad máxima de 15.0m, exploraciones localizadas sobre el tramo de vía mencionado, dichas perforaciones se realizaron con barrenos de recuperación de núcleo acoplado a broca diamantada de tamaño y diámetro NQ y HQ.


El estudio de suelos se realizó con el propósito de conocer las propiedades geomecánicas generales del subsuelo del sitio, las cuales permitieron establecer sus condiciones portantes y poder presentar los criterios generales para el diseño de cimentación y obras de adecuación del terreno que lleven a la solución inmediata de la problemática evidenciada sobre el tramo de vía que conecta el barrio la azotea con el barrio mesetas bajo. Se evidencian análisis de resultados de laboratorios, memorias de la determinación de capacidad de soporte del suelo, asentamientos, conclusiones y recomendaciones.

**Anexos y Evidencias:** (FOTOGRAFIAS, CAPTURAS DE PANTALLA DE CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS, DOCUMENTOS EN WORD, EXCEL, ETC).



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISOR**

Código: GCT-F-27  
Versión: V1  
Fecha: 29/04/2025  
Página 3 de 16

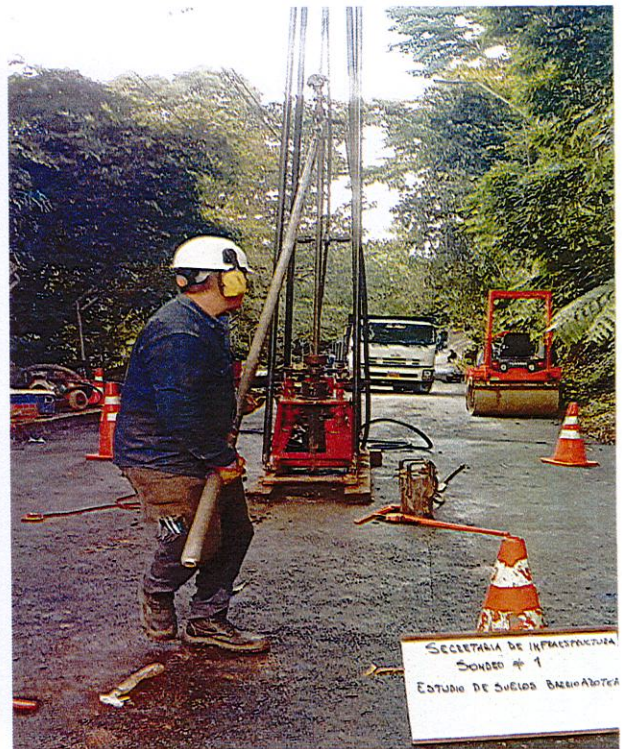

|                                                                                  |                                   |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> |  | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  | PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN |  | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                   |  | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE SUPERVISOR     |  | Página 4 de 16    |

## **ACTIVIDAD No. 2**

### **ESTABLECER LA OBLIGACIÓN**

- Toma de CBR inalterado, Penetración de CBR inalterado o remoldeado con y sin inmersión. Ensayos de clasificación por apique.
- Extracción de núcleos de carpeta asfáltica 4".
- Toma de briquetas marshal.
- Estabilidad y flujo marshal densidad bulk.
- Extracción de asfalto con centrifuga.

**Descripción del avance:** El contratista ejecutó dos (2) apiques con excavación manual hasta una profundidad máxima de 1.50m, Toma de CBR inalterado, Penetración de CBR inalterado o remoldeado con y sin inmersión. Ensayos de clasificación por apique. Extracción de dos (2) núcleos sobre carpeta asfáltica 4". Las exploraciones manuales fueron realizadas sobre la calle 16ª sur en el barrio Villahermosa, en el municipio de Villavicencio en las coordenadas 4°6'0.13"N 73°37'47.66"O, vía que comunica al barrio Villahermosa con la carretera del amor.

Las actividades ejecutadas se realizaron con el fin de definir los espesores de los materiales que conforman la estructura de pavimento del tramo objeto de estudio. Y realizar el control de calidad sobre cada uno de los materiales identificados, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas de ensayo INVIAS.

Los criterios para la ejecución del presente estudio de suelos y control de calidad son los correspondientes a los establecidos en las normas de ensayo invias sección 100 y la especificación técnica capítulo 3 para los agregados pétreos tipo sub base y base y Capítulo 4, artículo 450 para las muestras asfálticas que conforman la superficie de rodadura.

**Anexos y Evidencias:** (FOTOGRAFIAS, CAPTURAS DE PANTALLA DE CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS, DOCUMENTOS EN WORD, EXCEL, ETC).



|                                                                                  |                                   |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> |  | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  | PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN |  | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                   |  | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE SUPERVISOR     |  | Página 5 de 16    |

### **ACTIVIDAD No. 3.**



**ESTABLECER LA OBLIGACIÓN:** Estudios Geotécnicos para caracterización del subsuelo con equipo Mecánico por Percusión - método S P T. NSR-10.

**Descripción del avance:** El contratista ejecutó tres (3) sondeos con una profundidad máxima de 6m sobre el trazado actual de la vía, exploraciones proyectadas a una distancia promedio de 10.0m, distancias donde se localizarán los apoyos de la estructura diseñar, las exploraciones ejecutadas por el contratista se realizaron con equipo mecánico por percusión, con la finalidad de extraer muestras e identificar la conformación del perfil estratigráfico del subsuelo y determinar parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación.


El proyecto civil se encuentra ubicado en el municipio de Villavicencio en las coordenadas 4° 7'33.10"N 73°38'32.10"O, la zona materia de estudio cuenta con una topografía plana. El predio localizado para la ejecución del proyecto cuenta con un área de construcción de 950m2 aproximadamente.

El estudio de suelos se realizó con el propósito de conocer las propiedades geomecánicas generales del subsuelo del sitio, las cuales permitieron establecer sus condiciones portantes y poder presentar los criterios generales para el diseño de cimentación y obras de adecuación del terreno que lleven a la solución inmediata de la problemática evidenciada sobre la calle 6a sur y la carrera 52. El informe contiene el análisis de resultados de laboratorios, memorias de la determinación de capacidad de soporte del suelo, asentamientos, conclusiones y recomendaciones.

**Anexos y Evidencias:** (FOTOGRAFIAS, CAPTURAS DE PANTALLA DE CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS, DOCUMENTOS EN WORD, EXCEL, ETC.

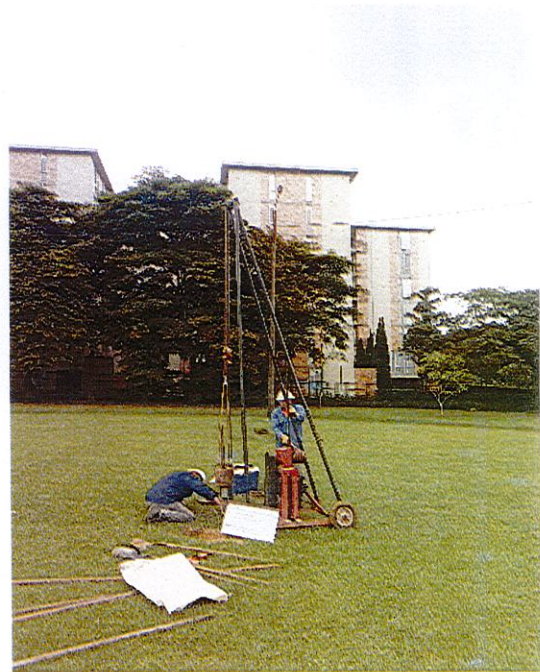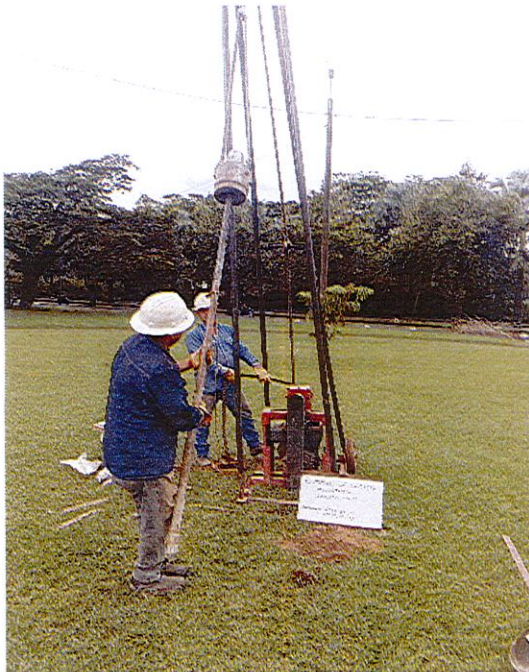

|                                                                                  |                                   |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> |  | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  | PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN |  | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                   |  | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE SUPERVISOR     |  | Página 6 de 16    |

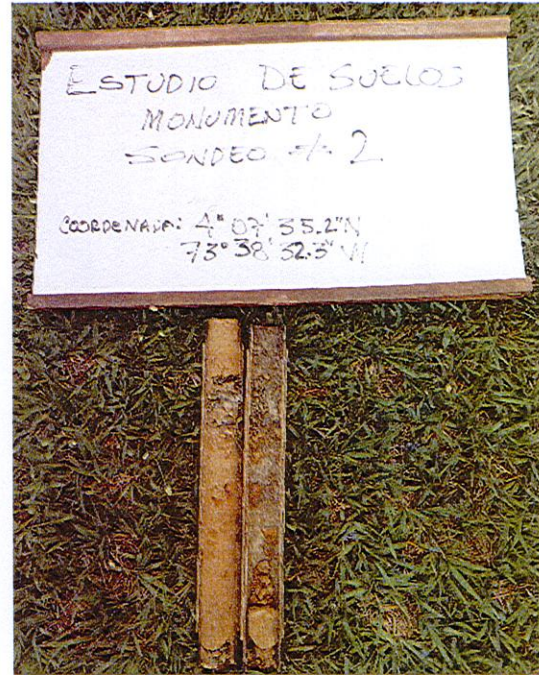

#### **ACTIVIDAD No. 4.**

##### **ESTABLECER LA OBLIGACIÓN:**

- Estudios Geotécnicos para caracterización del subsuelo con equipo Mecánico por Percusión - método S P T. CCP-14.
- Toma de CBR inalterado, Penetración de CBR inalterado o remoldeado con y sin inmersión. Ensayos de clasificación por apique.

**Descripción del avance:** El contratista ejecutó dos (2) sondeos con una profundidad máxima de 6m sobre el trazado actual de la vía, exploraciones proyectadas a una distancia promedio de 25.0m, perforaciones localizadas en cada uno de los apoyos de la estructura hidráulica a diseñar, las exploraciones ejecutadas por el contratista se realizaron con equipo mecánico por percusión, con la finalidad de extraer muestras e identificar la conformación del perfil estratigráfico del subsuelo y determinar parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación. Adicional el contratista ejecutó dos (2) apiques manuales hasta una profundidad de 1.50m con toma de CBR inalterado y/o procesado en laboratorio y caracterización de los materiales como insumo base para el diseño de pavimento.

El proyecto civil está localizado en las coordenadas 4°13'41.08"N 73°37'45.22"O vereda San José Alto, zona rural del municipio de Villavicencio, la estructura proyectada conecta las veredas San José con la vereda Puente Abadía.

El estudio de suelos se realizó con el propósito de conocer las propiedades geomecánicas generales del subsuelo del sitio, las cuales permitieron establecer sus condiciones portantes y poder presentar los criterios generales para el diseño de cimentación y obras de adecuación para la construcción de boxculvert y aproches de acceso sobre caño Canaán vereda San José Alto, zona rural del municipio de Villavicencio.

**Anexos y Evidencias:** (FOTOGRAFIAS, CAPTURAS DE PANTALLA DE CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS, DOCUMENTOS EN WORD, EXCEL, ETC.



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISOR**

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 7 de 16



|                                                                                  |                                   |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> |  | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  | PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN |  | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                   |  | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE SUPERVISOR     |  | Página 8 de 16    |

### **ACTIVIDAD No. 5.**

**ESTABLECER LA OBLIGACIÓN:** Estudios Geotécnicos para caracterización del subsuelo con equipo Mecánico por Percusión - método S P T. NSR-10.

**Descripción del avance:** El contratista ejecutó tres (3) sondeos con una profundidad máxima de 6m sobre el trazado actual de la vía, exploraciones proyectadas a una distancia promedio de 10.0m, distancias donde se localizarán los apoyos de la estructura diseñar, las exploraciones ejecutadas por el contratista se realizaron con equipo mecánico por percusión, con la finalidad de extraer muestras e identificar la conformación del perfil estratigráfico del subsuelo y determinar parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación.

El proyecto civil se encuentra localizado en el tramo vial ubicado en la carrera 18 a entre calles 16 y calle 14b barrio Bello Horizonte en el municipio de Villavicencio, Meta, en las coordenadas 4°8'8.20"N 73°37'10.50"O, la zona materia de estudio cuenta con una topografía plana.

El estudio de suelos se realizó con el propósito de conocer las propiedades geomecánicas generales del subsuelo del sitio, las cuales permitieron establecer sus condiciones portantes y poder presentar los criterios generales para el diseño de cimentación y obras de adecuación del terreno que lleven a la solución inmediata de la problemática evidenciada. El informe contiene el análisis de resultados de laboratorios, memorias de la determinación de capacidad de soporte del suelo, asentamientos, conclusiones y recomendaciones.

**Anexos y Evidencias:** (FOTOGRAFIAS, CAPTURAS DE PANTALLA DE CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS, DOCUMENTOS EN WORD, EXCEL, ETC.



|                                                                                  |                                          |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b>        |  | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  | <b>PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN</b> |  | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                          |  | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISOR</b>     |  | Página 9 de 16    |



#### **ACTIVIDAD No. 6.**

**ESTABLECER LA OBLIGACIÓN:** Estudios Geotécnicos para caracterización del subsuelo con equipo Mecánico por Percusión - método S P T. NSR-10.

**Descripción del avance:** El contratista ejecutó dos (2) sondeos con una profundidad máxima de 6m sobre el trazado actual de la vía, exploraciones proyectadas a una distancia promedio de 10.0m, distancias donde se localizarán los apoyos de la estructura diseñar, las exploraciones ejecutadas por el contratista se realizaron con equipo mecánico por percusión, con la finalidad de extraer muestras e identificar la conformación del perfil estratigráfico del subsuelo y determinar parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación.

El proyecto civil se encuentra localizado en el tramo vial ubicado en la calle 35 entre carreras 25 y carrera 26 barrio San Isidro en el municipio de Villavicencio, Meta, en las coordenadas 4°8'58.31"N 73°37'53.90"O, la zona materia de estudio cuenta con una topografía plana.

El estudio de suelos se realizó con el propósito de conocer las propiedades geomecánicas generales del subsuelo del sitio, las cuales permitieron establecer sus condiciones portantes y poder presentar los criterios generales para el diseño de cimentación y obras de adecuación del terreno que lleven a la solución inmediata de la problemática evidenciada. El informe contiene el análisis de resultados de laboratorios, memorias de la determinación de capacidad de soporte del suelo, asentamientos, conclusiones y recomendaciones.

**Anexos y Evidencias:** (FOTOGRAFIAS, CAPTURAS DE PANTALLA DE CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS, DOCUMENTOS EN WORD, EXCEL, ETC.



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISOR**

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 10 de 16



**ACTIVIDAD No. 7.**

**ESTABLECER LA OBLIGACIÓN:** Estudios Geotécnicos para Cimentaciones para puentes vehicular y/o peatonal. (1 sondeo hasta 15 metros lineales) en cumplimiento de la CCP - 14). Estudios Geotécnicos para caracterización del subsuelo con equipo Mecánico por Percusión - método SPT.

**Descripción del avance:** El contratista ejecutó dos (2) sondeos con equipo mecánico de rotación (30m) y de percusión (8m) sobre el trazado actual de la vía, exploraciones proyectadas donde se localizarán los apoyos de la estructura diseñar, las exploraciones ejecutadas por el contratista se realizaron con la finalidad de extraer muestras e identificar la conformación del perfil estratigráfico del subsuelo y determinar parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación.

El proyecto civil se encuentra localizado en el tramo vial ubicado sobre la transversal 29 barrio la Julia, centro del municipio de Villavicencio en las coordenadas 4° 9'14.28"N 73°38'6.12"O, el puente vehicular conecta el centro de la ciudad con el sector de La Grama y el Parque Infantil, la zona materia de estudio cuenta con una topografía semiondulada.

El estudio de suelos se realizó con el propósito de conocer las propiedades geomecánicas generales del subsuelo del sitio, las cuales permitieron establecer sus condiciones portantes y poder presentar los criterios generales para el diseño de cimentación y obras de adecuación del terreno que lleven a la solución inmediata de la problemática evidenciada. El informe contiene el análisis de resultados de laboratorios, memorias de la determinación de capacidad de soporte del suelo, asentamientos, conclusiones y recomendaciones.

**Anexos y Evidencias:** (FOTOGRAFIAS, CAPTURAS DE PANTALLA DE CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS, DOCUMENTOS EN WORD, EXCEL, ETC.



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISOR**

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 11 de 16





**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISOR**

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 13 de 16



|                                                                                  |                                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b><br><b>PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISOR</b> | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  |                                                                                                                           | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                                                                                                           | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  |                                                                                                                           | Página 14 de 16   |

### 3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

| RANGO DE CALIFICACIÓN                                                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXCELENTE</b>                                                                                                | El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.                                   |
| <b>BUENA</b>                                                                                                    | El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.                                  |
| <b>REGULAR</b>                                                                                                  | El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo. |
| <b>NO CUMPLE</b>                                                                                                | El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.              |
| EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA                                                                       |                                                                                                                                  |
| <b>CUMPLIMIENTO</b> (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos) | EXCELENTE                                                                                                                        |
| <b>CALIDAD</b> (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)     | EXCELENTE                                                                                                                        |
| <b>COMUNICACIÓN</b> (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)                                   | EXCELENTE                                                                                                                        |
| <b>EVALUACIÓN GENERAL</b> (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)                      | EXCELENTE                                                                                                                        |

### 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

**INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

| Mes de Cotizado    |                     |            |             | Diciembre  |           |          |
|--------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|
| Fecha de Pago      |                     |            |             | 12/12/2025 |           |          |
| Número de Planilla |                     |            |             | 9496367585 |           |          |
| Nombre             | Cargo               | Cedula     | IBC         | EPS        | Pensión   | Arl      |
| APONTE JHON        | Laboratorista       | 79844545   | \$1.423.500 | \$57.000   | \$227.800 | \$99.100 |
| FELIZZOLA RODOLFO  | Geotecnista         | 79321899   | \$1.423.500 | \$57.000   | \$227.800 | \$99.100 |
| GONZALEZ DAVID     | Laboratorista       | 1006797759 | \$1.423.500 | \$57.000   | \$227.800 | \$99.100 |
| SILVA JORGE        | Laboratorista       | 79846878   | \$1.423.500 | \$57.000   | \$227.800 | \$99.100 |
| GIRAL CARLOS       | Coordinador Tecnico | 1057604818 | \$1.423.500 | \$57.000   | \$227.800 | \$99.100 |

### 5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL

**CONTRATISTA:** Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

|                                                                                  |                                                                                                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b><br>PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISOR | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  |                                                                                                             | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                                                                                             | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  |                                                                                                             | Página 15 de 16   |

#### 6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

| Sistema de Gestión aplicable             | Requisito                                                                                                                                                    | Cumplió / No Cumplió |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Calidad                                  | Usó la documentación vigente establecida aplicable al desarrollo de las obligaciones contractuales.                                                          | Cumplió              |
| Seguridad y Salud en el Trabajo          | Participó de las actividades programadas en SST.                                                                                                             | Cumplió              |
|                                          | Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.                                         | Cumplió              |
|                                          | En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.                         | Cumplió              |
| Documental                               | La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad. | Cumplió              |
| Seguridad y Privacidad de la Información | Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.                                                                        | Cumplió              |
|                                          | Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.                                                            | Cumplió              |
| Medio Ambiente                           | El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.                                                          | Cumplió              |

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

#### 7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

| CONCEPTO                                  | VALOR           | AMORTIZACIÓN | FECHA                    | %      |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------|
| ANTICIPO                                  | 0               | 0            | N/A                      | 0      |
| PAGO AUTORIZADO EN PARCIAL No. 1          | 78.885.338 COP  | 0            | 16/10/2025 al 13/11/2025 | 65.74% |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME    | 40.872.930 COP  | 0            | 14/11/2025 al 12/12/2025 | 34.06% |
| SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR | 0 COP           | 0            |                          | 0%     |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                  | 119.758.268 COP | 0            | 16/10/2025 al 31/12/2025 | 99.8%  |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO               | \$241.732 COP   | 0            | N/A                      | 0.2%   |

#### 8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO N°. 2

|                                                                                  |                                   |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> |  | Código: GCT-F-27  |
|                                                                                  | PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN |  | Versión: V1       |
|                                                                                  |                                   |  | Fecha: 29/04/2025 |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE SUPERVISOR     |  | Página 16 de 16   |

relativas al pago del sistema de seguridad social integral y, en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de Cuarenta millones ochocientos setenta y dos mil novecientos treinta pesos m/te (40.872.930 COP) correspondiente al 34.06% del contrato, quedando a favor del municipio un valor de \$241.732. El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

**ANEXOS:**

Soportes de pago de la planilla seguridad social  
Otros que considere necesarios.

  
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE  
DIRECTOR DE OBRAS CIVILES  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
