

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES.

**CUMPLIMIENTO DE:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-360 DE 2025.**

**CONTRATISTA:
SERPROVALLE S.A.S**

OBJETO: ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 DICIEMBRE DE 2025.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES.

Plan de Desarrollo:	Unidos hacia la transformación del Municipio de Andalucía	No. De Informe:	#1 FINAL.
Línea Estratégica:	I. Unidos hacia la transformación Social	Fecha Acta de Inicio:	05 diciembre 2025
Sector:	Educación	Nombre contratista:	SERPROVALLE S.A.S
Programa:	Unidos por mejores condiciones de la infraestructura educativa	NIT:	901562059-3
Producto:	Infraestructura educativa mejorada	Representante Legal:	BEATRIZ EUGENIA OLAYA SIERRA
No. de Contrato:	OP-360 DE 2025	Periodo de Ejecución	05 diciembre de 2025, hasta el 30 de diciembre de 2025
Objeto de Contrato:	“ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.”	Supervisor:	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ, Secretario de Infraestructura.
Valor Contrato Inicial:	\$ 249.517.258,88	Porcentaje de Avance de cumplimiento del contrato:	100%
Valor total del Contrato:	\$249.517.258,88	Prorroga:	N/A
Duración del Contrato:	25 días Calendario	Adición:	N/A
Fecha Finalización:	30 diciembre de 2025		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

SEDE EDUCATIVA PEDRO ANTONIO MOLINA

1. CERRRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK.

1.1 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA

Actividad planteada para delimitar las zonas de intervención para prevenir el ingreso de personal no autorizado y mitigar el riesgo de un posible accidente.

La cinta se dispone e instala en diferentes ubicaciones en algunos casos con soportes nuevos con madera o árboles, rejas u otros elementos disponibles en el lugar, y se reemplazó conforme se fue deteriorando o cayendo por el paso o circulación del personal de obra. En su instalación se utilizó herramienta menor.



1.2 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM

Esta actividad consistió en los cortes necesarios que se realizaron a la losa de concreto de la denominada cancha múltiple, para poder realizar la construcción de los dados que dieron soporte a la estructura del cerramiento de lámina que se construyó.



1.3 DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CMS

Consistió en la demolición de los espacios donde se ejecutaron los cortes para poder realizar la construcción de los dados que dieron soporte a la estructura del cerramiento de lámina que se construyó. En su ejecución se utilizó herramienta menor.



1.4 EXCAVACION TIERRA A MANO.

Las excavaciones planteadas según el presupuesto y lo expuesto por la entidad contratante hacían referencia en la cantidad contratada a las excavaciones para la construcción de las bases donde se ubicarían las columnas de la estructura metálica a instalar. En su ejecución se utilizó herramienta menor.



1.5 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL

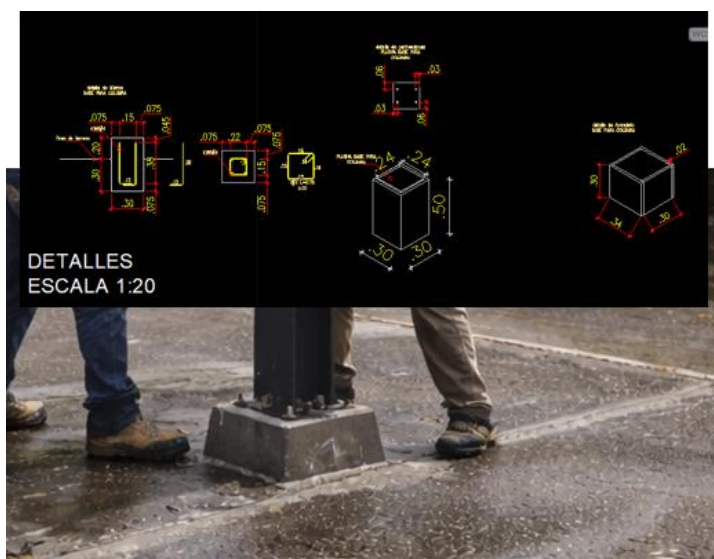
Este ítem se utilizó para poder realizar los rellenos necesarios en cada excavación donde se construyeron los dados de concreto de soporte de la estructura del cerramiento, para poder lograr la nivelación de la estructura. En su ejecución se utilizó herramienta menor.



1.6 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI

Esta actividad consistió en la fundición en concreto de 3000 PSI de las bases donde se apoyaron las columnas de la estructura metálica, la preparación del concreto atendió el principio de dosificación necesario para llegar a la resistencia esperada.

La mezcla se preparó en sitio, con el uso de herramienta menor y fue vaciada mediante carretilla; los volúmenes de cada base o dado de concreto según las especificaciones presentadas en el contrato eran de una altura de 50 centímetros, teniendo 30 centímetros enterrados.



1.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa.

Esta actividad consistió en el armado de los castillos en varillas según las especificaciones definidas por la supervisión en obra para refuerzo de los dados de concreto o bases donde se anclarían las columnas de la estructura metálica.

Los hierros fueron cortados, flejados y armados en taller, y llevados al sitio de la obra listos para fundición, se utilizó herramienta menor para el flejado y armado. En su ejecución se utilizó herramienta menor.



1.8 SUMINISTRO E INST PLATINAS EN 3/16" DE 24x24cm incluye 4 perforaciones.

Esta actividad consistió en la compra de platinas de 3/16" de 24x24 centímetros, y la realización de 4 perforaciones para el anclaje al hierro de las bases de concreto y posterior unión con la estructura metálica. Para el desarrollo se utilizó taladro de banco fijo, herramienta menor, y soldadura.



1.9 INSTALACION COLUMNAS METALICAS EXISTENTES.

Esta actividad consistió en la recepción de estructura metálica donada al municipio para realizar jornadas de taller para adecuarlas a las dimensiones requeridas con cortes o uniones, para luego izarla sobre las bases o dados de concreto mediante las platinas de 3/16", para su desarrollo se utilizó herramienta menor, soldadura.



1.10 INSTALACION DE LAMINAS DE METAL DECK EXISTENTES.

Esta actividad consistió en la recepción de láminas de metal deck donadas al municipio para realizar el cerramiento del que habla el primer capítulo del presupuesto, estas se adaptaron a las columnas metálicas instaladas. Para su instalación se utilizó herramienta menor, soldador y herramientas de corte de carpintería metálica.



1.11 ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA ≤ 10 KM

Actividad que se requirió para realizar el traslado del material que dispuso el municipio desde su sitio de almacenamiento hasta la obra, así como desde el taller a la obra de aquellos elementos que se fabricaron, unieron, cortaron o prepararon en taller antes de ir a su disposición final o instalación.



2 BATERIAS SANITARIAS

2.1 DESMONTE APARATO SANITARIO

Consistió en el retiro de los aparatos sanitarios ubicados en los diferentes baños de la sede, para su ejecución se utilizó herramienta menor.



2.2 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA

A través de este ítem se realizó el desmonte de las puertas y sus marcos, las cuales daban acceso a los diferentes baños, en su ejecución se utilizó herramienta menor.



2.3 DEMOLICION ENCHAFE CERAMICO

Se realizó la demolición del enchafe de los muros, del piso en general y de la pileta y orinales, para su ejecución se utilizó herramienta menor.



2.4 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE

Después de demolido el enchafe, se realizó la rasqueteada lijada y resanes necesarios para preparar la superficie de muros para el nuevo repello impermeabilizado. Para la ejecución se utilizó herramienta menor.



2.5 DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE

Se realiza el desmonte de la grifería vieja de los lavamanos múltiples y del lavamanos del baño de docentes.



2.6 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50- 60 CM.

Se realizó el enchape del piso del area en general de las baterías sanitarias, se instaló enchape ref. Piso Terrafuerte 51x51 tipo 2. Para su instalación se utilizaron herramientas menores y de corte de enchape.



2.7 ENCHAPE CERAMICA 25X25 – 1 CALIDAD.

Se realizó el enchape de paredes internas del area de los sanitarios, el salpicadero y lavamanos múltiples, la piletta de lavamanos y los orinales, se instaló enchape ref. Pared Slim Blanco Glacial 25x40 Ext. Para su instalación se utilizaron herramientas menores y de corte de enchape.



2.8 DEMOLICION REPELLO.

Se realizó la demolición del repello existente en los muros del area en general de las baterías sanitarias, según lo evidenciado e informado por la entidad contratante, este repello en su mayoría carecía de buena calidad, y se encontraba cargado de humedad, por lo que requería una demolición para reemplazo total. Se ejecutó con herramienta menor.



2.9 DEMOLICION MURO LAD. SOGA.

Se realizó la demolición del area necesaria para la instalación de la puerta del baño de docentes para modificar su ubicación debido que originalmente el ingreso al baño se daba por la ducha. La demolición se ejecutó con herramienta menor.



2.10 CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER).

Herramienta necesaria para realizar el corte preciso del muro donde se abrió la puerta de acceso al baño de docentes.



2.11 MURO LADRILLO SOGA SUCIO [2C].

Actividad consistente en cubrir el vano dejado por la puerta del baño de docentes que se reubicó.



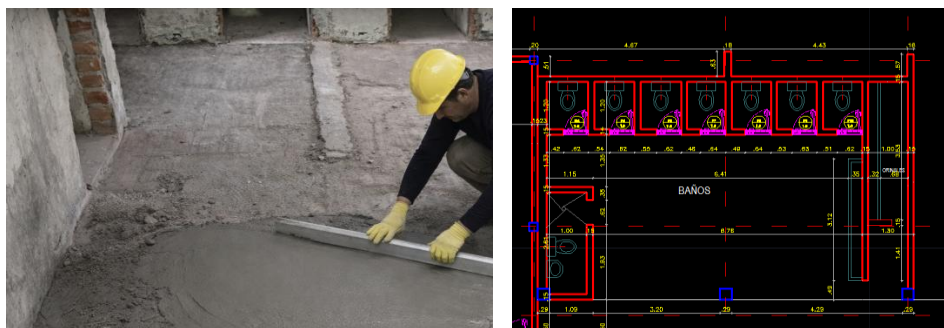
2.12 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2.

se repellaron las superficies de los muros de las baterías sanitarias con un componente impermeabilizante de SIKA en presentación líquida que se impregno en el mortero de repello.



2.13 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM.

se ejecutó la instalación de un mortero de nivelación del piso en general de las baterías sanitarias con un componente impermeabilizante de SIKA en presentación líquida que se impregno en el mortero.



2.14 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

Consistió en la aplicación del estuco a los muros de las baterías sanitarias que no fueron enchapados, en general tratándose de áreas exteriores, incluyendo sus filos y dilataciones.



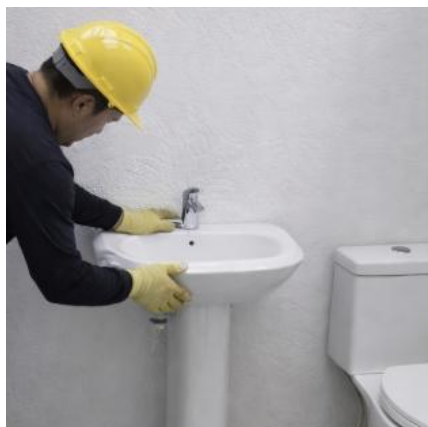
2.15 KORAZA [3M]

Pintura tipo exteriores utilizada para el acabado final de los muros del area de las baterías sanitarias, se aplicaron 3 manos, y su aplicación se realizó en jornadas diferentes para garantizar la adherencia y penetración de la pintura en las superficies.



2.16 COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I]

Se instaló un combo sanitario referencia XXX en el baño de docentes, para su instalación se utilizó herramienta menor.



2.17 SANITARIO LINEA MEDIA DS

Se instalaron sanitarios referencia Happy Blanco de Corona de dos piezas moderno. Para su instalación se utilizó herramienta menor.



2.18 MARCO ALUMINIO 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA



2.19 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA (2x0.60-1.0)

Estos items correspondieron a la fabricación, e instalación de las nuevas puertas de acceso a las baterías sanitarias individuales y al baño de docentes. Las naves y marcos se instalaron a plomo, modificando su eje de instalación ya que las que había estaban a diferentes alturas, de igual manera se entregaron con pasadores internos y con acabado final.



2.20 SALIDA S2 EMT

2.21 SAL LAMP EMT

Se realizó la reposición de los puntos de encendido y apagado de las luminarias del área general, y la salida de las mismas.



3. SALONES Y ACCESO.

3.1 CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S. JUNTA+VINOLO

En el Salón ubicado a la derecha desde el ingreso a la sede se ubicaba parte del cielo falso desprendido, se reemplazó esta area por un nuevo cielo y se le aplicó su respectivo acabado, para su instalación se utilizó herramienta menor y andamio.



3.2 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE

Actividad que se ejecutó para realizar la preparación de los muros de las aulas de clase, internos y externos para luego poder aplicar el nuevo acabado contratado. Para su ejecución se utilizó herramienta menor y andamio.



3.3 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2

Actividad consistente en aplicar un mortero en los muros de las aulas de clase, en sus caras internas y externas, con un componente impermeabilizante de SIKA en presentación líquida que se impregna en el mortero de repello. Para su ejecución se utilizó herramienta menor y andamio.



3.4 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]

Consistió en la aplicación del estuco a los muros de las aulas de clases, en sus caras internas y externas, incluyendo sus filos y dilataciones. Para su aplicación se utilizó herramienta menor y andamio.



2.15 KORAZA [3M]

Pintura tipo exteriores utilizada para el acabado final de los muros del área de las baterías sanitarias, se aplicaron 3 manos, y su aplicación se realizó en jornadas diferentes para garantizar la adherencia y penetración de la pintura en las superficies. Para su aplicación se utilizó herramienta menor y andamio.

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle



4. ACTIVIDADES GENERALES

4.1 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE EQ. PRESION

Se ejecutó la lavada de la superficie general de pisos de las aulas de clases y sus áreas externas, con equipo de lavado a presión.



4.2 ACARREO MATERIALES ESCOMBROS 10 PERS

Consistente en los viajes de retiro de escombros de las demoliciones y demás actividades ejecutadas en las que se produjo algún tipo de desecho a retirar de la obra.



4.3 CERRADURA ENTRADA PPAL

Se instaló una cerradura en la puerta de acceso principal de la sede, reemplazando el sistema anterior que consistía en bisagra o pasador metálico de

cierre con candado.



CONSTRUCCIÓN GRADAS, MATERAS Y PAVIMENTACIÓN COLEGIO ELEAZAR LIBREROS.

1. PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO

Actividad consistente en la revisión y ajuste de la propuesta en el area a intervenir, para su ejecucción se utilizó un equipo de topografía y personal no calificado.



Dentro de las actividades de preparación del sitio de trabajo se asumió a costro propio, la adecuación de una rampa de acceso apra el ingreso de la maquinaria para evitar un deterioro de las superficies existentes de concreto.



1.2 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8cm - 250mts.

Actividad planteada para delimitar las zonas de intervención para prevenir el ingreso de personal no autorizado y mitigar el riesgo de un posible accidente.

La cinta se dispone e instala en diferentes ubicaciones en algunos casos con soportes nuevos con madera o árboles, rejas u otros elementos disponibles en el lugar, y se reemplazó conforme se fue deteriorando o cayendo por el paso o circulación del personal de obra. En su instalación se utilizó herramienta menor.

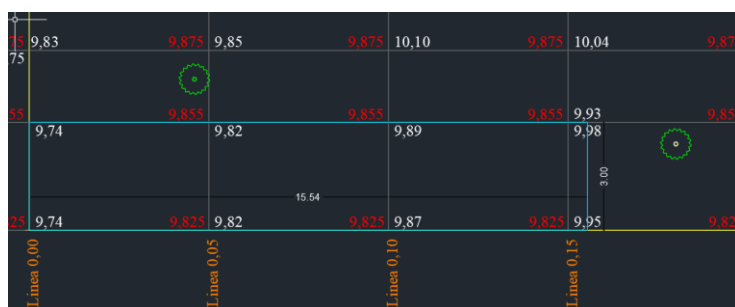


Se hizo necesario acordonar no solo el área de intervención si no la zona de acceso al colegio por la puerta donde se accede a la obra ya que las instalaciones son transitadas frecuentemente en la época navideña y de finalización de año escolar. Lo anterior con motivo de prevenir cualquier accidente.

2. DEMOLICIONES

2.1 DEMOLICION LOSA MACIZA C. $E \geq 20\text{cm}$

Se ejecutó la demolición de la losa que se ubicaba al lado de la palmera, en el área de intervención donde se construiría luego la nueva superficie. Para esta actividad se utilizó maquinaria pesada, bajo la supervisión de la administración municipal.



3. EXCAVACIONES

3.1 EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]

Se ejecutó la excavación se realizó en los 114.56 metros cúbicos del área total de la intervención donde se fundiría la losa nueva. Para esta actividad se utilizó maquinaria pesada, bajo la supervisión de la administración municipal.



3.2 CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 URBANA

Se ejecutó la conformación y compactación del area a intervenir, se ejecutó con un vibro compactador de doble rodillo Ingersoll-Rand DD24, con un peso operativo de 2,894 kg.



3.3 EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)(Andenes)

Se realiza la excavación del área a intervenir con el nuevo andén.

Se realiza la excavación del área a intervenir con el nuevo andén.



3.4 CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)

Se realizó el cargue del material de excavaciones para su posterior evacuación del sitio de intervención.

Se realizó el cargue del material de excavaciones para su posterior evacuación del sitio de intervención.



3.5 ACARREO MATERIALES CAMPERO CAMIONETA

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

Actividad ejecutada para realizar el retiro de material sobrante de obra.



3.6 DENSIDAD TERRENO(DENSIMETRO NUCLEAR)

Actividad realizada a través de la empresa INGETUL SAS, realizando el cálculo de peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono de arena.



4. ESTRUCTURA CANCHA, GRADAS Y MATERAS

4.1 SUB-BASE GRANULAR CLASE A

Material seleccionado aplicado para crear la base de apoyo para la nueva losa de concreto.



4.2 PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI

Nueva base fundida con concreto dosificado 3000 PSI, con malla electrosoldada según especificaciones entregadas por la entidad contratante, con ojales de 15 centímetros, con traslapo de dos ojos. Debido a la temporada decembrina, fue

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

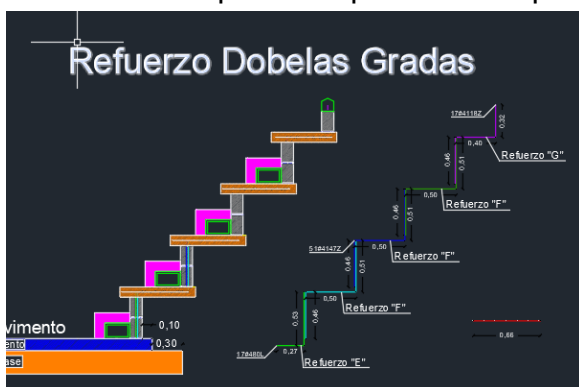
Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

imposible la contratación de un mixer para la fundición por lo que se debió ejecutar la actividad manualmente mezclando en trompo, se usaron dos y varias cuadrillas para la fundición.



4.3 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

Acero de refuerzo flejado para las obras de las materas y escaleras, acorde con los detalles aportados por el municipio.



4.4 SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM

Se ejecutó la construcción in sitio del sardinel para borde del andén en la parte superior sobre la carrera 4, acorde con las especificaciones técnicas aportadas por el municipio.



4.5 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI

Anden ubicado sobre la carrera 4, de 1.17 metros de ancho, con acabado escobillado, delimitado por el sardinel contra la vía, para su ejecución se utilizo

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

trompo de mezcla de concreto con la dosificación especificada por la entidad contratante.



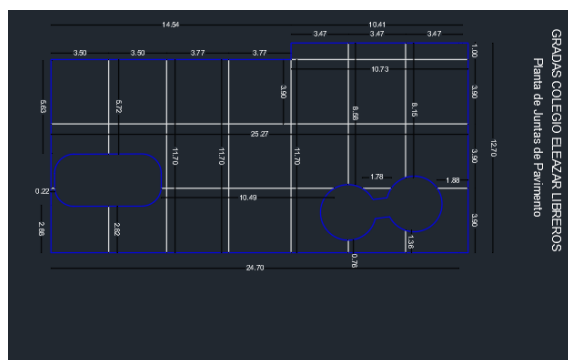
4.6 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT SALTARIN

Relleno con material seleccionado compactado con saltarín para la construcción de la gradería. Durante el proceso constructivo, se iba relleno después de la edificación de cada paso de las gradas. Para su ejecución se utilizó herramienta menor, y saltarín.



4.7 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 cm

Maquinaria utilizada de alquiler para realizar los cortes de dilatación de la losa fundida y del andén, acorde con las especificaciones aportadas por la entidad contratante.



4.8 MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM

Bloques de concreto estructural reforzado para la construcción de las gradas y

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

las materas. Para su instalación se utilizó herramienta menor.



4.9 LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM

Lozas macizas fundidas en las materas, según diseño aportado por la entidad contratante, así como para la fundición de los escalones de paso intermedio para las gradas y las mismas bases de paso de las graderías.



4.10 CINTA CONFINAMIENTO MURO ANTEPECHO CON CHAFLÁN h= 0,10m Ancho= 0,12m

Correspondiente a la cinta de confinamiento del remate de las materas y de las gradas construidas acorde con las especificaciones entregadas por el municipio.



4.11 MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84

Malla electrosoldada según especificaciones del contratante, instalada para la fundición de la losa del area general y las bases superiores de sentadero de las materas, las mallas se instalaron con topes ubicados bajo las mismas para garantizar que se ubiquen centradas en la fundición de las losas.



Durante la ejecución de las obras afortunadamente no se presentaron incidentes de mayor relevancia que incidieran en los tiempos o correcta ejecución de las actividades de obra, se contó siempre con la disposición de la entidad contratante para atender los llamados y peticiones, así como de su supervisión constante.

Se presentaron algunos periodos o episodios de lluvia que pueden evidenciarse en los registros de la bitácora de obra.

La obra se entregó el día 29 de diciembre de 2025, con la presencia del residente de obra y el supervisor de la Secretaría de Infraestructura Municipal.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor inicial	\$ 249.517.258,88
Adiciones	\$ 0,0
Valor total	\$ 249.517.258,88
Anticipo	\$ 74.855.177,66
Actas pagadas	\$ 0,0
Pago pendiente acta final.	\$174.662.081,22
Saldo a favor del municipio o pendiente de ejecución.	\$ 0,0

ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA.

ACTA FINAL DE OBRA ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.								
Nombre Entidad : SERPROVALLE SAS					FECHA		18/12/2025	
ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES CONTRACTUALES		CANTIDADES EJECUTADAS	
CÓDIGO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
(1) SEDE EDUCATIVA PEDRO ANTONIO MOLINA								
	1.0	CERRRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK						
330301	1.1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1,00	\$ 152.705,15	\$ 152.705,15	1,00	\$ 152.705,15
330127	1.2	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	10,80	\$ 7.355,00	\$ 79.434,00	10,80	\$ 79.434,00
010104	1.3	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1,70	\$ 51.487,66	\$ 87.529,02	1,70	\$ 87.529,02
100601	1.4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,85	\$ 28.967,87	\$ 24.622,68	0,85	\$ 24.622,68
100605	1.5	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	0,26	\$ 14.192,89	\$ 3.690,15	0,26	\$ 3.690,15
130204	1.6	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,19	\$ 1.629.273,73	\$ 1.938.835,73	1,19	\$ 1.938.835,73
120101	1.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	609,34	\$ 5.667,48	\$ 3.453.422,26	609,34	\$ 3.453.422,26
	1.8	SUMINISTRO E INST PLATINAS EN 3/16" DE 24x24cm incluye 4 perforaciones	UND	18,00	\$ 37.601,83	\$ 676.832,94	18,00	\$ 676.832,94
	1.9	INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS EXISTENTES	UND	18,00	\$ 37.498,87	\$ 674.979,66	18,00	\$ 674.979,66
	1.10	INSTALACION DE LAMINAS DE METAL DECK EXISTENTES	M2	155,19	\$ 23.498,47	\$ 3.646.727,55	155,19	\$ 3.646.727,55
010201	1.11	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	40,00	\$ 26.299,70	\$ 1.051.988,00	40,00	\$ 1.051.988,00
					SUBTOTAL	\$ 11.790.767,14	SUBTOTAL	\$ 11.790.767,14
	2	BATERIAS SANITARIAS						
100501	2.1	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	9,00	\$ 43.019,55	\$ 387.175,95	9,00	\$ 387.175,95
100515	2.2	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	8,00	\$ 28.968,59	\$ 231.748,72	8,00	\$ 231.748,72

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

1003 05	2.3	DEMOLICION ENCHAFE CERAMICO	M2	122,1 5	\$ 13.176,96	\$ 1.609.565,66	122,15	\$ 1.609.56 5,66
2901 15	2.4	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	175,4 7	\$ 4.322,44	\$ 758.458,54	175,47	\$ 758.458, 54
1005 40	2.5	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	7,00	\$ 29.744,98	\$ 208.214,86	7,00	\$ 208.214, 86
1905 14	2.6	ENCHAFE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	51,09	\$ 106.245,47	\$ 5.428.081,06	51,09	\$ 5.428.08 1,06
1905 27	2.7	ENCHAFE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD	M2	80,83	\$ 96.456,23	\$ 7.796.557,07	80,83	\$ 7.796.55 7,07
1003 19	2.8	DEMOLICION REPELLO	M2	222,7 8	\$ 9.420,14	\$ 2.098.618,78	222,78	\$ 2.098.61 8,78
1003 14	2.9	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	1,26	\$ 8.046,79	\$ 10.138,95	1,26	\$ 10.138,9 5
3301 07	2.1 0	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER)	DIA	2,00	\$ 66.809,00	\$ 133.618,00	2,00	\$ 133.618, 00
1402 23	2.1 1	MURO LADRILLO SOGA SUCIO [2C]	M2	1,12	\$ 87.823,53	\$ 98.362,35	1,12	\$ 98.362,3 5
1901 16	2.1 2	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	196,9 3	\$ 47.146,74	\$ 9.284.607,50	196,93	\$ 9.284.60 7,50
2001 08	2.1 3	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	51,09	\$ 54.659,80	\$ 2.792.569,18	51,09	\$ 2.792.56 9,18
2901 04	2.1 4	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	118,3 5	\$ 18.477,52	\$ 2.186.814,49	118,35	\$ 2.186.81 4,49
2906 19	2.1 5	KORAZA [3M]	M2	118,3 5	\$ 23.416,74	\$ 2.771.371,17	118,35	\$ 2.771.37 1,17
2504 50	2.1 6	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I]	JUEGO	1,00	\$ 1.067.412,76	\$ 1.067.412,76	1,00	\$ 1.067.41 2,76
2504 27	2.1 7	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	7,00	\$ 745.453,58	\$ 5.218.175,06	7,00	\$ 5.218.17 5,06
2213 01	2.1 8	MARCO ALUMINIO 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	8,00	\$ 313.380,08	\$ 2.507.040,64	8,00	\$ 2.507.04 0,64
3013 06	2.1 9	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	8,00	\$ 895.709,83	\$ 7.165.678,64	8,00	\$ 7.165.67 8,64
1705 39	2.2 0	SALIDA S2 EMT	UND	1,00	\$ 293.533,69	\$ 293.533,69	1,00	\$ 293.533, 69
1704 08	2.2 1	SAL LAMP EMT	UND	2,00	\$ 217.472,56	\$ 434.945,12	2,00	\$ 434.945, 12
					SUBTOTAL	\$ 52.482.688,19	SUBTOTAL	\$ 52.482.6 88,19
	3	SALONES Y ACCESO						
1804 05	3.1	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	9,20	\$ 69.952,53	\$ 643.563,27	9,20	\$ 643.563, 27

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

2901 15	3.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	343,3 7	\$ 4.322,44	1.484.196,22	\$ 343,37	1.484.19 6,22
1901 16	3.4	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	343,3 7	\$ 47.146,74	16.188.776,1 1	\$ 343,37	16.188.7 76,11
2901 04	2.1 4	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	343,3 7	\$ 18.477,52	6.344.626,04	\$ 343,37	6.344.62 6,04
2906 19	2.1 5	KORAZA [3M]	M2	343,3 7	\$ 23.416,74	8.040.606,01	\$ 343,37	8.040.60 6,01
					SUBTOTAL	\$ 32.701.767,6 5	SUBT OTAL	\$ 32.701.7 67,65
	4	ACTIVIDADES GENERALES						
3101 04	4.1	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	196,0 0	\$ 4.350,12	\$ 852.623,52	\$ 196,00	852.623, 52
1006 24	4.2	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	H	11,90	\$ 305.056,25	3.630.169,37	\$ 11,90	3.630.16 9,37
2701 12	4.3	CERRADURA ENTRADA PPAL	UND	1,00	\$ 161.048,55	\$ 161.048,55	\$ 1,00	161.048, 55
					SUBTOTAL	\$ 4.643.841,44	SUBT OTAL	\$ 4.643.84 1,44
		(2) CONSTRUCCIÓN GRADAS, MATERAS Y PAVIMENTACIÓN COLEGIO ELEAZAR LIBREROS						
	5	PRELIMINARES						
0.101 07	5.1	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE- PISTAS	M2	367,2 1	\$ 2.071,99	\$ 760.855,44	\$ 367,21	760.855, 44
3303 01	5.2	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8cm - 250mts.	UND	1,00	\$ 152.705,15	\$ 152.705,15	\$ 1,00	152.705, 15
					SUBTOTAL	\$ 913.560,59	SUBT OTAL	\$ 913.560, 59
	6	DEMOLICIONES						
1002 10	6.1	DEMOLICION LOSA MACIZA C. E>=20cm	m²	46,62	\$ 82.034,51	3.824.448,85	\$ 46,62	3.824.44 8,85
					SUBTOTAL	\$ 3.824.448,85	SUBT OTAL	\$ 3.824.44 8,85
	7	EXCAVACIONES						
0102 03	7.1	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	m³	114,5 6	\$ 5.108,50	\$ 585.229,76	\$ 114,56	585.230
0102 12	7.2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	m²	317,5 6	\$ 6.327,67	2.009.414,88	\$ 317,56	2.009.41 5
1006 02	7.3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)(Andenes)	m³	7,88	\$ 37.744,54	\$ 297.426,97	\$ 7,88	297.427
0102 09	7.4	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	m³	131,7 6	\$ 5.773,59	\$ 760.728,21	\$ 131,76	760.728

Nit 901562059-3

Teléfono 3122575094

Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

100613	7.5	ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA	m³ - km	797,87	\$ 12.337,46	\$ 9.843.689,21	797,87	\$ 9.843.689
530105	7.6	DENSIDAD TERRENO(DENSIMETRO NUCLEAR)	und.	10,00	\$ 59.635,00	\$ 596.350,00	10	\$ 596.350
					SUBTOTAL	\$ 14.092.839,03	SUBTOTAL	\$ 14.092.839,03
	8	ESTRUCTURA CANCHA, GRADAS Y MATERAS						
83201	8.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	m³	69,07	\$ 114.583,57	\$ 7.914.287,17	69,07	\$ 7.914.287
200135	8.2	PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI	m²	268,58	\$ 92.066,57	\$ 24.727.239,37	268,58	\$ 24.727.239
120101	8.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	kg.	270,35	\$ 5.667,48	\$ 1.532.203,21	270,35	\$ 1.532.203
10310	8.4	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	M	14,52	\$ 78.889,54	\$ 1.145.476,12	14,52	\$ 1.145.476
200132	8.5	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	m²	17,66	\$ 83.051,63	\$ 1.466.691,78	17,66	\$ 1.466.692
100620	8.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	m³	71,24	\$ 80.076,66	\$ 5.704.661,25	71,24	\$ 5.704.661
330127	8.7	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 cm	ml.	127,36	\$ 7.355,00	\$ 936.732,80	127,36	\$ 936.733
140106	8.9	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM	m²	50,67	\$ 74.767,29	\$ 3.788.458,58	50,67	\$ 3.788.459
120202	8.1	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	m²	72,68	\$ 90.413,26	\$ 6.571.235,73	72,68	\$ 6.571.236
130212	8.1	CINTA CONFINAMIENTO MURO ANTEPECHO CON CHAFLÁN h= 0,10m Ancho= 0,12m	ml.	69,20	\$ 46.251,80	\$ 3.200.624,56	69,2	\$ 3.200.625
130106	8.1	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	kg.	731,50	\$ 8.244,77	\$ 6.031.049,25	731,5	\$ 6.031.049
					SUBTOTAL	\$ 63.018.659,82	SUBTOTAL	\$ 63.018.659,82
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (1) + (2)				\$ 183.468.572,71		\$ 183.468.572,71
	5	COSTOS INDIRECTOS						
	5.1	ADMINISTRACION	30,0%			\$ 55.040.571,81		\$ 55.040.571,81
	5.2	IMPREVISTOS	0,0%			\$ 0,00		\$ 0,00
	5.3	UTILIDAD	6,0%			\$ 11.008.114,36		\$ 11.008.114,36
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 66.048.686,17		\$ 66.048.686,17
		VALOR TOTAL				\$ 249.517.258,88		\$ 249.517.258,88

Nit 901562059-3


Teléfono 3122575094



Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle


MEMORIAS DE CÁLCULO.

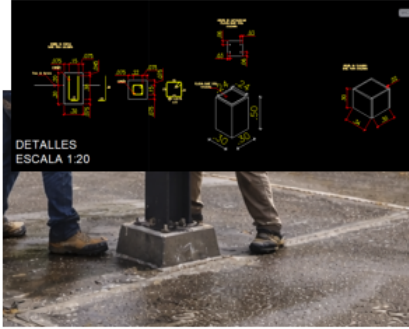
SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
27/12/2025												
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA								
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ		NIT O.C.C.		94356715				
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		901562059-3		CONTRATO DE OBRA N° OP-360-2025		
CAPITULO	CERRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK			ITEM	1.1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A-8CM-250MTS.			UNID.	UND	UBICACIÓN	
				Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	M-Eda. Total		
				Back	Alt	Longitud						
Subtotal										1,00		
DESPERDICIO 5%										0,05		
TOTAL										1,05		
				Firma:								
				ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS				


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
27/12/2025												
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA								
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ		NIT O.C.C.		94356715				
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		901562059-3		CONTRATO DE OBRA N° OP-360-2025		
CAPITULO	CERRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK			ITEM	1.1	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4A 7 CM			UNID.	M	UBICACIÓN	
				Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	M-Eda. Total		
				Back	Alt	Longitud						
Subtotal										10,80		
DESPERDICIO 5%										0,54		
TOTAL										11,34		
				Firma:								
				ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS				

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES									
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ						
27/12/2025													
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA									
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O C.C. 94356715					
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS				NIT O C.C. 901562059-3					
								CONTRATO DE OBRA N° OP-360-2025					
CAPITULO		CERRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK		ITEM		1.2		DEMOLICION LOSA CONCRETO E=20CMS		UNID. M2		ubicación	
				Fecha		Localización		Dimensiones		No Elem.		No. de Total	
								Ancho Alto Longitud					
								0,30		0,30 18,00		1,62	
Subtotal										1,62			
DESPERDICIO										5%		0,08	
TOTAL												1,70	
								Firma:					
								 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS					


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES									
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ						
27/12/2025													
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA									
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O C.C. 94356715					
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS				NIT O C.C. 901562059-3					
								CONTRATO DE OBRA N° OP-360-2025					
CAPITULO		CERRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK		ITEM		1.3		EXCAVACION TIERRA A MANO		UNID. M3		ubicación	
 				Fecha		Localización		Dimensiones		No Elem.		No. de Total	
								Ancho Alto Longitud					
								0,30 0,50		0,30 18,00		0,81	
Subtotal										0,81			
DESPERDICIO										5%		0,04	
TOTAL												0,85	
								Firma:					
								 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS					


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES											
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ								
27/12/2025															
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL											
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ											
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°					
						901562059-3				OP-360-2025					
CAPITULO		1.0		ITEM		1.4		RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL							
						Fecha		Localización		UNID.		M3		ubicación	
										Bacha		Alta		Longitud	
										0,30		0,15		0,30	
										18,00		0,24			
										Subtotal		0,24			
										DESPERDICIO		5%			
										TOTAL		0,26			
								Firma:							
								 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS							

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES											
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ								
27/12/2025															
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL											
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ											
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°					
						901562059-3				OP-360-2025					
CAPITULO		CERRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK		ITEM		1.5		COLUMNA CONCRETO 3000 PSI							
						Fecha		Localización		UNID.		M3		ubicación	
										Bacha		Alta		Longitud	
										0,30		0,70		0,30	
										18,00		1,13			
										Subtotal		1,13			
										DESPERDICIO		5%			
										TOTAL		1,19			
								Firma:							
								 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS							


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
27/12/2025											
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBEROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL							
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ							
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°	
						901562059-3				OP-360-2025	
CAPITULO	CERRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK			ITEM	1.8	INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS EXISTENTES			UNID.	UMD	Indicación
				Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	M-Edm. Total	
				Ancho	Alto	Longitud					
					se instalan una cada 3 metros	1,00	1,00	1,00	18,00	18,00	
Subtotal										18,00	
DESPERDICIO									5%		
TOTAL										18,00	
				Firma:							
				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS							


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
27/12/2025											
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBEROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL							
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ							
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°	
						901562059-3				OP-360-2025	
CAPITULO	CERRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK			ITEM	1.9	INSTALACION DE LAMINAS DE METAL DECK EXISTENTES			UNID.	M2	Indicación
				Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	M-Edm. Total	
				Ancho	Alto	Longitud					
					acorde con las indicaciones aportadas por la entidad contratante, en el borde de la foza de la cancha multiple para cercar la zona	1,00	3,00	51,73	1,00	155,19	
Subtotal										155,19	
DESPERDICIO									5%		
TOTAL										155,19	
				Firma:							
				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS							

SERPROVALLE S.A.S		MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	T-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL									
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ			NIT O.C.C.	94356715					
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS			NIT O.C.C.	901562059-3					
				CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025				
CAPITULO	BATERIAS SANITARIAS		ITEM	2.2		DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA				
				Fecha	Localización	UNID.	UND	ESPECIFICACIÓN		
						Ancho	Altura	Longitud	Nº Elem.	M-Edm. Total
					PUERTAS DE BAÑOS	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00
Subtotal							8,00			
DESPERDICIO						5%				
TOTAL							8,00			
				Firma:						
				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS						


SERPROVALLE S.A.S		MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	T-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL									
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ			NIT O.C.C.	94356715					
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS			NIT O.C.C.	901562059-3					
				CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025				
CAPITULO	BATERIAS SANITARIAS		ITEM	2.3		DEMOLICION EN CHAPE CERAMICO				
 				NUMERACION	Localización	UNID.	M2	ESPECIFICACIÓN		
						Ancho	Altura	Longitud	Nº Elem.	M-Edm. Total
				1	PAREDES INTERNAS	1,00	1,46	3,86	1,00	5,62
				2	PAREDES INTERNAS	1,00	1,46	3,80	1,00	5,53
				3	PAREDES INTERNAS	1,00	1,46	3,62	1,00	5,38
				4	PAREDES INTERNAS	1,00	1,46	3,70	1,00	5,38
				5	PAREDES INTERNAS	1,00	1,46	3,72	1,00	5,41
				6	PAREDES INTERNAS	1,00	1,46	3,79	1,00	5,51
				7	PAREDES INTERNAS	1,00	1,46	3,74	1,00	5,44
				8	PAREDES INTERNAS	1,00	1,47	6,65	1,00	5,78
				9	PAREDES INTERNAS	1,00	1,45	3,34	1,00	4,84
				10	SALPICADERO DE LAVAMANOS	1,00	0,39	3,12	1,00	3,09
				11	PIETA DE LAVAMANOS	1,00	0,43	3,42	1,00	6,68
				11	PISO EN GENERAL CALCULADA EN CAD					12,00
				Subtotal						122,15
DESPERDICIO						0,00				
TOTAL						122,15				
				Firma:						
				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS						

Nit 901562059-3
 Teléfono 3122575094
 Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL											
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O C.C.	94356715						
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS				NIT O C.C.	901562059-3	CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025			
CAPITULO	BATERIAS SANITARIAS			ITEM	2.10	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER)			UNID.	DIA	ubicación	
				Fecha	Localización	Backs	Altura	Incidencia	No Elem.	M. de T. de T.		
					para abrir nueva puerta en baño de profesores	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00		
Subtotal										2,00		
DESPERDICIO									5%			
TOTAL										2,00		
				Firma:								
												
				ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				RESIDENTE DE OBRA				
				SERPROVALLE SAS								

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL											
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O C.C.	94356715						
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS				NIT O C.C.	901562059-3	CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025			
CAPITULO	BATERIAS SANITARIAS			ITEM	2.11	MURO LADRILLO SOGA SUCIO [20]			UNID.	M2	ubicación	
 				Fecha	Localización	Backs	Altura	Incidencia	No Elem.	M. de T. de T.		
					para cerrar antiguo puerta en baño de profesores	1,00	1,80	0,62	1,00	1,12		
Subtotal										1,12		
DESPERDICIO									5%			
TOTAL										1,12		
				Firma:								
												
				ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				RESIDENTE DE OBRA				
				SERPROVALLE SAS								

[illegible][illegible]

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES																	
FECHA				DD		MM		AA		CORTE N°		1-Final		ELABORÓ		ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL																	
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ						NIT O.C.C.		94356715									
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS						NIT O.C.C.		901562059-3		CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025					
CAPITULO				SALONES Y ACCESO				ITEM		3.4		REPELO MURO IMPERMEABLE 1:2				UNID.		M2		INDICACIÓN	
				UBICACIÓN		Localización		Ancho		Alto		Incidido		No Elem.		M. 2da. Total					
				SALON 1		MURO EJE A CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS		1,00		2,30		3,31		2,00		46,11					
				SALON 1		MURO EN EJE 4 CARAS INT Y EXT		1,00		3,20		6,77		2,00		43,33					
				SALON 1		MURO EN EJE B CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS Y PUERTA		1,00		2,30		3,31		2,00		44,54					
				SALON 1		MURO EN EJE 1 CARA EXTERIOR E INTERIOR		1,00		3,20		6,77		2,00		43,33					
				SALON 2		MURO EN EJE C CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS		1,00		3,20		10,26		2,00		59,26					
				SALON 2		MURO EN EJE 2 CARA INTERNA Y EXTERNA		1,00		2,30		6,73		2,00		39,03					
				SALON 2		MURO EN EJE D CARA EXTERNA MENOS VANOS DE VENTANA Y PUERTA		1,00		3,20		7,47		1,00		23,30					
				SALON 2		MURO EN EJE 2 CARA INTERNA Y EXTERNA MENOS VANOS DE VENTANA Y PUERTA		1,00		2,30		6,73		2,00		33,87					
				Subtotal														333,37			
DESPERDICIO														10,00							
TOTAL														343,37							
Firma:																					
																					
ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ																					
RESIDENTE DE OBRA																					
SERPROVALLE SAS																					

SERPROVALLE S.A.S


MEMORIAS DE CANTIDADES


FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-Final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
27/12/2025												
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL											
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ					NIT O.C.C.	94356715					
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS					NIT O.C.C.	901562059-3					
						CONTRATO DE OBRA N°	OP-360-2025					
CAPITULO	SALONES Y ACCESO			ITEM	2.14	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	UNID.	SUPUESTO		ubicación		
						UBICACIÓN	Localización	Dimensiones				
								Ancho	Alto	longitud	No Elem.	M. 2da. Total
						SALON 1	MURO EJE A CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS	1,00	2,30	3,31	2,00	46,11
						SALON 1	MURO EN EJE 4 CARAS INT Y EXT	1,00	3,20	6,77	2,00	43,33
						SALON 1	MURO EN EJE B CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS Y PUERTA	1,00	2,30	3,31	2,00	44,54
						SALON 1	MURO EN EJE 1 CARA EXTERIOR E INTERIOR	1,00	3,20	6,77	2,00	43,33
						SALON 2	MURO EN EJE C CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS	1,00	3,20	10,26	2,00	59,26
						SALON 2	MURO EN EJE 2 CARA INTERNA Y EXTERNA	1,00	2,30	6,73	2,00	39,03
						SALON 2	MURO EN EJE D CARA EXTERNA MENOS VANOS DE VENTANA Y PUERTA	1,00	3,20	7,47	1,00	23,30
						SALON 2	MURO EN EJE 2 CARA INTERNA Y EXTERNA MENOS VANOS DE VENTANA Y PUERTA	1,00	2,30	6,73	2,00	33,87
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
Subtotal											333,37	
DESPERDICIO										32	10,00	
TOTAL											343,37	


Firma:


ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

Nit 901562059-3
 Teléfono 3122575094
 Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES													
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ										
27/12/2025																	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL																
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ																
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS																
NIT O C.C.	94356715																
NIT O C.C.	901562059-3																
CONTRATO DE OBRA N°	OP-360-2025																
CAPITULO	SALONES Y ACCESO		ITEM	2.15	KORAZA [DM]		UNID.	M2	ubicación								
																	
											UBICACIÓN	Localización	Área	Altura	Longitud	Nº Elem.	Nº de Total
											SALON 1	MURO EJE A CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS	1,00	2,30	3,31	2,00	46,11
											SALON 1	MURO EN EJE 4 CARAS INT Y EXT	1,00	3,20	6,77	2,00	43,33
											SALON 1	MURO EN EJE B CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS Y PUERTA	1,00	2,30	3,31	2,00	44,54
											SALON 1	MURO EN EJE 1 CARA EXTERIOR E INTERIOR	1,00	3,20	6,77	2,00	43,33
											SALON 2	MURO EN EJE C CARA EXTERIOR E INTERIOR MENOS VANOS DE VENTANAS	1,00	3,20	10,26	2,00	53,26
											SALON 2	MURO EN EJE 2 CARA INTERNA Y EXTERNA	1,00	2,30	6,73	2,00	38,03
											SALON 2	MURO EN EJE D CARA EXTERNA	1,00	3,20	7,47	1,00	23,30
											SALON 2	MURO EN EJE 2 CARA INTERNA Y EXTERNA MENOS VANOS DE VENTANA Y PUERTA	1,00	2,30	6,73	2,00	33,87
											Subtotal						333,37
DESPERDICIO						10,00											
TOTAL						343,37											
Firma:																	
																	
ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS																	


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES													
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ										
27/12/2025																	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL																
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ																
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS																
NIT O C.C.	94356715																
NIT O C.C.	901562059-3																
CONTRATO DE OBRA N°	OP-360-2025																
CAPITULO	ACTIVIDADES GENERALES		ITEM	4.1	LIMPIEZA LAPADO SUPERFICIE EQ. PRESION		UNID.	M2	ubicación								
																	
											UBICACIÓN	Localización	Área	Altura	Longitud	Nº Elem.	Nº de Total
												SALONES 1 Y 2 Y PASILLO DE ACCESO CALCULADA EN CAD					136,60
											Subtotal						136,60
DESPERDICIO						0,00											
TOTAL						136,60											
Firma:																	
																	
ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS																	


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL											
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O.C.C.	94356715						
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS				NIT O.C.C.	901562059-3	CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025			
CAPITULO	ACTIVIDADES GENERALES		ITEM	4.2	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS			UNID.	N	ubicación		
				UBICACIÓN	Localización	Dimensiones		ubicación		M-Elom. M-Alt. Total		
						Area	Alto	Longitud				
					PARA MOVIMIENTO DE PUPITRES Y OTROS ENCERES QUE HAY EN LOS SALONES							11,30
Subtotal										11,30		
DESPERDICIO										0,00		
TOTAL										11,30		
				Firma:				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS				


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL											
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O.C.C.	94356715						
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS				NIT O.C.C.	901562059-3	CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025			
CAPITULO	ACTIVIDADES GENERALES		ITEM	4.3	CERRADURA ENTRADA PPAL			UNID.	UND	ubicación		
				UBICACIÓN	Localización	Dimensiones		ubicación		M-Elom. M-Alt. Total		
						Area	Alto	Longitud				
					CERRADURA DE PORTON DE ACCESO							1,00
Subtotal										1,00		
DESPERDICIO										0,00		
TOTAL										1,00		
				Firma:				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS				

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	T-Final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL										
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ										
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS										
				MIT O C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025	
				MIT O C.C.		901562059-3					
CAPITULO	DEMOLICIONES			ITEM	6.1	DEMOLICION LOSAMACIZA C. E-20cm			UNID.	m³	ubicación
 				UBICACIÓN	Localización	Área	Altura	Incidencia	Nº Elem.	M-Edif. Total	
					Pisca al pie de la Palma	15,54		3,00	1,00	46,62	
Subtotal									46,62		
DESPERDICIO									0,00		
TOTAL									46,62		
				Firma:				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS			

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	T-Final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL										
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ										
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS										
				MIT O C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025	
				MIT O C.C.		901562059-3					
CAPITULO	EXCAVACIONES			ITEM	7.1	EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) [SR]			UNID.	m³	ubicación
 				UBICACIÓN	Localización	Área	Altura	Incidencia	Nº Elem.	M-Edif. Total	
										114,56	
Subtotal									114,56		
DESPERDICIO									0,00		
TOTAL									114,56		
				Firma:				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS			


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES									
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-Final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ						
27/12/2025													
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL									
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				MIT O C.C. 94356715					
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS				MIT O C.C. 901562059-3					
								CONTRATO DE OBRA N° OP-360-2025					
CAPITULO	EXCAVACIONES			ITEM	7.2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR-95 URBANA			UNID.	m³	INDICACIÓN		
						UBICACIÓN	Localización	Dimensiones		No Elem.	Mód. Total		
								Ancho	Alto			Longitud	
							CALCULADA EN CAD						317,56
						Subtotal					317,56		
						DESPERDICIO					0,00		
						TOTAL					317,56		
						Firma:							
						 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS							


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES								
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-Final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ					
27/12/2025												
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL								
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				MIT O C.C. 94356715				
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS				MIT O C.C. 901562059-3				
								CONTRATO DE OBRA N° OP-360-2025				
CAPITULO	EXCAVACIONES			ITEM	7.3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) (Andenes)			UNID.	m³	INDICACIÓN	
						UBICACIÓN	Localización	Dimensiones		No Elem.	Mód. Total	
								Ancho	Alto			AREA
							Anden + Sardinol kra 4to		0,30	26,25	1,00	7,88
						Subtotal					7,88	
						DESPERDICIO					0,00	
						TOTAL					7,88	
						Firma:						
						 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS						


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES									
27/12/2025				CORTE N°		t-final		ELABORÓ		ARC JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ			
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBEROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ									
SUPERVISOR				NIT O.C.C.		94356715		NIT O.C.C.		901562059-3			
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		901562059-3		CONTRATO DE OBRA N°			
CAPITULO				EXCAVACIONES		ITEM		7.4		CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)			
				UNID.		0		ubicación					
				ubicación		Localización		Dimensiones					
				Ancho		Alto		AREA		Mts Elom.		Mts.2da. Total	
				DEMOLICION LOSA MACIZA		0,20		45,62		1,00		9,32	
				EXCAVACION A MAQUINA(CAJEJO) (SR)		1,00		1,00		114,56		114,56	
				EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)(Andoneo)		1,00		1,00		7,88		7,88	
Subtotal										131,76			
DESPERDICIO										0,00			
TOTAL										131,76			
Firma:													
													
ELABORÓ: ARC JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ													
RESIDENTE DE OBRA													


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES										
FECHA		DD	MM	AA	CORTE M°		t-final		ELABORÓ		ARG JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ			
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL												
SUPERVISOR		WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O.C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA M°		OP-360-2025		
CONTRATISTA		SERPROVALLE SAS				NIT O.C.C.		901562059-3						
CAPÍTULO		EXCAVACIONES		ITEM		7.5		ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA						
		UBICACIÓN		Localización		Dimensionar		Hs Elom.		Mts. Tot.				
						Ancha	Alta					M2		
				DEMOLICIN LOZA							183,38			
				EXCAVACION A MAGUINA SIN RETIRO							362,82			
				EXCAVACION EN CONGLOMERADO							245,07			
											-			
											-			
											-			
											-			
											-			
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
									-					
								</						


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	T-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
27/12/2025											
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL							
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O.C.C. 94356715			
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS				NIT O.C.C. 901562059-3			
								CONTRATO DE OBRA N° QP-360-2025			
CAPITULO	EXCAVACIONES			ITEM	T.6	DENSIDAD TERRENO (DENSIMETRO NUCLEAR)			UNID.	med.	INDICACION
				UBICACIÓN	Localización	Dimensiónes			M3	No Elem.	M. Ed. Total
				Área	Alta						
					PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12C				1,00	5,00	5,00
					M 3000 PSI				1,00	5,00	5,00
					GRADAS						
Subtotal											10,00
DESPERDICIO											0,00
TOTAL											10,00
								Firma:			
								 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS			

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	T-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
27/12/2025											
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL							
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ				NIT O.C.C. 94356715			
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS				NIT O.C.C. 901562059-3			
								CONTRATO DE OBRA N° QP-360-2025			
CAPITULO	ESTRUCTURA CANCHA, GRADAS Y MATERAS			ITEM	8.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-S9 clase A)			UNID.	m³	INDICACION
				UBICACIÓN	Localización	Dimensiónes			ÁREA	No Elem.	M. Ed. Total
				Área	Alta						
					Zona interna		1,21	285,18	1,00	65,13	
					Andén exterior		1,11	16,31	1,00	3,34	
Subtotal											69,07
DESPERDICIO											0,00
TOTAL											69,07
								Firma:			
								 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS			


SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL										
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ										
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS										
				NIT O.C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025	
				NIT O.C.C.		901562059-3					
CAPITULO	ESTRUCTURA CHURCH, GRADOS 1			ITEM	8.4	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20)H-36-45CM			UNID.	M	ubicación
				UBICACIÓN	Localización	Dimensiones		LONGITUD	No Elem.	M-Eda. Total	
						Ancho	Alto				
					Sardinel Kra 4ta motera exterior			14.52	1.00	14.52	
Subtotal										14.52	
DESPERDICIO										0.00	
TOTAL										14.52	
				Firma:				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS			

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL										
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ										
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS										
				NIT O.C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°		OP-360-2025	
				NIT O.C.C.		901562059-3					
CAPITULO	ESTRUCTURA CHURCH, GRADOS 1			ITEM	8.5	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI			UNID.	m²	ubicación
				UBICACIÓN	Localización	Dimensiones		AREA	No Elem.	M-Eda. Total	
						Ancho	Alto				
					Anden kra 4ta Motera Exterior			17.66	1.00	17.66	
Subtotal										17.66	
DESPERDICIO										0.00	
TOTAL										17.66	
				Firma:				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS			

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES						
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL									
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ									
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		94356715	CONTRATO DE OBRA N°				
					901562059-3	OP-360-2025				
CAPITULO	ESTRUCTURA CHURCH, GRADOS Y MATERIAS		ITEM	8.9	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x34CM					
				UBICACIÓN	Localización	UNID.	m³	Indicaciones		
						Área	Área	LONGITUD	Mu Elem.	M-Eda. Total
				Grados		25,18		1,00		25,18
				Materia Guanabano		3,01		1,00		3,01
				Materia Palma		8,06		1,00		8,06
				Materia Exterior		8,43		1,00		8,43
										-
										-
										-
										-
Subtotal							50,67			
DESPERDICIO							0,00			
TOTAL							50,67			
				Firma:						
				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS						

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES						
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL									
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ									
CONTRATISTA	SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		94356715	CONTRATO DE OBRA N°				
					901562059-3	OP-360-2025				
CAPITULO	ESTRUCTURA CHURCH, GRADOS Y MATERIAS		ITEM	8.10	LOSAMACIZACION H-10 CM					
				UBICACIÓN	Localización	UNID.	m³	Indicaciones		
						Área	Área	LONGITUD	Mu Elem.	M-Eda. Total
				Grados		39,57		1,00		39,57
				Materia Guanabano		14,28		1,00		14,28
				Materia Palma		12,77		1,00		12,77
				ESCALON		0,51		12,00		6,06
										-
										-
										-
										-
Subtotal							72,68			
DESPERDICIO							0,00			
TOTAL							72,68			
				Firma:						
				 ELABORÓ: ARQ JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS						

Nit 901562059-3
 Teléfono 3122575094
 Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARC JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
27/12/2025											
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBEROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL							
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ							
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°	
								901562059-3		OP-360-2025	
CAPITULO	ESTRUCTURA CANCHA, GRADAS Y MATERAS			ITEM	8.11	CINTA CONFINAMIENTO MURO ANTEPECHO CON CHAFLANA- 0,10m Ancho- 0,12m			UNID.	m.	ubicación
				UBICACIÓN	Localización	Dimensiones		Mm Elem.	Medida Total		
						ANCHO	AREA			LONGITUD	
					Gradas			13,70	1,00	13,70	
					Matera Guanabano			19,20	1,00	19,20	
					Matera Palma			15,70	1,00	15,70	
					Matera Exterior			20,60	1,00	20,60	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
				Subtotal							
DESPERDICIO									0,00		
TOTAL									69,20		
								Firma:			
								 ELABORÓ: ARC JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS			

SERPROVALLE S.A.S				MEMORIAS DE CANTIDADES							
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1-final	ELABORÓ	ARC JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ				
27/12/2025											
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBEROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL							
SUPERVISOR				WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ							
CONTRATISTA				SERPROVALLE SAS		NIT O.C.C.		94356715		CONTRATO DE OBRA N°	
								901562059-3		OP-360-2025	
CAPITULO	ESTRUCTURA CANCHA, GRADAS Y MATERAS			ITEM	8.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.34			UNID.	Eq.	ubicación
				UBICACIÓN	Localización	Dimensiones		Mm Elem.	Medida Total		
						LONGITUD	ANCHO			KG/UND	
					Cancha			23,26	20,00	585,20	
					Gradas			23,26	3,00	69,78	
					Matera Guanabano			23,26	1,00	23,26	
					Matera Palma			23,26	1,00	23,26	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
				Subtotal							
DESPERDICIO									0,00		
TOTAL									731,50		
								Firma:			
								 ELABORÓ: ARC JORGE ANDRES TIGREROS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA SERPROVALLE SAS			

PERSONAL VINCULADO.

En la ejecución de las obras se contó con la vinculación del siguiente personal calificado:

Ingeniero Raúl Rodríguez García, en calidad de Director de Obra.
 Arquitecto Jorge Andrés Tigreros González, en calidad de Residente de Obra
 Gloria Viviana Álvarez Vásquez, en calidad de Profesional SISO.

Con base a los datos presentados, se informa el cumplimiento del objeto contractual, así

Nit 901562059-3
 Teléfono 3122575094
 Dir. Cr 5 n° 22-18 Andalucía Valle

como de las actividades contratadas, con el personal ofrecido en la propuesta, así como con los materiales con la calidad aprobados por la supervisión y la entidad contratante, Dado en Andalucía Valle del Cauca a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

BITACORA DE OBRA.

La bitácora de obra, se entregará en el recibo de obra a la supervisión del contrato.

PLANOS RECORD.

De acuerdo con el tipo de intervención, no se requiere la construcción de planos récord, ya que no hubo modificación alguna a la distribución espacial o de redes que amerite el trazado de nuevos planos.

Atentamente,



BEATRIZ EUGENIA OLAYA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
SERPROVALLE S.A.S.
