

NIT.900.195.023-0


**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°4.




“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 4384 DE 2024.
INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIERIA SAS**

1 AL 14 DE ABRIL DE 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

DIRECCIÓN: Cra 4 N 8 - 43 interior 9, Ibagué – Tolima
EMAIL: ingeologia@gmail.com TELEFONO: 3118587090



Contratista: UNION TEMPORAL CONSTRUPOYECTOS 2021

Interventoría: INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLÓGIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MES O PERIODO: 1 AL 14 DE ABRIL DE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N/A
1	INTRODUCCION		3
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		5
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Items no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		9
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	9
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	10
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	11
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	12
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	13
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	14
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	15
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	16
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		16
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	16
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	16
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	16
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	16
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	16
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	16
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		17
5.1	Información general del contrato		17
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		18
5.3	Informes especialistas y profesionales		18
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		18
5.5	Informe matriz de riesgos.		18
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		19
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		19
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	19
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	19
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	19
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	22
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	22
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		25
8	Anexos		26
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		27
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 
Nombre: VICENTE SUARES ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No 238 de fecha 23/12/2024

NIT.900.195.023-0

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de las obras al cual se le realizara interventoría corresponde al derivado del convenio 2322 de 2020 que tiene como objeto “ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/ INVIAS Y EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”.

Dicho contrato de obra es el 541 de 2021, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

Numero de proceso de obra: LP-004-2021

Enlace:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-26410&q-recaptcha-response=03AFcWeA5OzAry7NQmHSJEwV7NfM6gzA4zvbO4nZQ3Rz_5ao-oYG6oGOVdtuK2FxfGFEgnP--a8eK3LmagOMLznN3jPVIPI86-xllvT2sXJTlx1LKUp-cl2wh1xsc_hPMr2suUV8saJhX4zoCrhC9cRliqfGSzy1prGv46KqjO7jM23VCtDJ3eENbv1zfoWESk96xMTLLuuyoGqirVkmsWsDbf5tm5Wo2zxvSx3KJIQAEIqGwAPNjJBgekFluAuWHnDFPtXfZ4aWEqCERaQguMj47T3kgE9qZ5dCEK38YsJmPRbu7704TFT2EC-58Vtq6sU66Ud8MTsv9bMXH9CgJbJDCMzRKDWBzhw0OCXQ363vLWEa_IISPonYyNW_QOgdkNuPc rnE6_D38ZSu7VN0HPFG02SUsnkxJyMCQEcsfG9h_Qz6XLultRsGxMcLeTpYWpT3MlxLy_GGBZCG8Y5kCw_Qp6E19hw8ge8gAl4_2PyOSBi41O1MVhZAq65KwJQttgq88r7esu7wLliOf8GJlh99mCUc6OV_1DLMijwVA2i0RESzdDDOjp552L_LpqXI9jbJI4PhJ01YT5vIxKH30stQVbqID336AbzkoicWaBoTdvOsBv xmk8PQXAB6Q2hZssKrbrO9F9grHd-E-AmimTjOhW1sgLgfpX0b5Bk0xCFe-l1q15iCWMo0jJLVGe7irGzhqXTcaYP9NLZcPtun8hsVNWPqYl2Ct4SruXZCiQdf1v21pEvMg6aWXXW5_VtZmccdz8LZbdeY6dUbjjzZUj2umY16QBZ0-tWbbvjJ11Q8CVdc4Qfepvl2Z5AoY9hCoPPwEWO7rQZ7S48k6kSvADUdgXNBchBWAsXUJWDErmlvs n6R1SPuGXo-wNpu9rQO5QSFCiZBkbTlcC-0-30ZjfnpVEmPGFBnspicuf3zrpCBSjMKFmhU4eYk

Así como la entidad instituto nacional de vías (INVIAS) en cumplimiento de sus funciones ejecuta a través del contrato de interventoría N°4384 de 2024, la supervisión del proyecto, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

Numero de proceso de interventoría: IP-DT-TOL-015-2024

Enlace:

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7169803>

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS

El contrato de obra 541 de 2021 establece inicialmente el mejoramiento de la infraestructura vial existente, el mantenimiento periódico y adicionalmente solicita la construcción de alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 900mm, construcción de placa huella, construcción de Baden, construcción de gaviones, revisión de estudios y diseños, y obras de compensación ambiental y/o complementarias incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad.


Supervisor del contrato de interventoría: VICENTE SUARES ORTIZ

Gestor técnico de interventoría: DIEGO CAICEDO

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en la vía terciaria Yavi – Anarco, municipio de Natagaima en el departamento del Tolima

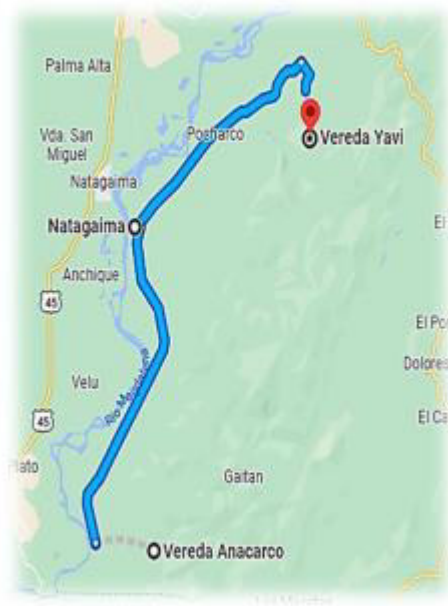

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Los tramos por intervenir corresponden a vías terciarias que dan acceso a las diferentes veredas Yavi y Anarco

NIT.900.195.023-0



**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

N/A	N/A
Foto inicial	Foto avance

Es de aclarar que a la presente fecha no se ha podido realizar la visita inicial al proyecto de ejecución debido a que el contratista de obra no ha enviado la información preliminar solicitada por esta interventoría, no a afiliado el personal, actualizado pólizas, entre otras actividades preliminares.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en construir aproximadamente 444 metros lineales de placa huella, a su vez realiza obras de drenaje, un (1) Baden, un (1) muro en gavión de 36 m², un (1) canal dissipador de 21.3 ml y un (1) muro de contención de 20.3 ml, dejando claro que estas cantidades pueden variar de acuerdo a las necesidades del proyecto

NIT.900.195.023-0

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

NÚMERO ID DEL SECOP	LP-004-2021
NÚMERO DEL CONTRATO.	541 DE 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO,	MANTENIMIENTO Y MEJORAMUENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE NATGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
CONTRATISTA,	UNION TEMPORAL CONSTRUPROYECTOS 2021
NIT	901.546.983-7
VALOR INICIAL	\$596.453.777,36
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	\$596.453.777,36
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	4 MESES
FECHA DE INICIO,	9/12/2021
OTRO SI 2 PRORROGA N°1	14/02/2022
OTRO SI 3 PRORROGA N°2	28/09/2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1/03/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	24/03/2022
FECHA PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1	12/04/2022
FECHA DE REINICIO 1	8/06/2022
FECHA DE SUSPENSION 2	1/09/2022
FECHA DE REINICIO 2	6/02/2023
OTRO SI 5 PRORROGA 3	30/06/2023
OTRO SI 6 PRORROGA 4	30/08/2023
OTRO SI 7 PRORROGA 5	30/10/2023
OTRO SI 8 PRORROGA 6	30/11/2023
FECHA DE SUSPENSION 3	29/12/2024
FECHA DE REINICIO 3	1/04/2024
OTRO SI 9 PRORROGA 7	1/04/2024
FECHA DE SUSPENSION 4	29/07/2024
FECHA DE REINICIO 4	10/01/2025
OTRO SI 11 PRORROGA 9	11/01/2025
OTRO SI 12 PRORROGA 10	12/03/2025
ACTA DE SUSPENSION N° 5	07/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	13/04/2025
PLAZO FINAL	21 MESES Y 18 DIAS



3.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES:

Durante el periodo correspondiente al mes de este informe no se pudieron realizar actividades de obra por el contratista de obra, pues de aclarar que en reiteradas ocasiones se solicitó la información preliminar y no fue enviada a esta interventoría, tampoco se cumplió con la fecha de inicio de obra como fue pactada en el acta de reunión 2, por lo que esta interventoría envió oficios para dejar la trazabilidad de lo mencionado y que se encontrara como anexo dentro del presente informe.

Se recibe pronunciamiento del contratista de obra y la alcaldía municipal de Natagaima para solicitar suspensión 5 desde el 7 de abril al 28 de abril, por lo que la interventoría con aprobación del supervisor del INVIAS se firmó dicha solicitud y se dejó claridad que el contrato se encuentra en un proceso de posible incumplimiento, por lo que se estarán programando reuniones para definir el estado del contratista, por otro lado la interventoría suspende el contrato el 14 de abril de 2025, con el mismo fin del contrato de obra.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

Para el presente periodo esta actividad no aplica para la obra en cuestión.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Durante el periodo correspondiente al mes de este informe no se pudieron realizar actividades de obra por el contratista de obra, tal como se mencionó en la justificación dada en las actividades ejecutadas en el mes.

NIT.900.195.023-0



**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA:

4.1. INFORME SEMANAL. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

No se realizan informes semanales debido a que no se iniciaron actividades de obra, se deja como seguimiento semanal los oficios enviados a la alcaldía municipal de Natagaima, al contratista de obra y al supervisor del contrato de interventoría.

NIT.900.195.023-0



**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

En el presente informe no se realizan actividades de obra razón por la cual no se presenta la información en los cuadros respectivos.

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

En el periodo del 1 al 14 de abril de 2025, el contratista de obra no ha presentado las hojas de vida pertinentes y su debida afiliación al sistema de seguridad social, para constancia de lo anterior mencionado anexo los oficios enviados por parte de esta interventoría.

NIT.900.195.023-0



**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

En el presente informe no se realizan actividades de obra razón por la cual no se presenta la información en los cuadros respectivos.

NIT.900.195.023-0



**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

En el presente informe no se realizan actividades de obra razón por la cual no se presenta la información en los cuadros respectivos.

NIT.900.195.023-0



**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

En el presente informe no se realizan actividades de obra razón por la cual no se presenta la información en los cuadros respectivos.

NIT.900.195.023-0

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

Durante el presente periodo no se ha enviado dicha información de parte del contratista, por lo que se ha dejado notificado.

UNION TEMPORAL CONSTRUPROYECTOS 2021

ASEGURADORA		CONTRATO:	N° 541 DE 2021
Póliza Única de Cumplimiento No:	SUMA	VIGENCIA	
	ASEGURADA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO			
PRESTACIONES			
ESTABILIDAD DE LA OBRA			

NIT.900.195.023-0

**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

En el presente informe no se realizan actividades de obra razón por la cual no se presenta la información en los cuadros respectivos.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL:

En el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron actividades de obra por lo que la interventoría solo realizó actividades como asistencia a reuniones como director de interventoría y a su vez dejar constancia de la problemática presentada, realizar los oficios idóneos para poder sustentar el incumplimiento del contratista.

4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo de obra.

Para el presente contrato **NO SE REALIZÓ** anticipo de obra.

4.9.2. Seguimiento al programa de obra:

En el presente período no se ha enviado la programación de obra por parte del contratista.

4.9.3. Seguimiento al programa de inversiones.

En el presente período no se ha enviado la programación de inversiones.

4.9.4. Actas suscritas

Para este mes el contratista no puede radicar actas puesto que no ha cumplido con lo solicitado por la interventoría y no se ha ejecutado actividades de obra.

NIT.900.195.023-0

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

5.1. CUADRO RESUMEN

PROCESO	IP-DT-TOL-015-2024
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	4383 DE 2024
INTERVENTOR:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIOLOGIA SAS
NIT	NIT: 901.195.023-0
REPRESENTANTE LEGAL	DAIRO DUEÑAS MORALES,
DIRECCIÓN	Carrera 7 N° 53-53 Ibagué, Tolima
TELEFONO	311 8587090
E-MAIL	ingenatagaima@gmail.com
MUNICIPIOS IMPACTADOS	NATAGAIMA
SUPERVISOR	VICENTE SUAREZ ORTIZ
ESTADO	EN EJECUCION
VALOR INICIAL	\$50.838.704,00
ADICIÓN N°1	0
VALOR TOTAL ACUMULADO	\$50.838.704,00
PLAZO INICIAL	Nueve (9) días
SUSPENSIÓN 1	27 de diciembre de 2024
REINICIO 1	14 de enero de 2025
SUSPENSION 2	14 de abril de 2025
PRORROGA 1	Tres (3) Meses
PLAZO FINAL	3 meses y 9 días
FECHA DE INICIO	23 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	2 de mayo de 2025

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR:

La interventoría en cumplimiento de sus funciones contractuales ha realizado actividades concernientes a sus obligaciones, estas enmarcadas en velar el buen desarrollo de la obra y el cumplimiento del objeto contractual, a continuación, se describen.

- ❖ Reunión de empalme de actividades y compromisos iniciales.
- ❖ Solicitar al contratista actividades preliminares, para poder dar inicio a obra, tales como envío de pólizas, afiliación del personal, cronograma de obra, diseños estructurales, etc.
- ❖ Realizar oficios documentando los acontecimientos de incumplimiento a las actividades de obra.
- ❖ Aprobación de prórroga al contrato de obra.
- ❖ Solicitud de información pendiente y actualización de póliza
- ❖ Solicitud a la alcaldía municipal de Natagaima de inicio proceso sancionatorio al contratista de obra.



No sé a podido avanzar en actividades de obra propias debido a que el contratista de obra no se reporta ni envía la información solicita en oficios.

5.3. INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES:

Para el presente periodo no se han podido realizar informes de especialistas debido a que no se ha iniciado obra.

5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA

Realizando el control y evaluación de la programación mensual de los recursos a ejecutar en el presente convenio solidario y para el contrato de interventoría, se realiza comparación con la ejecución mensual para el presente mes.

ACTAS	MES	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO INCLUIDO IVA	%EJECUTADO
INTERVENTORÍA ACTA 1	DICIEMBRE	\$ 50.838.704,00	\$ -	0,00%
INTERVENTORÍA ACTA 2	ENERO		\$ 2.610.563,00	5,13%
INTERVENTORIA ACTA 3	FEBRERO		\$ 2.610.563,00	5,13%
INTERVENTORIA ACTA 4	MARZO		\$ 2.610.563,00	5,13%
INTERVENTORIA ACTA 5	ABRIL		\$ 1.500.292,50	2,95%
TOTAL DEL VALOR EJECUTADO			\$ 9.331.981,50	18,36%

Se aclara que este valor es netamente correspondiente al pago de las actividades administrativas realizadas por el Director residente de interventoría.

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

cómo se ha venido informando durante el periodo del presente informe no se han realizado actividades que permitan realizar una evaluación a la matriz de riesgo

NIT.900.195.023-0

**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

En el presente periodo del informe no se ha dado inicio de obra por lo que el contrato de interventoría no presenta equipos y vehículos.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

En la ejecución de los trabajos de seguimiento y control que realiza la interventoría al contrato de obra que compone el objeto de esta Interventoría mantuvo el siguiente personal realizado las actividades propias de su especialización.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, muestra el control y los documentos pertinentes al personal de interventoría.

RELACIÓN PERSONAL	CÉDULA	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARL
DUEÑAS DAIRO	93.385.314	DIRECTOR	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, se muestra el control presupuestal de la ejecución del contrato de interventoría.

6.3.1. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONTRATO	VALOR
2024	1221024	10-21 DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN	11	NACIÓN	Principal	\$50.838.704

6.3.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA N°	MES 7 AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO	SALDO %
1	DIC DE 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.838.704,00	\$ 50.838.704,00	100,00%
2	ENE DE 2025	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50	\$ 50.838.704,00	\$ 48.228.141,50	94,87%
3	FEB DE 2025	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50	\$ 50.838.704,00	\$ 45.617.579,00	89,73%
4	MAR DE 2025	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50	\$ 50.838.704,00	\$ 43.007.016,50	84,60%
5	ABR DE 2025	\$ 1.380.750,00	\$ 262.342,50	\$ 1.643.092,50	\$ 50.838.704,00	\$ 41.363.924,00	81,36%

</

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
			VERSIÓN 1
			PÁGINA

FECHA

5/05/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4384 DE 2024

INTERVENIOR:

INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL:

ABRIL

PROYECTO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA".

CONVENIO No.:

541 DE 2021

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL CONSTRUPROYECTOS 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
19/12/2024	1221024	10-21 DIRECCION D E EJECUCION Y OPERACION	11	NACION	PRINCIPAL	\$ 50.838.704	\$ -
TOTAL						\$ 50.838.704	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 50.838.704

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE DE 2024	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	1221024	\$ 50.838.704	\$ 50.838.704	5/01/2025	
2	ENERO DE 2025	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50	0	0	0	1221024	\$ 48.228.142	\$ 48.228.142	5/02/2025	
3	FEBRERO DE 2025	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50	0	0	0	1221024	\$ 45.617.579	\$ 45.617.579	5/03/2025	
4	MARZO DE 2025	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50	0	0	0	1221024	\$ 43.007.017	\$ 43.007.017	5/04/2025	
5	ABRIL DE 2025	\$ 1.380.750,00	\$ 262.342,50	\$ 1.643.092,50	0	0	0	1221024	\$ 41.363.924	\$ 41.363.924	5/05/2025	
TOTALES		\$ 7.962.000	\$ 1.512.780	\$ 9.474.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.055.365	\$ 229.055.365		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE COSTOS 01	\$ -	\$ -	-
ACTA DE COSTOS 02	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50
ACTA DE COSTOS 03	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50
ACTA DE COSTOS 04	\$ 2.193.750,00	\$ 416.812,50	\$ 2.610.562,50
ACTA DE COSTOS 05	\$ 1.380.750,00	\$ 262.342,50	\$ 1.643.092,50
VALOR TOTAL	\$ 7.962.000,00	\$ 1.512.780,00	\$ 9.474.780,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Intervenior realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ING. DAIRO DUÉÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma

Nombre: VICENTE SUARES ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6320262808 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Cedajas, Interventor y Dirección Territorial.



6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

Se realiza seguimiento a las garantías y seguros del contrato de interventoría, a la fecha del presente informe ha transcurrido 4 periodos desde el 23 de diciembre de 2024 fecha del acta de inicio, en ese orden se anexa el formato de seguimiento de garantías que amparan a la entidad INVIAS en el marco del presente contrato de interventoría, incluyendo la modificación de la prórroga hasta el 17 de abril de 2025.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

Para garantizar el cumplimiento de este aspecto, se han implementado recursos técnicos y administrativos, acompañados de la supervisión constante del personal profesional designado con este propósito específico. Estas medidas se orientan a elevar la calidad de los proyectos, siguiendo rigurosamente los lineamientos establecidos por el sistema de gestión de calidad.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL:

a fecha de entrega del presente informe 1 al 14 de abril de 2025, no se han registrado variaciones o cambios que destacar, pues el contratista de obra no ha cumplido con las solicitudes de la interventoría y la entidad contratante.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		5/05/2025 (Día / Mes / Año)		
-------	--	--------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4384 DE 2024	INTERVENTOR:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS		
--------------------------------	--------------	--------------	--	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA					

FECHA DE INICIO:	23/12/2024				
PLAZO INICIAL:	9 DIAS				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	17 DE ABRIL DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	50.838.704,00			
VALOR ACUMULADO:	\$	50.838.704,00 (Incluye adiciones)			

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	VICENTE SUARES ORTIZ				
---	----------------------	--	--	--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
---	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 5.083.870,40	23	12	2024	5	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 10.167.740,80	23	12	2024	5	1	2028
Calidad del servicio	20%	\$ 10.167.740,80	23	12	2024	5	1	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	25-44-101196988				
Certificado de modificación o anexo No.:	2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	28/01/2025				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		5/05/2025
		(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 5.083.870,40
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 10.167.740,80
Calidad del servicio	20%	\$ 10.167.740,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2024	17	10	2025
23	12	2024	17	4	2028
23	12	2024	17	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101196988

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/01/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6320262808 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: EL INTERVENTOR DEBE MANIFESTAR LAS CONCLUSIONES RELEVANTES SOBRE EL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.

El porcentaje a la que la interventoría está realizando la supervisión y control es de un 34.94% del contrato de obra, es de aclarar que la interventoría siempre ha estado dada para iniciar obra, revisar documentación entre otras actividades propias de las obligaciones de la interventoría, pero el contratista no ha cumplido en ninguno de los compromisos o solicitudes realizadas.

Dicho incumplimiento ha sido notificado ante la entidad contratante la alcaldía municipal de Natagaima y ante la supervisión de la interventoría el instituto nacional de vías INVIA, para dejar constancia de las actuaciones de la interventoría y el contratista de obra.

Para concluir estamos a espera de información de parte del contratista de no ser enviada se realizará un proceso sancionatorio por el incumplimiento de sus obligaciones como lo estipula el contrato.

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

8. ANEXOS

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

8.1 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA.

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

8.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

NIT.900.195.023-0

**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

Ibagué, 12 de agosto de 2025

Señores

INVIAS

Carrera 3 Calle 4 Esquina
Alvarado-Tolima

ING-023-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA."

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION 3 SUSPENSION 3 CONTRATO No. 4384 DE 2024

Estimados señores:

La presente solicitud tiene por objeto realizar la ampliación 3 de la suspensión número 3, al contrato de interventoría 4384 de 2024, por cuarenta y seis (46) días calendario más, en el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2025 y el 30 de septiembre de 2025; esto debido a que el contrato de obra fue decretado por incumplimiento por parte de la alcaldía municipal, por dicha razón, el municipio de Natagaima solicita una ampliación adicional al plazo inicial del convenio con el fin de garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras, considerando los tiempos a tener en cuenta con desarrollar un nuevo proceso contractual para la ejecución de las obras faltantes, el tiempo de desarrollo de las mismas y el tiempo de liquidación contractual del contrato y del convenio.

Lo anterior se realiza con el fin de garantizar el acompañamiento al contrato de obra y así cumplir con el objeto del contrato de Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del Programa "Colombia Rural", en el municipio de Natagaima, departamento del Tolima, considerando que el contrato de obra derivado del convenio interadministrativos 2322 de 2020 se deberá contratar nuevamente.

Agradezco la atención prestada,



INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIERIA SAS

Representante Legal DAIRO DUEÑAS MORALES
C.C. No 93.385.314 de Ibagué

NIT.900.195.023-0

**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

Ibagué, 14 de abril de 2025

Señores

INVIAS

Carrera 3 Calle 4 Esquina
Alvarado-Tolima

ING-018-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA."

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION 2 CONTRATO No. 4384 DE 2024

Estimados señores:

De acuerdo con la información presentada por la alcaldía municipal de Natagaima, se establece que, a la fecha, no ha mejorado las condiciones climáticas adversas condición de fuerza mayor y a su vez realizan una modificación temporal del horario institucional por las fiestas santas, siendo necesario realizar la suspensión número 02, al contrato de interventoría 4384 de 2024, por dieciocho (15) días calendario, en el periodo comprendido entre el 14 de abril de 2025 hasta el (28) de abril de 2025; es de **ACLARAR** que no se debe reiniciar el contrato si no antes saber por parte de la alcaldía municipal de Natagaima que actuaciones se va a realizar con el contratista de obra, puesto que estamos solicitando un proceso sancionatorio.

Por lo anterior, se solicita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se realice la suspensión 02, al contrato 4384 de 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA, por un término de dieciocho (15) días calendario, reiniciando el día 28 de abril de 2025. Igualmente, teniendo en cuenta las festividades santas, es común que parte del personal se ausente para participar en dichas celebraciones, lo que reduce la capacidad operativa de la obra y ralentiza las actividades programadas.

En este sentido, recalcamos la importancia de garantizar el adecuado acompañamiento en el desarrollo de los proyectos y la inversión de los recursos en cumplimiento de los fines estatales y de obras al servicio de las comunidades.

Agradezco la atención prestada,



INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIERIA SAS

Representante Legal DAIRO DUEÑAS MORALES

C.C. No 93.385.314 de Ibagué

NIT.900.195.023-0

**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

Ibagué, 28 de abril de 2025

Señores

INVIAS

Carrera 3 Calle 4 Esquina
Alvarado-Tolima

ING-019-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA."


ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN SUSPENSION 2 CONTRATO No. 4384 DE 2024

Estimados señores:

Por medio de la presente solicito acomedidamente se amplié la suspensión del contrato de interventoría numero 2 por un plazo de dieciséis (16) días más a los establecidos, esto debido a que las condiciones climáticas no han mejorado y a su vez nos encontramos a la espera que se defina la condición del contratista de obra, por parte del INVIAS junto a la alcaldía municipal de Natagaima, ya que se realizara reunión en las oficinas de Bogotá para definir las condiciones del contratista de obra.

Por lo anterior, se solicita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se realice la ampliación a la suspensión 02, del contrato 4384 de 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA, por un término de dieciséis (16) días calendario, reiniciando el día 14 de mayo de 2025.

Agradezco la atención prestada,



INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIERIA SAS
Representante Legal DAIRÓ DUEÑAS MORALES
C.C. No 93.385.314 de Ibagué

NIT.900.195.023-0

**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

Ibagué, 30 de abril de 2025

Señores

INVIAS

Carrera 3 Calle 4 Esquina
Alvarado-Tolima

ING-020-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA."

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION 3 CONTRATO No. 4384 DE 2024

Estimados señores:

Por medio de la presente solicito comedidamente, sea cancelado el proceso de ampliación de la suspensión 2 cuyo radicado es 2025E-VUVRAZ-044050, puesto que por temas de plataforma Secop II y permisos al Director de la territorial vigente el ingeniero Vicente Suarez Ortiz no se pudo realizar dicha solicitud, por la que se dio trámite al reinicio del contrato el día de ayer 29 de abril de 2025 y solicita la suspensión 3 al contrato de interventoría con fecha de 30 de abril de 2025 por un plazo de quince (15) días, esto debido a que las condiciones climáticas no han mejorado y a su vez nos encontramos a la espera que se defina la condición del contratista de obra, por parte del INVIAS junto a la alcaldía municipal de Natagaima, ya que se realizara reunión en las oficinas de Bogotá para definir las condiciones del contratista de obra.

Por lo anterior, se solicita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se realice la suspensión N° 3, del contrato 4384 de 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA, por un término de quince (15) días calendario, reiniciando el día 15 de mayo de 2025.

Agradezco la atención prestada,



INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIERIA SAS

Representante Legal DAIRO DUEÑAS MORALES
C.C. No 93.385.314 de Ibagué

NIT.900.195.023-0

**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

Ibagué, 13 de mayo de 2025

Señores

INVIAS

Carrera 3 Calle 4 Esquina
Alvarado-Tolima

ING-021-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA."

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION 3 CONTRATO No. 4384 DE 2024

Estimados señores:

Por medio de la presente solicito acomedidamente ampliar la suspensión 3 del contrato de interventoría 4384 de 2024, con fecha de 13 de mayo de 2025 por un plazo de treinta (30) días, esto debido a en la reunión realizada en la sucursal de Bogotá del INVIAS, con asistencia de la alcaldía municipal de Natagaima y la interventoría, se acordó realizar el debido proceso sancionatorio al contratista de obra, por lo que no se ejecutara obra hasta que no se solucione o realice el debido proceso.

Por lo anterior, se solicita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se realice la ampliación 1 de la suspensión N° 3, del contrato 4384 de 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA, por un término de treinta (30) días calendario, reiniciando el día 15 de junio de 2025.

Agradezco la atención prestada,



INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS

Representante Legal DAIRO DUEÑAS MORALES

C.C. No 93.385.314 de Ibagué

NIT.900.195.023-0

**INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS**

Ibagué, 12 de junio de 2025

Señores

INVIAS

Carrera 3 Calle 4 Esquina
Alvarado-Tolima

ING-022-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA."

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION 3 CONTRATO No. 4384 DE 2024

Estimados señores:

La presente solicitud tiene por objeto realizar la ampliación 2 de la suspensión número 3, al contrato de interventoría 4384 de 2024, por sesenta (60) días calendario más, en el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 14 de agosto de 2025; esto debido a que el contrato de obra fue decretado por incumplimiento por parte de la alcaldía municipal, por dicha razón, el municipio de Natagaima solicita ampliar el plazo del convenio con el fin de garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras, considerando los tiempos a tener en cuenta con desarrollar un nuevo proceso contractual para la ejecución de las obras faltantes, el tiempo de desarrollo de las mismas y el tiempo de liquidación contractual del contrato y del convenio.

Lo anterior se realiza con el fin de garantizar el acompañamiento al contrato de obra y así cumplir con el objeto del contrato de Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del Programa "Colombia Rural", en el municipio de Natagaima, departamento del Tolima, considerando que el contrato de obra derivado del convenio interadministrativos 2322 de 2020 se deberá contratar nuevamente.

Agradezco la atención prestada,



INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIERIA SAS

Representante Legal DAIRÓ DUEÑAS MORALES
C.C. No 93.385.314 de Ibagué

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

8.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

**NO SE PRESENTA
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA**

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

NO SE PRESENTA INICIO DE OBRA

DIRECCIÓN: Cra 4 N 8 - 43 interior 9, Ibagué – Tolima
EMAIL: ingeologia@gmail.com TELEFONO: 3118587090

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

8.3 REGISTRO FOTOGRAFICO, SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

NO SE PRESENTA INICIO DE OBRA

DIRECCIÓN: Cra 4 N 8 - 43 interior 9, Ibagué – Tolima
EMAIL: ingeologia@gmail.com TELEFONO: 3118587090

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

8.4 BITACORA

NIT.900.195.023-0



INVERSIONES Y PROYECTOS
INGEOLOGIA SAS

NO SE PRESENTA INICIO DE OBRA

DIRECCIÓN: Cra 4 N 8 - 43 interior 9, Ibagué – Tolima
EMAIL: ingeologia@gmail.com TELEFONO: 3118587090
