

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8706478 DE 2025****1. ASPECTOS GENERALES**

CONTRATANTE	SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
CONTRATO NRO.	Contrato de obra
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CO1.PCCNTR.8706478DE 2025
OBJETO	Contratar El Suministro E Instalación De Aires Acondicionados Con Las Adecuaciones Locativas En Ambientes Laborales De Talento Humano, Infraestructura, Comunicaciones Y planeación, Coordinaciones Sede Complejo Centro Regional Risaralda
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S
CC o NIT	900.497.781-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Pereira en la Sede Regional SENA Cra. 8a. No. 26 - 79,
FECHA DE INICIO	17/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	16 días calendario.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNMIL CUARENTA Y NUEVE PESOS SESENTA Y UN CENTAVOS (\$101.321.049,61)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	1
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 108.042.130
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante acta única de pago, previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la Ley
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	Informe No.2
PERIODO DEL INFORME	23/12/2025 – 31/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros
NRO. DE PÓLIZA	CMZ-100017150
CERTIFICADO O ANEXO	Anexo 0
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2025
FECHA APROBACIÓN	17/12/2025



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16/12/2025	30/04/2026	\$20'264.209,92
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	16/12/2025	31/12/2028	\$5'066.052,48
Calidad del servicio	16/12/2025	31/03/2026	\$20'264.209,92

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ-100004987		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO		
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	17/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	16/12/2025	16/12/2025	\$284'700.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ-100017150		
CERTIFICADO O ANEXO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	17/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16/12/2025	30/04/2026	\$ 21.608.426
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	16/12/2025	31/12/2028	\$5.402.106.50
Calidad del servicio	16/12/2025	31/03/2026	\$ 21.608.426
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ-100004987		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO		
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	17/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VIGENCIA DESDE
	DESDE	DESDE	
Responsabilidad civil extracontractual	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Contar, durante toda la ejecución del contrato, con personal técnico, operativo y administrativo idóneo, suficiente y capacitado, conforme a los perfiles exigidos por la Entidad. Las hojas de vida deberán remitirse para revisión y aprobación previa por parte de la supervisión.	Personal según las exigencia de la entidad	-FOTOGRAFIAS -FICHAS TECNICAS - ANEXO 1
2) Mantener el personal ofertado. En caso de sustitución, deberá presentarse previamente la documentación que respalde la idoneidad del nuevo personal, sujeto a aprobación por parte de la supervisión.	-Ingeniero residente -Siso -Técnicos de Refrigeración	-ANEXO 2
3) Garantizar que el personal reciba instrucciones técnicas claras y oportunas, necesarias para la ejecución conforme a lo contratado	-Instrucciones Ejecución De Obra	
4) Designar, reemplazar o retirar personal bajo su responsabilidad, sin vínculo laboral con el SENA, y atender las observaciones de la supervisión en caso de incumplimiento de requisitos.	Siempre Se Ha Estado Atento A Esa Directriz Sin Necesidad De Tener Que Ejecutarla	
5) Cumplir con las normas de bioseguridad, el personal solo podrá estar en las zonas de trabajo de ejecución del contrato.	ASI Se Ha Realizado En Concordancia Con La Siso Y El Ingeniero Residente	
6) Coordinar con la supervisión el inicio de actividades conforme al plazo contractual. 2.2. Elaborar y socializar un cronograma detallado de obra, registrando avances, novedades o retrasos en la bitácora de seguimiento.	Se Ha Entregado Un Cronograma De Obra	-ANEXO 3



7) Mantener actualizados y disponibles documentos como la bitácora, cronograma, actas, registro fotográfico e informes.	Bitácora Cronograma Y Registro Fotográfico En Regla	ANEXO 4
8) SE Atender y responder oportunamente a observaciones, requerimientos e instrucciones de la supervisión, adoptando medidas correctivas sin generar sobrecostos.	Siempre Se Ha Atendido Sugerencias Y Correcciones De Obra Por Parte De La Supervisión	
9) Presentar oportunamente los informes técnicos, administrativos o financieros requeridos.	Se presenta acta no. 1 con sus respectivos soportes	ANEXO 5
10) Velar por una ejecución ajustada al objeto, evitando sobrecostos o sobre ejecución no autorizada.	Ejecucion Sin Sobrecostos Y Ajustada A El Contrato	
11) Utilizar materiales, equipos y herramientas nuevos, de óptima calidad, libres de defectos y conforme a las especificaciones técnicas y normativas (NTC, RETIE u otras que apliquen). 3.2. Suministrar todos los materiales, herramientas y equipos ofertados, y aquellos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato, sin que esto represente costos adicionales para la Entidad.	Todos Los Elementos De Proteccion Y Calidad De Los Materiales Se Ajustan A Lo Exigido Anexo Fichas Tecnicas	ANEXO 6
12) Garantizar la calidad de los materiales mediante certificados, fichas técnicas o pruebas de laboratorio cuando así lo requiera la supervisión.	Fichas Tecnicas	ANEXO 6
13) Sustituir, sin costo adicional, los materiales o elementos rechazados por mala calidad o incumplimiento.	No Se Presento	
14) Entregar las obras y bienes contratados en óptimas condiciones de funcionamiento, completamente terminados y libres de limitaciones jurídicas o gravámenes.	Se A Entregado Lo Ejecutado En Forma Optima	



15) Ejecutar las obras civiles, demoliciones, instalaciones, redes, acabados y demás ítems del presupuesto oficial conforme a cantidades, especificaciones técnicas y condiciones contractuales. 4.2. Respetar los diseños, planos y directrices técnicas aprobadas, garantizando continuidad estética y funcional con los ambientes existentes.	SE A ENTREGADO LO EJECUTADO EN FORMA OPTIMA	
16) Aplicar procedimientos constructivos adecuados que garanticen la durabilidad, seguridad y funcionalidad de las obras.	Se Ha Aplicado Los Procedimientos Requeridos Para La Obra ejecutada	
17) Verificar y dejar operativas las redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias mediante pruebas que serán registradas y verificadas por la supervisión.	N/A	
18) Ejecutar, sin costo adicional, las reparaciones o correcciones que indique la supervisión durante la ejecución o recepción.	Siempre Se Ha Intervenido Sin Costo Alguno Cualquier Reparacion O Daño Efectuado Por El Personal Del Contratista	
19) Responder por cualquier daño o perjuicio causado a bienes del SENA, terceros o personal, derivado de sus actuaciones u omisiones o las de su equipo de trabajo. 5.2. Ejecutar los ajustes o adecuaciones necesarias que indique la Entidad para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, dentro del alcance aprobado.	No Se Ha Tenido Esta Circunstancia	
20) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de los estudios previos, pliegos de condiciones, minuta del contrato, actas de inicio, interventoría y demás documentos contractuales	Se Ha Cumplido Con Todas Y Cada Una De Las Exigencias Contractuales	

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/12/2025	FETA-122	\$ 108.042.130	\$ 108.042.130	\$0.00	100 %

Porcentaje de ejecución física: **100 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN ARL	Y	Periodo reportado DICIEMBRE ANEXO 7	Planilla nro. 82370063
--------------------	---	--	------------------------

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN.

No aplica

3. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

4. OBSERVACIONES

Hace en parte de este informe:

1. Acta y preactas.
2. Acta De Mayores y Menores.



Para constancia se firma, el día 29 de diciembre de 2025.

 HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA Supervisor(e) del contrato	 Ing. JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ Apoyo a la supervisión
--	---

Elaboró: Javier Alejandro Morales, Ingeniero de Apoyo infraestructura.

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						GIL-F-064 V-1	
		ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA							
CONTRATO		CONTRATISTA				FECHA ACTA DE OBRA		ACTA N°	
CO1.PCCNTR.8706478		COMPañIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS SAS - NIT: 900.497.781-1				viernes, 26 de diciembre de 2025		UNO (1).	
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN AMBIENTES LABORALES DE TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y PLANEACION, COORDINACIONES SEDE COMPLEJO CENTRO REGIONAL RISARALDA Regional Risaralda, fase 2, durante la vigencia 2025.				SUPERVISOR:		CC.	
						HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA		10,093,372	
Plazo		Fecha de inicio		Fecha de Terminacion.		Valor ACTA			
14 Días		miércoles, 17 de diciembre de 2025		miércoles, 31 de diciembre de 2025		\$108,042,130			
Localización de la obra: SENA Regaional Risaralda. Cra. 8 # 26-79.		Vigencia del contrato				Valor I.V.A. ACTA			
		Año 2025.							
Valor inicial del contrato		\$ 101,321,049.61		Valor anticipo		\$579,846			
Valor adición		\$ 6,721,080.39							
Valor total		\$ 108,042,130.00							
PRESUPUESTO CONTRATADO				CONTRATO INICIAL		BALACEADO ADICION PRESUPUESTAL		ACTA DE OBRA N.1 Y FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AA PH1/220 v/60 hz R-410a								
2.1	Mini Split Inverter 18.000 BTU	UND	2.00	\$ 5,462,845.45	\$ 10,925,690.89	4.00	\$ 21,851,381.78	4.00	\$ 21,851,381.78
2.2	Mini Split Inverter 24.000 BTU.	UND	7.00	\$ 6,869,367.18	\$ 48,085,570.26	7.00	\$ 48,085,570.26	7.00	\$ 48,085,570.26
2.3	Split Inverter 36.000BTU	UND	1.00	\$ 8,368,741.02	\$ 8,368,741.02	1.00	\$ 8,368,741.02	1.00	\$ 8,368,741.02
2.4	Fancoil con Condensadora Inverter 60.000BTU	UND	1	\$ 14,039,425.10	\$ 14,039,425.10	-	\$ -	-	\$ -
3	OTROS								
3.1	Tubería y aislamiento adicional para equipos 18 a 24kBTU.	ML	9.00	\$ 132,197.01	\$ 1,189,773.05	38.08	\$ 5,034,673.87	38.08	\$ 5,034,673.87
3.2	Tubería y aislamiento adicional para equipos 36 a 60kBTU.	ML	2.00	\$ 219,693.70	\$ 439,387.39	4.00	\$ 878,774.78	4.00	\$ 878,774.78
3.3	Suministro e instalación acometida eléctrica adicional para equipos 18 a 24kBTU.	ML	9.00	\$ 175,889.08	\$ 1,583,001.69	33.00	\$ 5,804,339.52	33.00	\$ 5,804,339.52
3.4	Suministro e instalación acometida eléctrica adicional para equipos 36 a 60kBTU	ML	2.00	\$ 256,074.84	\$ 512,149.67	3.00	\$ 768,224.51	3.00	\$ 768,224.51
COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES					85,143,739.06		90,791,705.74		90,791,705.74
ADMINISTRACION					15%	12,771,560.86	15%	13,618,755.86	15%
UTILIDAD					3%	2,861,974.55	3%	3,051,822.18	3%
TOTAL A.U.					18.36%	15,633,535.41	18.36%	16,670,578.04	18.36%
IVA (%) SOBRE UTILIDAD					19%	543,775.17	19%	579,846.21	19%
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS					101,321,049.61		108,042,130.00		108,042,130.00
BALANCE PRESUPUESTAL									
V/R INICIAL CONTRATO:		101,321,049.61		V/R ANTICIPO:		-			
V/R ADICIONES:		6,721,080.39							
V/R ACTUAL CONTRATO:		108,042,130.00		% ANTICIPO :		-			
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR		
1	Acta Final 1	26-dic.-25	\$ 108,042,130.00	100.00%			108,042,130		
TOTAL			\$ 108,042,130.00	100.00%	-	-	108,042,130		

Acta Final No. 1 Corte No. 1 a diciembre 26 de 2025
Página 6 de 14

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						GIL-F-064 V-1	
		ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA							
CONTRATO		CONTRATISTA				FECHA ACTA DE OBRA		ACTA N°	
CO1.PCCNTR.8706478		COMPANHIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS SAS - NIT: 900.497.781-1				viernes, 26 de diciembre de 2025		UNO (1).	
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN AMBIENTES LABORALES DE TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y PLANEACION, COORDINACIONES SEDE COMPLEJO CENTRO REGIONAL RISARALDA Regional Risaralda, fase 2, durante la vigencia 2025.				SUPERVISOR:		CC.	
						HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA		10,093,372	
Plazo		Fecha de inicio		Fecha de Terminacion.		Valor ACTA			
14 Días		miércoles, 17 de diciembre de 2025		miércoles, 31 de diciembre de 2025		\$108,042,130			
Localización de la obra: SENA Regaional Risaralda. Cra. 8 # 26-79.		Vigencia del contrato				Valor I.V.A. ACTA			
		Año 2025.							
Valor inicial del contrato		\$ 101,321,049.61		Valor anticipo		\$579,846			
Valor adición		\$ 6,721,080.39							
Valor total		\$ 108,042,130.00							
PRESUPUESTO CONTRATADO				CONTRATO INICIAL		BALACEADO ADICION PRESUPUESTAL		ACTA DE OBRA N.1 Y FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
Presento:  HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Compañía de Construcciones Trujillo Asociados SAS Aprobó:  HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA SUPERVISOR SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ APOYO SUPERVISIÓN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE									



MEMORIAS DE CALCULO

ITEM2.20

CONTRATO NUMERO.

UBICACIÓN

Contrato de obra civil.

CO1.PCCNTR.8706478

Complejo Pereira, SENA Territorial Risaralda.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA. REGIONAL RISARALDA.

FECHA DE PREACTA

viernes, 26 de diciembre de 2025

Acta Final 1

ELABORÓ

JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN AMBIENTES LABORALES DE TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y PLANEACION, COORDINACIONES SEDE COMPLEJO CENTRO REGIONAL RISARALDA Regional Risaralda, fase 2, durante la vigencia 2025.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S

C.C - NIT

C.C - NIT

10,093,372.00

90049778-1

APOYO SUPERVISION

RESIDENTE OBRA

Javier Alejandro Morales Martinez

Arq. Hernando Trujillo Alvarez

CAPÍTULO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AA PH1/220 v/60 hz R-410a

ACTIVIDAD


Mini Split Inverter 24.000 BTU.

UNID.

UND

UBICACIÓN

Complejo Pereira, SENA Territorial Risaralda.



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Alto	Ancho		
Oficina Infraestructura				1.00	1.00
Oficina Ambiental				1.00	1.00
Oficina Comunicaciones				1.00	1.00
Ambientes Formación Integral				2.00	2.00
sede agropecuario Calle 20				2.00	2.00
SUBTOTAL					7.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO

CANTIDAD CONTRACTUAL

CANTIDAD MAYOR ó MENOR

TOTAL

7.00

7.00

0.00

7.00

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

Supervisor

Ing. JAVIER ALEJANDRO MORALES

Apoyo A la Supervision

Arq. Hernando Trujillo Alvarez

CONTRATISTA Representante Legal. Compañía de Construcciones Trujillo Asociados SAS

9 de 14



MEMORIAS DE CALCULO

ITEM3.20

CONTRATO NUMERO.

CONTRATO UBICACIÓN

Contrato de obra civil.

CO1.PCCNTR.8706478

Complejo Pereira, SENA Territorial Risaralda.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA. REGIONAL RISARALDA.

FECHA DE PREACTA

viernes, 26 de diciembre de 2025

Acta Final 1

ELABORÓ

JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN AMBIENTES LABORALES DE TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y PLANEACION, COORDINACIONES SEDE COMPLEJO CENTRO REGIONAL RISARALDA Regional Risaralda, fase 2, durante la vigencia 2025.

SUPERVISOR

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

C.C - NIT

10,093,372.00

APOYO SUPERVISION

Javier Alejandro Morales Martinez

CONTRATISTA

COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S

C.C - NIT

90049778-1

RESIDENTE OBRA

Arq. Hernando Trujillo Alvarez

CAPÍTULO

OTROS

ACTIVIDAD

Tubería y aislamiento adicional para equipos 36 a 60kBTU.

UNID.


UND

UBICACIÓN

Complejo Pereira, SENA Territorial Risaralda.


PUNTOS DE AIRES ACONDICIONADOS 4to PISO

ESCALA 1:10

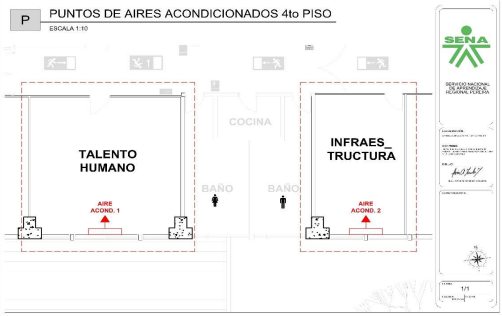

PUNTOS DE AIRES ACONDICIONADOS 5to PISO

ESCALA 1:10

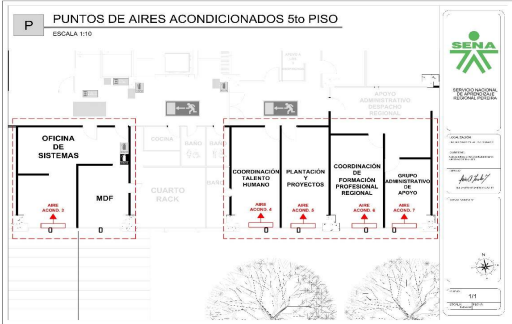





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Alto	Ancho		
Oficina Talento humano 4 piso	4.00			1.00	4.00
SUBTOTAL					4.00
TOTAL ACUMULADO					4.00
CANTIDAD CONTRACTUAL					4.00
CANTIDAD MAYOR ó MENOR					0.00
TOTAL					4.00

OBSERVACIONES:





COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S.

90049778-1

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

Supervisor

Ing. JAVIER ALEJANDRO MORALES

Apoyo A la Supervision

Arq. Hernando Trujillo Alvarez

CONTRATISTA Representante Legal. Compañía de Construcciones Trujillo Asociados SAS

12 de 14

