

 AERONAUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES				
Semana No.	21	Plazo total (días)	210	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	140	
Del	31/12/2024	% de tiempo transcurrido	66,67%	
Al	6/01/2025	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 775.760.378,04	Valor ejecutado	\$ 21.478.820,00	-\$ 754.281.558,04
Porcentaje programado	8,94%	Porcentaje ejecutado	0,25%	-8,69%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 1.782.554.593,32	Valor ejecutado	\$ 293.179.353,56	-\$ 1.489.375.239,76
Porcentaje programado	20,54%	Porcentaje ejecutado	3,38%	-17,16%

DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
<u>Contratista:</u> CONSORCIO ALFA		<u>Contratista:</u> GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
<u>Contrato No:</u> 23001138 H4 DE 2024		<u>Contrato No:</u> 23001299 H3 DE 2024		
<u>Valor Inicial:</u> \$ 8.706.192.504,00		<u>Valor inicial:</u> \$ 684.322.873,00		
<u>Valor Actualizado al modificadorio:</u> NA		<u>Valor actualizado al modificadorio:</u> NA		
<u>Valor actualizado 2:</u> NA		<u>Valor actualizado 2:</u> NA		
<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
<u>Plazo actualizado:</u> NA		<u>Plazo actualizado:</u> NA		
<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024		<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024		
<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024		<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024		
<u>Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		<u>Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1</u> 17/03/2025		<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1</u> 17/03/2025		
<u>Suspensión No.</u> NA		<u>Suspensión No.:</u> NA		
<u>Periodo de Suspensión No.</u> NA		<u>Periodo de Suspensión No.:</u> NA		
<u>Levantamiento de la suspensión No.</u> NA		<u>Levantamiento de la suspensión No.:</u> NA		
<u>Nueva fecha de terminación</u> 17/03/2025		<u>Nueva fecha de terminación:</u> 17/03/2025		
<u>Valor total actual del contrato</u> \$ 8.706.192.504,00		<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 684.322.873,00		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+750 al K1+710 Costado Nor Este. * Se realiza la Excavación de Mateerial No Clasificado de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+750 al K1+710 Costado Nor Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el K1+750 al K1+710 Costado Nor Este. * Construcción de campamento de la zona de combustible, mantenimiento de equipos y maquinaria.	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
N.A.


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.

ACTIVIDADES SISTEMA SST
*Preoperacionales de maquinaria *Señalización de rutas para vehículos que ingresan a pista (conos, colombinas y luz intermitente. *Aseo de áreas de trabajo. *Asistencia a comités de seguimiento *Atencion a requerimientos dados por la interventoría sobre requisitos de ingreso de personal. *Inspeccion eléctrica, orden y aseo. *charlas de seguridad. *instalacion de unidad sanitaria portátil para damas



AVANCE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		67,85%			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	39.240,54	2,38%	242,00	\$ 1.984.400,00	0,62%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	612.426,51	32,84%	3.940,20	\$ 8.274.420,00	0,64%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	16.540,00	12,31%	132,00	\$ 11.220.000,00	0,80%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	8.360,00	27,99%		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA EAA P-460. INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRAZADIZACION. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	41.800,00	5,31%		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 21.478.820,00	

AVANCE FINANCIERO

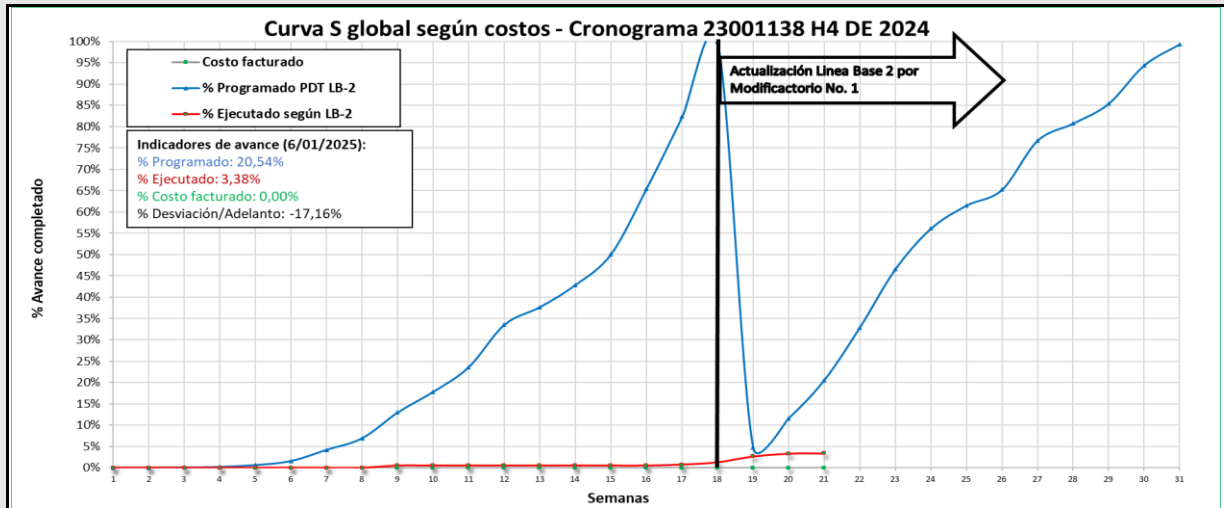


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor	\$ 775.760.378,04	Valor	\$ 21.478.820,00	Valor	\$ 1.782.554.593,32
Porcentaje	8,94%	Porcentaje	0,25%	Porcentaje	20,54%
				Porcentaje	3,38%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor		Valor	Valor	Valor	
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	

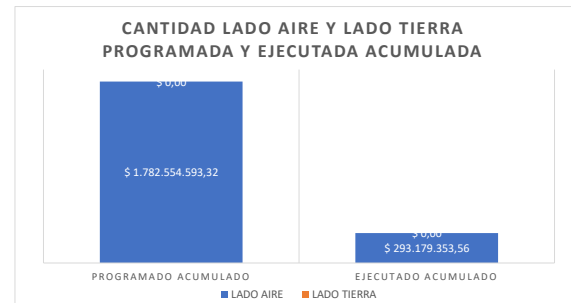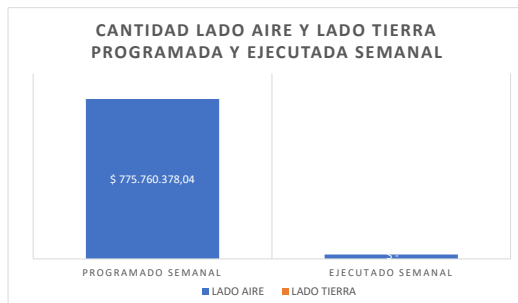


PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	3
	Operadores de Maquinaria	5
	Mecánico	1
	Ayudante	7
	Conductor Volqueta	3

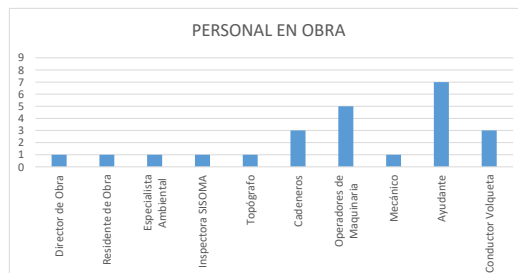

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	1
Excavadora de Orugas	1
Vibrocompactadores	2
Bulldozer	1
Carrozanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	3
Camioneta Doble Cabina	1

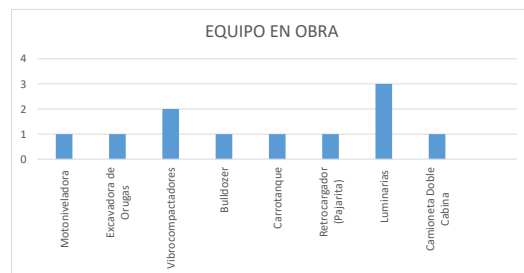

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

lunes, 30 diciembre 2024 06:44p. m.
1°23'56"N 77°17'24"W
173° S
Altitud:1816.0m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
COSTADO NE
K1+420 EJE 3 CORTE

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Jueves, 02 enero 2025 09:37p. m.
1°23'51"N 77°17'24"W
337° NW
Altitud: 1812.8m
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
COSTADO NS
K1+540 EJE 2 CORTE

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

OBSERVACIONES	
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificatorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	

FIRMA	
ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
