


	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
		FECHA	20/11/2023			
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						
DATOS GENERALES						
Semana No. 22 Plazo total (días) 210						
PERIODO						
Del 7/01/2025 Tiempo transcurrido desde inicio (días) 147						
Al 13/01/2025 % de tiempo transcurrido 70,00%						
Interventoría GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.						
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL						
PROGRAMADO						
EJECUTADO						
BALANCE						
Valor programado \$ 1.070.662.273,44						
Porcentaje programado 12,33%						
Valor ejecutado \$ 16.109.115,00						
Porcentaje ejecutado 0,19%						
-\$ 1.054.553.158,44						
-12,15%						
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA						
PROGRAMADO						
EJECUTADO						
BALANCE						
Valor programado \$ 2.853.216.866,76						
Porcentaje programado 32,87%						
Valor ejecutado \$ 320.099.352,36						
Porcentaje ejecutado 3,69%						
-\$ 2.533.117.514,40						
-29,18%						
DATOS DEL CONTRATO						
CONTRATO DE OBRA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Contratista: CONSORCIO ALFA						
Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.						
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024						
Contrato No: 23001299 H3 DE 2024						
Valor inicial: \$ 8.706.192.504,00						
Valor inicial: \$ 684.322.873,00						
Valor Actualizado al modificatorio: NA						
Valor actualizado al modificatorio: NA						
Valor actualizado 2: NA						
Valor actualizado 2: NA						
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.						
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.						
Plazo actualizado: NA						
Plazo actualizado: NA						
Fecha de iniciación: 13/08/2024						
Fecha de iniciación: 13/08/2024						
Fecha de vencimiento: 16/12/2024						
Fecha de vencimiento: 16/12/2024						
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.						
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.						
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025						
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025						
Suspensión No. NA						
Suspensión No. NA						
Periodo de Suspensión No. NA						
Periodo de Suspensión No. NA						
Levantamiento de la suspensión No. NA						
Levantamiento de la suspensión No. NA						
Nueva fecha de terminación 17/03/2025						
Nueva fecha de terminación 17/03/2025						
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00						
Valor total actual del contrato \$ 684.322.873,00						
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
ACTIVIDADES LADO AIRE						
ACTIVIDADES LADO TIERRA						
N.A.						
* Acopio de material tolerable						
* Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+710 al K1+680 Costado Nor Este.						
* Se realiza la Excavación de Mateiral No Clasificado de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+710 al K1+680 Costado Nor Este.						
* Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el K1+710 al K1+680 Costado Nor Este.						
* Construcción de campamento de la zona de combustible, mantenimiento de equipos y maquinaria.						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
N.A.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES						
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.						
ACTIVIDADES SISTEMA SST						
* Charla de seguridad referente a uso de EPP y ambiente y/o clima laboral.						
* Inducción y entrega de EPP a nuevo personal.						
* Verificación en campo de uso correcto de EPP.						
* Preoperacionales de maquinaria y vehículos.						
* Señalizaciones carretable de vehículos por plataforma.						
* Reposición de EPP.						
AVANCE CANTIDADES						
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024						
Semana No. 22						
(7 Ene - 13 Ene)						
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 2 - NORESTE		67,85%			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	39.248,54	2,38%	181,50	\$ 1.488.300,00	0,48%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	612.428,51	32,84%	2.955,15	\$ 6.206.815,00	0,48%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	16.540,00	12,31%	99,00	\$ 8.415.000,00	0,60%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	8.360,00	27,99%		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602. INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRAZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	41.800,00	5,31%		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 16.109.115,00	

AVANCE FINANCIERO

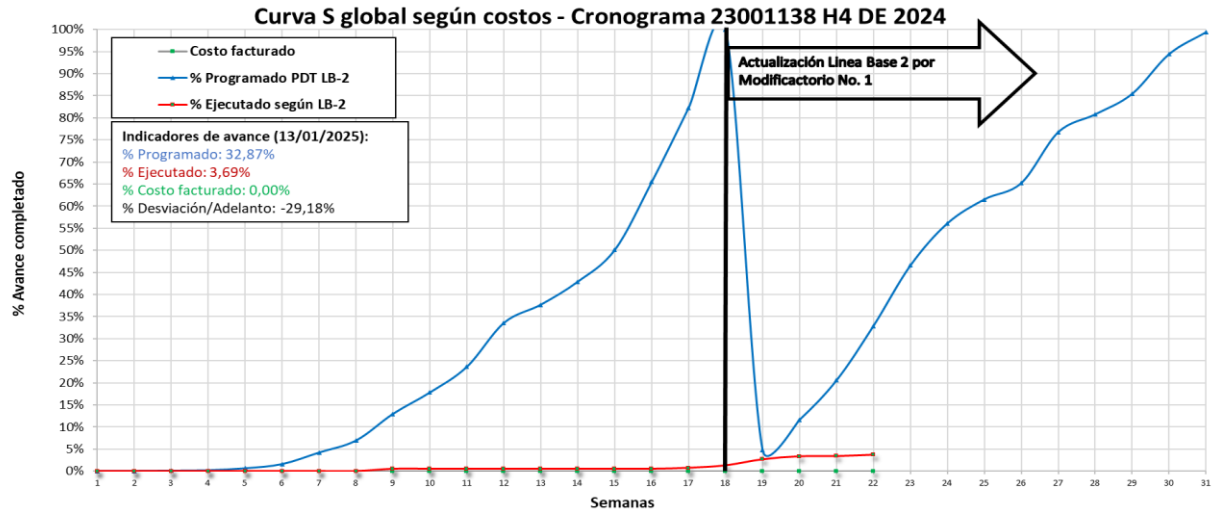

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
PROGRAMADO	Valor	\$ 1.070.662.273,44	Porcentaje	12,33%	EJECUTADO	Valor	\$ 16.109.115,00
	Porcentaje					Porcentaje	0,19%


PROGRAMADO	Valor	\$ 2.853.216.866,76	Porcentaje	32,87%	EJECUTADO	Valor	\$ 320.099.352,36
	Porcentaje					Porcentaje	3,69%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA


SEMANAL		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
PROGRAMADO	Valor	\$ 0,00	Porcentaje	0,00%	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje					Porcentaje	0,00%

PROGRAMADO	Valor	\$ 0,00	Porcentaje	0,00%	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje					Porcentaje	0,00%

CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA SEMANAL



CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA ACUMULADA





PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
MANO DE OBRA	Topógrafo	1
	Cadeneros	1
	Operadores de Maquinaria	5
	Mecánico	1
	Ayudante	12
	Conductor Volqueta	5

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS


MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	1
Excavadora de Orugas	1
Vibrocompactadores	2
Bulldozer	1
Carrozanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	3
Camioneta Doble Cabina	1

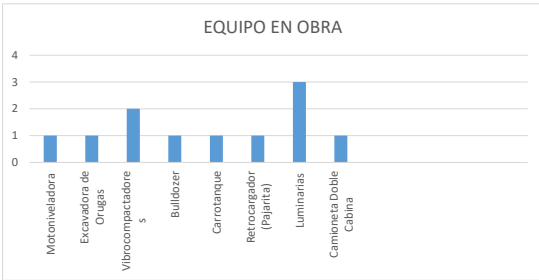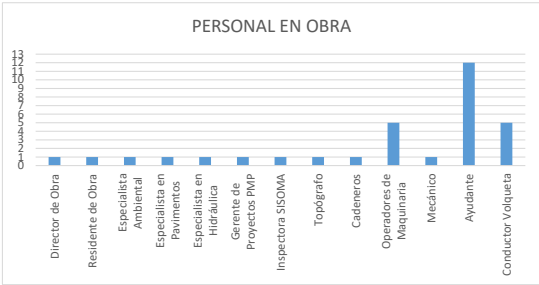


REGISTRO FOTOGRÁFICO




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

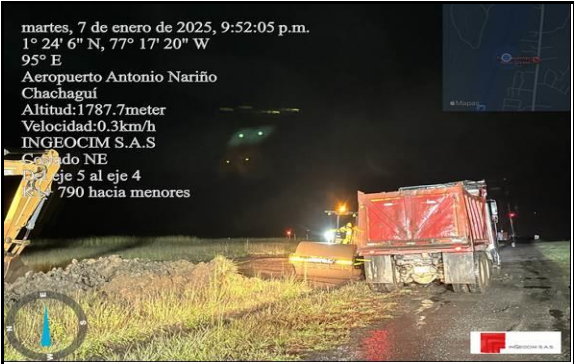


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

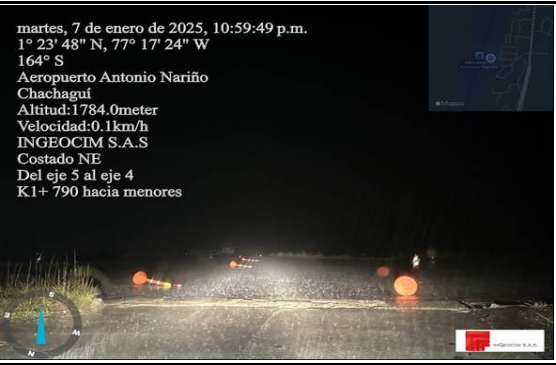

CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES POR LLUVIAS FUERTES DURANTE LA JORNADA.

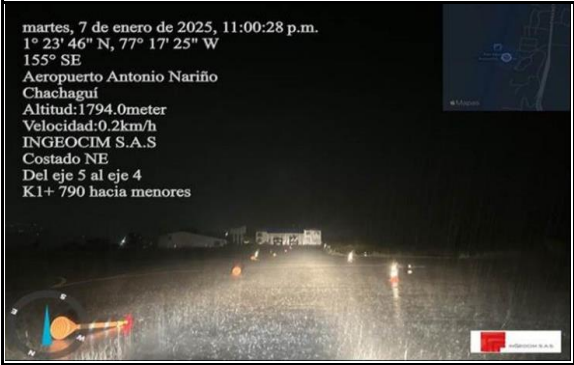

CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES POR LLUVIAS FUERTES DURANTE LA JORNADA.

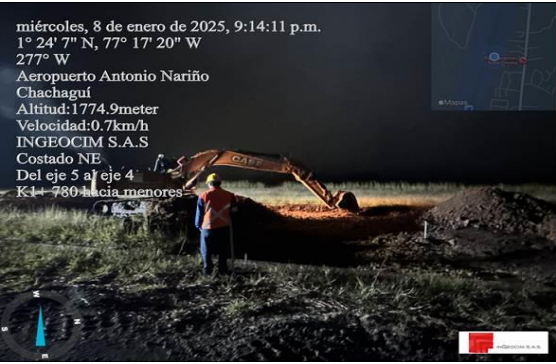


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

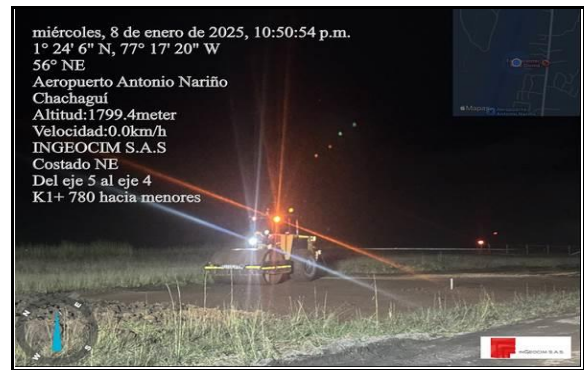

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

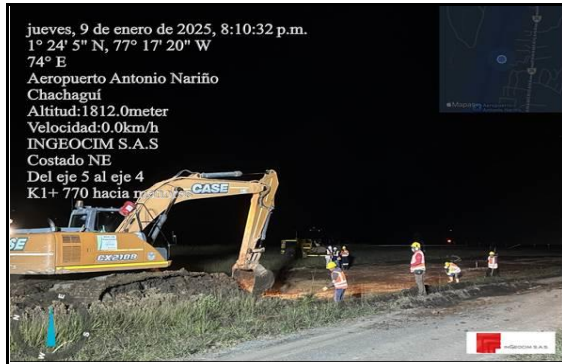


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

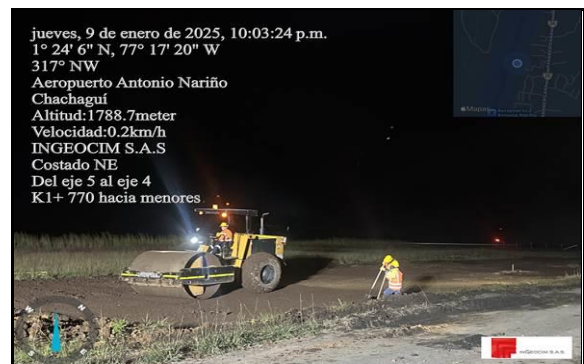


ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

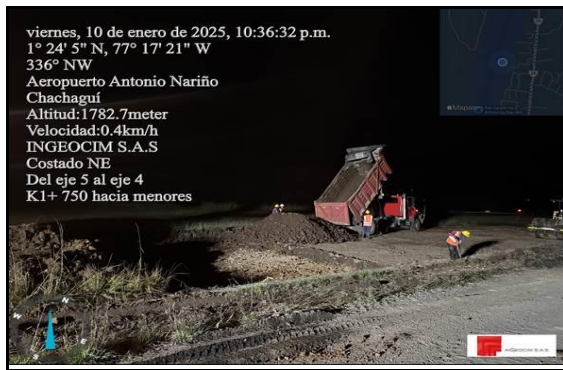

viernes, 10 de enero de 2025, 10:36:32 p.m.
1° 24' 5" N, 77° 17' 21" W
336° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1782.7meter
Velocidad:0.4km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+ 750 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 10 de enero de 2025, 11:19:28 p.m.
1° 24' 5" N, 77° 17' 20" W
152° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1806.8meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+ 750 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




sábado, 11 de enero de 2025, 12:09:38 a.m.
1° 24' 5" N, 77° 17' 20" W
163° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1806.7meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+ 750 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 11 de enero de 2025, 12:50:37 a.m.
1° 24' 5" N, 77° 17' 20" W
244° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1806.6meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+ 750 hacia menores

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

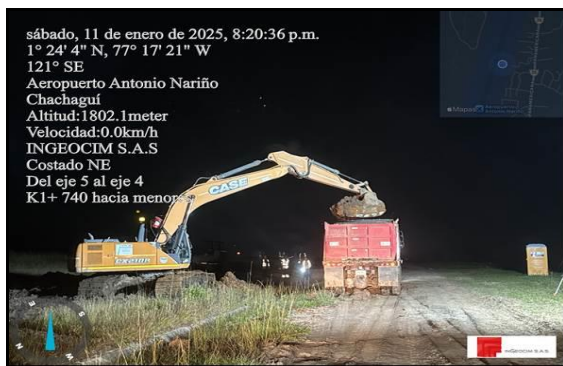

sábado, 11 de enero de 2025, 8:20:36 p.m.
1° 24' 4" N, 77° 17' 21" W
121° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1802.1meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+ 740 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 11 de enero de 2025, 8:25:33 p.m.
1° 24' 5" N, 77° 17' 20" W
269° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1801.0meter
Velocidad:3.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+ 740 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 11 de enero de 2025, 9:28:10 p.m.
1° 24' 0" N, 77° 17' 14" W
204° SW
Panamericana
Chachagui
Altitud:1759.8meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+ 740 hacia menores

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE.



sábado, 11 de enero de 2025, 9:41:26 p.m.
1° 24' 5" N, 77° 17' 20" W
218° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1800.7meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+ 740 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN DE FALLO SOBRE LA RASANTE.

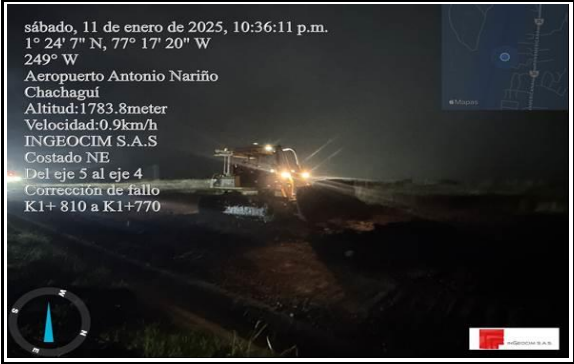

ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN DE FALLO SOBRE LA RASANTE.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. Z3001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. Z3001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
