

 AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES				
Semana No.	23	Plazo total (días)	210	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	154	
Del	14/01/2025	% de tiempo transcurrido	73,33%	
Al	20/01/2025	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 1.188.623.031,60	Valor ejecutado	\$ 53.726.640,00	-\$ 1.134.896.391,60
Porcentaje programado	13,69%	Porcentaje ejecutado	0,62%	-13,07%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 4.041.839.898,36	Valor ejecutado	\$ 373.220.837,92	-\$ 3.668.619.060,44
Porcentaje programado	46,56%	Porcentaje ejecutado	4,30%	-42,26%

DATOS DEL COTRATO				
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No: 23001299 H3 DE 2024	
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00	
Valor Actualizado al modificatorio: NA			Valor actualizado al modificatorio: NA	
Valor actualizado 2: NA			Valor actualizado 2: NA	
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	
Plazo actualizado: NA			Plazo actualizado: NA	
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024	
Fecha de vencimiento: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024	
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No.1: 17/03/2025	
Suspensión No.: NA			Suspensión No.: NA	
Periodo de Suspensión No.: NA			Periodo de Suspensión No.: NA	
Levantamiento de la suspensión No.: NA			Levantamiento de la Suspensión No.: NA	
Nueva fecha de terminación: 17/03/2025			Nueva fecha de terminación: 17/03/2025	
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00			Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+680 al K1+500 Costado Nor Este. * Se realiza la Excavación de Mateerial No Clasificado de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+680 al K1+500 Costado Nor Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el K1+680 al K1+500 Costado Nor Este. * Construcción de campamento de la zona de combustible, mantenimiento de equipos y maquinaria.	N.A.


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Mediante el comunicado T-003-2024-107-OFC de fecha 14 de enero 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 5 correspondiente al mes de diciembre de 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-108-OFC de fecha 14 de enero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA el Apremio No. 1 - Solicitud actualización de pólizas según suscripción de la Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 para la ejecución del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-109-OFC de fecha 16 de enero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA el Apremio No. 2 – Bajo rendimiento en la ejecución de las actividades de obra del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-110-OFC de fecha 16 de enero 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Posible afectación económica al contrato de interventoría de la referencia.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.

ACTIVIDADES SISTEMA SST
*capacitación en riesgo eléctrico por parte de la arl seguros bolivar. *inspección de botiquín, camilla y orden y aseo. *Actividades de inducción y entrega de epp. *Visita en campo para verificar las redes eléctricas en la zona de alfa (costado noreste). Esta visita se realizo con el señor Luis Lopez (eléctrico aeropuerto) e ingeniero Henry Pabon (ingeniero del proyecto de luces lado aire). *Verifiación en campo del uso de correcto de epp.

AVANCE CANTIDADES						
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 2 - NORESTE		67,95%			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	39.248,54	2,38%	924,00	\$ 7.576.800,00	2,35%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	612.428,51	32,84%	1.940,40	\$ 4.074.840,00	0,32%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	16.540,00	12,31%	495,00	\$ 42.075.000,00	2,99%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	8.360,00	27,99%		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	41.800,00	5,31%		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 53.726.640,00	

AVANCE FINANCIERO

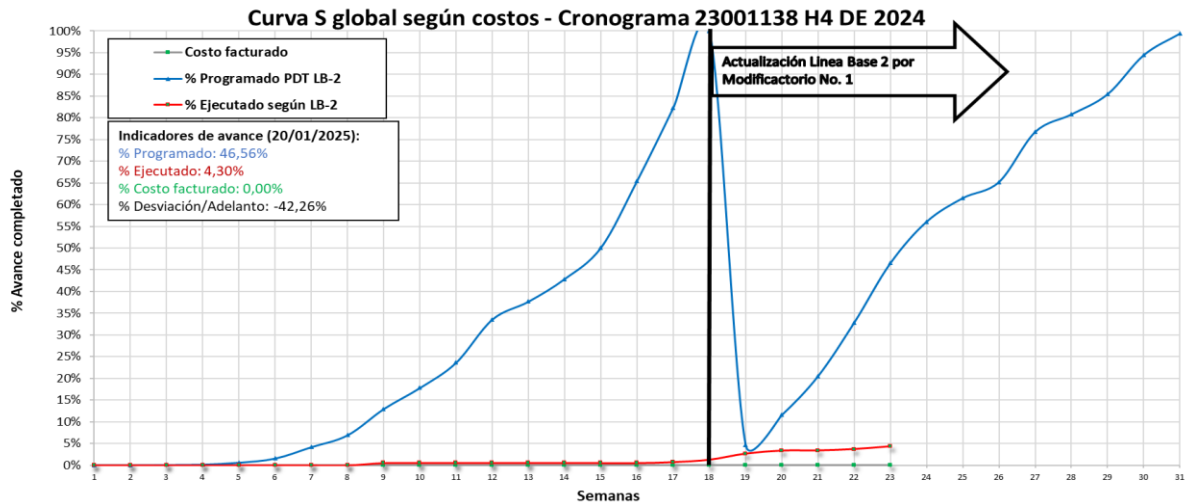


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 1.188.623.031,60	Valor	\$ 53.726.640,00	Valor	\$ 4.041.839.898,36	Valor	\$ 373.220.837,92
Porcentaje	13,69%	Porcentaje	0,62%	Porcentaje	46,56%	Porcentaje	4,30%


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor		Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA SEMANAL



CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA ACUMULADA





PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	1
MANO DE OBRA	Operadores de Maquinaria	5
	Mecánico	1
	Ayudante	13
	Conductor Volqueta	5

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	1
Excavadora de Orugas	1
Vibrocompactadores	2
Bulldozer	1
Carrotanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	3
Camioneta Doble Cabina	1

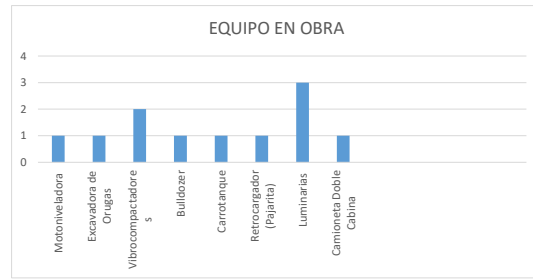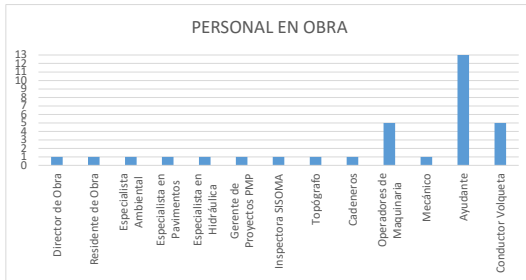

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

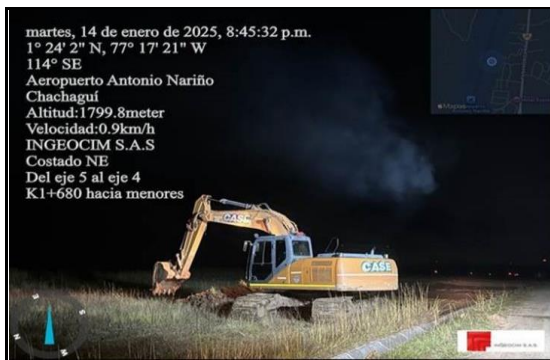

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

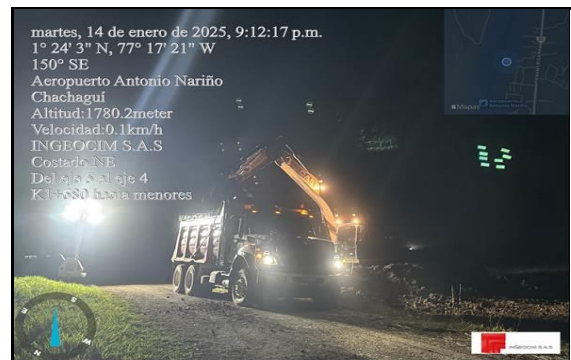


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

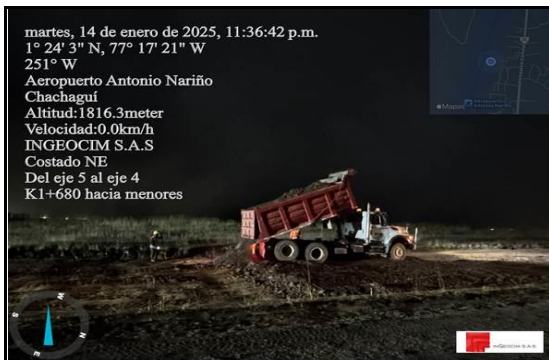


martes, 14 de enero de 2025, 11:36:42 p.m.
1° 24' 3" N, 77° 17' 21" W
251° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1816.3meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+680 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

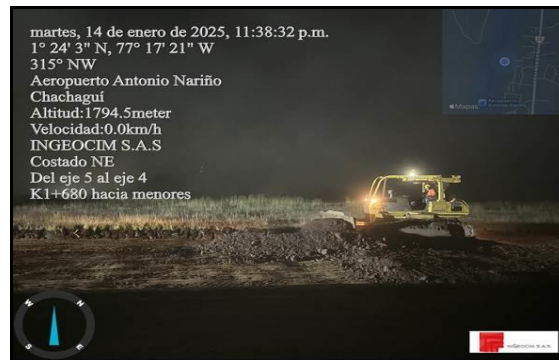


martes, 14 de enero de 2025, 11:38:32 p.m.
1° 24' 3" N, 77° 17' 21" W
315° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1794.5meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+680 hacia menores

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

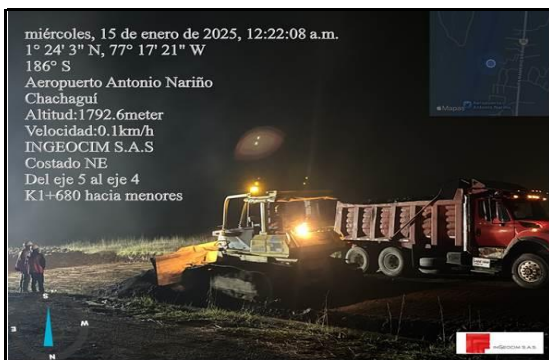


miércoles, 15 de enero de 2025, 12:22:08 a.m.
1° 24' 3" N, 77° 17' 21" W
186° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1792.6meter
Velocidad:0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+680 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

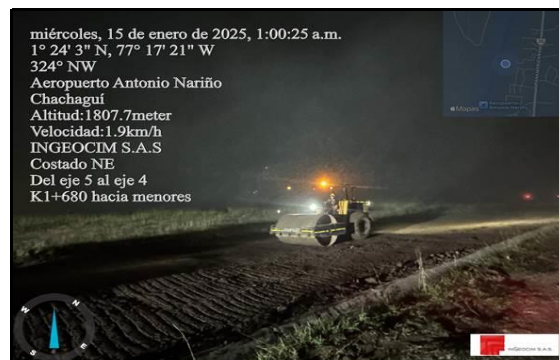

miércoles, 15 de enero de 2025, 1:00:25 a.m.
1° 24' 3" N, 77° 17' 21" W
324° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1807.7meter
Velocidad:1.9km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+680 hacia menores

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

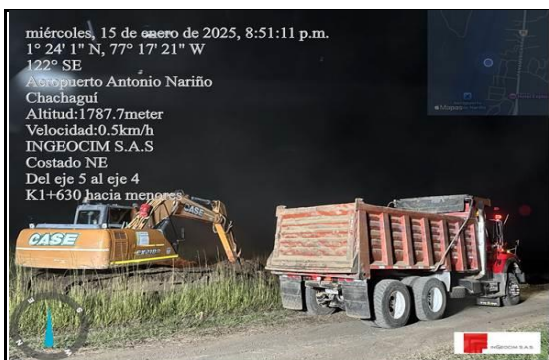


miércoles, 15 de enero de 2025, 8:51:11 p.m.
1° 24' 1" N, 77° 17' 21" W
122° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1787.7meter
Velocidad:0.5km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+630 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




miércoles, 15 de enero de 2025, 8:51:19 p.m.
1° 24' 1" N, 77° 17' 21" W
121° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1790.2meter
Velocidad:0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+630 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

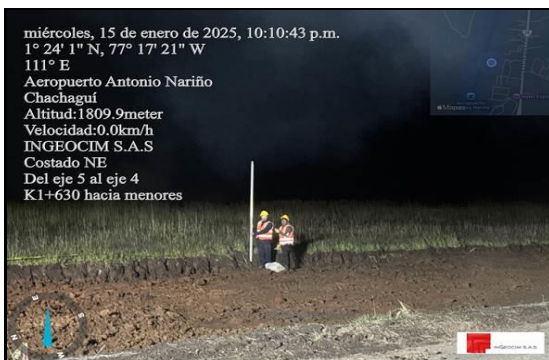


miércoles, 15 de enero de 2025, 10:10:43 p.m.
1° 24' 1" N, 77° 17' 21" W
111° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1809.9meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+630 hacia menores

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE NIVELES DE LA SUBRASANTE CON LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA.

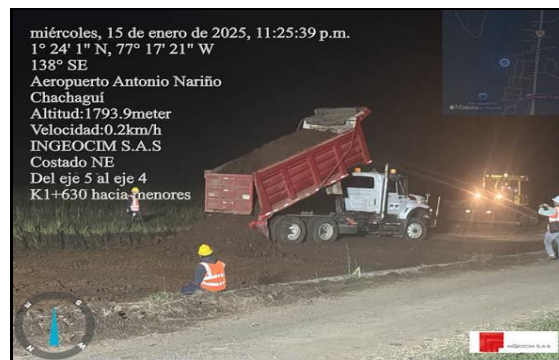


miércoles, 15 de enero de 2025, 11:25:39 p.m.
1° 24' 1" N, 77° 17' 21" W
138° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1793.9meter
Velocidad:0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 al eje 4
K1+630 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

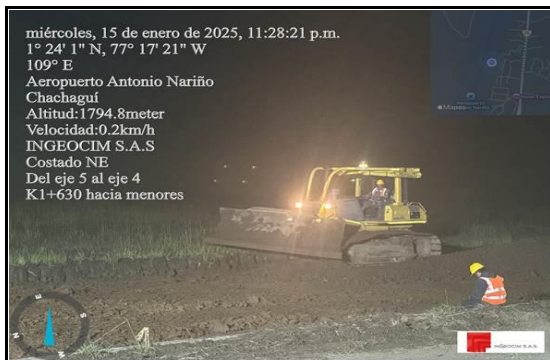

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

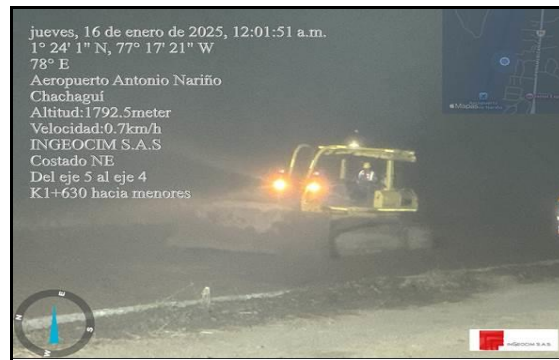

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE SUBRASANTE POR EL ESTADO EVIDENCIADO EN CAMPO DE SATURACIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE




ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE NIVELES DE LA SUBRASANTE CON LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

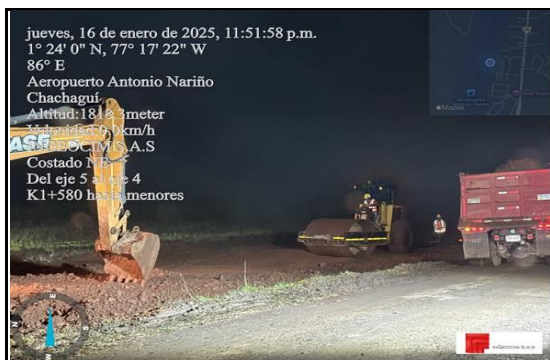


ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

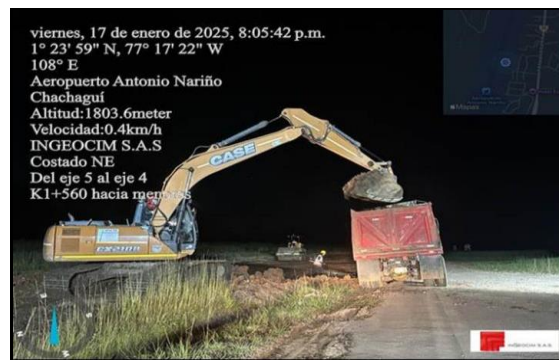

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

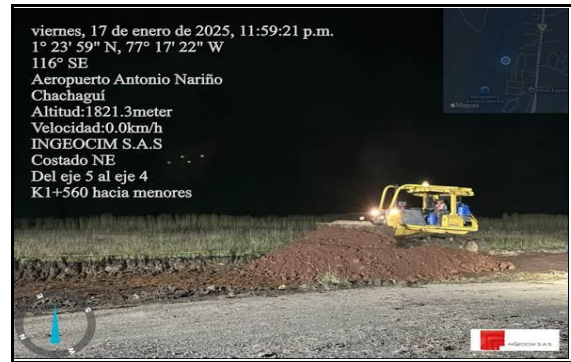

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

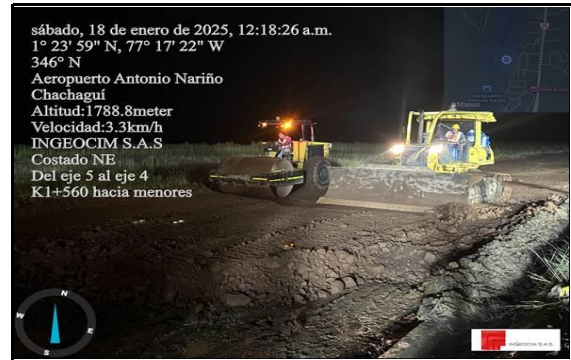

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

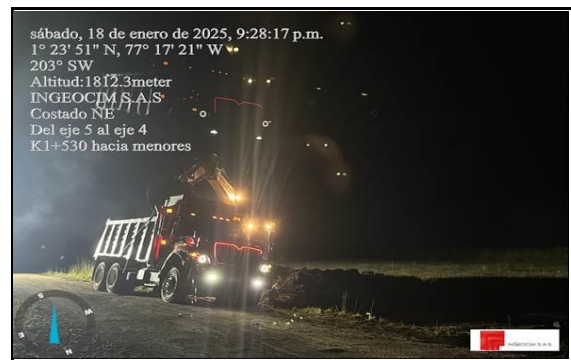

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025. 	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
