



	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 24		Plazo total (días)		210	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)		161	
Del 21/01/2025		% de tiempo transcurrido		76,67%	
Al 27/01/2025		Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado	\$ 825.725.307,12	Valor ejecutado	\$ 62.161.440,00	-\$ 763.563.867,12	
Porcentaje programado	9,51%	Porcentaje ejecutado	0,72%	-8,80%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado	\$ 4.867.565.205,48	Valor ejecutado	\$ 435.893.598,48	-\$ 4.431.671.607,00	
Porcentaje programado	56,08%	Porcentaje ejecutado	5,02%	-51,05%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLAN DE CONTINGENCIA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado	\$ 389.750.970,25	Valor ejecutado	\$ 62.161.440,00	-\$ 327.589.530,25	
Porcentaje programado	4,49%	Porcentaje ejecutado	0,72%	-3,77%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA - PLAN DE CONTINGENCIA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado	\$ 389.750.970,25	Valor ejecutado	\$ 358.501.449,25	-\$ 31.249.521,00	
Porcentaje programado	4,49%	Porcentaje ejecutado	4,13%	-0,36%	
DATOS DEL COTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No: 23001299 H3 DE 2024		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificadorio: NA			Valor actualizado al modificadorio: NA		
Valor actualizado 2: NA			Valor actualizado 2: NA		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: NA			Plazo actualizado: NA		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025		
Suspensión No.: NA			Suspensión No.: NA		
Periodo de Suspensión No.: NA			Periodo de Suspensión No.: NA		
Levantamiento de la suspensión No.: NA			Levantamiento de la suspensión No.: NA		
Nueva fecha de terminación 17/03/2025			Nueva fecha de terminación: 17/03/2025		
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00			Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+500 al K1+405 Costado Nor Este. * Se realiza la Excavación de Mateiral No Clasificado de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+500 al K1+405 Costado Nor Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el K1+500 al K1+405 Costado Nor Este. * Construcción de campamento de la zona de combustible, mantenimiento de equipos y maquinaria.			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-111-OFC de fecha 21 de enero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud de actualización del NOTAM del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-112-OFC de fecha 22 de enero 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-084-2024 – Respuesta al requerimiento de actualización del NOTAM del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-113-OFC de fecha 22 de enero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la respuesta al comunicado C-ALFA-082-2024 – Observaciones al diseño de la fórmula de trabajo de la base estabilizada con cemento del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-114-OFC de fecha 23 de enero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-074-2024 – Revisión y observaciones a los APU de los ítems no previstos del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-115-OFC de fecha 23 de enero 2025 se remitió a la AEROCIVIL y al CONSORCIO ALFA el Apremio No. 3 – Impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-116-OFC de fecha 25 de enero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-081-2025 – Observaciones al Plan de					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* Induccion a nuevo personal. * Inspecciones de seguridad: Inspección almacenamiento de herramientas, equipos y materiales, Inspección de seguridad industrial, Inspección botiquin y extintor de maquinaria, Inspeccion de extintores, Inspeccion de orden y aseo. * Reunion del COPASST. * Preoperacionales de maquinaria y vehiculos. * Entrega de EPP					

AVANCE CANTIDADES						
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024						
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (V3)."				Semana No. 24 (21 Ene - 27 Ene)		
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 2 - NORESTE			67,85%		
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	39.248,54	2,38%	739,20	\$ 6.061.440,00	1,88%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	612.428,51	32,84%		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	16.540,00	12,31%	660,00	\$ 56.100.000,00	3,99%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	8.360,00	27,99%		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	41.800,00	5,31%		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 62.161.440,00	

AVANCE FINANCIERO

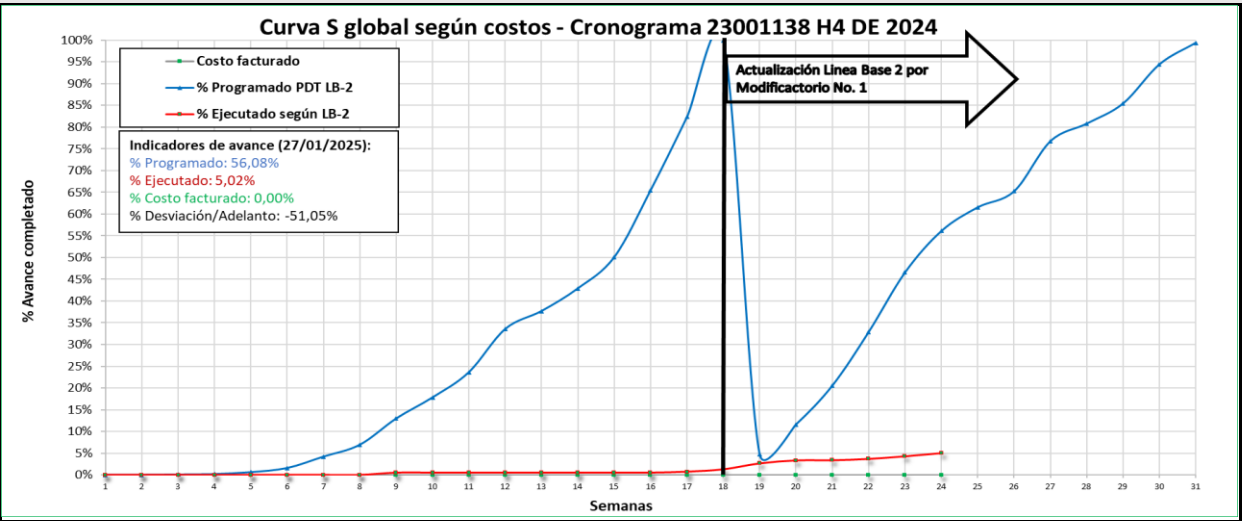

AVANCE FINANCIERO - PLAN DE CONTINGENCIA
--

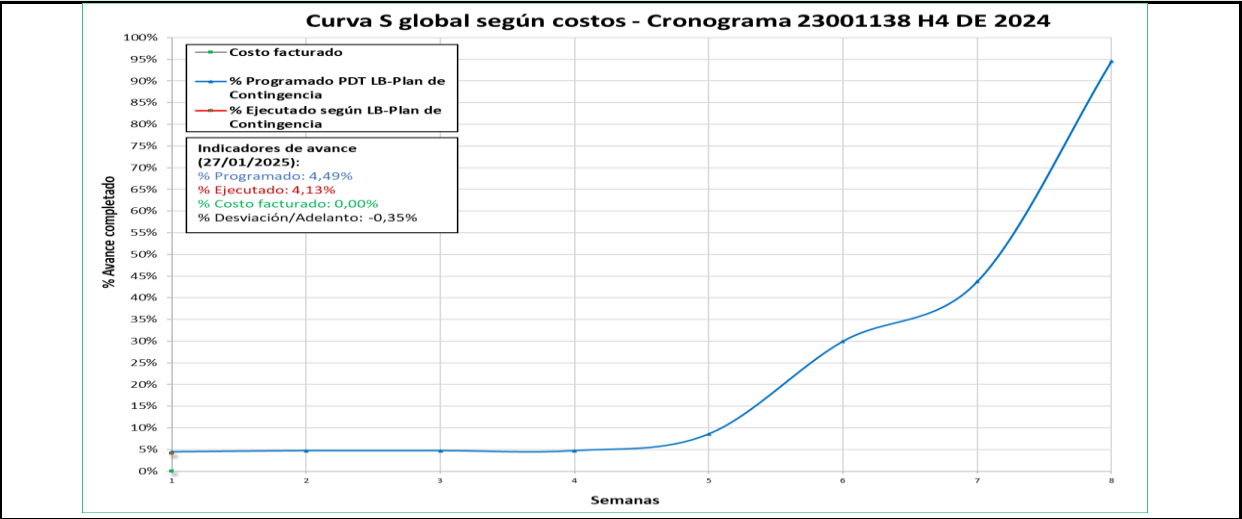


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 825.725.307,12	EJECUTADO	Valor	\$ 62.161.440,00
	Porcentaje	9,51%		Porcentaje	0,72%
PROGRAMADO	Valor	\$ 4.867.565.205,48	EJECUTADO	Valor	\$ 435.893.598,48
	Porcentaje	56,08%		Porcentaje	5,02%


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE - PLAN DE CONTINGENCIA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 389.750.970,25	EJECUTADO	Valor	\$ 62.161.440,00
	Porcentaje	4,49%		Porcentaje	0,72%
PROGRAMADO	Valor	\$ 389.750.970,25	EJECUTADO	Valor	\$ 358.501.449,25
	Porcentaje	4,49%		Porcentaje	4,13%



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

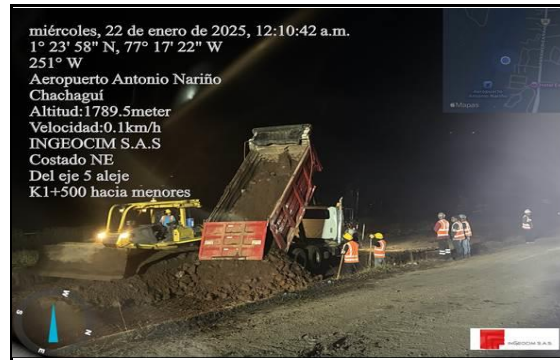


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

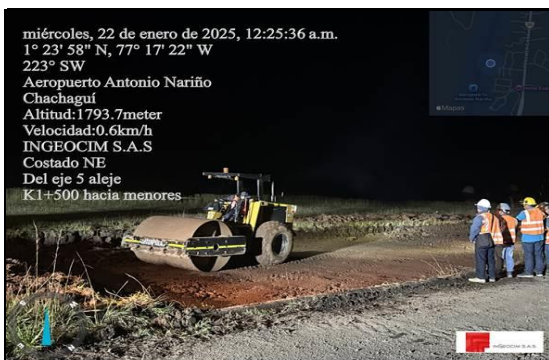

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

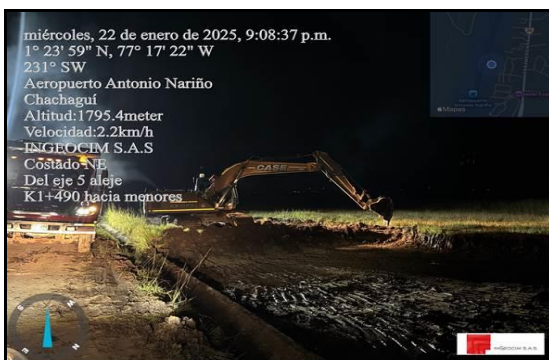

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

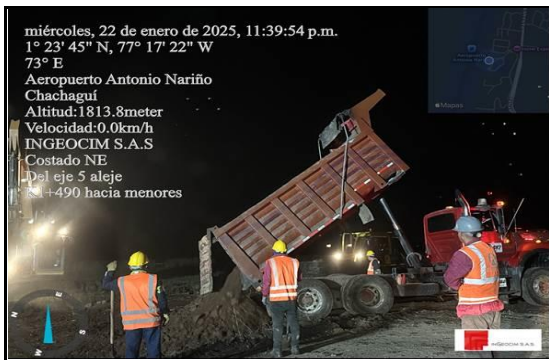

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




jueves, 23 de enero de 2025, 12:34:09 a.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 23" W
312° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1810.1meter
Velocidad:2.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 aleje
K1+490 hacia menores

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 23 de enero de 2025, 8:28:08 p.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 23" W
244° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1778.3meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 aleje
K1+466 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

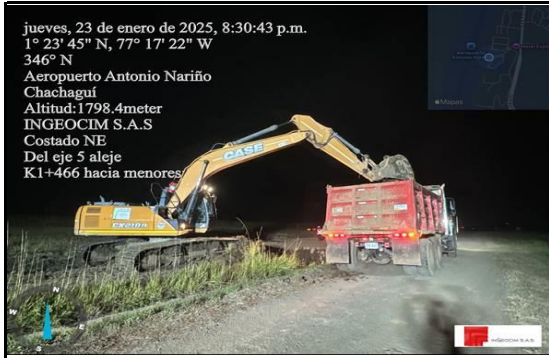

jueves, 23 de enero de 2025, 8:30:43 p.m.
1° 23' 45" N, 77° 17' 22" W
346° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1798.4meter
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 aleje
K1+466 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 23 de enero de 2025, 9:22:49 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 21" W
138° SE
Chachafruto
Chachagui
Altitud:1805.8meter
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 aleje
K1+466 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 23 de enero de 2025, 11:52:55 p.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 22" W
284° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1814.7meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 aleje
K1+466 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 24 de enero de 2025, 12:08:21 a.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 23" W
279° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1814.9meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 aleje
K1+466 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 24 de enero de 2025, 12:20:27 a.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 23" W
272° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1815.8meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 aleje
K1+466 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 24 de enero de 2025, 12:25:57 a.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 23" W
350° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1789.7meter
Velocidad:0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 5 aleje
K1+466 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

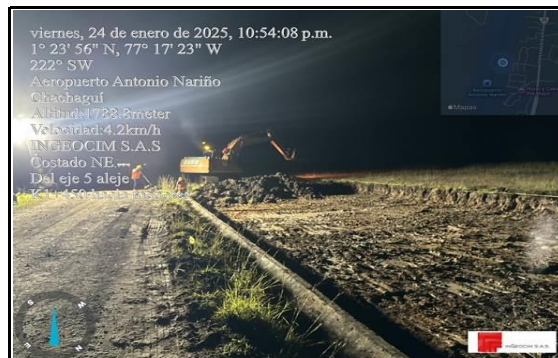


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

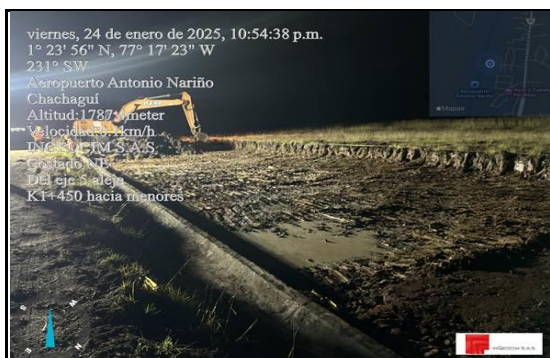


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

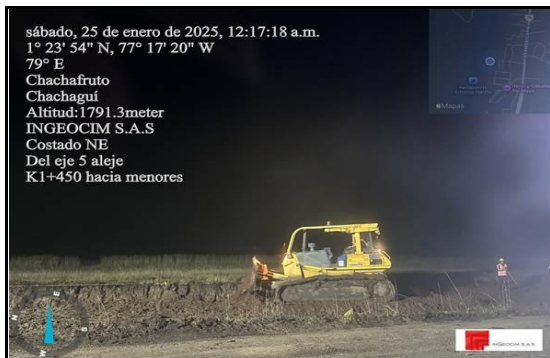


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

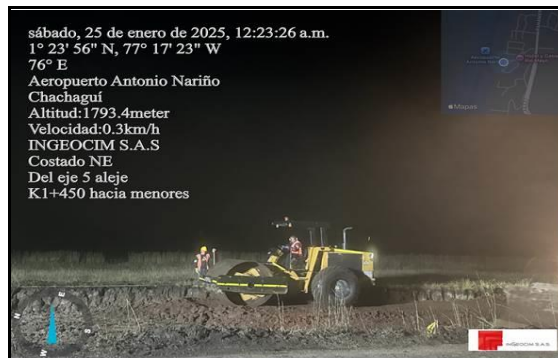

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

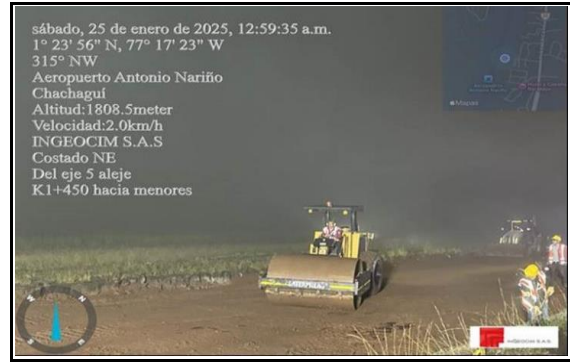

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

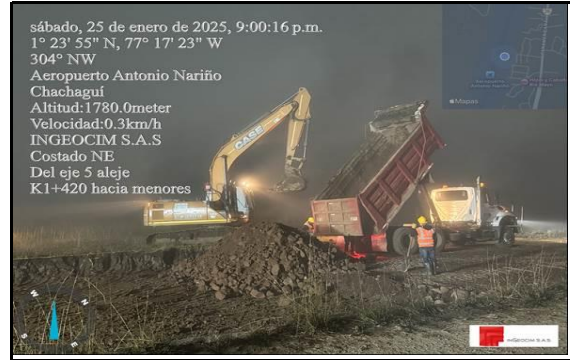

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025. 	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
