


	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No.		25	Plazo total (días)		210
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)		168	
Del		28/01/2025	% de tiempo transcurrido		80,00%
Al		3/02/2025	Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado		\$ 918.315.202,52	Valor ejecutado		- \$ 801.582.202,52
Porcentaje programado		10,58%	Porcentaje ejecutado		-9,23%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado		\$ 5.785.880.408,00	Valor ejecutado		- \$ 5.238.700.288,40
Porcentaje programado		66,65%	Porcentaje ejecutado		-60,35%
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No: 23001299 H3 DE 2024		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificadorio: NA			Valor actualizado al modificadorio: NA		
Valor actualizado 2: NA			Valor actualizado 2: NA		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: NA			Plazo actualizado: NA		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025		
Suspensión No. NA			Suspensión No.: NA		
Periodo de Suspensión No. NA			Periodo de Suspensión No.: NA		
Levantamiento de la suspensión No. NA			Levantamiento de la suspensión No.: NA		
Nueva fecha de terminación 17/03/2025			Nueva fecha de terminación: 17/03/2025		
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00			Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+405 al K1+250 Costado Nor Este y del Eje No. 4 al Eje No. 3 desde el K1+400 al K1+480. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 5 al Eje No. 4 de Franja desde el K1+405 al K1+250 Costado Nor Este y del Eje No. 4 al Eje No. 3 desde el K1+400 al K1+480. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el K1+405 al K1+250 Costado Nor Este y del Eje No. 4 al Eje No. 3 desde el K1+400 al K1+480.			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-117-OFC de fecha 29 de enero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-085-2025 – Revisión de APU, balance de obra actualizado y solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-118-OFC de fecha 31 de enero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA el Apremio No. 1 – Incumplimiento en la instalación de la valla informativa del mejoramiento de las franjas de Seguridad del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-119-OFC de fecha 31 de enero 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Reiteración de la posible afectación económica al contrato de interventoría de la referencia. Mediante el comunicado T-003-2024-120-OFC de fecha 1 de febrero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-092-2025 – Reiteración del Apremio No. 1 por el presunto incumplimiento en la entrega del plan de contingencia ajustado del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-121-OFC de fecha 3 de febrero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-091-2024 – Observaciones al diseño de la fórmula de trabajo de la base estabilizada con cemento del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-122-OFC de fecha 3 de febrero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-085-2024 – Observaciones al concepto geotécnico del mejoramiento de la subrasante de las franjas de seguridad del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-123-OFC de fecha 3 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Incumplimiento de compromisos adquiridos en el comité de seguimiento No. 20 y reiteración del impulso de proceso administrativo sancionatorio del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-124-OFC de fecha 3 de febrero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-093-2025 – Observaciones a la solicitud de Prórroga del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. .					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* inducción a nuevo personal. * entrega de dotación y EPP. * Charla de SST con respecto a riesgo eléctrico, prohibido el uso de celulares durante actividades críticas y medidas de prevención por el aterrizaje de helicópteros en horario de trabajo. * Verificación de uso adecuado de EPP. * Preoperacionales de maquinaria y vehículos.					

AVANCE CANTIDADES						
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				Semana No. 25 (28 Ene - 3 Febr)		
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 2 - NORESTE			67,95%		
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	39.248,54	2,38%	1.252,50	\$ 10.270.500,00	3,19%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	612.428,51	32,84%		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	16.540,00	12,31%	1.252,50	\$ 106.462.500,00	7,57%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	8.360,00	27,99%		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	41.800,00	5,31%		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 116.733.000,00	



AVANCE FINANCIERO

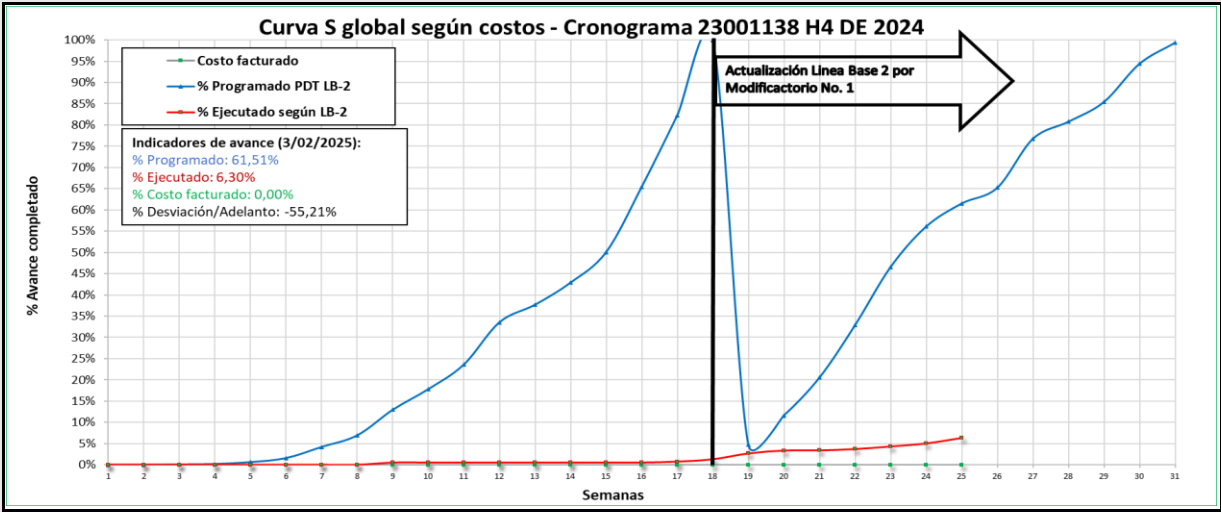

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO
Valor	\$ 918.315.202,52	Valor	\$ 116.733.000,00	Valor	\$ 5.785.880.408,00
Porcentaje	10,58%	Porcentaje	1,34%	Porcentaje	66,65%
				Valor	\$ 547.180.119,60
				Porcentaje	6,30%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO
Valor		Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%




PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	1
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	1
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	2
	Especialista en Pavimentos	1	Bulldozer	1
	Especialista en Hidráulica	1	Carrozanque	1
	Gerente de Proyectos PMP	1	Retrocargador (Pajarita)	1
	Inspectora SISOMA	1	Luminarias	3
	Topógrafo	1	Camioneta Doble Cabina	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	1		
	Operadores de Maquinaria	5		
	Mecánico	1		
	Ayudante	13		
	Conductor Volqueta	6		

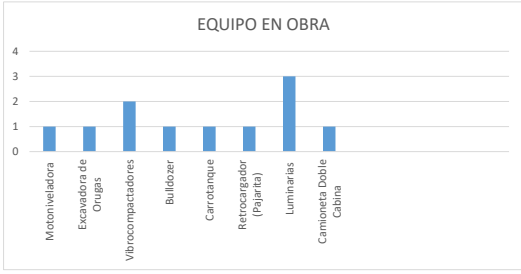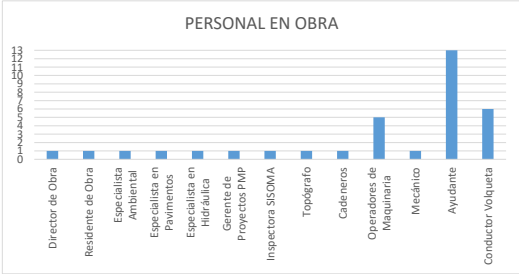

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
lunes, 27 de enero de 2025, 8:03:24 p.m. 1° 23' 54" N, 77° 17' 24" W 74° E Aeropuerto Antonio Nariño Chachagui Altitud:1811.5meter Velocidad:1.9km/h INGEOCIM S.A.S Costado NE Del eje 5 aleje K1+405 hacia menores	lunes, 27 de enero de 2025, 8:28:15 p.m. 1° 23' 55" N, 77° 17' 23" W 202° S Aeropuerto Antonio Nariño Chachagui Altitud:1811.6meter Velocidad:0.0km/h INGEOCIM S.A.S Costado NE Del eje 5 aleje K1+405 hacia menores
ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.
lunes, 27 de enero de 2025, 11:29:36 p.m. 1° 23' 45" N, 77° 17' 22" W 210° SW Aeropuerto Antonio Nariño Chachagui Altitud:1791.3meter INGEOCIM S.A.S Costado NE Del eje 5 aleje K1+405 hacia menores	lunes, 27 de enero de 2025, 11:34:24 p.m. 1° 23' 45" N, 77° 17' 22" W 223° SW Aeropuerto Antonio Nariño Chachagui Altitud:1815.4meter Velocidad:0.0km/h INGEOCIM S.A.S Costado NE Del eje 5 aleje K1+405 hacia menores
ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

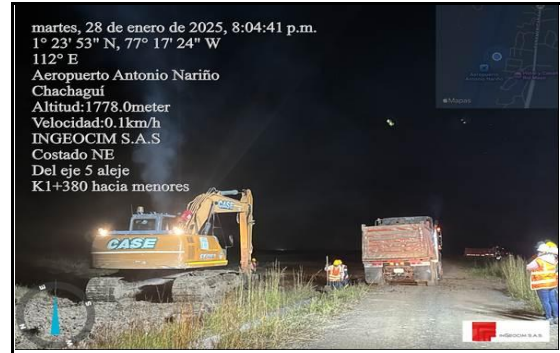

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

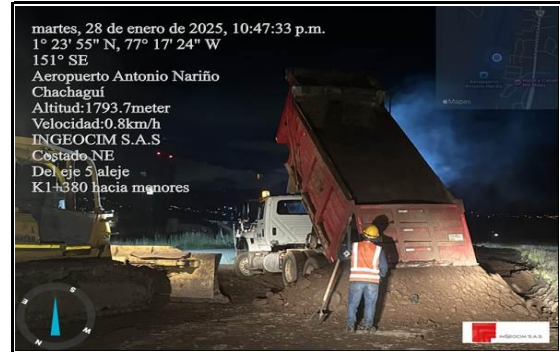

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

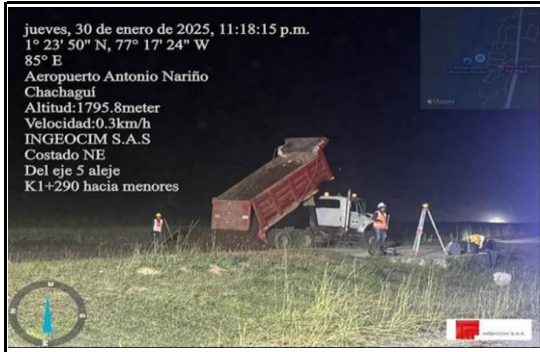


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE CONTROL DE NIVELES POR TOPOGRAFÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

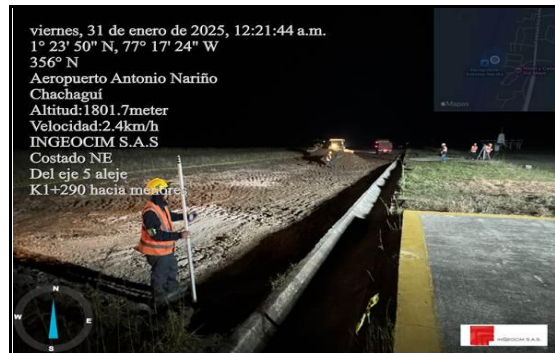

ACTIVIDADES DE CONTROL DE NIVELES POR TOPOGRAFÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

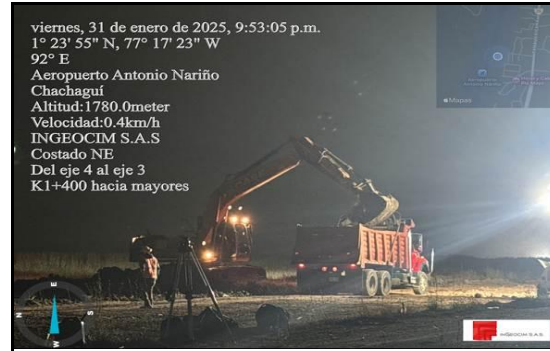

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

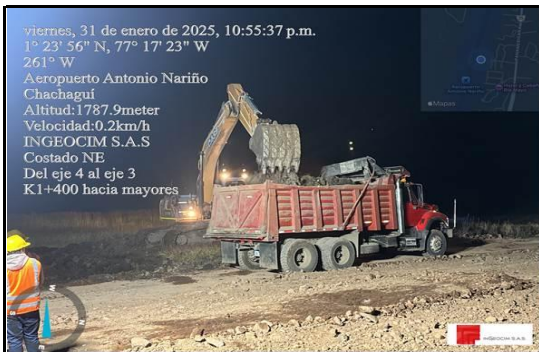


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

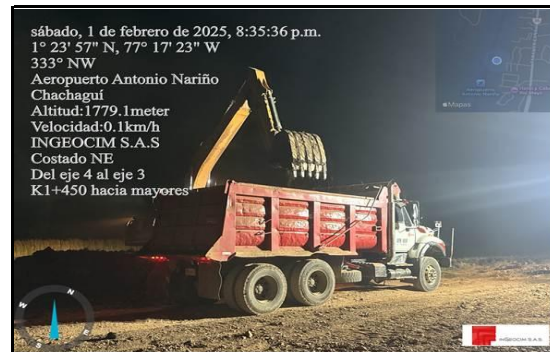

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

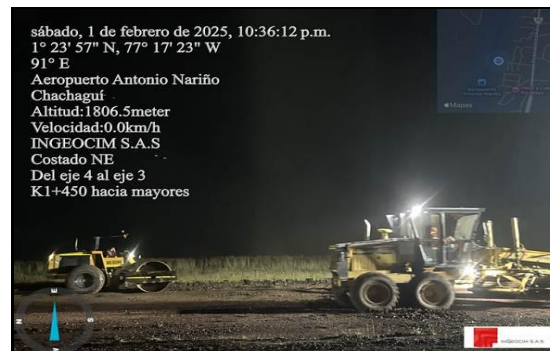

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
